

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 64

(PARTE I- INFORME SOBRE EL
CONTRATO)

PERÍODO:

Diciembre 01 al 31 de 2025



BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA

L1T1-INT-GGP-IN-0064_01_VBB

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 2 de 37		

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

Versión	Acción	Fecha	Descripción de la Acción
V00	Creación del documento	20/03/2021	Creación del informe mensual de interventoría
V01	Codificación de la plantilla	25/03/2021	Ajuste de cajetín superior de la plantilla codificación
V02	Ajustes en la portada de la plantilla	26/06/2022	Cambio de imagen de portada, uso de colores institucionales y redistribución de información
V03	Ajustes en la portada de la plantilla	01/09/2024	Cambio de imagen de portada, uso del color rojo en el material rodante

CONTROL DE APROBACIÓN DEL INFORME

	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboración	Constanza Escobar R	Coordinadora Administrativa	14/01/2026
Revisión	Jesús Torres Romero	Subdirector Técnico	14/01/2026
Aprobación	Javier Descarga Nápoles	Director Interventoría	14/01/2026

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 3 de 37		

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORME SOBRE EL CONTRATO: Contrato de Interventoría 148 de 2020	5
1.1.	Introducción	5
1.2.	Resumen Ejecutivo	7
1.2.1.	Seguimiento Jurídico	7
1.2.2.	Seguimiento a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	8
2.1.	formación legal del Contrato	10
a)	Número del Contrato	10
b)	Objeto	10
c)	Fecha de suscripción del Contrato	10
d)	Fecha de inicio del Contrato	10
e)	Fecha Máxima de terminación del Contrato	11
f)	Plazo, prórrogas, suspensiones y reiniciación en sus diferentes fases	11
g)	Valor del Contrato, adiciones y modificaciones	11
h)	Supervisor del Contrato	12
i)	Informe en relación con el estado de las garantías:	12
1.4	Información Administrativa y Financiera del Contrato	14
a)	Soporte que demuestra que el interventor está a paz y salvo de las obligaciones tributarias	14
b)	Valor pagado del Contrato, detallando el valor a pagar del mes en curso y pago acumulado	14
1.5	Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Interventoría	23
1.5.1	Formatos de Gestión SST del CSPLMB.....	23
1.5.2	Certificaciones de Paz y salvo	28
1.5.3	Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social	28
1.5.4	Pagos de salarios personal de interventoría	29
1.5.5	Egresos de personal/ Examen de retiro	29
1.5.6	Registro de la notificación de riesgos	29
1.5.7	Registro de asistencia a la inducción SST	30
1.5.8	Conceptos médicos ocupacionales	30
1.5.9	Registro de Capacitaciones y entrenamientos	30
1.5.10	Entrega de EPP	31
1.5.11	Soporte Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ("COPASST")	31
1.5.12	Soporte Comité de Convivencia Laboral	31
1.5.13	Aprobación emitida entidad gubernamental PESV	31
1.5.14	Soporte cumplimiento PESV.....	32
1.5.15	Registro de capacitaciones conductores	32
1.5.16	Soporte Actas de comité ambiental y SST	32
1.5.17	Registro Fotográfico	32
1.5.18	Registro de PQRS.....	32
1.5.19	Registro de inspecciones.....	33
1.5.20	Documentos finales de año.....	33
1.5.21	Otras actividades SST realizadas por interventoría	34
1.5.22	Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV	34
1.5.23	Cumplimiento de las obligaciones SST por parte de interventoría	36
1.6.	Seguimiento Contrato No. 148 de 2020	37

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 4 de 37		

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1.3-1. Porcentaje de participación, Consorcio Supervisor PLMB.	11
Tabla 1.4-1. Valores del Contrato	14
Tabla 1.4-2. Causación Retribución del Interventor a pesos y dólares constantes de diciembre de 2017 antes de IVA	17
Tabla 1.4-3. Valores pagados en pesos y dólares antes de IVA	19
Tabla 1.4-4. Valores retención Fase Previa COP antes de IVA	20
Tabla 1.4-5. Valores retención Fase Previa USD antes de IVA	21
Tabla 1.4-6. Valor de la Retribución del Interventor noviembre de 2025 antes de IVA	21
Tabla 1.5-1 Seguimiento personal interventoría	24
Tabla 1.5-2 Seguimiento sexo personal interventoría	25
Tabla 1.5-3 Accidentes laborales Interventoría	26
Tabla 1.5-4 Análisis tendencial plan de trabajo	35
Tabla 1.5-5 siniestros de tránsito 2025	35

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 5 de 37		

1. INFORME SOBRE EL CONTRATO: Contrato de Interventoría 148 de 2020

1.1. Introducción

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) y el Consorcio Supervisor PLMB (CSPLMB) dando aplicabilidad a lo dispuesto en la modalidad de contratación correspondiente a la SBCC de acuerdo con las políticas de adquisición del BID (GN 2350-9), de acuerdo con el inciso segundo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y en las obligaciones adquiridas por la EMB en los contratos de crédito suscritos con el Banco, suscribieron el 2020-08-25, el Contrato de Interventoría No. 148 de 2020, cuyo objeto es:

El Interventor se obliga para con la EMB a realizar la Interventoría integral, técnica, económica, financiera, contable, jurídica, administrativa, operativa, predial, ambiental, social y de seguridad salud en el trabajo, en relación con las obligaciones adquiridas por el Concesionario a través del Contrato de Concesión que dicho Concesionario ejecute durante la vigencia de este Contrato.

Por consiguiente, el objeto del Contrato comprende, sin limitarse, a la verificación en forma presencial en los términos establecidos en el Contrato de Concesión y en lo no señalado por éste, en este Contrato de las obligaciones a cargo del Concesionario en relación con:

- i) La financiación, Estudios y Diseños de Detalle Principales y Otros Estudios y Diseños de Detalle, ejecución de las Obras de Construcción, Obras de la Fase Previa, Obras de Edificaciones, Obras para Redes a Cargo del Concesionario, Obras de Adecuación y Reparación de Desvíos, Obras para Intersección Especiales, la Gestión Social y Ambiental del Proyecto, así como la Operación y el Mantenimiento del Proyecto.
- ii) La financiación, diseño, instalación, suministro, pruebas individuales y de conjunto, Certificaciones y puesta en marcha, así como la Operación, reposición, Mantenimiento del Material Rodante y de los Sistemas Metro-Ferrovianos, y la prestación del servicio público de transporte masivo férreo de pasajeros en Bogotá a través de la PLMB.
- iii) La Reversión Parcial, la Reversión y liquidación del Contrato de Concesión, en el caso en que dichas actividades ocurran durante la vigencia del presente Contrato,
- iv) En general, verificar, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión y en este Contrato, el cumplimiento por parte del Concesionario de sus obligaciones contractuales.

Para el presente Contrato, aplicarán las cláusulas del BID quien junto con el BIRF y BEI hacen parte de la financiación integral del Proyecto a través de los préstamos 4572/OC-CO (BID), el 8901-CO (BIRF) y el 89993 (BEI), junto al Convenio de Cofinanciación de la Nación y el Distrito. Así mismo, se registrará por lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y demás Leyes Aplicables.

El plazo será de máximo once (11) años, contados a partir de la entrada en vigor del Contrato, o cuando el Precio del Contrato del que trata la sección 6.2 de estas CEC se agote, lo que suceda

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 6 de 37		

primero. Cualquier prórroga o adición del plazo de este Contrato deberá realizarse a través de un otrosí, previo cumplimiento de los trámites presupuestales y legales correspondientes por parte de la EMB. ii) El Interventor declara y manifiesta que conoce que las prestaciones del presente Contrato están asociadas a las Fases y Etapas del Contrato de Concesión. Por consiguiente, también declara y manifiesta que las fases y etapas del presente Contrato corresponderán a la duración efectiva de las Fases y Etapas del Contrato de Concesión, por lo que la suscripción de las respectivas actas por parte del Concesionario y la EMB para iniciar una Fase o Etapa del Contrato de Concesión se entenderá que dicha Fase y Etapa también inicie respecto de este Contrato. El acta de Inicio del Contrato de la Interventoría se suscribió el 2020-09-23, fecha en la cual entra en vigor el Contrato de Interventoría.

En virtud del Informe Técnico que a continuación se presenta, el Consorcio Supervisor PLMB, informa sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas establecidas en el Apéndice A2 Capítulo II, numeral 1, 2, 3 y 4, consistentes en la verificación, seguimiento y control a las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión a cargo del Concesionario y ejecución en debida forma de las actividades y obligaciones relacionadas en el numeral 3 y 4 del del Apéndice en mención, en este orden, el CSPLMB presenta a la EMB, el **Informe Mensual No. 64**, correspondiente al desarrollo de las actividades del periodo, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice B - Requisitos para la Presentación de Informes, con el fin de describir las actividades realizadas por el Concesionario, la Interventoría, el avance del proyecto, el control financiero, conclusiones y recomendaciones.

Durante el mes de diciembre de 2025 el Interventor hizo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones financieras establecidas en el Contrato de Concesión y analiza y presenta en el siguiente informe, la información financiera del Patrimonio Autónomo correspondiente al mes de noviembre de 2025. Dentro de las gestiones realizadas se encuentra la realización del Comité de Coordinación Financiera, revisión del Informe de Gestión de la Fiduciaria, asistencia al Comité Fiduciario, cálculo y seguimiento a la Retribución del tercer trimestre de 2025, entre otros.

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 7 de 37		

1.2. Resumen Ejecutivo

1.2.1. Seguimiento Jurídico

2. REFERENCIA CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

Nota aclaratoria: Durante el periodo reportado no se gestionaron tramites o requerimientos relacionados con personal contractual de la interventoría.

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 8 de 37		

1.2.2. Seguimiento a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó el seguimiento y control de las actividades ejecutadas en todos los frentes del Proyecto PLMB, verificando el cumplimiento de los lineamientos del PMAS y de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el frente General se supervisaron las labores de los contratistas en los diferentes sectores del viaducto y en las oficinas ML1, incluyendo seguridad física, mantenimiento en estaciones, replanteos y levantamientos topográficos. También se controlaron actividades como instalación de mojones, protección de taludes, orden y aseo, manejo y acopio de materiales granulares, retiro de RCD y mantenimiento de puntos ecológicos. A nivel SST, se desarrollaron capacitaciones, análisis de riesgos, apertura de permisos de trabajo, inspecciones de seguridad y acompañamiento en actividades de redes, cerramientos y señalización.

En el frente Building, las labores supervisadas incluyeron orden y aseo, instalación de mojones, manejo de acopios, retiro de RCD, mantenimiento de puntos ecológicos, producción de pilotes, conexiones eléctricas, traslado de redes húmedas, adecuación de estructuras y construcción de cerramientos perimetrales. Se verificó la correcta ejecución de permisos de trabajo, análisis de riesgos, inspecciones de seguridad, capacitaciones y el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro, especialmente en tareas críticas como alturas e izaje. También se realizó acompañamiento permanente en obra y atención al ciudadano en los puntos designados.

En los frentes WS1 y WS2 se realizó seguimiento a la implementación de medidas de seguridad para actividades de alto riesgo, verificando el uso adecuado de EPP y EPCC, el diligenciamiento de ATS, permisos de trabajo y planes de izaje. Se realizaron inducciones y capacitaciones al personal, además de responder a incidencias emitidas por la Interventoría. Se supervisaron las actividades constructivas como excavaciones mecánicas, armado de acero, entibados estructurales, construcción de pilotes, adecuación de corredores seguros, instalación de cerramientos, prospecciones arqueológicas y mantenimiento de campamentos y unidades sanitarias. También se garantizó el orden y aseo en los frentes de trabajo.

En el frente WS3 se acompañaron las jornadas de aseo, el mantenimiento del PMT, los izajes para descargue y traslado de acero, adecuación de campamentos, armado de parrillas para muros pantalla, excavaciones y demoliciones para vigas cabecal y fundidas de concreto. De igual manera se supervisaron actividades de mejoramiento de suelos, excavaciones para redes, instalación de tubería, recuperación de áreas intervenidas con concreto y la instalación de cerramientos perimetrales. Se llevaron a cabo capacitaciones e inspecciones de SST conforme al cronograma.

En el frente WS4 – CHEC se verificó el cumplimiento del PMT, el control de tráfico, la instalación y mantenimiento de cerramientos, pilosombras, señalización y demarcación vial. También se inspeccionaron actividades de hincado de pilotes, trabajos en alturas, trabajos en caliente, izajes de carga, medición de gases, pruebas de alcoholemia y retiro de RCD. Se mantuvo el orden y aseo en las zonas intervenidas, así como la gestión de contratistas y el desarrollo de charlas y capacitaciones SSTA.

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 9 de 37		

En el frente Redes se acompañaron actividades de excavación y demolición para redes secas y húmedas, instalación de tuberías, fundición de concreto en cajas, izaje de elementos, trabajos en túnel liner y mejoramiento de suelos. Se realizaron jornadas de limpieza, mantenimiento de señalización y senderos, inspecciones programadas y recuperación con concreto de áreas intervenidas. Asimismo, se desarrollaron capacitaciones SST dirigidas a todo el personal.

En el frente Rieles se supervisó el transporte, izaje y almacenamiento de rieles, así como la instalación de rieles de prueba. Se verificaron actividades como topografía, instalación de geotextil, colocación y compactación de balasto, nivelación, instalación de durmientes, soldadura de prueba e instalación de aceros y vaciado de concreto en plintos. También se revisaron los ATS, permisos de trabajo y planes de izaje.

Finalmente, en el frente JV se gestionaron permisos de trabajo en alturas, caliente, excavaciones y espacios confinados, así como los planes de izaje necesarios. Se realizaron ATS, inspecciones SST, capacitaciones, charlas e inducciones. Las actividades constructivas incluyeron el montaje de estaciones BRT, señalización y demarcación de áreas, instalación de barreras, implementación de PMT y tableros de control operacional, excavación de redes y construcción de cimentaciones. Se mantuvo orden y aseo en las zonas intervenidas y se continuó con la premiación de comportamientos seguros.

En conjunto, todas estas acciones permitieron asegurar el avance de las obras bajo condiciones de seguridad, orden y cumplimiento de los procedimientos establecidos.

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 10 de 37		

2.1. formación legal del Contrato

a) Número del Contrato

Contrato de Interventoría N.º. 148 de 2020

b) Objeto

El Interventor se obliga para con la EMB a realizar la Interventoría integral, técnica, económica, financiera, contable, jurídica, administrativa, operativa, predial, ambiental, social y de seguridad salud en el trabajo, en relación con las obligaciones adquiridas por el Concesionario a través del Contrato de Concesión que dicho Concesionario ejecute durante la vigencia de este Contrato.

Por consiguiente, el objeto del Contrato comprende, sin limitarse, a la verificación en forma presencial en los términos establecidos en el Contrato de Concesión —y en lo no señalado por éste, en este Contrato— de las obligaciones a cargo del Concesionario en relación con:

- i)* La financiación, Estudios y Diseños de Detalle Principales y Otros Estudios y Diseños de Detalle, ejecución de las Obras de Construcción, Obras de la Fase Previa, Obras de Edificaciones, Obras para Redes a Cargo del Concesionario, Obras de Adecuación y Reparación de Desvíos, Obras para Intersección Especiales, la Gestión Social y Ambiental del Proyecto, así como la Operación y el Mantenimiento del Proyecto.
- ii)* La financiación, diseño, instalación, suministro, pruebas individuales y de conjunto, Certificaciones y puesta en marcha, así como la Operación, reposición, Mantenimiento del Material Rodante y de los Sistemas Metro-Ferrovianos, y la prestación del servicio público de transporte masivo férreo de pasajeros en Bogotá a través de la PLMB.
- iii)* La Reversión Parcial, la Reversión y liquidación del Contrato de Concesión, en el caso en que dichas actividades ocurran durante la vigencia del presente Contrato,
- iv)* En general, verificar, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión y en este Contrato, el cumplimiento por parte del Concesionario de sus obligaciones contractuales”.

c) Fecha de suscripción del Contrato

2020-08-25

d) Fecha de inicio del Contrato

2020-09-23

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 11 de 37		

e) Fecha Máxima de terminación del Contrato

2031-09-22

f) Plazo, prórrogas, suspensiones y reiniciación en sus diferentes fases

Máximo once (11) años, contados a partir de la entrada en vigor del Contrato, o cuando el precio del Contrato del que trata la sección 6.2 de estas CEC se agote, lo que suceda primero. El acta de Inicio del Contrato de la Interventoría se suscribió el 2020-09-23 fecha en la cual entra en vigor el Contrato de Interventoría.

g) Valor del Contrato, adiciones y modificaciones

El Precio del Contrato corresponde a la suma de doscientos veintitrés mil trescientos dieciocho millones ochocientos treinta y seis mil cincuenta y tres pesos con sesenta centavos (COP 223.318.836.053,60) de diciembre de 2017, IVA incluido. De acuerdo con los valores contenidos en la Propuesta del Interventor y las condiciones establecidas en este Contrato, por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el mismo y en los documentos del Proceso de Selección del Interventor.

El porcentaje de participación de la Interventoría se encuentra distribuido de la siguiente manera:

EMPRESA	Participación (%)
AYESA México S.A de C.V.	25
AYESA ingeniería y arquitectura SAU, Sucursal Colombia	15
MAB Ingeniería de Valor S.A.	20
MM S.P.A.	15
ITALFERR S.P.A.	25

Tabla 2.1-1. Porcentaje de participación, Consorcio Supervisor PLMB.

En el mes de marzo de 2023 se surtió modificación al Contrato de Interventoría, a saber, así:

No. DE MODIFICACIÓN	FECHA	MODIFICACION REALIZADA
Modificación No. 1	10 de marzo de 2023	El 10 de marzo de 2023, las partes suscribieron el modificatorio 1, el ajustando las siguientes cláusulas: - Numerales 1 y 2 de la Cláusula 6.4, romanito XVI de las CEC del contrato de interventoría - Literal k, del numeral 1, Sección II del Apéndice A2 contrato de interventoría - Literal o, al numeral 1 del Apéndice A2 del contrato de interventoría - Cláusula 6.4 romanito VII numerales 1 y 3 de las CEC del contrato de interventoría - Cláusula 6.4 romanito VIII numerales 1 y 3 de las CEC del contrato de interventoría - Cláusula 3.4, literal b) de las CEC del contrato de interventoría

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 12 de 37		

h) Supervisor del Contrato

Gerente Ejecutivo PLMB – Leonel Mauricio Vera Maldonado

i) Informe en relación con el estado de las garantías:

En el presente literal se muestra información general sobre las garantías constituidas en el Contrato de interventoría 148 de 2020 sección III ‘*Condiciones Especiales del contrato CEC*’.

- Se actualizaron las Garantías Contractuales del Contrato de Interventoría conforme al inicio de la Fase de Construcción surtida el 25 de julio de 2023, las cuales fueron aprobadas por la EMB mediante oficio EXTS23-0004681.
- Mediante comunicado L1T1-INT-CE-24-0649 (EXT24-0002719) la Interventoría remitió para revisión y aprobación de la EMB las Garantías Contractuales actualizadas conforme la variación del IPC 2024, las cuales fueron aprobadas por la EMB mediante oficio EXTS24-00015530.
- Mediante comunicados L1T1-INT-CE-25-1137 (EXT25-0003534) y L1T1-INT-CE-25-1080 (EXT25-0003388) la Interventoría remitió para revisión y aprobación de la EMB las Garantías Contractuales actualizadas conforme la variación del IPC 2025, las cuales fueron aprobadas por la EMB mediante oficio EXTS25-0001527.

A continuación, se muestran las Garantías Contractuales aprobadas por la EMB.

GARANTÍAS

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:

Contrato No.	148 de 2020
Objeto de la póliza	AMPARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES CAUSADOS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (ASEGURADO), LOS CUALES REPRESENTEN LESIÓN O MUERTE A PERSONAS Y/O EL DETERIORO O DESTRUCCIÓN DE BIENES DE TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 148 DE 2020: ‘EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON LA EMB A REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONCESIONARIO A TRAVÉS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN QUE DICHO CONCESIONARIO EJECUTE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO.
Contratista	CONSORCIO SUPERVISOR PLMB
Tomador	CONSORCIO SUPERVISOR PLMB NIT 901404612-0 CONFORMADO POR: AYESA MÉXICO SA DE CV IDENTIFICADO CON NUMERO RFC AME031128173 (25%). AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900494141-4 (15%). MAB INGENIERÍA DE VALOR SA NIT. 900139110-5 (20%). MM SPA IDENTIFICADO CON NÚMERO 01742310152 (15%). ITALFERR SPA IDENTIFICADO CON NÚMERO 06770620588 (25%).
Asegurado	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ SA NIT 901038962-3.
Compañía Aseguradora	Seguros del Estado S. A.
Póliza No.	15-40-101089677 – Anexo 6.
Fecha de expedición	2025-07-14.

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 13 de 37		

Contrato No.	148 de 2020	
Riesgos asegurados (Amparos)	Vigencia	Valor asegurado
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	Desde 2023-07-25 Hasta 2026-07-25	\$31.678.457.058.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	Desde 2023-07-25 Hasta 2026-07-25	\$31.678.457.058.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	Desde 2023-07-25 Hasta 2026-07-25	\$31.678.457.058.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Desde 2023-07-25 Hasta 2026-07-25	\$31.678.457.058.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	Desde 2023-07-25 Hasta 2026-07-25	\$31.678.457.058.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	Desde 2023-07-25 Hasta 2026-07-25	\$31.678.457.058.00
GASTOS MÉDICOS	Desde 2023-07-25 Hasta 2026-07-25	\$31.678.457.058.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	Desde 2023-07-25 Hasta 2026-07-25	\$31.678.457.058.00

Póliza de Cumplimiento:

Contrato No.	148 de 2020		
Objeto de la póliza	AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 148 DEL 2020 CUYO OBJETO ES: 'EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON LA EMB A REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONCESIONARIO A TRAVÉS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN QUE DICHO CONCESIONARIO EJECUTE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO.		
Contratista	CONSORCIO SUPERVISOR PLMB		
Tomador	CONSORCIO SUPERVISOR PLMB NIT 901404612-0 CONFORMADO POR: AYESA MÉXICO SA DE CV IDENTIFICADO CON NUMERO RFC AME031128I73(25%) AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900494141-4 (15%) MAB INGENIERÍA DE VALOR SA NIT. 900139110-5 (20%) MM SPA IDENTIFICADO CON NÚMERO 01742310152 (15%) ITALFERR SPA IDENTIFICADO CON NÚMERO 06770620588 (25%)		
Asegurado	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ SA NIT 901038962-3		
Compañía Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
Póliza No.	15-44-101284815 – Anexo 4		
Fecha de expedición	2025-02-21		
Riesgos asegurados (Amparos)	Vigencia	Valor asegurado	Porcentaje
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde 2023-07-25 Hasta 2028-03-14	\$31.678.457.058,00	Valor mayor o igual a COP 21.191.855.729, expresados en pesos constantes de diciembre de 2017.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde 2023-07-25 Hasta 2030-09-14	\$15.839.228.530,00	Valor mayor o igual a COP 10.595.927.865, expresados en pesos constantes de diciembre de 2017.
CALIDAD DEL SERVICIO	Desde 2027-09-14 Hasta 2032-09-14	\$28.510.611.353,14	Valor mayor o igual a COP 19.072.670.157, expresados en pesos constantes de diciembre de 2017.

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 14 de 37		

1.4 Información Administrativa y Financiera del Contrato

a) Soporte que demuestra que el interventor está a paz y salvo de las obligaciones tributarias

En el LINK se encuentra el Anexo 1.4 A Certificado cumplimiento Obligaciones Tributarias

[1.4. Información Activa y Financiera.pdf](#)

b) Valor pagado del Contrato, detallando el valor a pagar del mes en curso y pago acumulado

Concepto	Valor de referencia en pesos (\$)	Pesos colombianos (\$ dic 2017)	Dólares estadounidenses (US dic 2017)
Valor Fase Previa	48.873.741.183	26.319.044.561,00	2.826.941,00
Valor Fase de Construcción	174.743.502.391	91.309.157.653,00	9.807.559,00
Valor Fase de Certificaciones Pruebas, Certificaciones y Puesta en Marcha	24.638.014.701	6.650.139.855,00	714.295,00
Etapas de Operación y Mantenimiento	32.351.956.126	17.835.298.259,00	1.915.698,00
Valor antes de IVA (incluye todos los demás tributos a cargo del Consultor)	280.607.214.401	142.113.640.328,00	15.264.493,00
IVA (19%)	53.315.370.736	27.001.591.662,32	2.900.253,67
Valor total	333.922.585.137	169.115.231.990,32	18.164.746,67

Tabla 1.4-1. Valores del Contrato

Nota: Los pesos y dólares están expresados en cifras constantes de diciembre de 2017

Se presenta la causación de la Retribución del Interventor en pesos constantes de diciembre de 2017, y la causación acumulada, antes de IVA.

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR OFERTADO FASE PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		VALOR CAUSADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		CAUSACIÓN ACUMULADA PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017	
1	148-2020	oct-20	26.319.044.561,00	COP	324.926.476,06	COP	324.926.476,06	COP
			2.826.941,00	USD	34.900,51	USD	34.900,51	USD
2	148-2020	nov-20	26.319.044.561,00	COP	974.779.428,19	COP	1.299.705.904,25	COP
			2.826.941,00	USD	104.701,52	USD	139.602,02	USD
3	148-2020	dic-20	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP	2.306.977.980,04	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD	247.793,59	USD
4	148-2020	ene-21	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP	3.314.250.055,83	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD	355.985,16	USD
5	148-2020	feb-21	26.319.044.561,00	COP	909.794.132,97	COP	4.224.044.188,80	COP
			2.826.941,00	USD	97.721,42	USD	453.706,58	USD
6	148-2020	mar-21	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP	5.231.316.264,59	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD	561.898,15	USD
7	148-2020	abr-21	26.319.044.561,00	COP	974.779.428,19	COP	6.206.095.692,78	COP
			2.826.941,00	USD	104.701,52	USD	666.599,67	USD
8	148-2020	may-21	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP	7.213.367.768,57	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD	774.791,24	USD
9	148-2020	jun-21	26.319.044.561,00	COP	974.779.428,19	COP	8.188.147.196,76	COP
			2.826.941,00	USD	104.701,52	USD	879.492,76	USD
10	148-2020	jul-21	26.319.044.561,00	COP	1.007.272.075,79	COP	9.195.419.272,55	COP
			2.826.941,00	USD	108.191,57	USD	987.684,32	USD

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 15 de 37		

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR OFERTADO FASE PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		VALOR CAUSADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		CAUSACIÓN ACUMULADA PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017	
11	148-2020	ago-21	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	1.007.272.075,79 108.191,57	COP USD	10.202.691.348,34 1.095.875,89	COP USD
12	148-2020	sep-21	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	974.779.428,19 104.701,52	COP USD	11.177.470.776,52 1.200.577,41	COP USD
13	148-2020	oct-21	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	1.007.272.075,79 108.191,57	COP USD	12.184.742.852,31 1.308.768,98	COP USD
14	148-2020	nov-21	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	974.779.428,19 104.701,52	COP USD	13.159.522.280,50 1.413.470,50	COP USD
15	148-2020	dic-21	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	1.007.272.075,79 108.191,57	COP USD	14.166.794.356,29 1.521.662,07	COP USD
16	148-2020	ene-22	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	1.007.272.075,79 108.191,57	COP USD	15.174.066.432,08 1.629.853,64	COP USD
17	148-2020	feb-22	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	909.794.132,97 97.721,42	COP USD	16.083.860.565,05 1.727.575,06	COP USD
18	148-2020	mar-22	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	1.007.272.075,79 108.191,57	COP USD	17.091.132.640,85 1.835.766,63	COP USD
19	148-2020	abr-22	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	974.779.428,19 104.701,52	COP USD	18.065.912.069,03 1.940.468,14	COP USD
20	148-2020	may-22	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	1.007.272.075,79 108.191,57	COP USD	19.073.184.144,82 2.048.659,71	COP USD
21	148-2020	jun-22	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	974.779.428,19 104.701,52	COP USD	20.047.963.573,01 2.153.361,23	COP USD
22	148-2020	jul-22	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	1.007.272.075,79 108.191,57	COP USD	21.055.235.648,80 2.261.552,80	COP USD
23	148-2020	ago-22	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	1.007.272.075,79 108.191,57	COP USD	22.062.507.724,59 2.369.744,37	COP USD
24	148-2020	sep-22	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	974.779.428,19 104.701,52	COP USD	23.037.287.152,78 2.474.445,89	COP USD
25	148-2020	oct-22	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	1.007.272.075,79 108.191,57	COP USD	24.044.559.228,57 2.582.637,46	COP USD
26	148-2020	nov-22	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	974.779.428,19 104.701,52	COP USD	25.019.338.656,76 2.687.338,98	COP USD
27	148-2020	dic-22	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	1.007.272.075,79 108.191,57	COP USD	26.026.610.732,55 2.795.530,55	COP USD
28	148-2020	ene-23	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	1.007.272.075,79 108.191,57	COP USD	27.033.882.808,34 2.903.722,12	COP USD
29	148-2020	feb-23	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	909.794.132,97 97.721,42	COP USD	27.943.676.941,31 3.001.443,53	COP USD
30	148-2020	marzo 1 - 30	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	974.779.428,19 104.701,52	COP USD	28.918.456.369,50 3.106.145,05	COP USD
31	148-2020	mar-31	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	27.618.750,47 2.966,54	COP USD	28.946.075.119,96 3.109.111,60	COP USD
32	148-2020	abr-23	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	828.562.513,96 88.996,29	COP USD	29.774.637.633,93 3.198.107,89	COP USD
33	148-2020	may-23	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	856.181.264,42 91.962,83	COP USD	30.630.818.898,35 3.290.070,72	COP USD
34	148-2020	jun-23	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	828.562.513,96 88.996,29	COP USD	31.459.381.412,31 3.379.067,01	COP USD
35	148-2020	julio 1 - 25	26.319.044.561,00 2.826.941,00	COP USD	690.468.761,63 74.163,58	COP USD	32.149.850.173,94 3.453.230,59	COP USD
35	148-2020	julio 26 - 31	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	336.313.656,18 36.123,61	COP USD	32.486.163.830,12 3.489.354,20	COP USD
36	148-2020	ago-23	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	34.223.784.387,05 3.675.992,83	COP USD

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 16 de 37		

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR OFERTADO FASE PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		VALOR CAUSADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		CAUSACIÓN ACUMULADA PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017	
37	148-2020	sep-23	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.681.568.280,90 180.618,03	COP USD	35.905.352.667,95 3.856.610,86	COP USD
38	148-2020	RETENCIÓN FASE PREVIA	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD			35.905.352.667,95 3.856.610,86	COP USD
39	148-2020	oct-23	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	37.642.973.224,88 4.043.249,49	COP USD
40	148-2020	nov-23	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.681.568.280,90 180.618,03	COP USD	39.324.541.505,78 4.223.867,52	COP USD
41	148-2020	dic-23	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	41.062.162.062,71 4.410.506,15	COP USD
42	148-2020	ene-24	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	42.799.782.619,64 4.597.144,78	COP USD
43	148-2020	feb-24	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.625.516.004,87 174.597,43	COP USD	44.425.298.624,51 4.771.742,21	COP USD
44	148-2020	mar-24	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	46.162.919.181,44 4.958.380,84	COP USD
45	148-2020	abr-24	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.681.568.280,90 180.618,03	COP USD	47.844.487.462,34 5.138.998,87	COP USD
46	148-2020	may-24	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	49.582.108.019,27 5.325.637,50	COP USD
47	148-2020	jun-24	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.681.568.280,90 180.618,03	COP USD	51.263.676.300,17 5.506.255,53	COP USD
48	148-2020	jul-24	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	53.001.296.857,10 5.692.894,16	COP USD
49	148-2020	ago-24	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	54.738.917.414,03 5.879.532,79	COP USD
50	148-2020	sep-24	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.681.568.280,90 180.618,03	COP USD	56.420.485.694,93 6.060.150,82	COP USD
51	148-2020	oct-24	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	58.158.106.251,86 6.246.789,45	COP USD
52	148-2020	nov-24	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.681.568.280,90 180.618,03	COP USD	59.839.674.532,76 6.427.407,48	COP USD
53	148-2020	dic-24	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	61.577.295.089,69 6.614.046,11	COP USD
54	148-2020	ene-25	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	63.314.915.646,62 6.800.684,74	COP USD
55	148-2020	feb-25	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.569.463.728,84 168.576,83	COP USD	64.884.379.375,46 6.969.261,57	COP USD
56	148-2020	mar-25	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	66.621.999.932,39 7.155.900,20	COP USD
57	148-2020	abr-25	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.681.568.280,90 180.618,03	COP USD	68.303.568.213,29 7.336.518,23	COP USD
58	148-2020	may-25	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	70.041.188.770,22 7.523.156,86	COP USD
59	148-2020	jun-25	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.681.568.280,90 180.618,03	COP USD	71.722.757.051,12 7.703.774,89	COP USD
60	148-2020	jul-25	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	73.460.377.608,05 7.890.413,52	COP USD
61	148-2020	ago-25	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	75.197.998.164,98 8.077.052,15	COP USD
62	148-2020	sep-25	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.681.568.280,90 180.618,03	COP USD	76.879.566.445,88 8.257.670,18	COP USD
63	148-2020	oct-25	91.309.157.653,00 9.807.559,00	COP USD	1.737.620.556,93 186.638,63	COP USD	78.617.187.002,81 8.444.308,81	COP USD

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA					
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 17 de 37		

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR OFERTADO FASE PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		VALOR CAUSADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		CAUSACIÓN ACUMULADA PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017	
64	148-2020	nov-25	91.309.157.653,00	COP	1.681.568.280,90	COP	80.298.755.283,71	COP
			9.807.559,00	USD	180.618,03	USD	8.624.926,84	USD

Tabla 1.4-2. Causación Retribución del Interventor a pesos y dólares constantes de diciembre de 2017 antes de IVA

De acuerdo con la modificación No. 1 al Contrato de Interventoría No. 148 de 2020, el plazo de la Fase Previa se extendió hasta el 30 de marzo de 2023, acorde con la modificación al Contrato de Concesión. Dicha Fase no culminó en esta fecha prevista por causas no imputables a la Interventoría. Aunque a solicitud de la Empresa Metro de Bogotá se realizó un descuento del 15% en la remuneración del Interventor a partir del día 31 de marzo de 2023 hasta la terminación de la Fase Previa, esta Interventoría no está de acuerdo con dicho descuento.

A continuación, se presenta los valores pagados al corte del presente informe tanto en valores constantes de diciembre de 2017, como en valores corrientes, antes de IVA.

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR PAGADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		VALOR PAGADO ACUMULADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		VALOR PAGADO PESOS Y DOLARES CORRIENTES		VALOR PAGADO ACUMULADO PESOS Y DOLARES CORRIENTES	
1	148-2020	oct-20	282.686.034,17	COP	282.686.034,17	COP	306.923.765,75	COP	306.923.765,75	COP
			30.363,44	USD	30.363,44	USD	32.071,02	USD	32.071,02	USD
2	148-2020	nov-20	848.058.102,52	COP	1.130.744.136,69	COP	919.458.784,70	COP	1.226.382.550,45	COP
			91.090,32	USD	121.453,76	USD	96.154,30	USD	128.225,32	USD
3	148-2020	dic-20	876.326.705,94	COP	2.007.070.842,63	COP	953.724.112,08	COP	2.180.106.662,53	COP
			94.126,67	USD	215.580,43	USD	99.452,99	USD	227.678,31	USD
4	148-2020	ene-21	876.326.705,94	COP	2.883.397.548,57	COP	957.612.065,89	COP	3.137.718.728,42	COP
			94.126,67	USD	309.707,10	USD	99.876,04	USD	327.554,35	USD
5	148-2020	feb-21	791.520.895,69	COP	3.674.918.444,26	COP	870.411.649,42	COP	4.008.130.377,84	COP
			85.017,63	USD	394.724,73	USD	90.704,47	USD	418.258,82	USD
6	148-2020	mar-21	876.326.705,94	COP	4.551.245.150,20	COP	968.552.587,08	COP	4.976.682.964,92	COP
			94.126,67	USD	488.851,40	USD	101.134,12	USD	519.392,94	USD
7	148-2020	abr-21	848.058.102,52	COP	5.399.303.252,72	COP	942.909.008,75	COP	5.919.591.973,67	COP
			91.090,32	USD	579.941,72	USD	98.676,13	USD	618.069,07	USD
8	148-2020	may-21	876.326.705,94	COP	6.275.629.958,66	COP	984.104.402,34	COP	6.903.696.376,01	COP
			94.126,67	USD	674.068,39	USD	102.782,80	USD	720.851,87	USD
9	148-2020	jun-21	848.058.102,52	COP	7.123.688.061,18	COP	951.834.094,02	COP	7.855.530.470,03	COP
			91.090,32	USD	765.158,71	USD	100.391,34	USD	821.243,21	USD
10	148-2020	jul-21	876.326.705,94	COP	8.000.014.767,12	COP	986.816.928,25	COP	8.842.347.398,28	COP
			94.126,67	USD	859.285,38	USD	104.236,76	USD	925.479,97	USD
11	148-2020	ago-21	876.326.705,94	COP	8.876.341.473,06	COP	991.156.969,72	COP	9.833.504.368,00	COP
			94.126,67	USD	953.412,05	USD	104.452,10	USD	1.029.932,07	USD
12	148-2020	sep-21	848.058.102,52	COP	9.724.399.575,58	COP	962.859.199,35	COP	10.796.363.567,35	COP
			91.090,32	USD	1.044.502,37	USD	101.357,21	USD	1.131.289,28	USD
13	148-2020	oct-21	876.326.705,94	COP	10.600.726.281,52	COP	995.135.341,06	COP	11.791.498.908,41	COP
			94.126,67	USD	1.138.629,04	USD	105.605,95	USD	1.236.895,23	USD
14	148-2020	nov-21	848.058.102,52	COP	11.448.784.384,04	COP	967.759.246,17	COP	12.759.258.154,58	COP
			91.090,32	USD	1.229.719,36	USD	102.701,45	USD	1.339.596,68	USD
15	148-2020	dic-21	876.326.705,94	COP	12.325.111.089,98	COP	1.007.341.707,68	COP	13.766.599.862,26	COP
			94.126,67	USD	1.323.846,03	USD	106.450,90	USD	1.446.047,58	USD
16	148-2020	ene-22	876.326.705,94	COP	13.201.437.795,92	COP	1.024.068.950,83	COP	14.790.668.813,09	COP

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 18 de 37		

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR PAGADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		VALOR PAGADO ACUMULADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		VALOR PAGADO PESOS Y DOLARES CORRIENTES		VALOR PAGADO ACUMULADO PESOS Y DOLARES CORRIENTES	
			94.126,67	USD	1.417.972,70	USD	107.346,65	USD	1.553.394,23	USD
17	148-2020	feb-22	791.520.895,69	COP	13.992.958.691,61	COP	940.073.981,66	COP	15.730.742.794,75	COP
			85.017,63	USD	1.502.990,33	USD	97.843,87	USD	1.651.238,10	USD
18	148-2020	mar-22	876.326.705,94	COP	14.869.285.397,55	COP	1.051.194.209,99	COP	16.781.937.004,74	COP
			94.126,67	USD	1.597.117,00	USD	109.773,46	USD	1.761.011,56	USD
19	148-2020	abr-22	848.058.102,52	COP	15.717.343.500,07	COP	1.029.972.340,57	COP	17.811.909.345,31	COP
			91.090,32	USD	1.688.207,32	USD	106.825,43	USD	1.867.836,99	USD
20	148-2020	may-22	876.326.705,94	COP	16.593.670.206,01	COP	1.073.256.087,44	COP	18.885.165.432,75	COP
			94.126,67	USD	1.782.333,99	USD	111.603,12	USD	1.979.440,11	USD
21	148-2020	jun-22	848.058.102,52	COP	17.441.728.308,53	COP	1.043.972.474,33	COP	19.929.137.907,08	COP
			91.090,32	USD	1.873.424,31	USD	109.486,56	USD	2.088.926,67	USD
22	148-2020	jul-22	876.326.705,94	COP	18.318.055.014,47	COP	1.087.451.639,74	COP	21.016.589.546,82	COP
			94.126,67	USD	1.967.550,98	USD	113.122,75	USD	2.202.049,42	USD
23	148-2020	ago-22	876.326.705,94	COP	19.194.381.720,41	COP	1.098.572.995,99	COP	22.115.162.542,81	COP
			94.126,67	USD	2.061.677,65	USD	113.082,66	USD	2.315.132,08	USD
24	148-2020	sep-22	848.058.102,53	COP	20.042.439.822,94	COP	1.073.022.751,88	COP	23.188.185.294,69	COP
			91.090,32	USD	2.152.767,97	USD	109.670,20	USD	2.424.802,28	USD
25	148-2020	oct-22	876.326.705,94	COP	20.918.766.528,88	COP	1.116.746.919,63	COP	24.304.932.214,32	COP
			94.126,67	USD	2.246.894,64	USD	113.785,58	USD	2.538.587,86	USD
26	148-2020	nov-22	805.712.486,39	COP	21.724.479.015,27	COP	1.033.971.248,87	COP	25.338.903.463,19	COP
			91.090,32	USD	2.337.984,96	USD	110.003,86	USD	2.648.591,72	USD
27	148-2020	dic-22	876.326.705,94	COP	22.600.805.721,21	COP	1.139.532.137,32	COP	26.478.435.600,51	COP
			94.126,67	USD	2.432.111,63	USD	113.321,67	USD	2.761.913,39	USD
28	148-2020	ene-23	876.326.705,94	COP	23.477.132.427,15	COP	1.159.785.664,16	COP	27.638.221.264,67	COP
			94.126,67	USD	2.526.238,30	USD	114.227,72	USD	2.876.141,11	USD
29	148-2020	feb-23	791.520.895,69	COP	24.268.653.322,84	COP	1.064.943.508,02	COP	28.703.164.772,69	COP
			85.017,63	USD	2.611.255,93	USD	103.749,35	USD	2.979.890,46	USD
30	148-2020	marzo 1 - 30	848.058.102,52	COP	25.116.711.425,36	COP	1.152.998.515,98	COP	29.856.163.288,67	COP
			91.090,32	USD	2.702.346,25	USD	111.528,04	USD	3.091.418,50	USD
31	148-2020	mar-31	24.028.312,91	COP	25.140.739.738,27	COP	32.668.291,29	COP	29.888.831.579,96	COP
			2.580,89	USD	2.704.927,14	USD	3.159,96	USD	3.094.578,46	USD
32	148-2020	abr-23	720.849.387,15	COP	25.861.589.125,42	COP	987.709.436,78	COP	30.876.541.016,74	COP
			77.426,77	USD	2.782.353,91	USD	95.278,42	USD	3.189.856,88	USD
33	148-2020	may-23	744.877.700,05	COP	26.606.466.825,47	COP	1.025.090.668,93	COP	31.901.631.685,67	COP
			80.007,67	USD	2.862.361,58	USD	98.702,32	USD	3.288.559,20	USD
34	148-2020	jun-23	720.849.387,15	COP	27.327.316.212,62	COP	994.998.256,42	COP	32.896.629.942,09	COP
			77.426,77	USD	2.939.788,35	USD	95.826,80	USD	3.384.386,00	USD
35	148-2020	julio 1 - 25	600.707.822,62	COP	27.928.024.035,24	COP	833.317.857,52	COP	33.729.947.799,61	COP
			64.522,31	USD	3.004.310,66	USD	80.007,99	USD	3.464.393,99	USD
35	148-2020	julio 26 - 31	292.592.880,88	COP	28.220.616.916,12	COP	405.892.621,07	COP	34.135.840.420,68	COP
			31.427,54	USD	3.035.738,20	USD	38.970,30	USD	3.503.364,29	USD
36	148-2020	ago-23	1.503.915.402,78	COP	29.724.532.318,90	COP	2.101.149.347,98	COP	36.236.989.768,66	COP
			161.536,25	USD	3.197.274,45	USD	201.198,20	USD	3.704.562,49	USD
37	148-2020	sep-23	1.462.964.404,38	COP	31.187.496.723,28	COP	2.054.520.068,93	COP	38.291.509.837,59	COP
			157.137,69	USD	3.354.412,14	USD	196.188,81	USD	3.900.751,30	USD
38	148-2020	RETENCIÓN FASE PREVIA	4.187.295.004,36	COP	35.374.791.727,64	COP	5.692.941.216,72	COP	43.984.451.054,31	COP
			449.759,33	USD	3.804.171,47	USD	550.670,76	USD	4.451.422,06	USD
39	148-2020	oct-23	1.511.729.884,53	COP	36.886.521.612,17	COP	2.128.307.292,04	COP	46.112.758.346,35	COP
			162.375,61	USD	3.966.547,08	USD	202.650,72	USD	4.654.072,78	USD
40	148-2020	nov-23	1.462.964.404,38	COP	38.349.486.016,55	COP	2.069.312.734,18	COP	48.182.071.080,53	COP
			157.137,69	USD	4.123.684,77	USD	195.718,40	USD	4.849.791,18	USD

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 19 de 37		

ACTA	No. DE CONTRATO	PERIODO	VALOR PAGADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		VALOR PAGADO ACUMULADO PESOS Y DOLARES CONSTANTES DIC 2017		VALOR PAGADO PESOS Y DOLARES CORRIENTES		VALOR PAGADO ACUMULADO PESOS Y DOLARES CORRIENTES	
41	148-2020	dic-23	1.511.729.884,53 COP	162.375,61 USD	39.861.215.901,08 COP	4.286.060,38 USD	2.148.116.381,53 COP	202.041,46 USD	50.330.187.462,06 COP	5.051.832,64 USD
42	148-2020	ene-24	1.511.729.884,53 COP	162.375,61 USD	41.372.945.785,61 COP	4.448.435,99 USD	2.167.769.493,93 COP	203.142,08 USD	52.497.956.955,99 COP	5.254.974,72 USD
43	148-2020	feb-24	1.414.198.924,24 COP	151.899,76 USD	42.787.144.709,85 COP	4.600.335,75 USD	2.049.946.418,35 COP	191.212,40 USD	54.547.903.374,34 COP	5.446.187,12 USD
44	148-2020	mar-24	1.511.729.884,53 COP	162.375,61 USD	44.298.874.594,38 COP	4.762.711,36 USD	2.206.763.764,58 COP	205.720,74 USD	56.754.667.138,92 COP	5.651.907,86 USD
45	148-2020	abr-24	1.462.964.404,38 COP	157.137,69 USD	45.761.838.998,76 COP	4.919.849,05 USD	2.148.257.264,05 COP	199.859,68 USD	58.902.924.402,97 COP	5.851.767,54 USD
46	148-2020	may-24	1.511.729.884,53 COP	162.375,61 USD	47.273.568.883,29 COP	5.082.224,66 USD	2.229.224.464,48 COP	206.864,83 USD	61.132.148.867,45 COP	6.058.632,37 USD
47	148-2020	jun-24	1.462.964.404,38 COP	157.137,69 USD	48.736.533.287,67 COP	5.239.362,35 USD	2.164.257.493,82 COP	200.259,34 USD	63.296.406.361,27 COP	6.258.891,71 USD
48	148-2020	jul-24	1.511.729.884,53 COP	162.375,61 USD	50.248.263.172,20 COP	5.401.737,96 USD	2.240.922.745,67 COP	207.175,06 USD	65.537.329.106,94 COP	6.466.066,77 USD
49	148-2020	ago-24	1.511.729.884,53 COP	162.375,61 USD	51.759.993.056,73 COP	5.564.113,57 USD	2.240.922.745,67 COP	207.343,67 USD	67.778.251.852,61 COP	6.673.410,44 USD
50	148-2020	sep-24	1.462.964.404,38 COP	157.137,69 USD	53.222.957.461,11 COP	5.721.251,26 USD	2.173.918.009,90 COP	200.977,06 USD	69.952.169.862,51 COP	6.874.387,50 USD
51	148-2020	oct-24	1.511.729.884,53 COP	162.375,61 USD	54.734.687.345,64 COP	5.883.626,87 USD	2.243.418.378,99 COP	207.915,39 USD	72.195.588.241,50 COP	7.082.302,89 USD
52	148-2020	nov-24	1.462.964.404,38 COP	157.137,69 USD	56.197.651.750,02 COP	6.040.764,56 USD	2.176.936.921,18 COP	201.099,45 USD	74.372.525.162,68 COP	7.283.402,34 USD
53	148-2020	dic-24	1.511.729.884,53 COP	162.375,61 USD	57.709.381.634,55 COP	6.203.140,17 USD	2.259.795.972,67 COP	207.876,53 USD	76.632.321.135,35 COP	7.491.278,87 USD
54	148-2020	ene-25	1.511.729.884,53 COP	162.375,61 USD	59.221.111.519,08 COP	6.365.515,78 USD	2.281.008.855,90 COP	209.237,32 USD	78.913.329.991,25 COP	7.700.516,19 USD
55	148-2020	feb-25	1.365.433.444,09 COP	146.661,84 USD	60.586.544.963,17 COP	6.512.177,62 USD	2.083.652.562,75 COP	189.827,98 USD	80.996.982.554,00 COP	7.890.344,17 USD
56	148-2020	mar-25	1.511.729.884,53 COP	162.375,61 USD	62.098.274.847,70 COP	6.674.553,23 USD	2.319.067.264,05 COP	210.638,95 USD	83.316.049.818,05 COP	8.100.983,12 USD
57	148-2020	abr-25	1.462.964.404,38 COP	157.137,69 USD	63.561.239.252,08 COP	6.831.690,92 USD	2.259.051.307,89 COP	204.479,01 USD	85.575.101.125,94 COP	8.305.462,13 USD
58	148-2020	may-25	1.511.729.884,53 COP	162.375,61 USD	65.072.969.136,61 COP	6.994.066,53 USD	2.341.839.918,11 COP	211.736,28 USD	87.916.941.044,05 COP	8.517.198,41 USD
59	148-2020	jun-25	1.462.964.404,38 COP	157.137,69 USD	66.535.933.540,99 COP	7.151.204,22 USD	2.268.711.823,97 COP	205.604,68 USD	90.185.652.868,02 COP	8.722.803,09 USD
60	148-2020	jul-25	1.511.729.884,53 COP	162.375,61 USD	68.047.663.425,52 COP	7.313.579,83 USD	2.350.730.611,82 COP	212.778,94 USD	92.536.383.479,84 COP	8.935.582,03 USD
61	148-2020	ago-25	1.511.729.884,53 COP	162.375,61 USD	69.559.393.310,05 COP	7.475.955,44 USD	2.355.097.970,13 COP	213.390,18 USD	94.891.481.449,97 COP	9.148.972,21 USD
62	148-2020	sep-25	1.462.964.404,38 COP	157.137,69 USD	71.022.357.714,43 COP	7.633.093,13 USD	2.286.523.400,50 COP	207.031,85 USD	97.178.004.850,47 COP	9.356.004,06 USD

Tabla 1.4-3. Valores pagados en pesos y dólares antes de IVA

Al valor pagado en pesos constantes de diciembre de 2017 por concepto del período de noviembre de 2022, se descontó el valor del acuerdo transaccional firmado por las partes el 28 de diciembre de 2022 por valor de COP \$ 42.345.616,13 constantes de diciembre de 2017.

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 20 de 37		

Adicionalmente, al valor pagado del Informe No. 36 se le realizó un descuento de COP \$ 7.814.481,75 y USD 839,36, constantes de diciembre de 2017, por concepto de un ajuste realizado al valor pagado de la retención del 13% correspondiente a la Fase Previa.

Al valor pagado en pesos por concepto del período de noviembre de 2022 (Factura FE60), se descontó el valor del acuerdo transaccional firmado por las partes el 28 de diciembre de 2022 por valor de COP \$ 55.064.156, al cual se le realizó una retención de COP \$ 1.376.603,90.

Igualmente, al valor pagado correspondiente al Informe No. 36, se le realizó un descuento de COP \$ 10.624.373,30 y USD \$ 1.027,68, por concepto de un ajuste realizado al valor pagado de la retención del 13% de la Fase Previa.

Retención Fase Previa:

En el mes de septiembre de 2023 se recibió el valor de la retención del 13% de los honorarios de la interventoría durante de la Fase Previa. De acuerdo con la revisión de la fórmula de cálculo de la Retención de la Fase Previa, Sección 6.4 del Contrato de Interventoría No. 148 de 2020, efectuada por la Empresa Metro de Bogotá y el Consorcio Sup(COPor PLMB, en la cual se encontró que había un error en dicho cálculo, la Interventoría autorizó a la EMB a realizar un descuento de la facturación del Informe de Interventoría No. 36, por un monto en COP de 10.624.373,30 (COP \$ 7.814.481,75 de diciembre de 2017) y USD de 1.027,68 (USD 839,36 de diciembre de 2017), valores antes de IVA.

Se presentan los cálculos correspondientes:

Retención Fase Previa COP	
Valor ofertado en Pesos FP COP dic 2017	26.319.044.561,00
Días	810
Días hasta duración estimada FP	890
Días adicionales duración estimada FP	117
IPC marzo 2023	131,77
IPC diciembre 2017	96,92
Valor COP dic 2017 retención Fase Previa	4.179.480.522,61
Valor Pesos retención Fase Previa	5.682.316.843,42
Valor pagado en septiembre de 2023	5.692.941.216,72
Descuento en el Informe No. 36	10.624.373,30

Tabla 1.4-4. Valores retención Fase Previa COP antes de IVA

Retención Fase Previa USD	
Valor ofertado en Dólares FP USD dic 2017	2.826.941,00
Días	810
Días hasta duración estimada FP	890
Días adicionales duración estimada FP	117
IPCEU marzo 2023	301,836
IPCEU diciembre 2017	246,524
Valor USD dic 2017 retención Fase Previa	448.919,98
Valor Dólares retención Fase Previa	549.643,08

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 21 de 37		

Retención Fase Previa USD	
Valor pagado en septiembre de 2023	550.670,76
Descuento en el Informe No. 36	1.027,68

Tabla 1.4-5. Valores retención Fase Previa USD antes de IVA

El 30 de abril de 2024 se firmó el Acuerdo Transaccional No. 2, que determinó una suma que el Interventor debe pagar a la EMB, por valor de COP \$ 549.645.520 de diciembre de 2017 y estableció que dicho valor debía ser actualizado al momento de realizar el descuento de la facturación. Dicho descuento fue realizado en la factura del mes de mayo de 2024, por valor de COP \$ 810.517.310,34.

A continuación, se presenta el valor a pagar por el informe correspondiente al mes de noviembre de 2025 (antes de IVA), una vez sea aprobado dicho informe y se emita la respectiva factura.

Remuneración 1 – 30 de noviembre de 2025:

NOVIEMBRE 2025 - INFORME 63		Valor
Remuneración del 1 al 30 de noviembre 2025 en pesos		2.634.954.341,94
Remuneración del 1 al 30 de noviembre de 2025 en pesos de dic de 2017		1.681.568.280,90
Valor ofertado en pesos fase construcción \$ dic 2017		91.309.157.653,00
Días		1629
Valor día en pesos fase construcción \$ dic 2017		56.052.276,03
IPC noviembre 2025		151,87
IPC dic 2017		96,92
Rd		0%
Fecha inicial:		1 de noviembre de 2025
Fecha final:		30 de noviembre de 2025
Días		30
Valor a pagar COP (87%)		2.292.410.277,49
NOVIEMBRE 2025 - INFORME 63		Valor
Remuneración del 1 al 30 de noviembre de 2025 en USD		237.470,90
Remuneración del 1 al 30 de noviembre de 2025 en USD de dic 2017		180.618,03
Valor ofertado en dólares fase construcción \$US dic 2017		9.807.559,00
Días		1629
Valor día en dólares fase construcción \$ dic 2017		6.020,60
IPCEU noviembre 2025		324,122
IPCEU dic 2017		246,524
Rd		0%
Fecha inicial:		1 de noviembre de 2025
Fecha final:		30 de noviembre de 2025
Días		30
Valor a pagar USD (87%)		206.599,69

Tabla 1.4-6. Valor de la Retribución del Interventor noviembre de 2025 antes de IVA

Este es el mes sobre el cual se tiene el último dato de inflación observada de Colombia a la fecha de elaboración del presente informe.

Con respecto al valor a pagar en Dólares corrientes por el informe del mes de octubre de 2025, se informa que, a la fecha de corte del presente informe, no había sido publicado el IPCEU de octubre

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 22 de 37		

de 2025 por parte del *US Bureau of Labor Statistics*, por lo tanto, el valor facturado fue calculado con el IPCEU de septiembre de 2025, con la nota de que una vez sea publicado oficialmente este índice, se realizará el ajuste respectivo.

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 23 de 37		

1.5 Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Interventoría

“El Consorcio Supervisor PLMB, en cumplimiento de lo establecido en el Apéndice C del Contrato de Interventoría No. 148 de 2025, cuenta con la disponibilidad del personal mínimo exigido para realizar actividades de seguimiento y verificación a las obligaciones emanadas del Contrato de Concesión No. 163 de 2019. En el Formato GA-FR-031 LISTADO PERSONAL se presenta relación del i) personal mínimo dispuesto para el proyecto de acuerdo con la fase o etapa correspondiente, ii) personal propuesto por metodología y iii) personal adicional al propuesto y/u ofertado en la metodología, que ha sido necesario vincular al Proyecto por circunstancias operativas y de gestión que, en criterio de la Interventoría, exceden lo previsto contractualmente y obedecen, en parte, a deficiencias del Concesionario en sus procesos de control, calidad y seguridad, de lo cual se deja constancia mediante las alertas, avisos y advertencias, así como en las manifestaciones y recomendaciones realizadas en el marco de la supervisión.”

Los anexos correspondientes a este informe pueden ser consultados a través del siguiente enlace:

[1.5. Información SST Interventor.pdf](#)

En esta sección del informe, se exponen las actividades y acciones de la interventoría para garantizar, supervisar y vigilar el adecuado desarrollo del Contrato 148 de 2020 en lo relativo a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La redacción del presente informe se ajusta a las disposiciones establecidas en el Apéndice B del contrato de interventoría, específicamente en la Sección II, Numeral 1.5, y se complementa con la inclusión de los respaldos exigidos.

Con el objetivo de asegurar que la totalidad de los trabajadores involucrados en la ejecución del contrato de interventoría posean las competencias necesarias para salvaguardar su seguridad y salud, la interventoría ha implementado diversas actividades orientadas a la formación, sensibilización y gestión empresarial.

1.5.1 Formatos de Gestión SST del CSPLMB

A continuación, se presenta el análisis de los formatos de reporte de la gestión SST de la Interventoría, los cuales fueron diligenciados durante el periodo de reporte de este informe.

a) GA-FR-023 Seguimiento mantenimiento vehículos, maquinaria y equipos:

La Interventoría contó con (13) vehículos para realizar los desplazamientos requeridos en el seguimiento al contrato. Las novedades relacionadas con el retiro de vehículos pueden consultarse en el formato correspondiente, acompañado de su justificación. Cada conductor

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 24 de 37		

realizó diariamente la inspección preoperacional del vehículo, dejando constancia mediante el formato adjunto (Anexo 1.5-13). Durante el periodo de reporte, los vehículos no presentaron ninguna novedad.

b) **GA-FR-024** Listado de vehículos, maquinaria y equipos:

Se contó con (13) vehículos. Todos los vehículos cuentan con el seguro obligatorio de accidente de tránsito (SOAT) y la revisión técnico-mecánica vigente, según corresponda.

c) **GA-FR-026** Abastecimiento de combustible: El suministro de combustible (gas, gasolina o diésel) a las camionetas utilizadas se llevó a cabo en estaciones de servicio. Durante el mes de reporte, no se registraron novedades en este aspecto.

d) **GA-FR-027** Acciones preventivas y correctivas a los reportes preoperacionales de maquinaria, equipos y vehículos: El informe de gestión de acciones preventivas de equipos y maquinaria se incluye en el Anexo 1.5-1, detallando las medidas adoptadas a partir de los reportes preoperacionales.

e) **GA-FR-029** Inducción, Capacitación y/o Entrenamiento:

En el periodo, se registraron (7) ingresos de personal, de los que los soportes de inducción para (7) personas se detallan en el Anexo 1.5-7.

Asimismo, los respaldos de notificación de riesgos al personal están disponibles para su revisión en el Anexo 1.5-6.

f) **GA-FR-031** Listado personal, seguridad social y conceptos médicos ocupacionales:

Se reporta un total de 268 personas vinculadas a la interventoría durante este periodo, lo que refleja una consolidación de 259 personal antiguos, 7 nuevos ingresos y 2 retiros en el periodo.

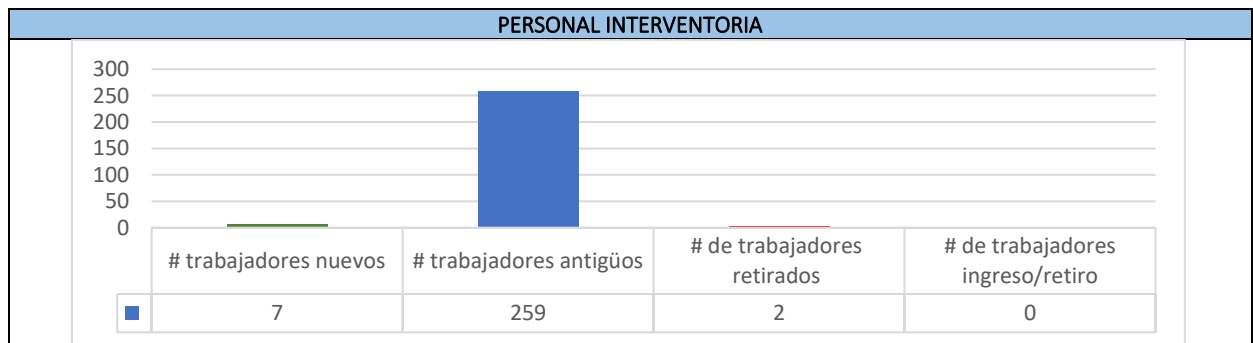


Tabla 1.5-1 Seguimiento personal interventoría

La Interventoría empleó: 84 mujeres (31%) y 184 hombres (69%)

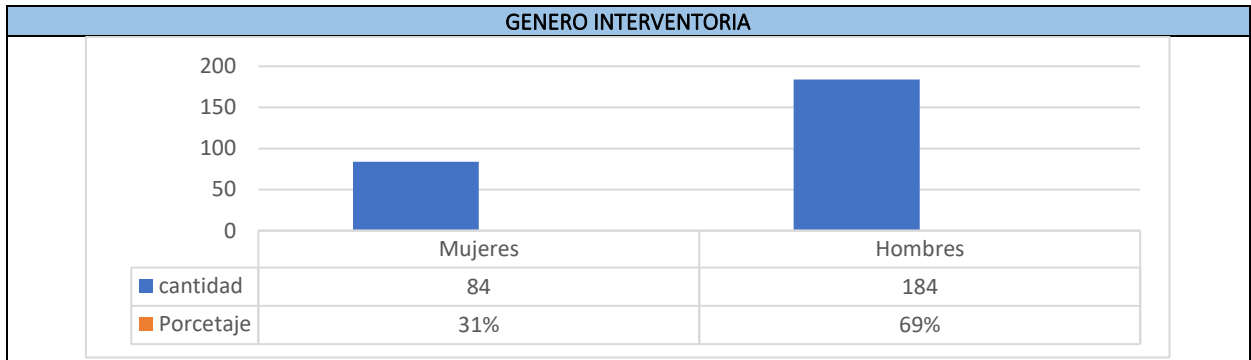


Tabla 1.5-2 Seguimiento sexo personal interventoría

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la interventoría llevó a cabo la verificación de la afiliación y/o pago de seguridad social, así como el Concepto Médico Ocupacional, como requisitos previos para el ingreso al contrato.

Nota: Cabe aclarar la información del formato 31 se actualizó según los exámenes médicos periódicos realizados.

Se procedió a verificar el cumplimiento del pago de seguridad social para todo el personal antiguo del proyecto. En el caso del personal ubicado en el extranjero, se adjuntan las certificaciones correspondientes.

Adicionalmente, la Interventoría gestionó el pago correspondiente a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) para el personal independiente contratado bajo la modalidad de prestación de servicios, y que realiza actividades clasificadas en riesgo IV o V. Los documentos relativos al egreso del personal están disponibles para su revisión en el Anexo 1.5-5.

g) **GA-FR-032** Reporte de caracterización de accidentes, enfermedades laborales y ausentismo:

Durante el periodo de reporte, no se registró un accidente laboral.

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 26 de 37		

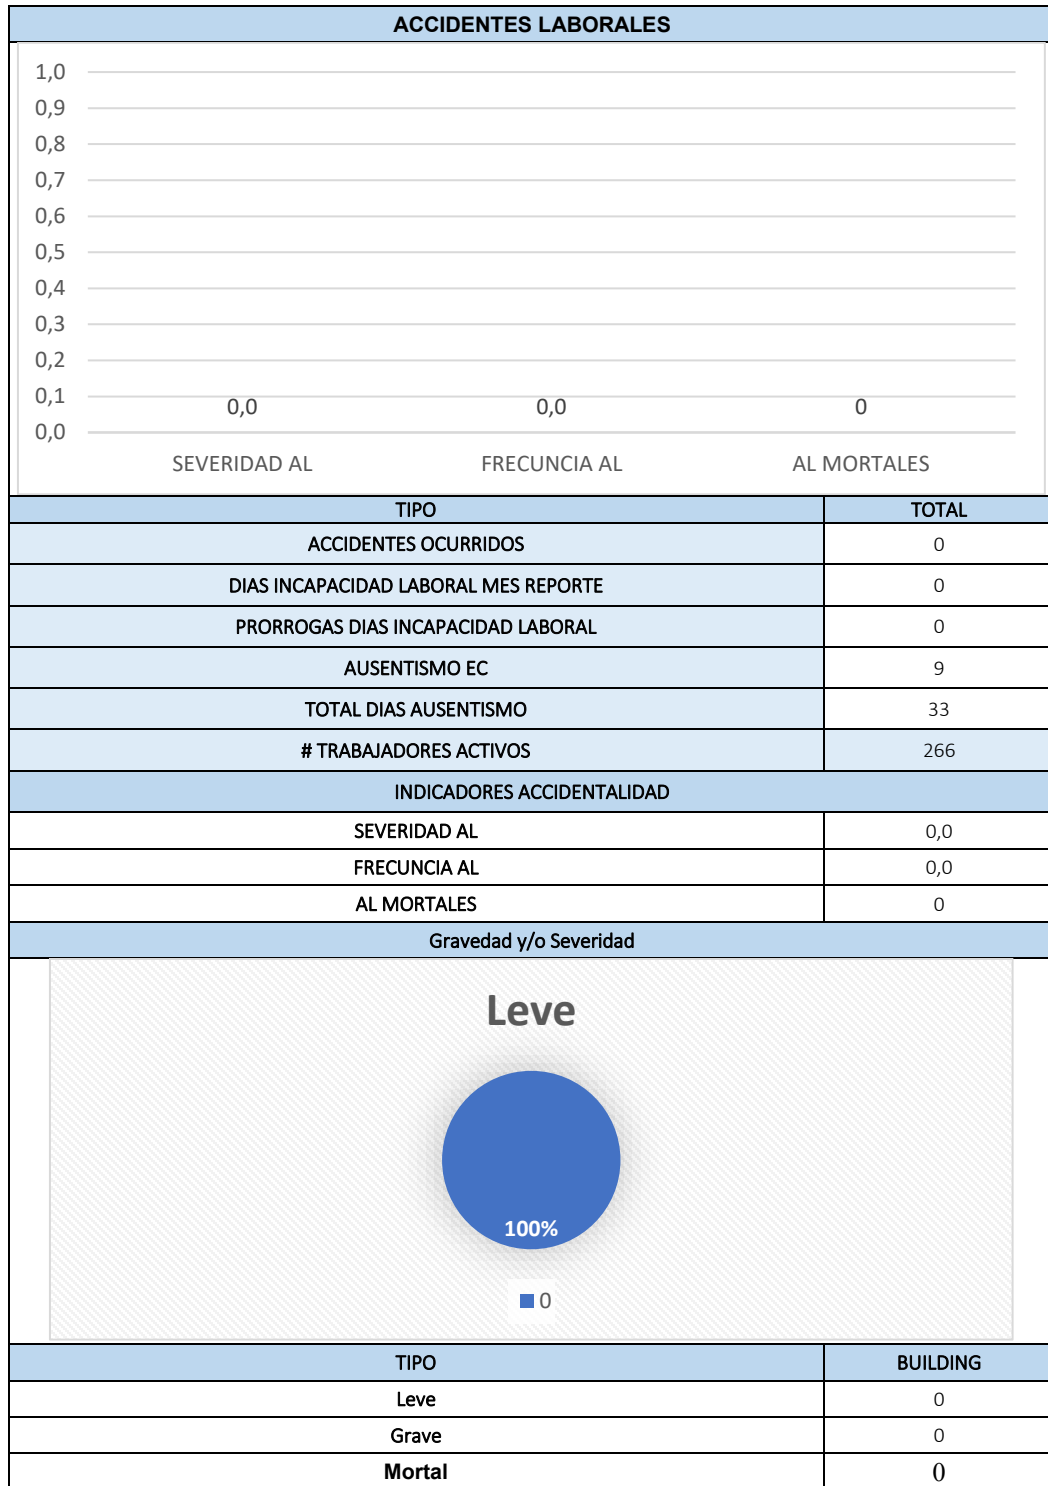


Tabla 1.5-3 Accidentes laborales Interventoría

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 27 de 37		

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a los indicadores de Accidentes Laborales (AL) y Enfermedades Laborales (EL) del periodo evaluado, con una población de 266 trabajadores activos:

2. Frecuencia de Accidentalidad

Durante el mes de reporte no se presentaron accidentes laborales, por lo tanto, la tasa de frecuencia de accidentalidad fue de 0,0 casos por cada 100 trabajadores.

3. Severidad de Accidentalidad

No se registraron días de incapacidad laboral asociados a accidentes de trabajo durante el periodo, razón por la cual la tasa de severidad fue de 0,0 días perdidos por cada 100 trabajadores.

4. Accidentalidad Mortal

En el periodo evaluado no se reportaron accidentes laborales con consecuencias fatales, por lo que la tasa de accidentalidad mortal fue de 0.

5. Enfermedades Laborales

Durante el mes no se identificaron casos activos ni nuevos de enfermedad laboral, por lo tanto, tanto la prevalencia como la incidencia de enfermedades laborales fueron de 0.

6. Ausentismo por Causa Médica

Se registraron 9 eventos de ausentismo por enfermedad común (EC), los cuales generaron un total de 33 días de ausentismo durante el periodo, sin relación con accidentes o enfermedades laborales.

- h) **GA-FR-033** Reporte de incidentes laborales: Durante el mes pasado, no se registraron incidentes laborales en las actividades llevadas a cabo por la interventoría.
- i) **GA-FR-034** Registro de actos y condiciones inseguras: En el periodo reciente, se identificaron (1) condición insegura. El estado detallado de este reporte se encuentra disponible en el formato GA-FR-034 Registro de Actos y Condiciones Inseguras
- j) **GA-FR-037** Consolidado de emergencias: No se presentaron emergencias durante la ejecución de las actividades de la interventoría en el periodo de este informe.

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 28 de 37		

- k) **GA-FR-050** Seguimiento, uso y manejo Elementos de Protección Personal (EPP): Durante el último periodo de reporte, se llevó a cabo el seguimiento al uso y manejo de los Elementos de Protección Personal (EPP). Se realizó la entrega de EPP a los cargos asociados, según lo establecido en los formatos de entrega de EPP y de acuerdo con las necesidades específicas de las actividades. Para el personal recién incorporado, la entrega de EPP no fue necesaria en dicho periodo, considerando su rol y tipo de contratación. Se pueden verificar soportes pertinentes en el Anexo 1.5-10. Es importante señalar que los demás ingresos reportados corresponden a contrataciones independientes.

l) **Gestión tareas de trabajo en alturas**

La Interventoría ha implementado una gestión para supervisar y asegurar el cumplimiento de la legislación de SST con respecto al trabajo seguro en alturas, catalogada como actividades de alto riesgo, A continuación, se detallan las principales acciones llevadas a cabo:

- **Programa de Protección y Prevención contra Caídas en Alturas:** La Interventoría tiene su programa de prevención y protección contra caídas en alturas, el responsable idóneo que administra dicho programa.
- **Capacitación del Personal Técnico y Supervisión** Se capacitaron y entrenaron a los jefes de los frentes en trabajos seguros en alturas, junto con los Inspectores y residentes A-SST, especialista en tareas de alto riesgo y los demás profesionales técnicos que participan en la supervisión de las obras.
- **Permisos y Certificaciones de Trabajo en Alturas** se implementan los permisos de trabajo en alturas y ATS Lo anterior en el anexo 1.5-17, así mismo en el anexo 1.5-13 se adjunta las inspecciones correspondientes.

1.5.2 **Certificaciones de Paz y salvo**

Original de la certificación emitida por el revisor fiscal (si aplica) o por el contador y el representante legal del Interventor, en la cual se certifique que se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos de salarios, honorarios, prestaciones y seguridad social, de la totalidad del personal reportado en el respectivo periodo. La certificación presentada por el Interventor deberá contener el listado de personal certificado. Las respectivas certificaciones, del personal reportado en el presente periodo, se adjuntan en el Anexo 1.5-2.

Nota: En el certificado general de la interventoría se incluye el personal que se integró en el presente periodo según formato 31, no se incluye el personal que se retiró.

1.5.3 **Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social**

Copias de afiliaciones y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral del Personal vinculado o retirado por el Interventor, dentro del periodo respectivo.

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 29 de 37		

En el Anexo 1.5-3 se adjuntan las afiliaciones al SGSS del personal que ingreso durante el periodo del presente informe.

Además, se anexa el pago de seguridad social del personal antiguo que laboró en el periodo.

Para los trabajadores ubicados en el extranjero se anexan las respectivas certificaciones de sus empresas contratantes, que evidencian que están cubiertos por la seguridad social en sus países.

El CSPLMB realizó el respectivo pago de la ARL al personal independiente que tiene contrato por prestación de servicios, que realiza actividades clasificadas en riesgo IV o V.

Los respectivos soportes se adjuntan en el Anexo 1.5-3.

1.5.4 Pagos de salarios personal de interventoría

Soportes de pago de los salarios a los empleados del Interventor, dentro del periodo respectivo.

En el Anexo 1.5-4 se adjuntan los soportes de pago de nómina del mes reportado en el presente informe, de cada empleado de la interventoría.

Se presenta casos del personal profesional independiente contratado por la Interventoría por contrato de prestación de servicios, que tienen dedicaciones parciales, a quienes se le paga mes vencido una vez se revise y verifique la cuenta de cobro mensual que deben hacer llegar al área contable.

1.5.5 Egresos de personal/ Examen de retiro

Copia del formato de la notificación, en la cual le informo a su Personal el derecho que tiene a realizarse el examen médico de egreso, si fuere aplicable.

Se realiza la notificación del derecho a realizarse el examen médico de egreso, para el personal que ingreso en el presente periodo. Para su verificación en el Anexo 1.5- 5.

Como novedad del presente informe, los egresos son de metodología contractual independiente.

En el presente periodo se retiró 2 persona. Para su verificación Anexo 1.5-5

1.5.6 Registro de la notificación de riesgos

Copia del formato de notificación de riesgos. Este soporte únicamente se deberá presentar, cuando se haya vinculado Personal nuevo dentro del respectivo periodo.

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 30 de 37		

A cada trabajador que ingresa al proyecto, se le realiza la notificación de los riesgos a los que va a estar expuesto en su ambiente laboral, de acuerdo con el cargo a desempeña.

Durante el periodo se socializo (7) notificación de riesgos al personal que se vinculó en el periodo de reporte, verificar en el Anexo 1.5-6.

1.5.7 Registro de asistencia a la inducción SST

Copia de los formatos de inducción al Personal que se haya vinculado al Interventor dentro del respectivo periodo.

A todo el personal que ingreso al proyecto en el presente periodo, se le realizó una inducción en temas SST, como fueron: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Políticas: SST, de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas, seguridad vial, objetivos del SG-SST, SGSS ARL, EPS, AFP, inducción PESV, definición y reporte de Accidentes y enfermedad laboral, Peligro y Riesgo, actos y condiciones inseguras, Reglamento de higiene y seguridad industrial, notificación de riesgos, plan de Emergencias, EPP uso y reposición, COPASST, Comité de Convivencia Laboral, acoso laboral, normas de seguridad. verificar en el Anexo 1.5-7.

1.5.8 Conceptos médicos ocupacionales

Durante el periodo se realizaron 7 exámenes ocupaciones debido al ingreso de personal reportado en el mes. Anexo 1.5-8.

1.5.9 Registro de Capacitaciones y entrenamientos

Copia de los formatos de capacitación y entrenamiento realizados en el respectivo período.

Para el proceso de formación en el mes del reporte se cumplió con las capacitaciones programadas en el cronograma de capacitación 2025, así mismo cada oficina implemento sensibilizaciones diferentes las temas que se dictaron los cuales fueron los siguientes:

- Pausas activas
- Semana de la salud donde se realizó varias actividades
- entre otros

Los soportes de las capacitaciones realizadas se presentan en el anexo 1.5-9.

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 31 de 37		

1.5.10 Entrega de EPP

Copia de las actas de entrega o reposición de los Elementos de Protección Personal (“EPP”) que haya sido entregado durante el periodo respectivo.

Los soportes de entrega o reposición de EPP se pueden verificar en el anexo 1.5-10.

De acuerdo con los entregables la reposición, se realizó conforme a la necesidad de las actividades; se incluye para verificación los soportes de la actividad en el anexo 1.5-10

Los demás colaboradores realizan trabajo de oficina y/o; por lo anterior no ha sido necesario la entrega de estos elementos.

1.5.11 Soporte Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (“COPASST”)

- a) Copia de la convocatoria y/o conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (“COPASST”), en caso de haber ocurrido durante el periodo respectivo. Adicionalmente, el Interventor deberá presentar el acta de la reunión del COPASST, que se haya llevado a cabo durante el periodo respectivo.

Se programa reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (“COPASST”) dentro de los 15 días del mes siguiente, se anexa soporte de reunión del mes noviembre en el Anexo 1.5-16

1.5.12 Soporte Comité de Convivencia Laboral

Copia de la convocatoria y/o conformación del Comité de Convivencia Laboral (“COCOLAB”), en caso de haber ocurrido durante el periodo respectivo. Adicionalmente, el Interventor deberá presentar el acta de la reunión del COCOLAB, que se haya llevado a cabo durante el periodo respectivo.

Se programa reunión del Comité de Convivencia Laboral (“COCOLAB”), se anexa soporte de reunión del mes diciembre en la próxima versión.

1.5.13 Aprobación emitida entidad gubernamental PESV

Adjuntar copia de la aprobación emitida por la Autoridad Gubernamental del Plan Estratégico de Seguridad Vial (“PESV”).

En relación con la aprobación ante la autoridad gubernamental, no se requiere aprobación según Decreto 2106/2019 artículo 110, se debe realizar reporte de autogestión de forma anual según resolución 40595/2022 en el paso 20 por los medios que disponga la entidad verificadora que le

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 32 de 37		

corresponda, cabe resaltar según ley 2050/2020 artículo 1 la entidad que le corresponde al Consorcio Supervisor PLMB es el Ministerio de trabajo el cual no se ha pronunciado.

1.5.14 Soporte cumplimiento PESV

Adjuntar copia de la certificación emitida por la Autoridad Gubernamental, respecto del cumplimiento de la implementación de PESV.

En relación con la aprobación ante la autoridad gubernamental, no se requiere aprobación según Decreto 2106/2019 artículo 110, se debe realizar reporte de autogestión de forma anual según resolución 40595/2022 en el paso 20 por los medios que disponga la entidad verificadora que le corresponda, cabe resaltar según ley 2050/2020 artículo 1 la entidad que le corresponde al Consorcio Supervisor PLMB es el Ministerio de trabajo el cual no se ha pronunciado.

1.5.15 Registro de capacitaciones conductores

Adjuntar copia de los soportes de capacitación de conductores en concordancia con las actividades programadas en el período respectivo.

Durante el periodo, se llevaron a cabo verificaciones visuales en el frente de obra entre el Interventor y la EMB, relacionadas con la gestión SST. No se realizó ninguna capacitación en el periodo.

1.5.16 Soporte Actas de comité ambiental y SST

En relación con las actas de los comités Ambiental y de SST del Interventor, correspondientes a la 171, 172 y 173, las cuales están en proceso de firma y se anexaran en la próxima versión.

1.5.17 Registro Fotográfico

Registro fotográfico a color georreferenciado de las actividades de SST ejecutadas en el periodo correspondiente.

En el Anexo 1.5-11 se adjunta el registro fotográfico, donde se hace una breve descripción de cada fotografía, de acuerdo con las actividades realizadas en el periodo.

1.5.18 Registro de PQRS

Registro acumulado de las peticiones, quejas y reclamos ("PQRS") gestionadas por el Interventor. El formato será acordado con la EMB al momento de la firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, y el mismo se ajustará de acuerdo con las necesidades de la EMB.

No se han gestionado PQRS relacionadas con el componente SST en el periodo. ☐

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 33 de 37		

1.5.19 Registro de inspecciones

Adjuntar el listado de las inspecciones planeadas y ejecutadas, en el cual se deberán detallar las fechas en las cuales se llevaron a cabo, durante el periodo respectivo.

Actividades de Inspección realizadas:

- Inspección de Botiquín
- Inspección de extintores
- Inspección de instalaciones locativas
- Inspecciones de EPCC

Las inspecciones preoperacionales diarias de los vehículos empleados durante el mes se han realizado sin novedad.

Los registros de inspección y lista de inspecciones se presentan en el Anexo 1.5-13.

Así mismo se realiza inspección a los equipos utilizados para el trabajo en alturas en el presente periodo, anexo 1.5-13.

Las inspecciones se realizan con el objetivo de verificar condiciones de seguridad en las actividades que se realizan durante el periodo del presente informe, como resultado de estas, se obtiene un control y buenas prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, para evitar cualquier afectación física y moral de los trabajadores. Se realizan las inspecciones planeadas en el Copasst.

1.5.20 Documentos finales de año

Adicionalmente, al final del año fiscal el Interventor deberá presentar a la EMB la documentación relacionada con la gestión de SST del Contrato:

- i. Certificación emitida por el revisor fiscal o representante legal y el contador, en la cual conste que a la fecha de su emisión no se han interpuesto reclamaciones o demandas, como consecuencia de la falta de pago de salarios u honorarios, prestaciones y seguridad sociales del Personal del Interventor. En caso de existir reclamaciones o demandas deberá acompañarse de un informe de las acciones tomadas por el Interventor.

Para este periodo no se programó actividad

- ii. Documento emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (“ARL”), en la cual conste una relación de los accidentes laborales que hayan ocurrido durante la respectiva anualidad.

Para este periodo no se programó actividad

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 34 de 37		

Certificación emitida por el ente competente del porcentaje de cumplimiento de la implementación del SG-SST por parte del Interventor.

Para este periodo no se programó actividad

iii. Soportes de reubicación laboral de trabajadores (si aplica).

No aplica para el periodo del presente informe.

1.5.21 Otras actividades SST realizadas por interventoría

Durante el periodo se realizaron las actividades del Plan de Trabajo SST, enfocadas en las actividades de supervisión e implementación de buenas prácticas de seguridad con el personal del CSPLMB; conforme a la programación, entre las más importantes ejecutadas en el periodo del informe están la realización de capacitaciones, inspecciones, verificación de condiciones inseguras, recorridos en los frentes de obra activos, comités del SG-SST, comités del contrato entre otras.

Como cumplimiento a la gestión de supervisión de actividades al contrato; esta Interventoría presenta un registro fotográfico de supervisión de las actividades constructivas en el anexo 1.5-11.

De igual manera como apoyo a la supervisión esta Interventoría realiza recorridos permanentes por los frentes de obra activos con el fin de evidenciar la gestión de buenas prácticas de SST.

La supervisión de la Interventoría durante el periodo se ha realizado de manera permanente, en cada frente de obra; con acompañamientos a las actividades programadas de alto riesgo, de igual manera la realización de verificación de las condiciones de señalización de seguridad, senderos peatonales, orden y aseo en los frentes de obra, equipamiento de seguridad para los contratistas entre otros.

1.5.22 Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV

La Interventoría empleó (13) vehículos en la ejecución de sus actividades. El plan estratégico de seguridad vial este articulado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

En este periodo la interventoría realizó las siguientes actividades conducentes a la implementación del PESV.

- Se realiza la Inducción del plan estratégico de seguridad vial, política de seguridad vial, programas al personal que ingreso en el periodo del informe, ver Anexo 1.5-7.
- Se verificaron los documentos del vehículo que ingreso al proyecto (licencia de conducción, licencia de tránsito, SOAT, tecnicomecanicas, póliza, mantenimientos)
- Se actualizó la base de datos de los conductores.

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 35 de 37		

- Se verificó en el SIMIT la información sobre infracciones de tráfico de los conductores del Consorcio.
- Se realiza control a los vehículos con que cuenta el Consorcio en cuanto a: preoperacionales diarios, mantenimientos preventivos de acuerdo con el kilometraje. (Anexos 1.5-1, y 1.5-13).
- Verificación de cumplimiento de la política de seguridad vial, Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño (prevención de la distracción, gestión de velocidad segura, cero tolerancias a la conducción bajo efectos del alcohol y sustancias psicoactivas, gestión de velocidad segura y seguimiento a los indicadores entre otros.
- Se realiza el proceso de actualización del plan anual de trabajo del PESV articulado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Anexos 1.5-15).

Avance del plan de trabajo del plan estratégico de seguridad vial



Tabla 1.5-4 Análisis tendencial plan de trabajo

En el periodo de reporte no se ha presentado siniestro de tránsito como se evidencia en el siguiente grafico

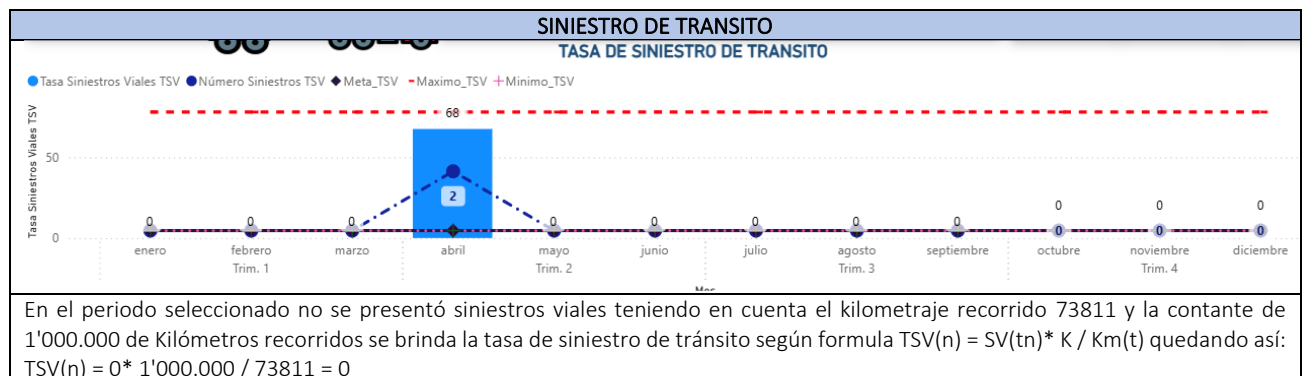


Tabla 1.5-5 siniestros de tránsito 2025

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 36 de 37		

1.5.23 Cumplimiento de las obligaciones SST por parte de interventoría

En el Anexo 1.5-14 se presenta la matriz de los requerimientos específicos sobre la verificación que debe hacer la interventoría, expresados en el Apéndice A2 “Obligaciones específicas del contrato de interventoría.

Conforme a lo establecido en el plan de trabajo SST, se presenta en el presente informe la ejecución de actividades proyectadas (Programadas y Ejecutadas) para el periodo del presente informe. Anexo 1.5-15.

De igual manera se ejecutaron las actividades del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo; conforme a la metodología de priorización de los principales riesgos asociados al proyecto; dentro de las actividades ejecutadas se presenta la gestión de capacitaciones, inspecciones programadas, control normativo de personal, gestión de comité del Copasst, entrega de elementos de protección personal, acompañamiento a las actividades críticas en el frente de obra, recorridos de supervisión de obra, revisión de preoperacionales, verificación de senderos peatonales y señalización general de seguridad en el frente de obra y en las áreas de influencia del proyecto.

 CONSORCIO SUPERVISOR PLMB	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				 METRO BOGOTÁ	
	CONTRATO No. 148 DE 2020 INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 163 DE 2019.					
	Código del Formato CSPLMB-FT-LFG-006	Vigencia del Formato 01/09/2024	Versión: V03	Pág. 37 de 37		

1.6. Seguimiento Contrato No. 148 de 2020

En el LINK se encuentra las actas realizadas en el Periodo

[1.6 Actas Sto Interventoría.pdf](#)
