METRO LINEA 1

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTÁ


METRO BOGOTÁ

PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO – ANEXO 01: PLAN DEEJECUCIÓN EN PRIMAVERA - P6 (CRONOGRAMA)

L1T1-0000-000-CON-ED-GEN-PN-0009_A01


El contenido de este documento no podrá ser divulgado a terceros ya sea en parte o en su totalidad sin autorización escrita de **METRO LINEA 1 SAS**
The content of this document may not be disclosed to third parties either in part or in full without written authorization from **METRO LINEA 1 SAS**
未经 **METRO LINEA 1 SAS** 的书面授权，不得将本文档的内容部分或全部透露给第三方

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04	**PROGRAMACION GENERAL PLMB**	2700	20-Oct-20	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.0	**HITO DEL PROYECTO**	2700	20-Oct-20	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.0.1	**Hitos - Fase Previa <810d>**	810	20-Oct-20	08-Jan-23
M-100000	INICIO DEL PROYECTO	0	20-Oct-20	
M-100010	FPMS1: Inicio de estudios y diseño <IFP + 20d>	0	09-Nov-20	
M-100030	FPMS2: Inicio de las obras de adecuacion del terreno patio de taller (UE1) <IFP + 301	0	17-Aug-21*	
M-100020	FPMS3: Inicio de Obras para Av. Caracas con Calle 72 (UE304) <IFP + 332d>	0	17-Sep-21*	
M-100060	Finalización de la fase preliminar <IFP + 810d>	0		08-Jan-23
PLMB-T1-V04.0.2	**Hitos - Fase De Construccion <1710D>**	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
M-100070	Firma del Acta de Inicio de la Fase de Construcción (IFC)	0	08-Jan-23	
M-100040	FCMS1: Inicio actividades de adecuacion del area de prefabricacion y almacenamiento	0	18-Jan-23*	
M-100050	FCMS3: Inicio construccion obras del Viaducto en el tramo de la AvCaracas de Calle 1	0	07-Jun-23*	
M-100090	FCMS6: Inicio montaje tableros (UE92-UE157) <IFC + 840d)	0	27-Sep-23*	
M-100080	FCMS2: Inicio de las obras de los edificios del patio taller UE36) <IFC + 630d>	0	29-Sep-24*	
M-100110	FCMS7: Finalización de SER 1 o SER 2 (UE385 / UE386) <IFC + 810d>	0		28-Mar-25*
M-100130	FCMS8: Finalización vias de pruebas del material rodante en Patio Taller <IFC + 990d>	0		24-Sep-25*
M-100150	FCMS4: Finalización estructura del viaducto (UE147-UE157) <IFC + 1140d>	0		21-Feb-26*
M-100120	FCMS5: Finalización de 27 UE´s completas de cimentacion, pilas y capiteles del viadu	0		20-Aug-26*
M-100140	FCMS11: Entrega del 1er tren con prueba in situ (UE581) <IFC + 1350d>	0		19-Sep-26*
M-100160	FCMS9: Finalización Urbanismo por Av. Caracas Calle 1 y Calle 26 (UE253-UE260) <I	0		19-Oct-26*
M-100100	FCMS12: Finalización de obra civil estacion Portal Americas (UE160-UE161) <IFC + 1	0		17-Jan-27*
M-100190	FCMS14: Suministro y ensayo de trenes del No. 2 al No. 13 (UE582-UE587) <IFC + 1	0		17-Jan-27*
M-100180	FCMS10: Finalización instalacion via ferrea (UE440-UE505) <IFC + 1470d>	0		17-Jan-27*
M-100170	FCMS13: Finalización instalación de sistemas metro ferroviarios E.P Americas (UEs41	0		17-May-27*
M-100220	FCMS15: Fin pruebas equipos sistema de alimentacion electrica de traccion 750 V (UE	0		16-Jun-27*
M-100200	FCMS17: Finalización instalacion sistema CBTC (UE515-UE520) <IFC + 1650d>	0		16-Jul-27*
M-100210	FCMS16: finalización instalación y pruebas sistemas CCO (UE508) <IFC + 1710d>	0		14-Sep-27*
M-100230	Finalización de la fase de construcción <IFC + 1710d>	0		14-Sep-27*
PLMB-T1-V04.0.3	**Hitos - Fase de Pruebas, Certificaciones y Puesta en Marcha <180d>**	180	14-Sep-27	12-Mar-28
M-100240	Firma del acta de inicio de la fase de prueba y puesta en servicio (IFT)	0	14-Sep-27	
M-100250	FTMS1: Obtencion de certificaciones de las pruebas individuales y de integracion de si	0		12-Mar-28
M-100260	Finalización de la fase de prueba y puesta en servicio <IFT + 180d>	0		12-Mar-28*
PLMB-T1-V04.1	**FASE PREVIA**	810	20-Oct-20	08-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.01	**Requisitos preliminares y General**	180	20-Oct-20	18-Apr-21
PLMB-T1-V04.1.01.01	**Entregables**	180	20-Oct-20	18-Apr-21
P-1000	Plan de gestión del proyecto (= 90d)	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1010	Plan de gestión del alcance (= 90d)	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1020	Plan de comunicación	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1030	Sistema de gestión de la calidad (= 90d)	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1040	Plan de gestión de la calidad	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1050	Plan De Ejecucion	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1060	Diccionario WBS (Composición de paquetes de trabajo para actividades principales y c	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1070	plan de gestión del cronograma (= 90d)	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1080	Plan de gestión de seguridad	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1090	Plan de aseguramiento del sistema RAMS (= 180d)	180	20-Oct-20	18-Apr-21
P-1100	Plan de gestión de interfaz	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1110	Plan de gestión del subsistema	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1120	Plan de gestión de los requerimientos técnicos	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1130	Plan de gestión de Retribucion	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1140	Plan de gestión de adquisiciones y suministros	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1150	Proyecto de gestión de modificaciones	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1160	Plan de gestión de documentos	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1170	Plan de gestión de riesgos (= 90d)	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1180	Plan de recursos humanos (= 90d)	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1190	Plan de control de calidad (= 90d)	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1200	Plan de gestión de compatibilidad electromagnética de EMC	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1210	Plan de gestión de la instalación	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1220	Plan de aprobación de diseño	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1230	Plan de organización y diseño.	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1240	Plan de gestión de la construccion	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-1250	Plan de gestión de pruebas y verificación	90	20-Oct-20	18-Jan-21

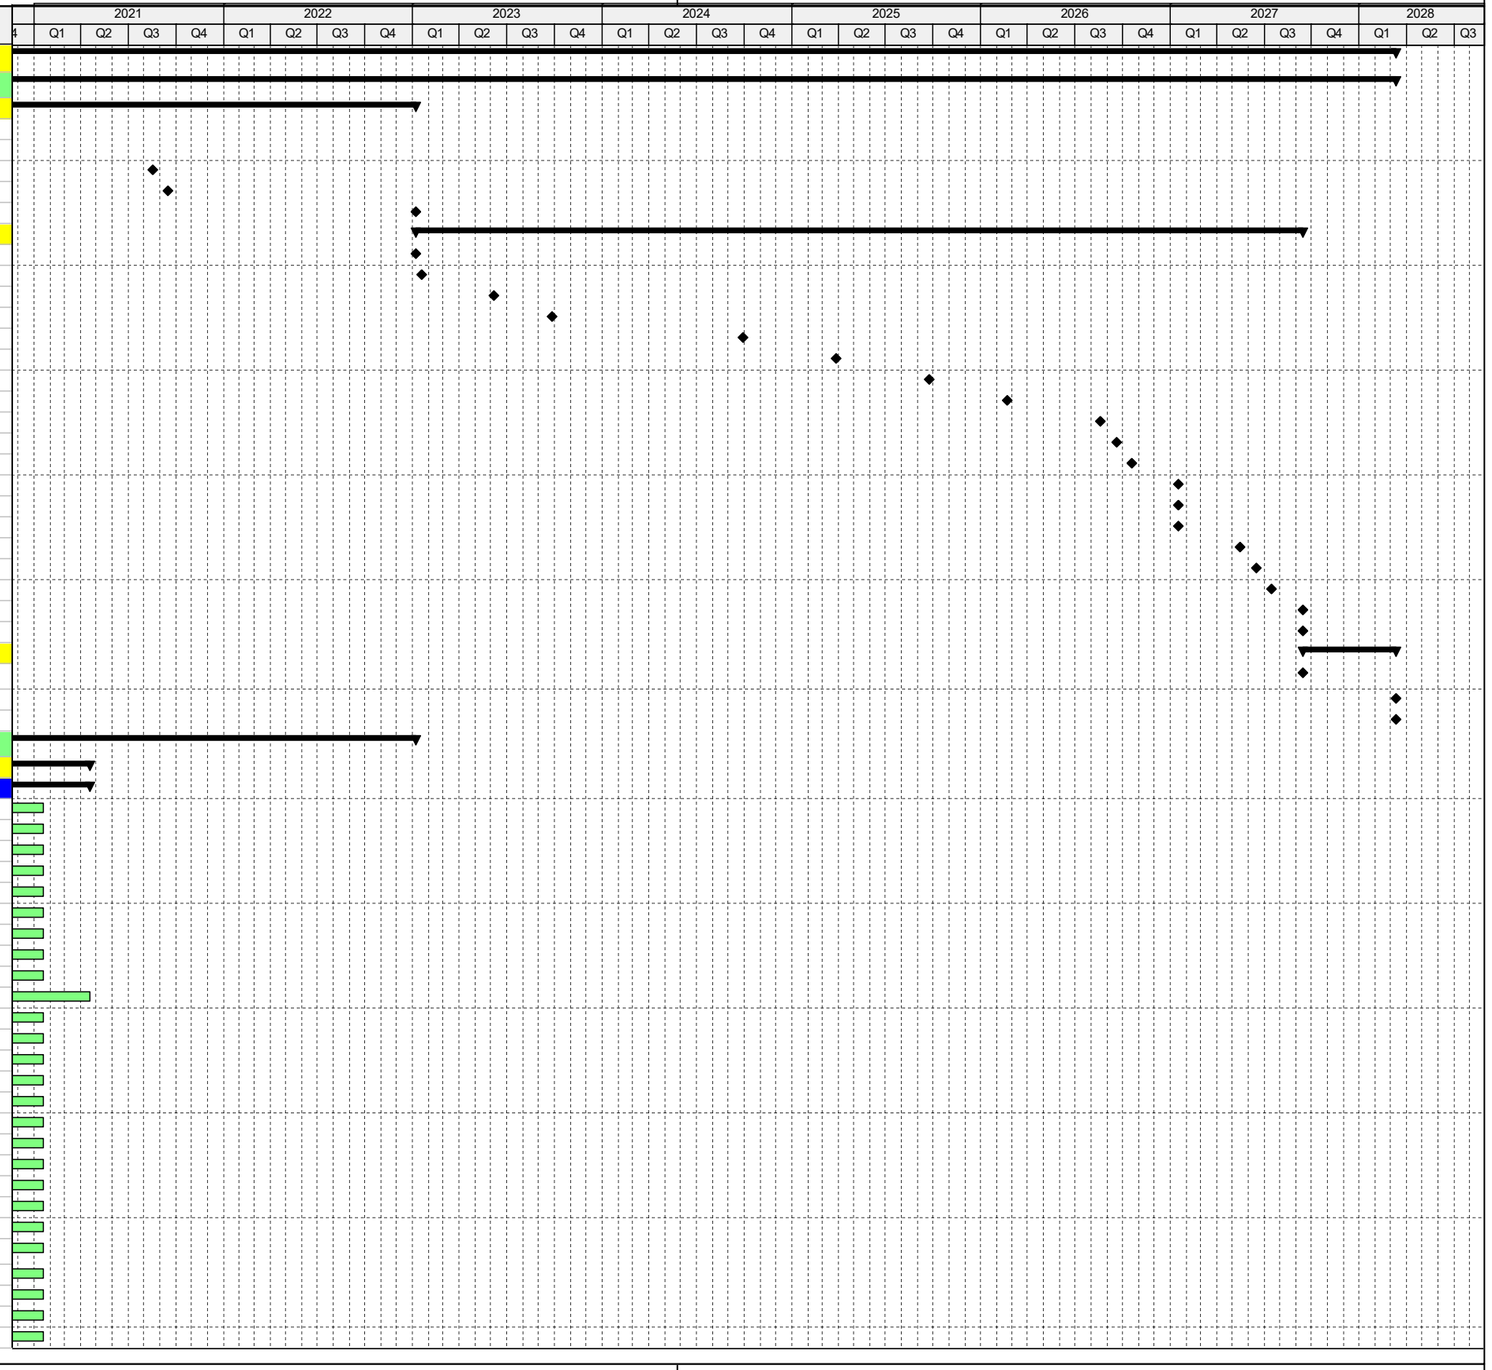


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.1.02	Disposicion de Predios	780	19-Nov-20	08-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.02.01	Espacio público (reubicación de la red EMB completa)	312	02-Mar-22	08-Jan-23
P-22620	Posesión del sitio -Para viaducto - IE1 (CR 91A - CR 86 G) <AT12-Tabla 3: IFP + 450d>	0		02-Mar-22*
P-22630	Posesión del sitio -Para viaducto - IE2 (CR86A BIS-CR80G BIS <AT12-Tabla 3: IFP + 4	0		06-Apr-22*
P-22640	Posesión del sitio -Para viaducto - IE3 (CR80C-CLL42C Sur)<AT12-Tabla 3: IFP + 450	0		06-Apr-22*
P-22690	Posesión del sitio -Para viaducto - IE12 (CLL13-CLL24) <AT12-Tabla 3: IFP + 450d>	0		30-Apr-22*
P-22670	Posesión del sitio -Para viaducto - IE9 (DG16 Sur-CR24C) <AT12-Tabla 3: IFP + 450d>	0		10-May-22*
P-22700	Posesión del sitio -Para viaducto - IE13 (CLL25-CLL42) <AT12-Tabla 3: IFP + 450d>	0		01-Jun-22*
P-22710	Posesión del sitio -Para viaducto - IE14 (CLL44-CLL61) <AT12-Tabla 3: IFP + 450d>	0		01-Jun-22*
P-13480	Posesión del sitio -Para viaducto - IE8 (CR41a-CLL22 Sur) <AT12-Tabla 3: IFP + 360d>	0		02-Jun-22*
P-22680	Posesión del sitio -Para viaducto - IE11 (CLL3-CLL11) <AT12-Tabla 3: IFP + 450d>	0		24-Jun-22*
P-22650	Posesión del sitio -Para viaducto - IE4 (CLL42C Sur-CLL40 Sur) <AT12-Tabla 3: IFP +	0		30-Jun-22*
P-22660	Posesión del sitio -Para viaducto - IE5 (CLL39 Sur - CR72a BIS) <AT12-Tabla 3: IFP +	0		31-Jul-22*
P-22730	Posesión del sitio -Para viaducto - IE16 (CLL73-CLL79A) <AT12-Tabla 3: IFP + 450d>	0		02-Sep-22*
P-65640	Posesión del sitio -Para viaducto - IE17 (CLL79A-CLL81) <AT12-Tabla 3: IFP + 690d>	0		10-Sep-22*
P-70750	Posesión del sitio -Para viaducto - IE10 (CR24-CLL2) <AT12-Tabla 3: IFP + 720d>	0		07-Dec-22*
P-22720	Posesión del sitio -Para viaducto - IE15 (CLL63-CLL72) <AT12-Tabla 3: IFP + 450d>	0		13-Dec-22*
P-83610	Posesión del sitio -Para viaducto - IE6 (CF72-Av. CR68) <AT12-Tabla 3: IFP + 810d>	0		08-Jan-23*
P-83620	Posesión del sitio -Para viaducto - IE7 (CR52B BIS-CR50A) <AT12-Tabla 3: IFP + 810d	0		08-Jan-23*
P-83670	Posesión de Sitio -Por Viaducto - Ramal Técnico	0		08-Jan-23*
PLMB-T1-V04.1.02.02	Premisas (reubicación de la red EMB completa)	780	19-Nov-20	08-Jan-23
P-2580	Propiedad del sitio del patio del taller: (Excepto predio ocupado por emisora de Radio)	0		19-Nov-20*
P-9260	Posesión del sitio para la Estación-E8	0		17-Sep-21*
P-13490	Posesión del sitio para la Estación-E6	0		15-Oct-21*
P-6680	Posesión del sitio para la Estación-E1	0		31-Jan-22*
P-16460	Posesión del sitio para la Estación-E10A	0		14-Feb-22*
P-16470	Posesión del sitio para la Estación-E10D	0		14-Feb-22*
P-22740	Posesión del sitio para la Estación-E2	0		02-Mar-22*
P-35990	Propiedad del sitio del patio del taller: (Predio ocupado emisora de Radio)	0		13-Apr-22*
P-22750	Posesión del sitio para la Estación-E3A	0		11-Jun-22*
P-22790	Posesión del sitio para la Estación-E3D	0		11-Jun-22*
P-22760	Posesión del sitio para la Estación-E4A	0		31-Jul-22*
P-22770	Posesión del sitio para la Estación-E5A	0		31-Jul-22*
P-22800	Posesión del sitio para la Estación-E4D	0		31-Jul-22*
P-22810	Posesión del sitio para la estación-E5D	0		31-Jul-22*
P-27250	Posesión del sitio para la Estación-E14A	0		01-Sep-22*
P-27290	Posesión del sitio para la Estación-E14D	0		01-Sep-22*
P-27230	Posesión del sitio para la Estación-E12A	0		02-Sep-22*
P-27270	Posesión del sitio para la estación-E12D	0		02-Sep-22*
P-22780	Posesión del sitio para la Estación-E9A	0		30-Nov-22*
P-22820	Posesión del sitio para la Estación-E9D	0		30-Nov-22*
P-27240	Posesión del sitio para la Estación-E13A	0		02-Dec-22*
P-40800	Posesión del sitio para la Estación-E16A	0		02-Dec-22*
P-27280	Posesión del sitio para la Estación-E13D	0		02-Dec-22*
P-40810	Posesión del sitio para la Estación-E16D	0		02-Dec-22*
P-27220	Posesión del sitio para la Estación-E11A	0		15-Dec-22*
P-27260	Posesión del sitio para la Estación-E11D	0		15-Dec-22*
P-83630	Posesión del sitio para la Estación-E7A	0		08-Jan-23*
P-83640	Posesión del sitio para la Estación-E15A	0		08-Jan-23*
P-83650	Posesión del sitio para la estación-E7D	0		08-Jan-23*
P-83660	Posesión del sitio para la estación-E15D	0		08-Jan-23*
PLMB-T1-V04.1.03	Estudios de ingeniería y diseños detallados	809	20-Oct-20	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.01	Hitos	122	18-Apr-21	17-Aug-21
P-6700	EMB_Entregar al Concesionario todos los diseños finales de las Redes a cargo del EM	0		18-Apr-21*
P-6780	Entrega Inventario de Redes AT13 180 dias	0		19-Apr-21*
P-10430	Entrega Plan para el traslado, proteccion, reubicacion y/o manejo de Redes AT13 300	0		17-Aug-21*
PLMB-T1-V04.1.03.02	ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN CAMPO	505	20-Oct-20	08-Mar-22
PLMB-T1-V04.1.03.02.1	Topografía	201	20-Oct-20	17-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.1.1	CORREDOR PRINCIPAL	188	09-Nov-20	17-Aug-21
P-2520	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	20	09-Nov-20	07-Dec-20
P-3000	Trabajos de campo(Red geodesica, Poligonales,nivelacion y elevacion detallada) WF1	55	07-Jan-21	26-Mar-21
P-3560	Levantamiento topografico convencional del WF1 - WF6	60	19-Feb-21	19-May-21

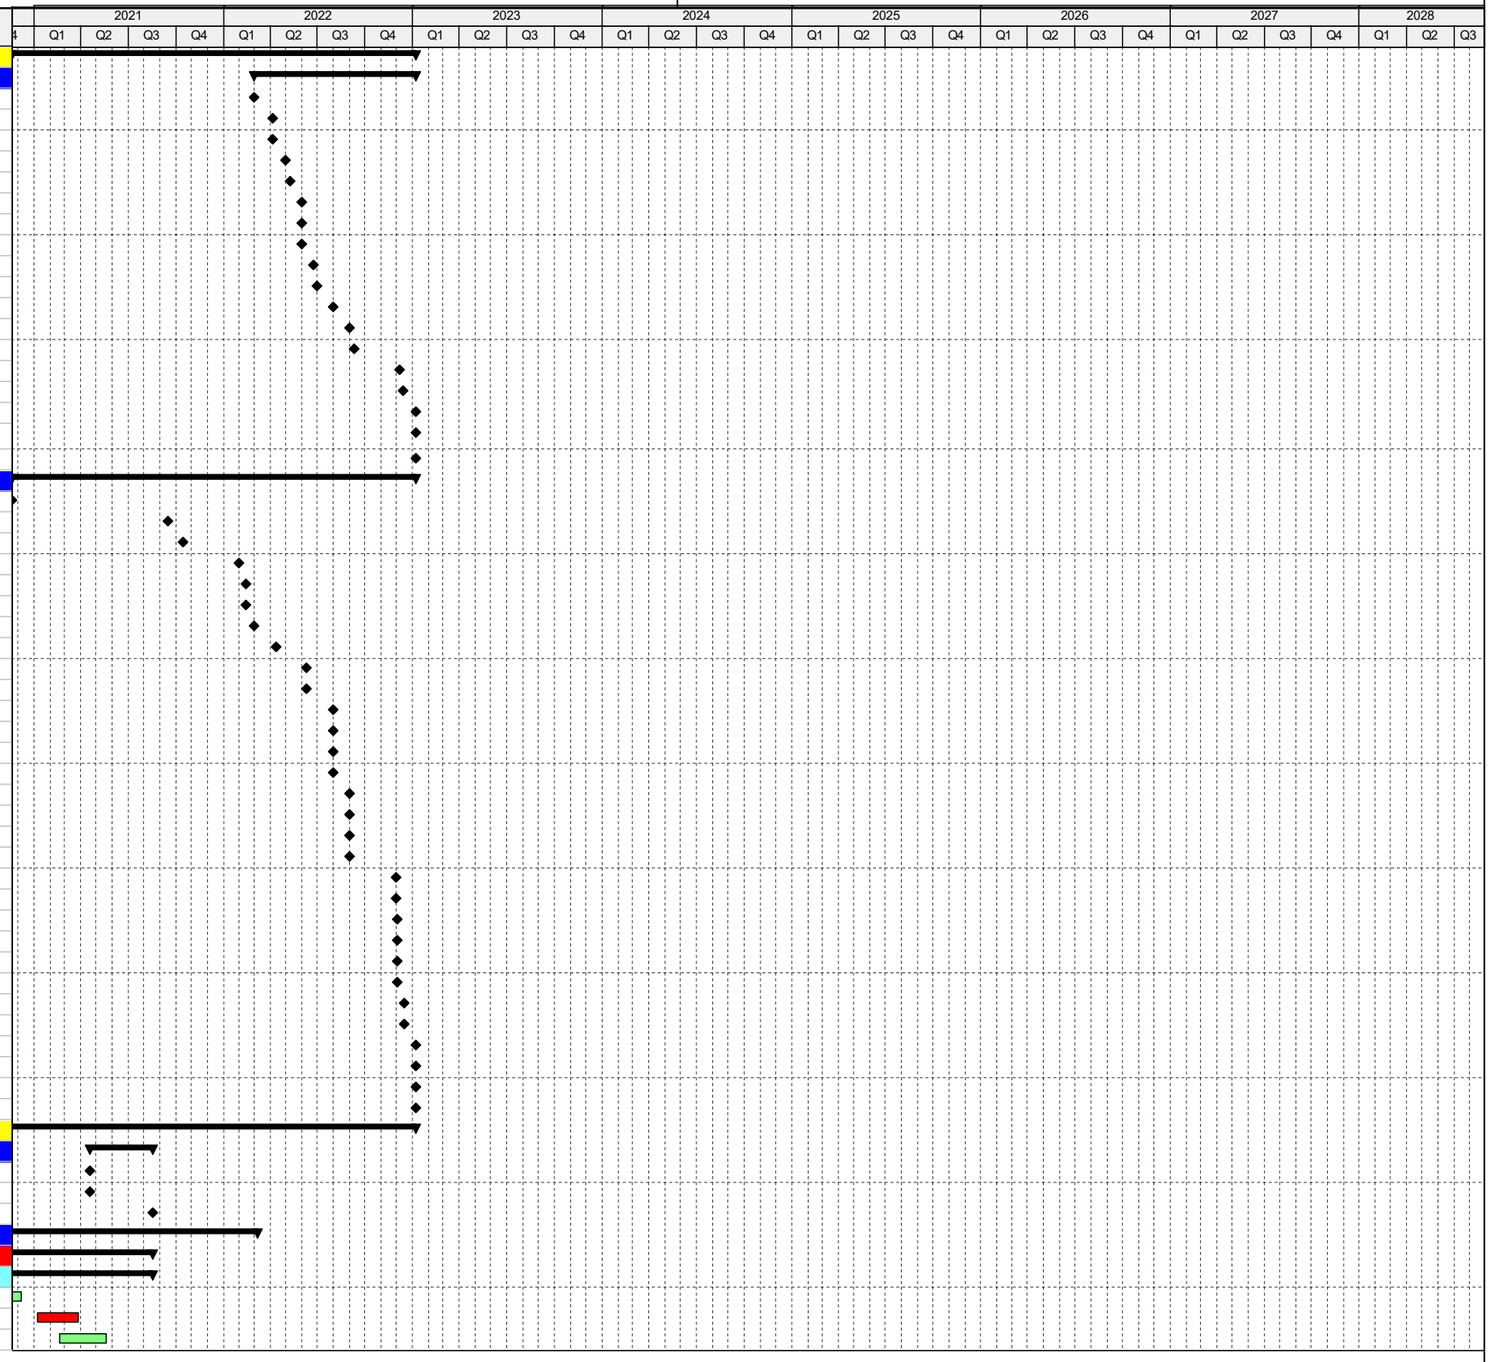

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-4480	Procesamiento de datos y generacion productos y entrega a Interventoria	43	30-Mar-21	01-Jun-21
P-8100	Revision de la interventoria producto	20	02-Jun-21	01-Jul-21
P-8970	Atencion de comentarios de interventoria	10	02-Jul-21	16-Jul-21
P-9320	Revisión de la interventoria(Resultados)	20	19-Jul-21	17-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.1.2 Puente Vehicular. Puente Av. 68		125	09-Nov-20	12-May-21
P-2530	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	20	09-Nov-20	07-Dec-20
P-2740	Trabajos de campo(Red geodesica, Poligonales,nivelacion y elevacion detallada)	10	09-Dec-20	22-Dec-20
P-2850	Procesamiento de datos y generacion productos	45	23-Dec-20	26-Feb-21
P-3720	Revision de la interventoria producto	20	01-Mar-21	29-Mar-21
P-4490	Atencion de comentarios de interventoria	10	30-Mar-21	14-Apr-21
P-6660	Revisión de la interventoria(Resultados)	20	15-Apr-21	12-May-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.1.3 Deprimido Vehicular. Deprimido Av. 72		134	09-Nov-20	26-May-21
P-2540	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	20	09-Nov-20	07-Dec-20
P-2860	Trabajos de campo(Red geodesica, Poligonales,nivelacion y elevacion detallada)	9	23-Dec-20	06-Jan-21
P-3010	Procesamiento de datos y generacion productos	45	07-Jan-21	11-Mar-21
P-3870	Revision de la interventoria producto	20	12-Mar-21	13-Apr-21
P-6600	Atencion de comentarios de interventoria	10	14-Apr-21	27-Apr-21
P-6940	Revisión de la interventoria(Resultados)	20	28-Apr-21	26-May-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.1.4 Patio Taller		125	20-Oct-20	23-Apr-21
P-1650	Trabajos de campo(Red geodesica, Poligonales,nivelacion y elevacion detallada)	30	20-Oct-20	02-Dec-20
P-2670	Procesamiento de datos y generacion productos	45	03-Dec-20	09-Feb-21
P-3470	Revision de la interventoria producto	20	10-Feb-21	09-Mar-21
P-3820	Atencion de comentarios de interventoria	10	10-Mar-21	24-Mar-21
P-4090	Revisión de la interventoria(Resultados)	20	25-Mar-21	23-Apr-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.2 Geotecnia		434	20-Oct-20	27-Dec-21
P-1910	Investigacion y Recopilacion de Informacion existente	14	20-Oct-20	09-Nov-20
PLMB-T1-V04.1.03.02.2.1 Corredor Principal		413	09-Nov-20	27-Dec-21
P-2010	Elaboración de plan de exploración y entrega	58	09-Nov-20	03-Feb-21
P-3380	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	60	03-Feb-21	04-Apr-21
P-3400	Revisión del plan por interventoria R1	20	04-Feb-21	03-Mar-21
P-3760	Atencion de comentarios de interventoria	5	04-Mar-21	10-Mar-21
P-3860	Revisión del plan por interventoria R2	20	11-Mar-21	12-Apr-21
P-5730	Exploracion geotecnia en campo WF1-WF2	67	13-Apr-21	21-Jul-21
P-8850	Exploracion geotecnia en campo WF3-WF4	63	21-Jun-21	20-Sep-21
P-9370	Revisión de la interventoria(Resultados) WF1-WF2	20	22-Jul-21	19-Aug-21
P-10620	Exploracion geotecnia en campo WF5-WF6	63	27-Aug-21	26-Nov-21
P-11100	Revisión de la interventoria(Resultados) WF3-WF4	20	21-Sep-21	19-Oct-21
P-17410	Revisión de la interventoria(Resultados) WF5-WF6	20	29-Nov-21	27-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.2.2 Puente Vehicular. Puente Av. 68		241	09-Nov-20	08-Jul-21
P-2020	Elaboración de plan de exploración y entrega	22	09-Nov-20	10-Dec-20
P-2810	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	60	10-Dec-20	08-Feb-21
P-2820	Revisión del plan por interventoria R1	20	11-Dec-20	12-Jan-21
P-3060	Atencion de comentarios de interventoria	20	13-Jan-21	09-Feb-21
P-3480	Revisión del plan por interventoria R2	20	10-Feb-21	09-Mar-21
P-4570	Exploracion geotecnia en campo	45	05-Apr-21	08-Jun-21
P-8250	Revisión de la interventoria(Resultados)	20	09-Jun-21	08-Jul-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.2.3 Deprimido Vehicular. Deprimido Av. 72		193	20-Oct-20	30-Apr-21
P-1340	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	20	20-Oct-20	09-Nov-20
P-1660	Elaboración de plan de exploración y entrega	20	20-Oct-20	18-Nov-20
P-2600	Revisión del plan por interventoria	20	19-Nov-20	17-Dec-20
P-2830	Atencion de comentarios de interventoria	20	18-Dec-20	19-Jan-21
P-3200	Exploracion geotecnia en campo	50	20-Jan-21	31-Mar-21
P-4580	Revisión de la interventoria(Resultados)	20	05-Apr-21	30-Apr-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.2.4 Patio Taller		130	20-Oct-20	30-Apr-21
P-1670	Elaboración de plan de exploración y entrega	20	20-Oct-20	18-Nov-20
P-2610	Revisión del plan por interventoria	20	19-Nov-20	17-Dec-20
P-2840	Atencion de comentarios de interventoria	20	18-Dec-20	19-Jan-21
P-3210	Exploracion geotecnia en campo	50	20-Jan-21	31-Mar-21
P-4590	Revisión de la interventoria(Resultados)	20	05-Apr-21	30-Apr-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.2.5 Estaciones (Incluye Edificios de acceso)		413	09-Nov-20	27-Dec-21
P-2550	Elaboración de plan de exploración y entrega	20	09-Nov-20	07-Dec-20
P-2720	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	60	07-Dec-20	05-Feb-21

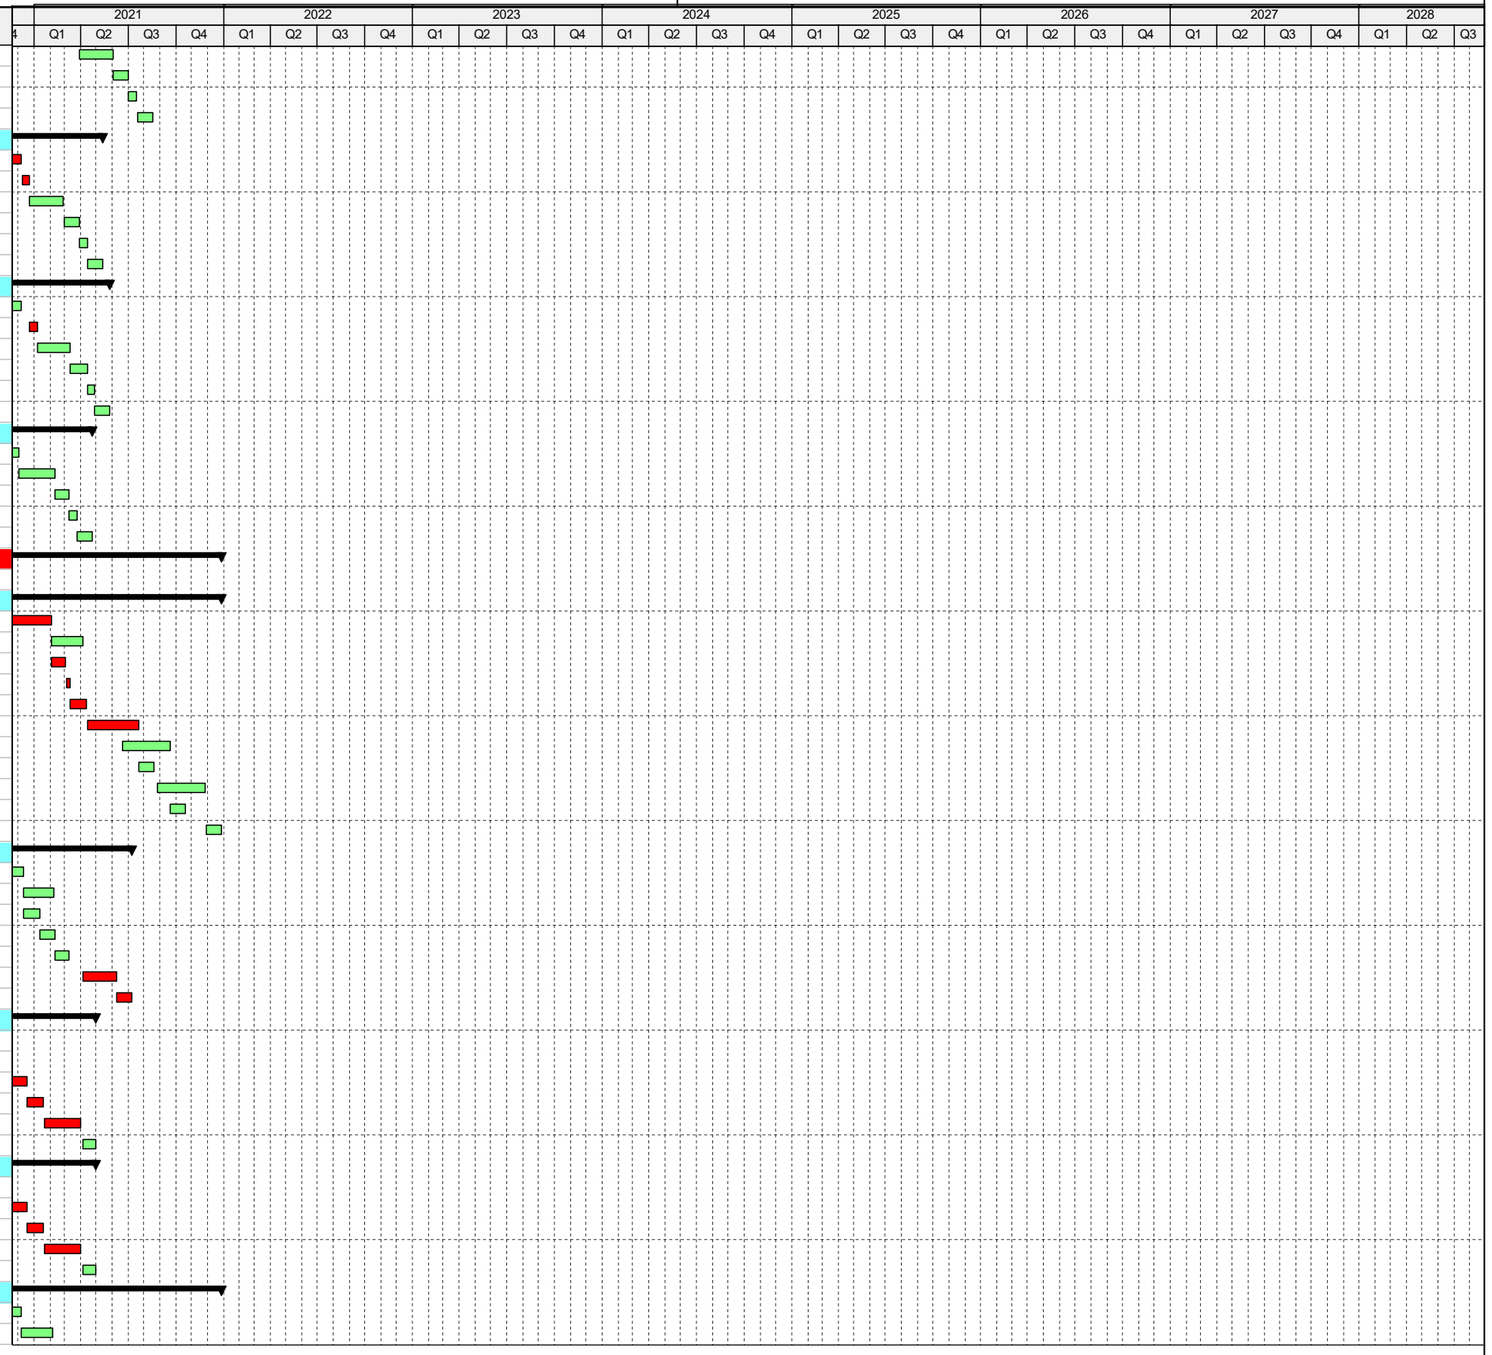


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-2760	Revisión del plan por interventoria R1	20	09-Dec-20	07-Jan-21
P-3030	Atencion de comentarios de interventoria	20	08-Jan-21	05-Feb-21
P-3450	Revisión del plan por interventoria R2	20	08-Feb-21	05-Mar-21
P-7430	Exploracion geotecnia en campo WF1-WF2	50	11-May-21	26-Jul-21
P-8860	Exploracion geotecnia en campo WF3-WF4	63	21-Jun-21	20-Sep-21
P-10130	Revisión de la interventoria(Resultados) WF1-WF2	20	27-Jul-21	24-Aug-21
P-10630	Exploracion geotecnia en campo WF5-WF6	63	27-Aug-21	26-Nov-21
P-11110	Revisión de la interventoria(Resultados) WF3-WF4	20	21-Sep-21	19-Oct-21
P-17420	Revisión de la interventoria(Resultados) WF5-WF6	20	29-Nov-21	27-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.2.6	**Deprimido Peatonal Calle 13**	315	09-Dec-20	20-Oct-21
P-2750	Elaboración de plan de exploración y entrega	50	09-Dec-20	19-Feb-21
P-3570	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	60	19-Feb-21	20-Apr-21
P-3580	Revisión del plan por interventoria	20	22-Feb-21	19-Mar-21
P-3990	Atencion de comentarios de interventoria	20	23-Mar-21	21-Apr-21
P-10120	Exploracion geotecnia en campo	40	27-Jul-21	21-Sep-21
P-11130	Revisión de la interventoria(Resultados)	20	22-Sep-21	20-Oct-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.2.7	**Interferencias**	301	22-Feb-21	20-Dec-21
P-3590	Elaboración de plan de exploración y entrega	50	22-Feb-21	05-May-21
P-7150	Revisión del plan por interventoria	20	06-May-21	03-Jun-21
P-8150	Atencion de comentarios de interventoria	20	04-Jun-21	06-Jul-21
P-9060	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	20	06-Jul-21	26-Jul-21
P-11140	Exploracion geotecnia en campo	40	22-Sep-21	19-Nov-21
P-17320	Revisión de la interventoria(Resultados)	20	22-Nov-21	20-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.3	**Estudio Hidrologico y de Inundacion para el Patio Taller**	85	25-Mar-21	30-Jul-21
P-4100	Desarrollo de la Metodologia	5	25-Mar-21	31-Mar-21
P-4600	Informacion de la CAR sobre el Rio Bogota	20	05-Apr-21	30-Apr-21
P-4610	Elaboracion Estudio de Inundacion y entrega	30	05-Apr-21	14-May-21
P-7600	Revision por parte de la Interventoria	20	18-May-21	16-Jun-21
P-8820	Atencion de Comentarios	10	17-Jun-21	30-Jun-21
P-8930	Revision por parte de la Interventoria(No Objecion)	20	01-Jul-21	30-Jul-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.4	**Estudio sobre el efecto Sismico**	90	22-Jul-21	30-Nov-21
P-9380	Analisis sismico de todos los tramos del Viaducto y entrega reporte	30	22-Jul-21	02-Sep-21
P-10980	Revisión de la interventoria	20	03-Sep-21	30-Sep-21
P-11710	Atencion de comentarios de interventoria	20	01-Oct-21	29-Oct-21
P-14140	Revisión de la interventoria(Resultados)	20	02-Nov-21	30-Nov-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.5	**Estudio sobre ruido y vibraciones**	225	13-Apr-21	08-Mar-22
P-5910	Analisis de estudio de ruido y vibracion y entrega	175	13-Apr-21	27-Dec-21
P-20740	Revisión de la interventoria	20	28-Dec-21	25-Jan-22
P-24960	Atencion de comentarios de interventoria	10	26-Jan-22	08-Feb-22
P-26510	Revisión de la interventoria(Resultados)	20	09-Feb-22	08-Mar-22
PLMB-T1-V04.1.03.02.6	**Catastro e inventario de redes**	302	20-Oct-20	17-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.6.1	**Catastro e Inventario Redes Secas**	302	20-Oct-20	17-Aug-21
P-1350	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	20	20-Oct-20	09-Nov-20
P-2500	Inventario de Red Secas y entrega	108	09-Nov-20	19-Apr-21
P-6800	Revisión de la interventoria	30	20-Apr-21	01-Jun-21
P-8120	Revisión de la EMB	20	02-Jun-21	01-Jul-21
P-8990	Atencion de comentarios de interventoria	10	02-Jul-21	16-Jul-21
P-9330	Revisión final Interventoria(No Objecion)	20	19-Jul-21	17-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.6.2	**Catastro Inventario de Redes Humedas**	302	20-Oct-20	17-Aug-21
P-1360	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	20	20-Oct-20	09-Nov-20
P-2510	Inventario de Redes humedas y entrega	108	09-Nov-20	19-Apr-21
P-6810	Revisión de la interventoria	30	20-Apr-21	01-Jun-21
P-8130	Revisión de la EMB	20	02-Jun-21	01-Jul-21
P-9000	Atencion de comentarios de interventoria	10	02-Jul-21	16-Jul-21
P-9340	Revisión final Interventoria(No Objecion)	20	19-Jul-21	17-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.7	**Plan de Traslado de Redes**	238	19-Apr-21	13-Dec-21
P-6790	Entrega Plan para el traslado, proteccion, reubicacion y/o manejo de Redes	120	19-Apr-21	17-Aug-21
P-10460	Revisión de la interventoria	30	18-Aug-21	28-Sep-21
P-11660	Revisión de la EMB	20	29-Sep-21	27-Oct-21
P-13860	Atencion de comentarios de interventoria	10	28-Oct-21	11-Nov-21
P-16420	Revisión final Interventoria(No Objecion)	20	12-Nov-21	13-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.03.02.8	**Inventario Urbanista**	220	09-Nov-20	30-Sep-21

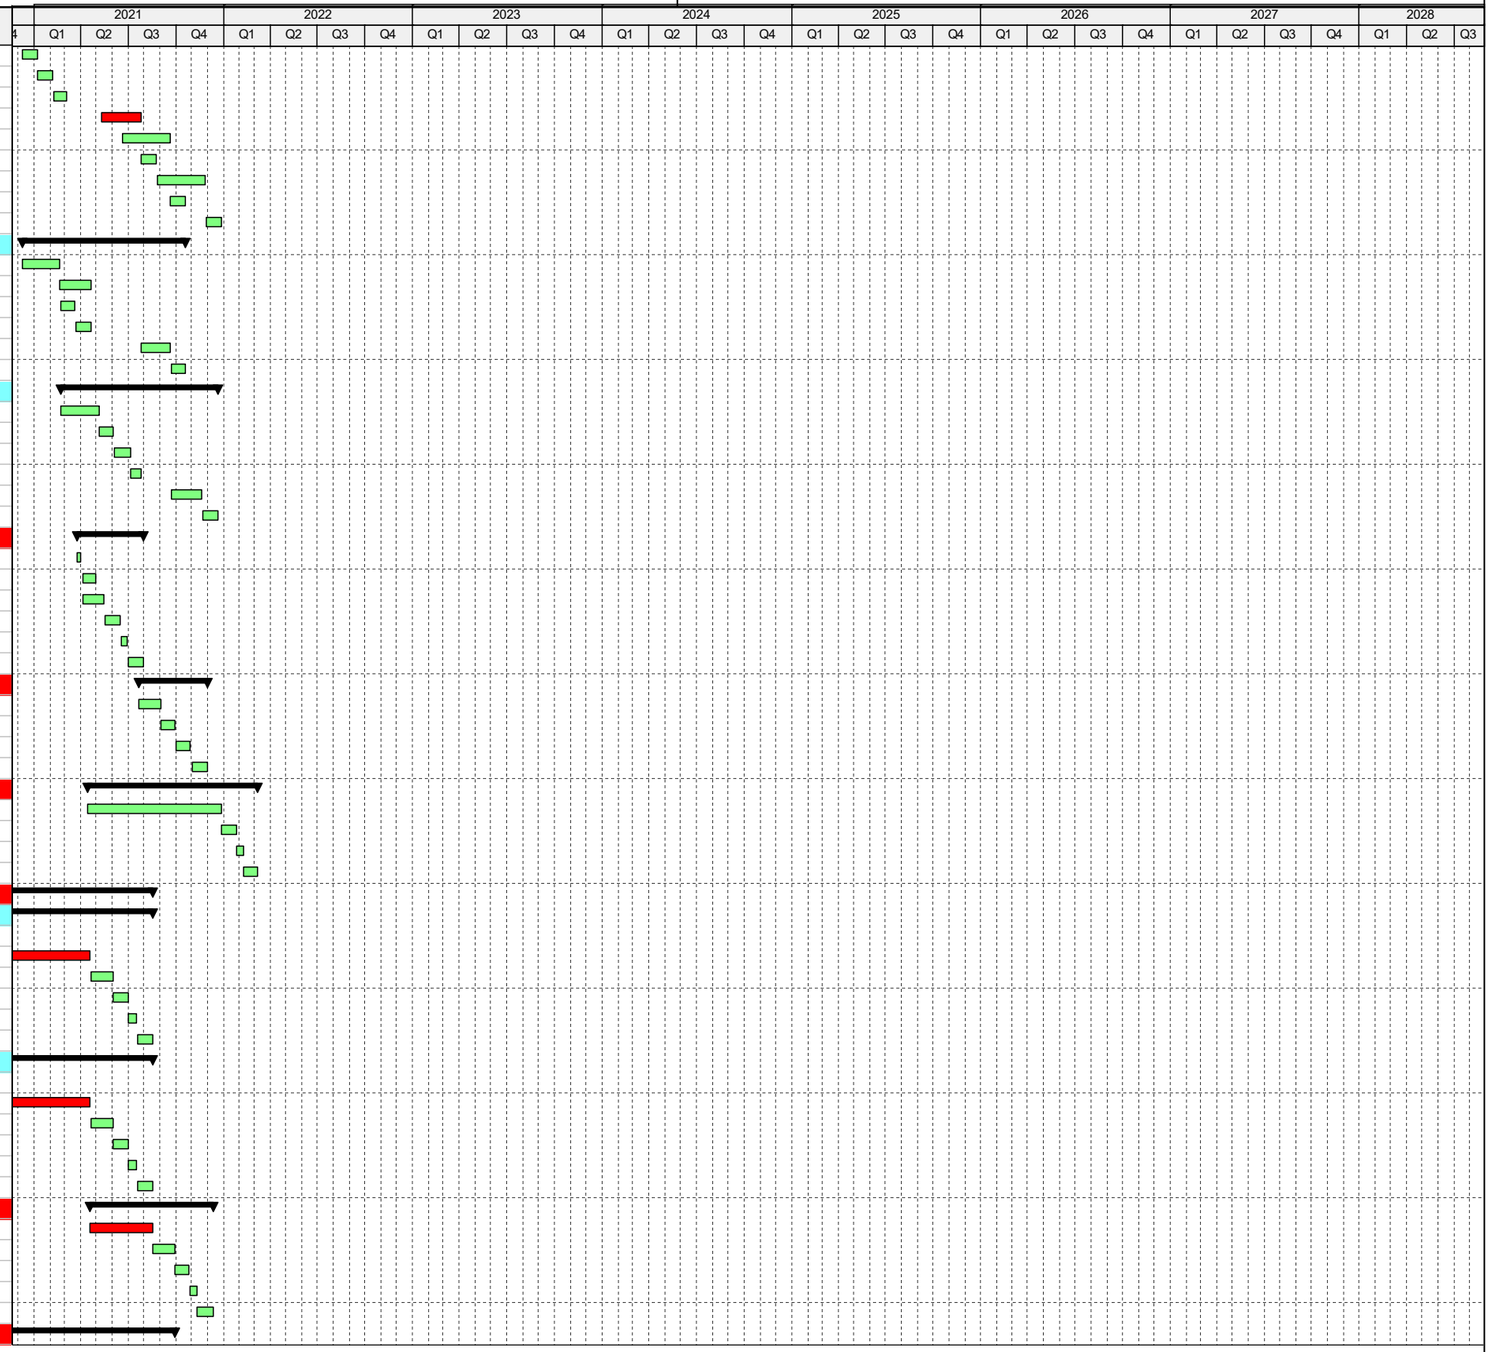


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-2490	Inventario de Urbanismo existente y entrega	150	09-Nov-20	21-Jun-21
P-8870	Revisión de la interventoria	20	22-Jun-21	21-Jul-21
P-9430	Atencion de comentarios de interventoria	30	22-Jul-21	02-Sep-21
P-10990	Revisión final Interventoria(No Objecion)	20	03-Sep-21	30-Sep-21
PLMB-T1-V04.1.03.03 VIADUCTO		432	13-Apr-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.0 Datos de entrada para diseños		264	13-Apr-21	04-May-22
P-5920	60% elaboracion y entrga de diseños(CRITERIOS DE DISEÑO,NOTAS Y ESPECIFICA	214	13-Apr-21	21-Feb-22
P-28530	Revisión de la interventoria R1 60%	20	22-Feb-22	22-Mar-22
P-32460	Atencion de comentarios de interventoria 60%	10	23-Mar-22	05-Apr-22
P-35450	Revisión de la interventoria R2 60%	20	06-Apr-22	04-May-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.01 K0+000-K2+083		430	13-Apr-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.01.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-5720	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	13-Apr-21	11-Feb-22
P-27340	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	14-Feb-22	22-Jun-22
P-27350	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22
P-30700	Atencion de comentarios de interventoria 60%	20	14-Mar-22	11-Apr-22
P-35960	Revisión de la interventoria R2 60%	20	12-Apr-22	10-May-22
P-46610	Final 100%	80	23-Jun-22	19-Oct-22
P-46620	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-52690	Atencion de comentarios de interventoria 90%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-57900	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-72560	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78430	Atencion de comentarios de interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-81660	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.01.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		430	13-Apr-21	04-Jan-23
P-5740	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	270	13-Apr-21	12-May-22
P-40830	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	60	13-May-22	10-Aug-22
P-40840	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-44900	Atencion de comentarios de interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47220	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-58320	Final 100%	50	11-Aug-22	21-Oct-22
P-58330	Revisión de la interventoria R1 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64120	Atencion de comentarios de interventoria 90%	10	09-Sep-22	22-Sep-22
P-67800	Revisión de la interventoria R2 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73190	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-79000	Atencion de comentarios de interventoria 100%	10	23-Nov-22	06-Dec-22
P-82370	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.01.3 MEP		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27360	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	60	14-Feb-22	10-May-22
P-40530	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	11-May-22	25-Jul-22
P-40540	Revisión de la interventoria R1 60%	20	11-May-22	08-Jun-22
P-44180	Atencion de comentarios de interventoria 60%	10	09-Jun-22	22-Jun-22
P-46630	Revisión de la interventoria R2 60%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-52700	Final 100%	50	26-Jul-22	04-Oct-22
P-52710	Revisión de la interventoria R1 90%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60600	Atencion de comentarios de interventoria 90%	10	24-Aug-22	06-Sep-22
P-63760	Revisión de la interventoria R2 90%	20	07-Sep-22	04-Oct-22
P-68870	Revisión de la interventoria R1 100%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75460	Atencion de comentarios de interventoria 100%	10	03-Nov-22	18-Nov-22
P-78440	Revisión de la interventoria R2 100%	20	21-Nov-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.01.4 MISC		190	14-Feb-22	18-Nov-22
P-27370	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	60	14-Feb-22	10-May-22
P-40550	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	11-May-22	25-Jul-22
P-40560	Revisión de la interventoria R1 60%	20	11-May-22	08-Jun-22
P-44190	Atencion de comentarios de interventoria 60%	10	09-Jun-22	22-Jun-22
P-46640	Revisión de la interventoria R2 60%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-52720	Final 100%	50	26-Jul-22	04-Oct-22
P-52730	Revisión de la interventoria R1 90%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60610	Atencion de comentarios de interventoria 90%	10	24-Aug-22	06-Sep-22
P-63770	Revisión de la interventoria R2 90%	20	07-Sep-22	04-Oct-22
P-68880	Revisión de la interventoria R1 100%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-68890	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Oct-22	02-Nov-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-75470	Atencion de comentarios de interventoria 100%	10	03-Nov-22	18-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.01.5	**Viaducto: STR: Viga Continua 36 + 53 +36 (Incluye zócalos de carril)**	430	13-Apr-21	04-Jan-23
P-5750	60% Elaboracion y entrega del diseño	250	13-Apr-21	13-Apr-22
P-36130	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	80	14-Apr-22	10-Aug-22
P-36140	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Apr-22	12-May-22
P-40850	Atencion de comentarios de interventoria 60%	10	13-May-22	26-May-22
P-42700	Revisión de la interventoria R2 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-58340	Final 100%	50	11-Aug-22	21-Oct-22
P-58350	Revisión de la interventoria R1 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64130	Atencion de comentarios de interventoria 90%	10	09-Sep-22	22-Sep-22
P-67810	Revisión de la interventoria R2 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73200	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-79010	Atencion de comentarios de interventoria 100%	10	23-Nov-22	06-Dec-22
P-82380	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.02	**K2+083-K2+323**	430	13-Apr-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.02.1	**Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope**	428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-5930	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	13-Apr-21	11-Feb-22
P-27390	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	14-Feb-22	22-Jun-22
P-27400	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22
P-30710	Atencion de comentarios de interventoria 60%	20	14-Mar-22	11-Apr-22
P-35970	Revisión de la interventoria R2 60%	20	12-Apr-22	10-May-22
P-46650	Final 100%	80	23-Jun-22	19-Oct-22
P-46660	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-52840	Atencion de comentarios de interventoria 90%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-57910	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-72620	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78500	Atencion de comentarios de interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-81720	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.02.2	**Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z**	430	13-Apr-21	04-Jan-23
P-5940	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	270	13-Apr-21	12-May-22
P-41020	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	60	13-May-22	10-Aug-22
P-41030	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45100	Atencion de comentarios de interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47310	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-58450	Final 100%	50	11-Aug-22	21-Oct-22
P-58460	Revisión de la interventoria R1 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64340	Atencion de comentarios de interventoria 90%	10	09-Sep-22	22-Sep-22
P-67920	Revisión de la interventoria R2 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73280	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-79120	Atencion de comentarios de interventoria 100%	10	23-Nov-22	06-Dec-22
P-82420	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.02.3	**MEP**	210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27410	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44200	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44210	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50250	Atencion de comentarios de interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-52850	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60670	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60680	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67270	Atencion de comentarios de interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-68900	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75480	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75490	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81730	Atencion de comentarios de interventoria100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.02.4	**MISC**	210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27420	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44220	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44230	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50260	Atencion de comentarios de interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-52860	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60690	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60700	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22

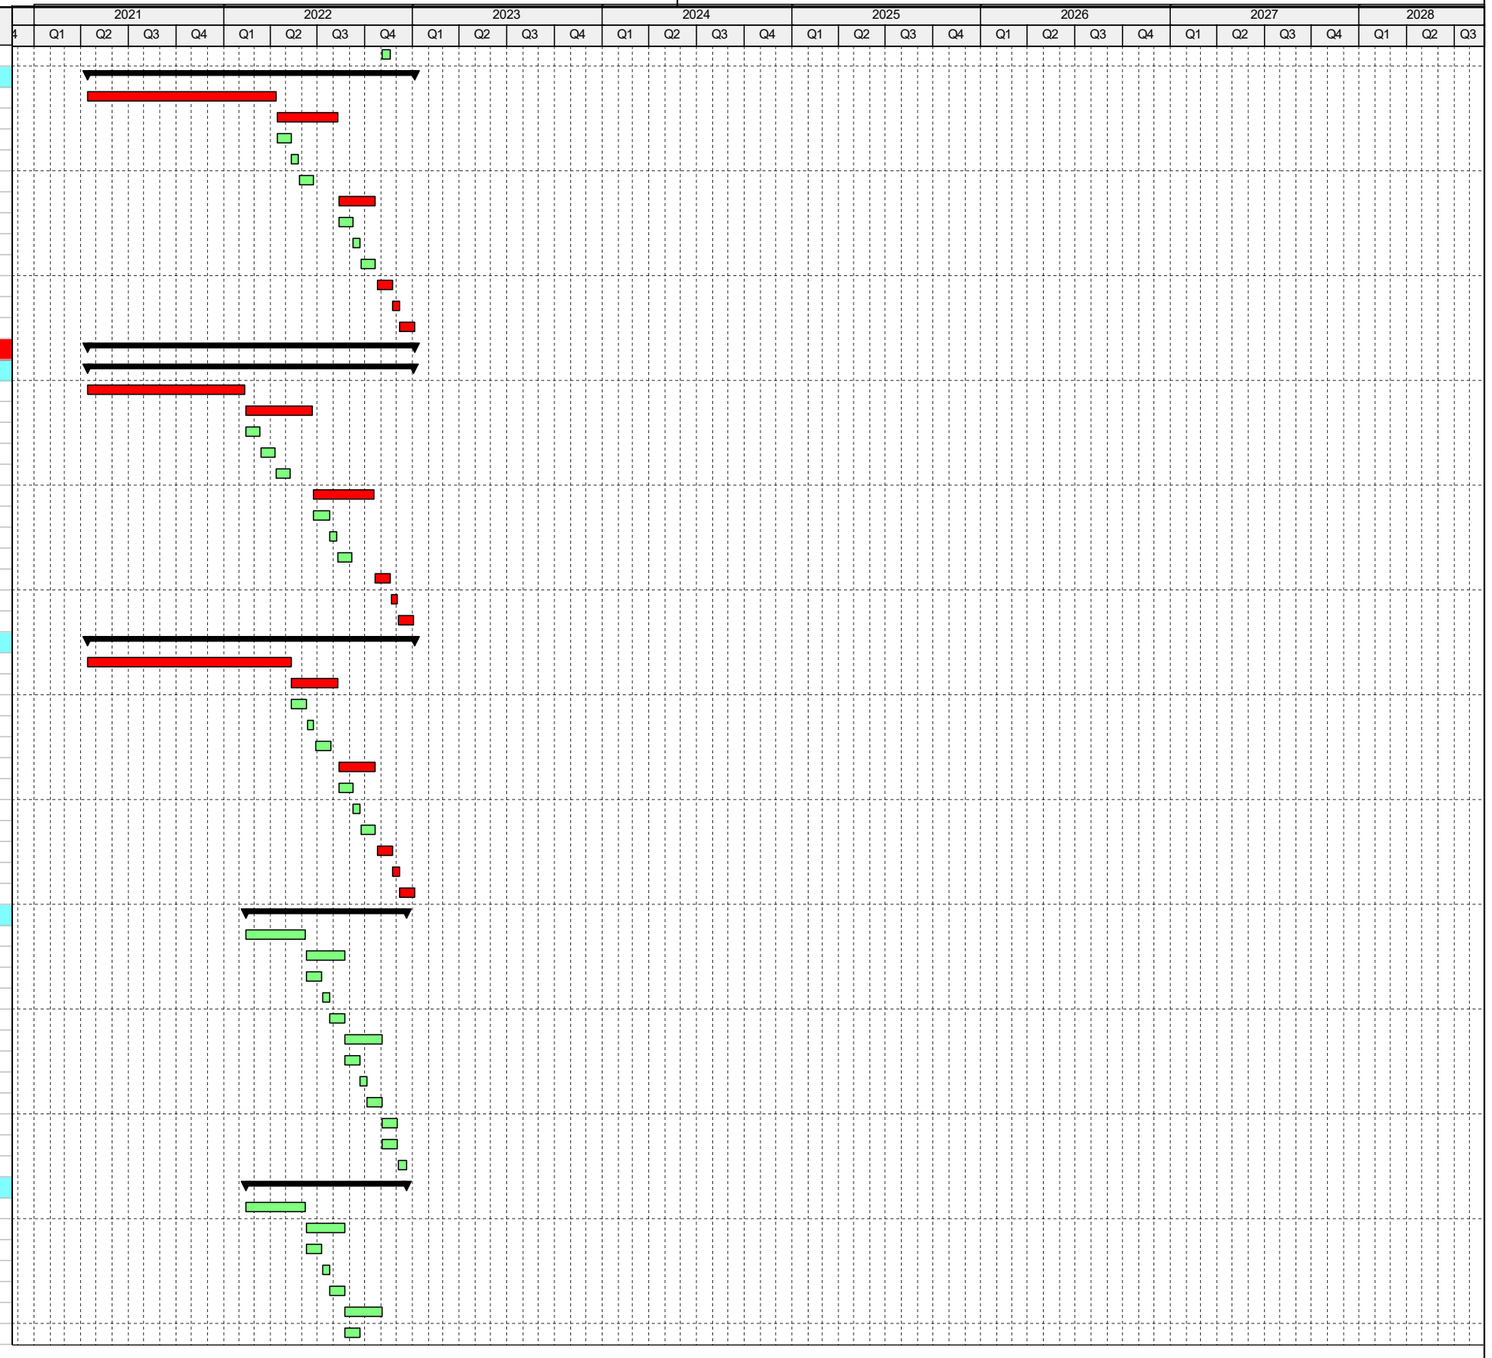

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-67280	Atencion de comentarios de interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-68910	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75500	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75510	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81740	Atencion de comentarios de interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.03 K2+323-K3+407		430	13-Apr-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.03.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-5950	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	13-Apr-21	11-Feb-22
P-27430	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	14-Feb-22	22-Jun-22
P-27440	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22
P-30720	Atencion de comentarios de interventoria 60%	20	14-Mar-22	11-Apr-22
P-35980	Revisión de la interventoria R2 60%	20	12-Apr-22	10-May-22
P-46670	Final 100%	80	23-Jun-22	19-Oct-22
P-46680	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-52870	Atencion de comentarios de interventoria 90%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60710	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-72630	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78510	Atencion de comentarios de interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-81750	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.03.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		430	13-Apr-21	04-Jan-23
P-5960	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	270	13-Apr-21	12-May-22
P-41040	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	60	13-May-22	10-Aug-22
P-41050	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45110	Atencion de comentarios de interventoria 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-50720	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-58470	Final 100%	50	11-Aug-22	21-Oct-22
P-58480	Revisión de la interventoria R1 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64350	Atencion de comentarios de interventoria 90%	10	09-Sep-22	22-Sep-22
P-67930	Revisión de la interventoria R2 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73290	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-79130	Atencion de comentarios de interventoria100%	10	23-Nov-22	06-Dec-22
P-82430	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.03.3 MEP		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27450	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44240	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44250	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50270	Atencion de comentarios de interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-52880	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60720	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60730	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67290	Atencion de comentarios de interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-68920	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75520	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75530	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81760	Atencion de comentarios de interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.03.4 MISC		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27460	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44260	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44270	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50280	Atencion de comentarios de interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-52890	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60740	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60750	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67300	Atencion de comentarios de interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-68930	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75540	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75550	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81770	Atencion de comentarios de interventoria100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.04 K3+407-K3+642		430	13-Apr-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.04.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-5970	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	13-Apr-21	11-Feb-22
P-27470	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	14-Feb-22	22-Jun-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-27480	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22
P-30730	Atencion de comentarios de interventoria 60%	10	14-Mar-22	28-Mar-22
P-32980	Revisión de la interventoria R2 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-46690	Final 100%	80	23-Jun-22	19-Oct-22
P-46700	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-52900	Atencion de comentarios de interventoria 90%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-57920	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-72640	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78520	Atencion de comentarios de interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-81780	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.04.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		430	13-Apr-21	04-Jan-23
P-5980	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	270	13-Apr-21	12-May-22
P-41060	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	60	13-May-22	10-Aug-22
P-41070	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45120	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47320	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-58490	Final 100%	50	11-Aug-22	21-Oct-22
P-58500	Revisión de la interventoria R1 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64360	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	09-Sep-22	22-Sep-22
P-67940	Revisión de la interventoria R2 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73300	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-79140	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	23-Nov-22	06-Dec-22
P-82440	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.04.3 MEP		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27490	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44280	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44290	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50290	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-52910	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60760	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60770	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67310	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-68940	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75560	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75570	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81790	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.04.4 MISC		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27500	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44300	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44310	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50300	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-52920	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60780	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60790	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67320	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-68950	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75580	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75590	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81800	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.05 K3+642-K4+468		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.05.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-5990	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	13-Apr-21	11-Feb-22
P-27510	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	14-Feb-22	22-Jun-22
P-27520	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22
P-30740	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	14-Mar-22	28-Mar-22
P-32990	Revisión de la interventoria R2 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-46710	Final 100%	80	23-Jun-22	19-Oct-22
P-46720	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-52930	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-57930	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-72650	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78530	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-81810	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.05.2	**Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z**	422	13-Apr-21	23-Dec-22
P-6000	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	270	13-Apr-21	12-May-22
P-41080	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	13-May-22	08-Sep-22
P-41090	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45130	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47330	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-57190	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-64370	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69460	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-71550	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-73310	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-77810	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80340	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.05.3	**MEP**	210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27530	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44320	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44330	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50310	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-52940	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60800	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60810	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67330	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-68960	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75600	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75610	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81820	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.05.4	**MISC**	210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27540	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44340	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44350	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50320	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-52950	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60820	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60830	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67340	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-68970	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75620	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75630	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81830	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.06	**K4+468-K4+644**	428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.06.1	**Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope**	428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-6010	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	13-Apr-21	11-Feb-22
P-27550	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	14-Feb-22	22-Jun-22
P-27560	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22
P-30750	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	14-Mar-22	28-Mar-22
P-33000	Revisión de la interventoria R2 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-46730	Final 100%	80	23-Jun-22	19-Oct-22
P-46740	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-52960	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-57940	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-72660	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78540	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-81840	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.06.2	**Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z**	422	13-Apr-21	23-Dec-22
P-6020	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	270	13-Apr-21	12-May-22
P-41100	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	13-May-22	08-Sep-22
P-41110	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45140	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47340	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-57200	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-64380	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22



Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-69470	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-71560	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-73320	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-77820	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80350	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.06.3 MEP		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27570	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44360	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44370	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50330	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-52970	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60840	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60850	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67350	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-68980	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75640	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75650	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81850	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.06.4 MISC		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27580	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44380	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44390	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50340	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-52980	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60860	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60870	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67360	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-68990	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75660	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75670	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81860	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.07 K4+644-K5+573		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.07.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-6030	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	13-Apr-21	11-Feb-22
P-27590	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	14-Feb-22	22-Jun-22
P-27600	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22
P-30760	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	14-Mar-22	28-Mar-22
P-33010	Revisión de la interventoria R2 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-46750	Final 100%	80	23-Jun-22	19-Oct-22
P-46760	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-52990	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-57950	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-72670	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78550	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-81870	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.07.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		422	13-Apr-21	23-Dec-22
P-6040	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	270	13-Apr-21	12-May-22
P-41120	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	13-May-22	08-Sep-22
P-41130	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45150	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47350	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-57210	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-64390	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69480	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-71570	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-73330	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-77830	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80360	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.07.3 MEP		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27610	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44400	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44410	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22



Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Summary
Milestone

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-50350	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53000	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60880	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60890	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67370	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69000	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75680	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75690	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81880	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.07.4 MISC		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27620	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44420	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44430	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50360	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53010	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60900	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60910	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67380	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69010	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75700	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75710	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81890	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.08 K5+573-K5+780		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.08.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-6050	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	13-Apr-21	11-Feb-22
P-27630	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	14-Feb-22	22-Jun-22
P-27640	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22
P-30770	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	14-Mar-22	28-Mar-22
P-33020	Revisión de la interventoria R2 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-46770	Final 100%	80	23-Jun-22	19-Oct-22
P-46780	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-53020	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-57960	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-72680	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78560	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-81900	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.08.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		422	13-Apr-21	23-Dec-22
P-6060	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	270	13-Apr-21	12-May-22
P-41140	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	13-May-22	08-Sep-22
P-41150	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45160	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47360	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-57220	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-64400	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69490	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-71580	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-73340	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-77840	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80370	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.08.3 MEP		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27650	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44440	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44450	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50370	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53030	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60920	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60930	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67390	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69020	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75720	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75730	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81910	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22




© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.1.03.03.08.4 MISC		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27660	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44460	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44470	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50380	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53040	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60940	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60950	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67400	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69030	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75740	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75750	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81920	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.09 K5+780-K6+553		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.09.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-6070	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	13-Apr-21	11-Feb-22
P-27670	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	14-Feb-22	22-Jun-22
P-27680	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22
P-30780	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	14-Mar-22	28-Mar-22
P-33030	Revisión de la interventoria R2 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-46790	Final 100%	80	23-Jun-22	19-Oct-22
P-46800	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-53050	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-57970	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-72690	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78570	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-81930	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.09.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		422	13-Apr-21	23-Dec-22
P-6080	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	270	13-Apr-21	12-May-22
P-41160	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	13-May-22	08-Sep-22
P-41170	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45170	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47370	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-57230	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-64410	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69500	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-71590	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-73350	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-77850	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80380	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.09.3 MEP		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27690	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44480	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44490	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50390	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53060	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60960	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60970	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67410	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69040	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75760	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75770	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81940	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.09.4 MISC		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27700	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44500	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44510	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50400	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53070	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60980	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-60990	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67420	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22




© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-69050	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75780	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75790	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81950	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.10 K6+553-K6+776		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.10.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-6090	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	13-Apr-21	11-Feb-22
P-27710	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	14-Feb-22	22-Jun-22
P-27720	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22
P-30790	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	14-Mar-22	28-Mar-22
P-33040	Revisión de la interventoria R2 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-46810	Final 100%	80	23-Jun-22	19-Oct-22
P-46820	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-53080	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-57980	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-72700	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78580	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-81960	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.10.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		422	13-Apr-21	23-Dec-22
P-6100	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	270	13-Apr-21	12-May-22
P-41180	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	13-May-22	08-Sep-22
P-41190	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45180	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47380	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-57240	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-64420	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69510	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-71600	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-73360	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-77860	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80390	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.10.3 MEP		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27730	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44520	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44530	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50410	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53090	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-61000	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-61010	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67430	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69060	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75800	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75810	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81970	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.10.4 MISC		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27740	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44540	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44550	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50420	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53100	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-61020	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-61030	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67440	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69070	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75820	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75830	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-81980	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.11 K6+776-K7+830		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.11.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-6110	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	13-Apr-21	11-Feb-22
P-27750	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	14-Feb-22	22-Jun-22
P-27760	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22

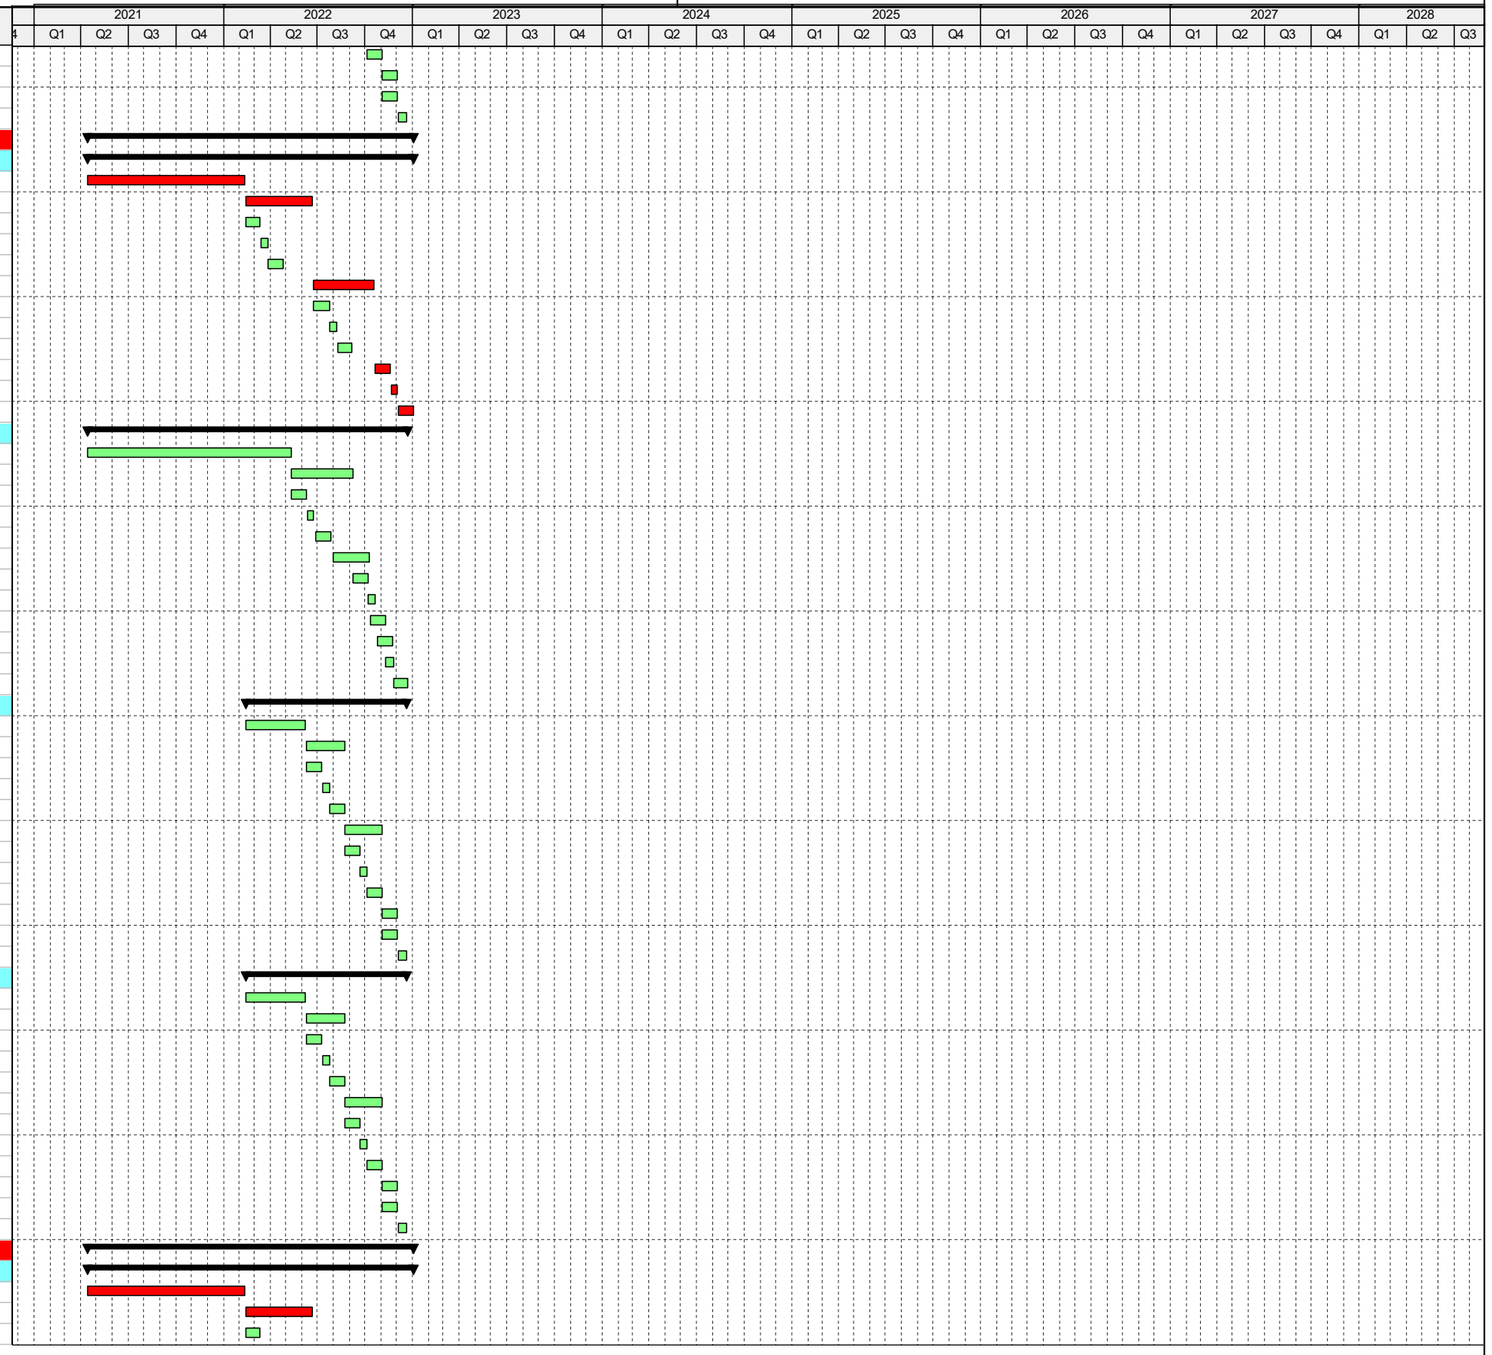

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-30800	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	14-Mar-22	28-Mar-22
P-33050	Revisión de la interventoria R2 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-46830	Final 100%	80	23-Jun-22	19-Oct-22
P-46840	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-53110	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-57990	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-72710	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78590	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-81990	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.11.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		422	13-Apr-21	23-Dec-22
P-6120	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	270	13-Apr-21	12-May-22
P-41200	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	13-May-22	08-Sep-22
P-41210	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45190	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47390	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-57250	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-64430	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69520	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-71610	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-73370	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-77870	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80400	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.11.3 MEP		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27770	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44560	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44570	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50430	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53120	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-61040	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-61050	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67450	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69080	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75840	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75850	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-82000	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.11.4 MISC		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27780	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44580	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44590	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50440	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53130	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-61060	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-61070	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67460	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69090	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75860	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75870	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-82010	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.12 K7+830-K8+049		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.12.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-6130	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	13-Apr-21	11-Feb-22
P-27790	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	14-Feb-22	22-Jun-22
P-27800	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22
P-30810	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	14-Mar-22	28-Mar-22
P-33060	Revisión de la interventoria R2 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-46850	Final 100%	80	23-Jun-22	19-Oct-22
P-46860	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-53140	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-58000	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-72720	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78600	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-82020	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23

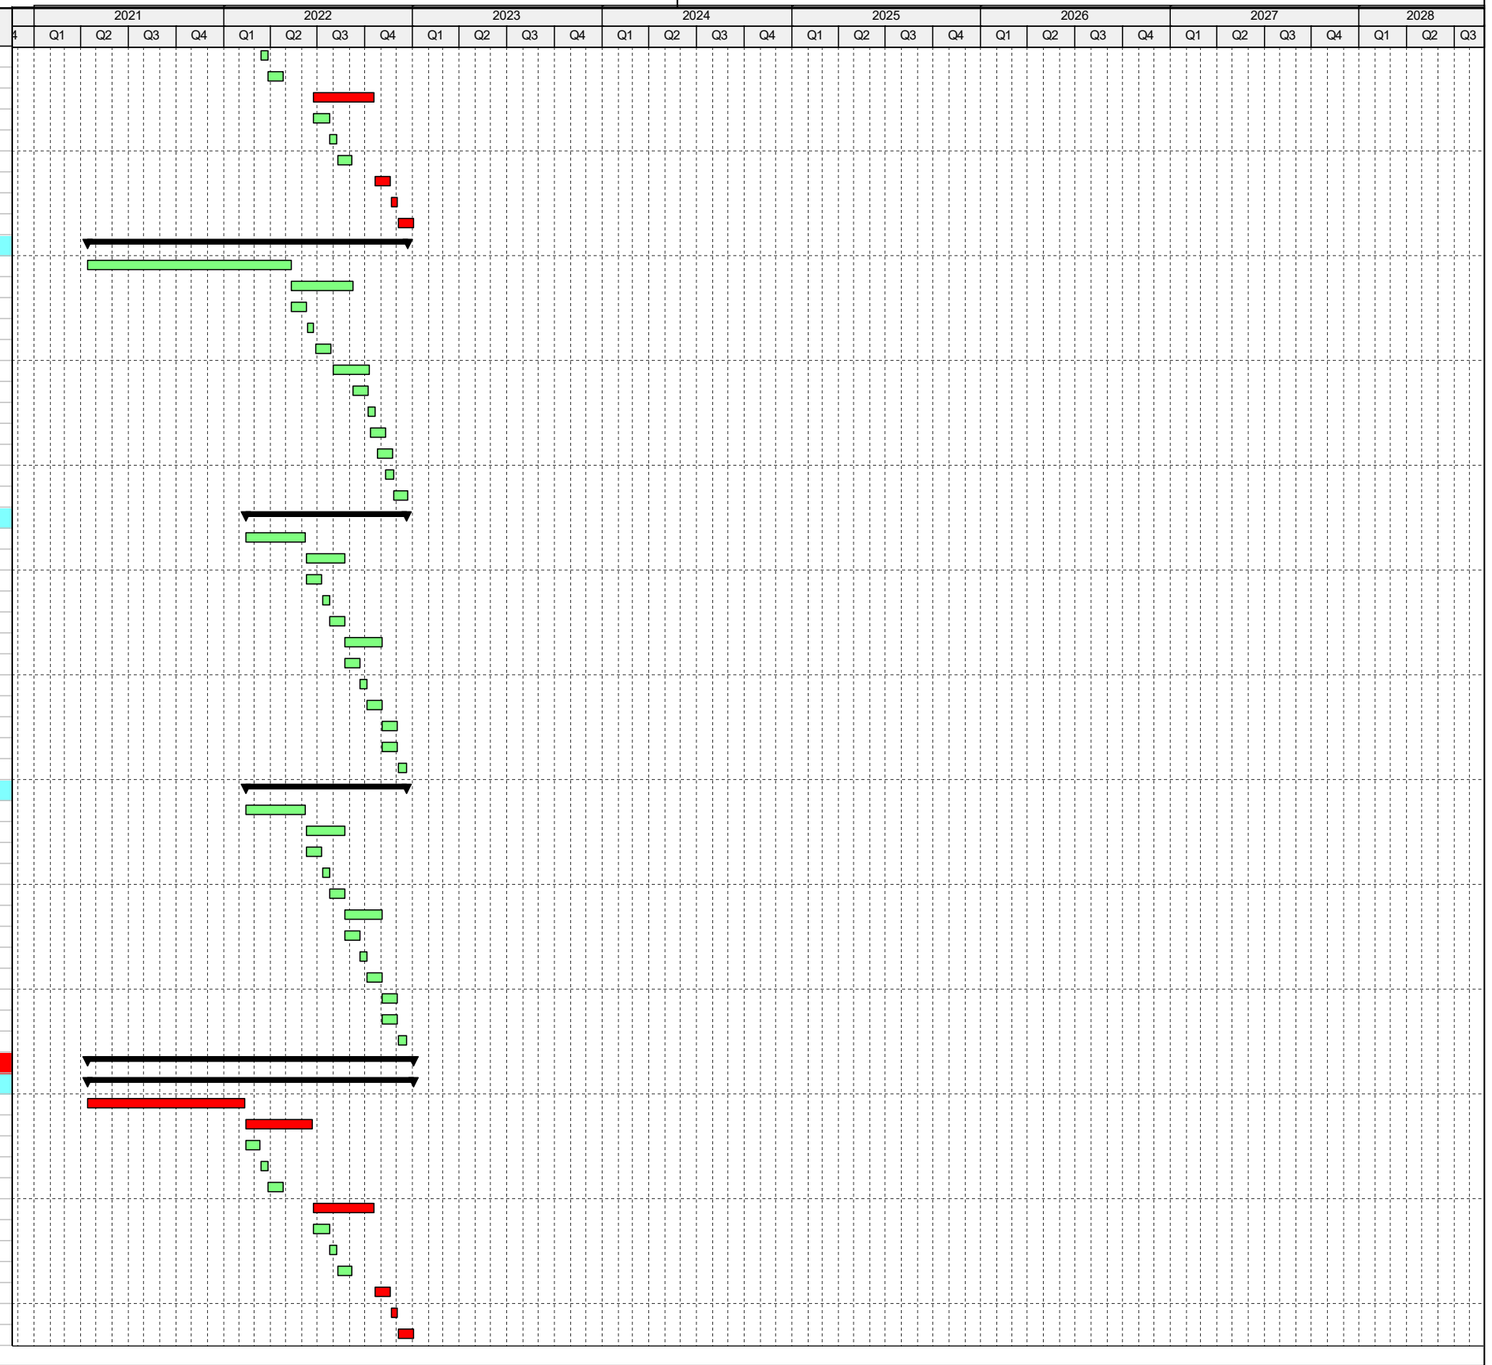

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.1.03.03.12.2	**Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z**	422	13-Apr-21	23-Dec-22
P-6140	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	270	13-Apr-21	12-May-22
P-41220	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	13-May-22	08-Sep-22
P-41230	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45200	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47400	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-57260	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-64440	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69530	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-71620	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-73380	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-77880	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80410	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.12.3	**MEP**	210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27810	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44600	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44610	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50450	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53150	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-61080	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-61090	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67470	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69100	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75880	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75890	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-82030	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.12.4	**MISC**	210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27820	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44620	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44630	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50460	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53160	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-61100	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-61110	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67480	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69110	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75900	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75910	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-82040	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.13	**K8+049-K9+607**	428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.13.1	**Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope**	428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-6150	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	13-Apr-21	11-Feb-22
P-27830	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	14-Feb-22	22-Jun-22
P-27840	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22
P-30820	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	14-Mar-22	28-Mar-22
P-33070	Revisión de la interventoria R2 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-46870	Final 100%	80	23-Jun-22	19-Oct-22
P-46880	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-53170	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-58010	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-72730	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78610	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-82050	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.13.2	**Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z**	422	13-Apr-21	23-Dec-22
P-6160	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	270	13-Apr-21	12-May-22
P-41240	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	13-May-22	08-Sep-22
P-41250	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45210	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47410	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-57270	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-64450	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69540	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Oct-22	21-Oct-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-71630	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-73390	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-77890	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80420	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.13.3 MEP		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27850	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44640	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44650	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50470	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53180	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-61120	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-61130	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67490	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69120	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75920	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75930	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-82060	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.13.4 MISC		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27860	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44660	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44670	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50480	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53190	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-61140	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-61150	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67500	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69130	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75940	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75950	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-82070	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.14 K9+607-K9+808		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.14.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-6170	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	13-Apr-21	11-Feb-22
P-27870	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	14-Feb-22	22-Jun-22
P-27880	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22
P-30830	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	14-Mar-22	28-Mar-22
P-33080	Revisión de la interventoria R2 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-46890	Final 100%	80	23-Jun-22	19-Oct-22
P-46900	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-53200	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-58020	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-72740	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78620	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-82080	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.14.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		422	13-Apr-21	23-Dec-22
P-6180	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	270	13-Apr-21	12-May-22
P-41260	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	13-May-22	08-Sep-22
P-41270	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45220	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47420	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-57280	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-64460	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69550	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-71640	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-73400	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-77900	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80430	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.14.3 MEP		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27890	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44680	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44690	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50490	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-53210	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-61160	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-61170	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67510	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69140	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75960	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75970	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-82090	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.14.4 MISC		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27900	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44700	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44710	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50500	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53220	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-61180	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-61190	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67520	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69150	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-75980	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-75990	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-82100	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.15 K9+808-K10+637		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.15.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-6190	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	13-Apr-21	11-Feb-22
P-27910	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	14-Feb-22	22-Jun-22
P-27920	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22
P-30840	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	14-Mar-22	28-Mar-22
P-33090	Revisión de la interventoria R2 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-46910	Final 100%	80	23-Jun-22	19-Oct-22
P-46920	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-53230	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-58030	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-72750	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78630	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-82110	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.15.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		422	13-Apr-21	23-Dec-22
P-6200	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	270	13-Apr-21	12-May-22
P-41280	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	13-May-22	08-Sep-22
P-41290	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45230	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47430	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-57290	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-64470	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69560	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-71650	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-73410	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-77910	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80440	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.15.3 MEP		210	14-Feb-22	19-Dec-22
P-27930	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44720	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44730	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50510	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53240	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-61200	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-61210	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67530	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69160	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-76000	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-76010	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-82120	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.15.4 MISC		210	14-Feb-22	19-Dec-22




© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-27940	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	14-Feb-22	08-Jun-22
P-44740	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	09-Jun-22	23-Aug-22
P-44750	Revisión de la interventoria R1 60%	20	09-Jun-22	08-Jul-22
P-50520	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Jul-22	25-Jul-22
P-53250	Revisión de la interventoria R2 60%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-61220	Final 100%	50	24-Aug-22	02-Nov-22
P-61230	Revisión de la interventoria R1 90%	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67540	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69170	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Oct-22	02-Nov-22
P-76020	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-76030	Revisión de la interventoria R2 100%	20	03-Nov-22	02-Dec-22
P-82130	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	05-Dec-22	19-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.16 K10+637-K10+829		412	11-May-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.16.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		392	11-May-21	09-Dec-22
P-7210	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	202	11-May-21	03-Mar-22
P-29790	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	04-Mar-22	14-Jul-22
P-29800	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Mar-22	01-Apr-22
P-35330	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	04-Apr-22	18-Apr-22
P-37190	Revisión de la interventoria R2 60%	20	19-Apr-22	16-May-22
P-51390	Final 100%	50	15-Jul-22	26-Sep-22
P-51400	Revisión de la interventoria R1 90%	20	15-Jul-22	12-Aug-22
P-59510	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	16-Aug-22	29-Aug-22
P-63010	Revisión de la interventoria R2 90%	20	30-Aug-22	26-Sep-22
P-68340	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-Sep-22	25-Oct-22
P-74550	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Oct-22	09-Nov-22
P-77920	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Nov-22	09-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.16.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		412	11-May-21	06-Jan-23
P-7220	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	260	11-May-21	26-May-22
P-42780	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-42790	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47440	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50730	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-59520	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-67950	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73420	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-74560	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76370	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-80450	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82640	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.16.3 MEP		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-29810	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49420	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49430	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57300	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59530	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66510	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66520	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71660	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74570	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80460	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80470	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83080	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.16.4 MISC		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-29820	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49440	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49450	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57310	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59540	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66530	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66540	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71670	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74580	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-80480	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80490	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83090	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.17 K10+829-K12+033		412	11-May-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.17.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		392	11-May-21	09-Dec-22
P-7230	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	202	11-May-21	03-Mar-22
P-29830	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	04-Mar-22	14-Jul-22
P-29840	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Mar-22	01-Apr-22
P-35340	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	04-Apr-22	18-Apr-22
P-37200	Revisión de la interventoria R2 60%	20	19-Apr-22	16-May-22
P-51410	Final 100%	50	15-Jul-22	26-Sep-22
P-51420	Revisión de la interventoria R1 90%	20	15-Jul-22	12-Aug-22
P-59550	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	16-Aug-22	29-Aug-22
P-63020	Revisión de la interventoria R2 90%	20	30-Aug-22	26-Sep-22
P-68350	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-Sep-22	25-Oct-22
P-74590	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Oct-22	09-Nov-22
P-77930	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Nov-22	09-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.17.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		412	11-May-21	06-Jan-23
P-7240	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	260	11-May-21	26-May-22
P-42800	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-42810	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47450	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50740	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-59560	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-67960	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73430	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-74600	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76380	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-80500	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82650	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.17.3 MEP		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-29850	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49460	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49470	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57320	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59570	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66550	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66560	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71680	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74610	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80510	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80520	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83100	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.17.4 MISC		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-29860	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49480	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49490	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57330	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59580	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66570	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66580	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71690	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74620	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80530	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80540	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83110	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.18 K12+033-K12+214		412	11-May-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.18.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		392	11-May-21	09-Dec-22
P-7250	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	202	11-May-21	03-Mar-22
P-29870	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	04-Mar-22	14-Jul-22
P-29880	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Mar-22	01-Apr-22
P-35350	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	04-Apr-22	18-Apr-22

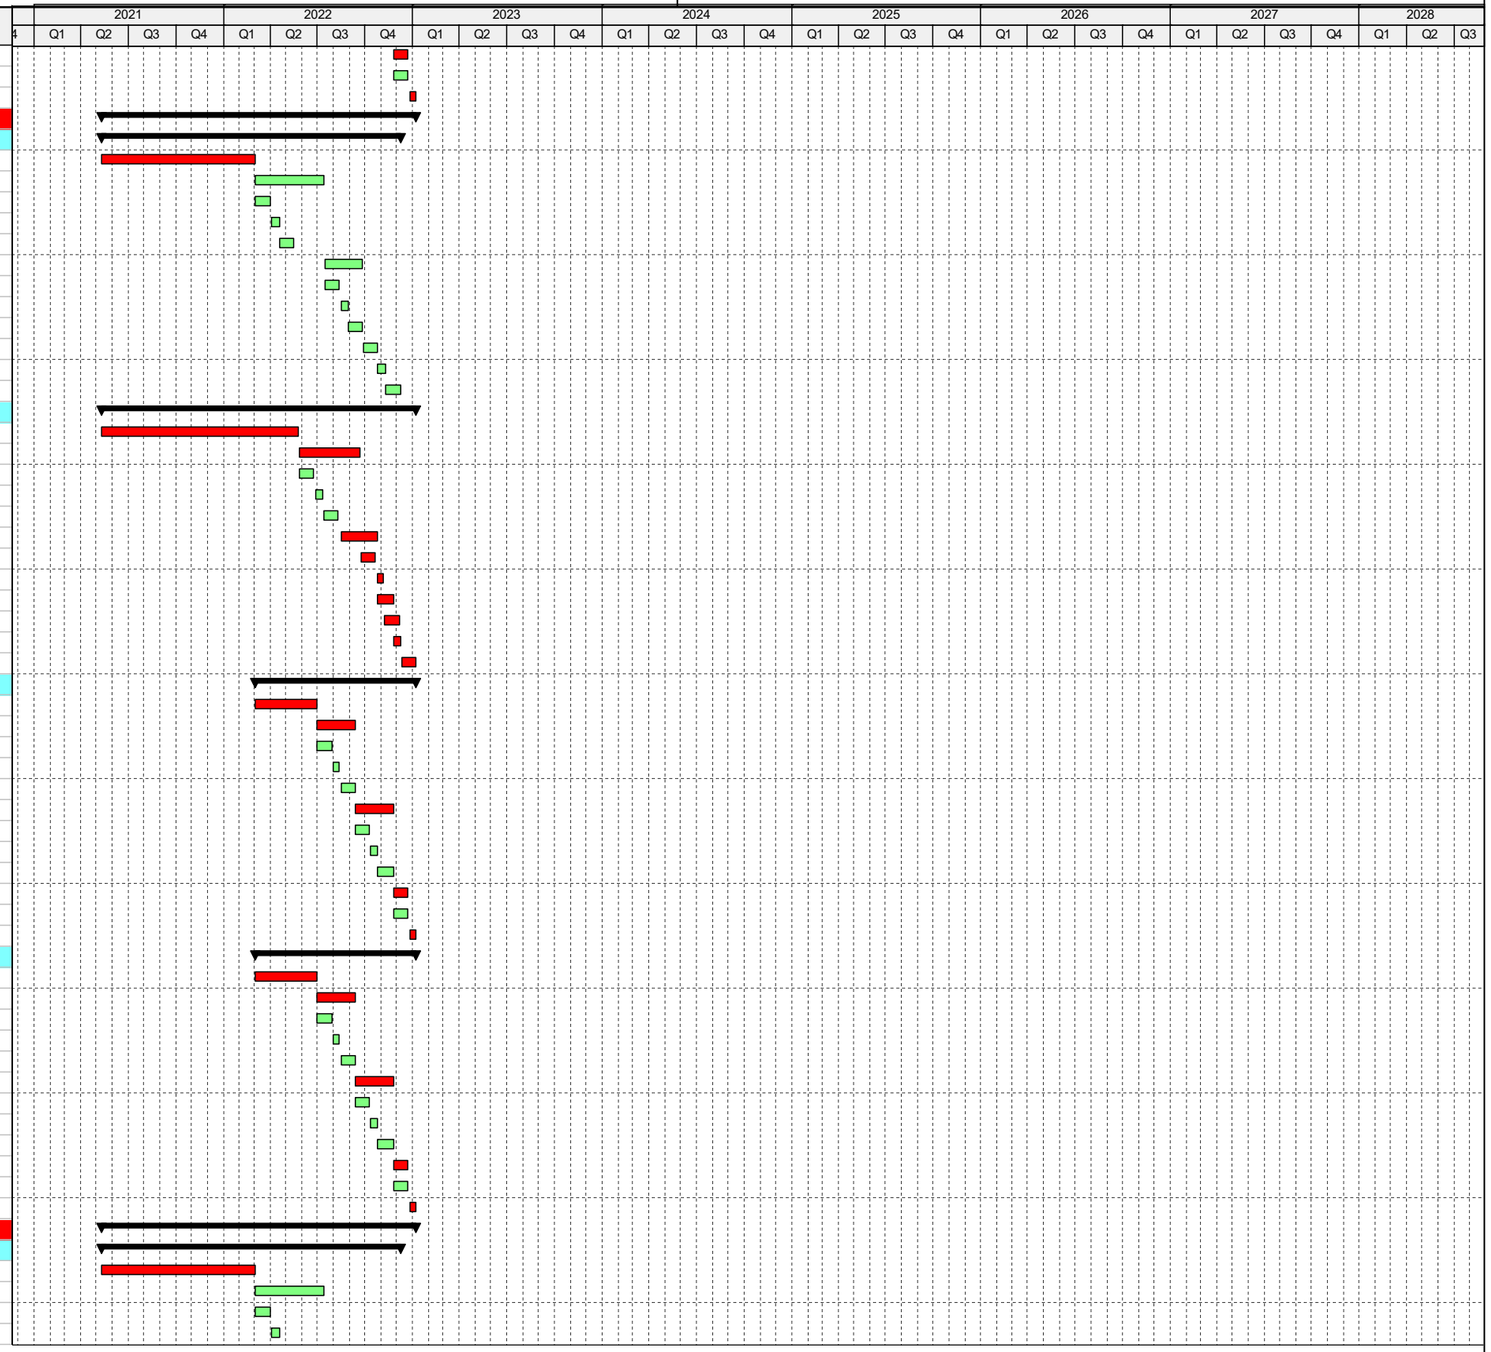


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-37210	Revisión de la interventoria R2 60%	20	19-Apr-22	16-May-22
P-51430	Final 100%	50	15-Jul-22	26-Sep-22
P-51440	Revisión de la interventoria R1 90%	20	15-Jul-22	12-Aug-22
P-59590	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	16-Aug-22	29-Aug-22
P-63030	Revisión de la interventoria R2 90%	20	30-Aug-22	26-Sep-22
P-68360	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-Sep-22	25-Oct-22
P-74630	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Oct-22	09-Nov-22
P-77940	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Nov-22	09-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.18.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		412	11-May-21	06-Jan-23
P-7260	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	260	11-May-21	26-May-22
P-42820	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-42830	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47460	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50750	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-59600	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-67970	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73440	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-74640	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76390	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-80550	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82660	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.18.3 MEP		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-29890	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49500	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49510	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57340	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59610	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66590	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66600	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71700	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74650	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80560	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80570	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83120	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.18.4 MISC		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-29900	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49520	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49530	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57350	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59620	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66610	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66620	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71710	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74660	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80580	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80590	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83130	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.19 K12+214-K13+723		432	13-Apr-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.19.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		392	11-May-21	09-Dec-22
P-7270	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	202	11-May-21	03-Mar-22
P-29910	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	04-Mar-22	14-Jul-22
P-29920	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Mar-22	01-Apr-22
P-35360	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	04-Apr-22	18-Apr-22
P-37220	Revisión de la interventoria R2 60%	20	19-Apr-22	16-May-22
P-51450	Final 100%	50	15-Jul-22	26-Sep-22
P-51460	Revisión de la interventoria R1 90%	20	15-Jul-22	12-Aug-22
P-59630	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	16-Aug-22	29-Aug-22
P-63040	Revisión de la interventoria R2 90%	20	30-Aug-22	26-Sep-22
P-68370	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-Sep-22	25-Oct-22
P-74670	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Oct-22	09-Nov-22
P-77950	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Nov-22	09-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.19.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		412	11-May-21	06-Jan-23

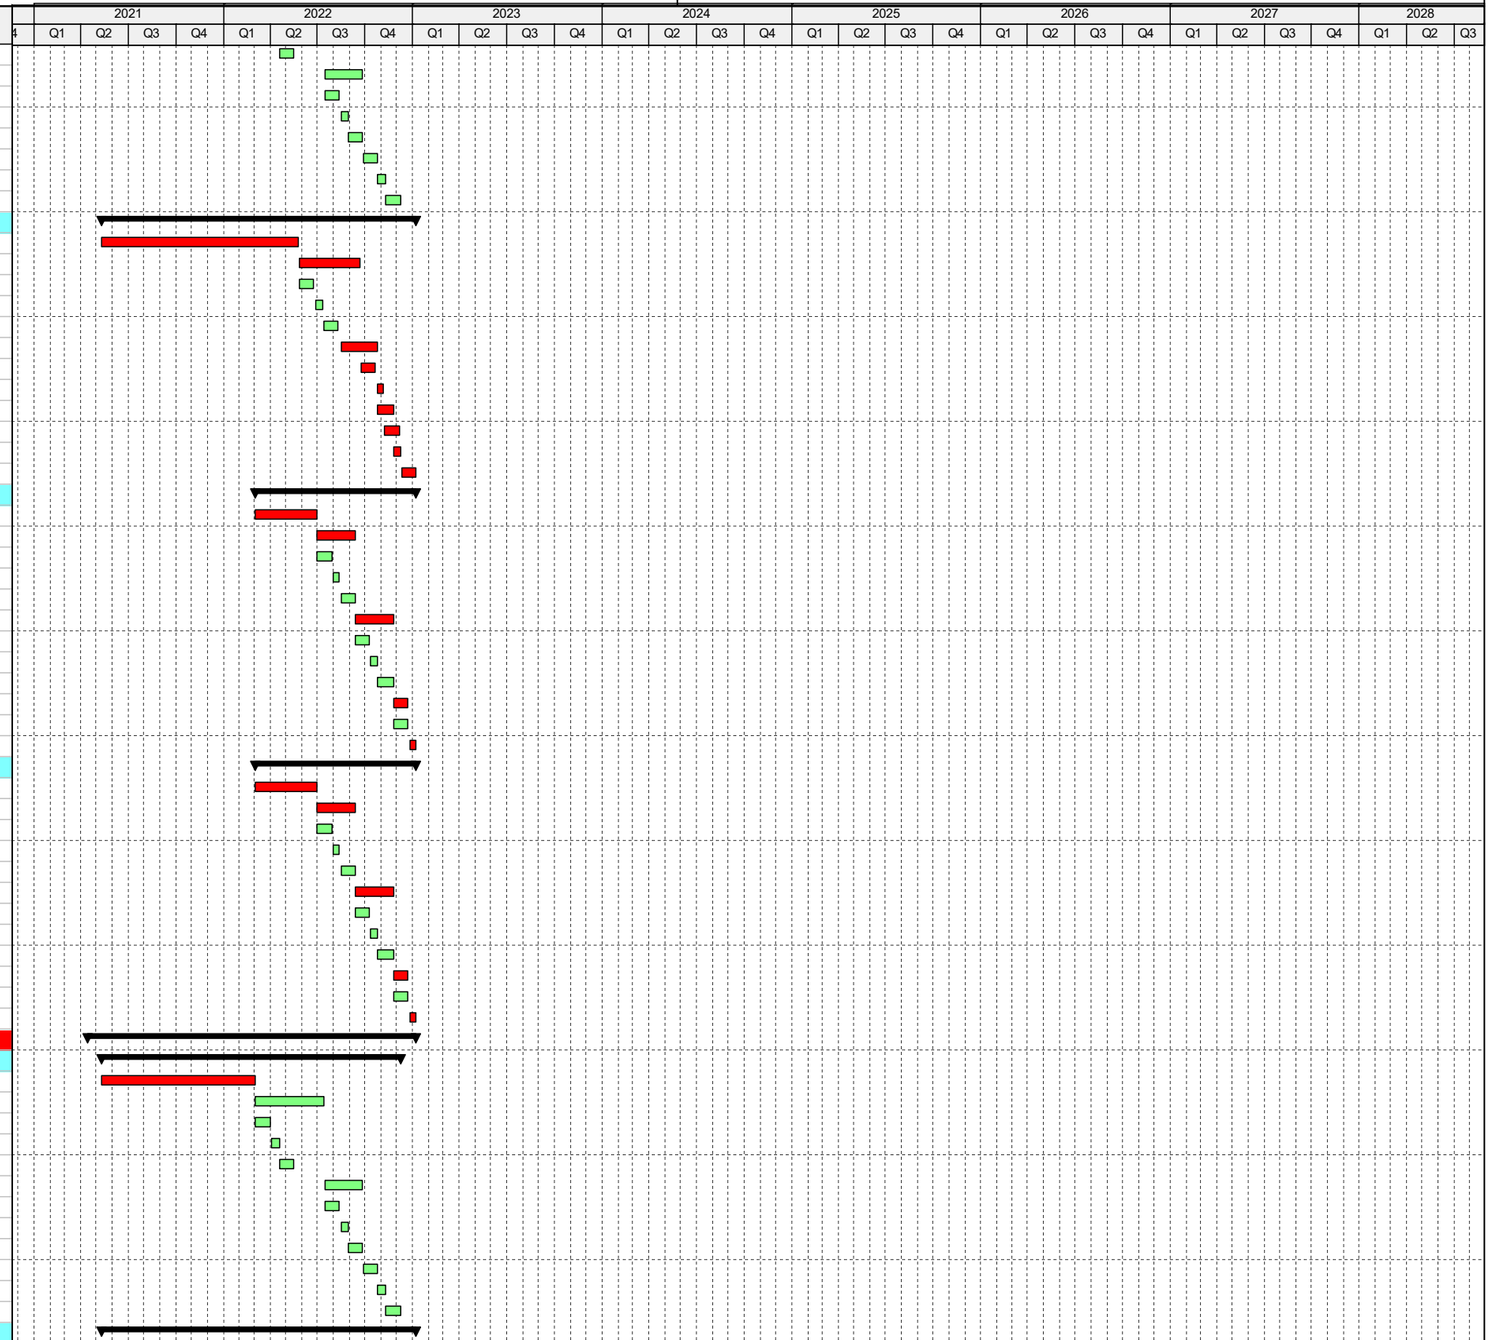


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-7280	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	260	11-May-21	26-May-22
P-42840	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-42850	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47470	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50760	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-59640	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-67980	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73450	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-74680	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76400	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-80600	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82670	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.19.3 MEP		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-29930	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49540	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49550	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57360	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59650	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66630	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66640	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71720	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74690	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80610	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80620	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83140	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.19.4 MISC		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-29940	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49560	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49570	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57370	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59660	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66650	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66660	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71730	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74700	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80630	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80640	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83150	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.19.5 Viaducto: STR: Viga Continua 36 + 53 +36 (Incluye zócalos de carril)		414	13-Apr-21	13-Dec-22
P-5770	60% Elaboracion y entrega del diseño	240	13-Apr-21	30-Mar-22
P-33600	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	80	31-Mar-22	27-Jul-22
P-33610	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-37760	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-40870	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-50020	Final 100%	60	05-Jul-22	28-Sep-22
P-53510	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61360	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64160	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-68480	Revisión de la interventoria R1 100%	20	29-Sep-22	27-Oct-22
P-75140	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	28-Oct-22	11-Nov-22
P-78070	Revisión de la interventoria R2 100%	20	15-Nov-22	13-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.19.6 Viaducto: Puente de acero 70+70m		414	13-Apr-21	13-Dec-22
P-6210	60% Elaboracion y entrega del diseño	240	13-Apr-21	30-Mar-22
P-33830	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	80	31-Mar-22	27-Jul-22
P-33840	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-37970	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41300	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-50040	Final 100%	60	05-Jul-22	28-Sep-22
P-53830	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61610	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64480	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-68510	Revisión de la interventoria R1 100%	20	29-Sep-22	27-Oct-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-75170	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	28-Oct-22	11-Nov-22
P-78110	Revisión de la interventoria R2 100%	20	15-Nov-22	13-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.20 K13+723-K13+930		412	11-May-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.20.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		392	11-May-21	09-Dec-22
P-7290	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	202	11-May-21	03-Mar-22
P-29950	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	04-Mar-22	14-Jul-22
P-29960	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Mar-22	01-Apr-22
P-35370	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	04-Apr-22	18-Apr-22
P-37230	Revisión de la interventoria R2 60%	20	19-Apr-22	16-May-22
P-51470	Final 100%	50	15-Jul-22	26-Sep-22
P-51480	Revisión de la interventoria R1 90%	20	15-Jul-22	12-Aug-22
P-59670	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	16-Aug-22	29-Aug-22
P-63050	Revisión de la interventoria R2 90%	20	30-Aug-22	26-Sep-22
P-68380	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-Sep-22	25-Oct-22
P-74710	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Oct-22	09-Nov-22
P-77960	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Nov-22	09-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.20.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		412	11-May-21	06-Jan-23
P-7300	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	260	11-May-21	26-May-22
P-42860	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-42870	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47480	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50770	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-59680	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-67990	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73460	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-74720	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76410	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-80650	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82680	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.20.3 MEP		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-29970	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49580	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49590	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57380	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59690	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66670	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66680	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71740	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74730	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80660	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80670	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83160	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.20.4 MISC		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-29980	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49600	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49610	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57390	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59700	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66690	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66700	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71750	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74740	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80680	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80690	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83170	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.21 K13+930-K14+985		412	11-May-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.21.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		392	11-May-21	09-Dec-22
P-7310	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	202	11-May-21	03-Mar-22
P-29990	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	04-Mar-22	14-Jul-22
P-30000	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Mar-22	01-Apr-22
P-35380	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	04-Apr-22	18-Apr-22
P-37240	Revisión de la interventoria R2 60%	20	19-Apr-22	16-May-22

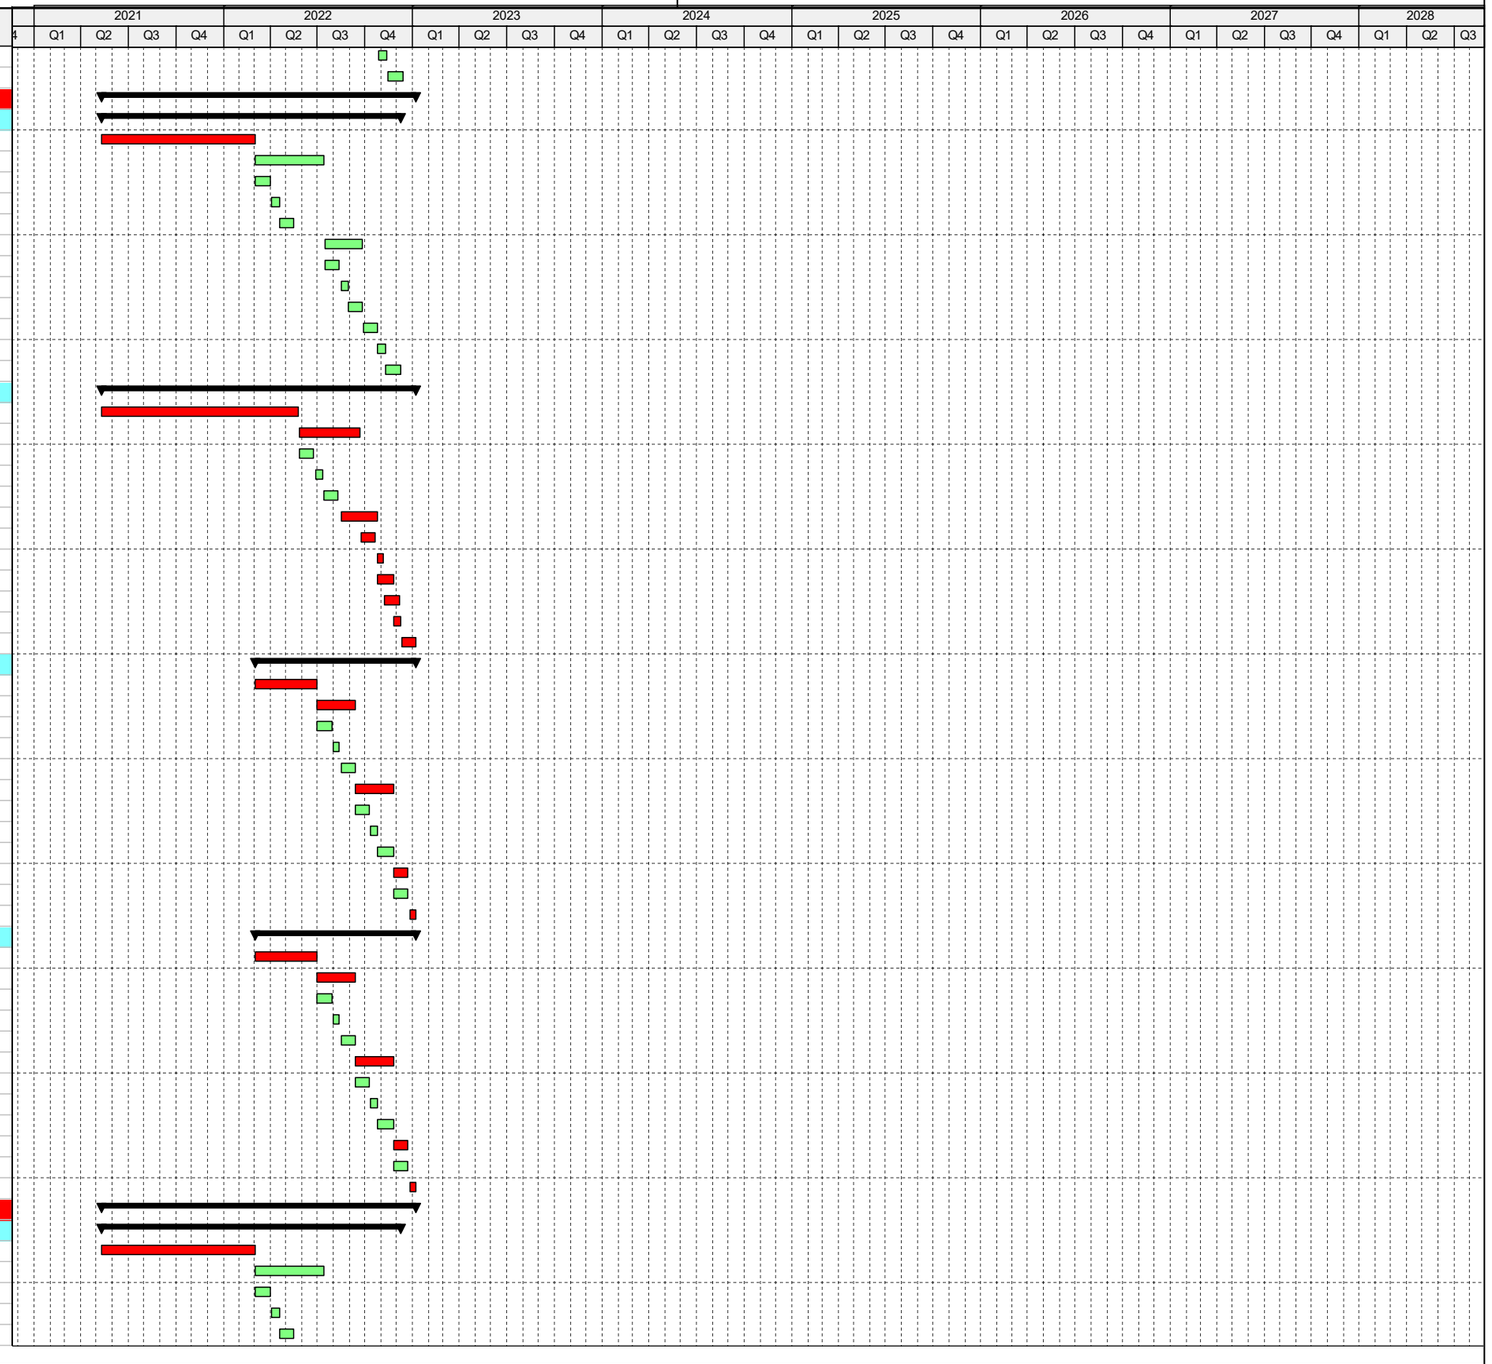


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-51490	Final 100%	50	15-Jul-22	26-Sep-22
P-51500	Revisión de la interventoria R1 90%	20	15-Jul-22	12-Aug-22
P-59710	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	16-Aug-22	29-Aug-22
P-63060	Revisión de la interventoria R2 90%	20	30-Aug-22	26-Sep-22
P-68390	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-Sep-22	25-Oct-22
P-74750	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Oct-22	09-Nov-22
P-77970	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Nov-22	09-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.21.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		412	11-May-21	06-Jan-23
P-7320	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	260	11-May-21	26-May-22
P-42880	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-42890	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47490	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50780	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-59720	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-68000	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73470	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-74760	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76420	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-80700	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82690	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.21.3 MEP		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-30010	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49620	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49630	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57400	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59730	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66710	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66720	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71760	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74770	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80710	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80720	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83180	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.21.4 MISC		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-30020	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49640	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49650	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57410	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59740	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66730	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66740	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71770	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74780	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80730	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80740	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83190	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.22 K14+985-K15+202		412	11-May-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.22.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		392	11-May-21	09-Dec-22
P-7330	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	202	11-May-21	03-Mar-22
P-30030	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	04-Mar-22	14-Jul-22
P-30040	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Mar-22	01-Apr-22
P-35390	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	04-Apr-22	18-Apr-22
P-37250	Revisión de la interventoria R2 60%	20	19-Apr-22	16-May-22
P-51510	Final 100%	50	15-Jul-22	26-Sep-22
P-51520	Revisión de la interventoria R1 90%	20	15-Jul-22	12-Aug-22
P-59750	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	16-Aug-22	29-Aug-22
P-63070	Revisión de la interventoria R2 90%	20	30-Aug-22	26-Sep-22
P-68400	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-Sep-22	25-Oct-22
P-74790	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Oct-22	09-Nov-22
P-77980	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Nov-22	09-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.22.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		412	11-May-21	06-Jan-23
P-7340	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	260	11-May-21	26-May-22

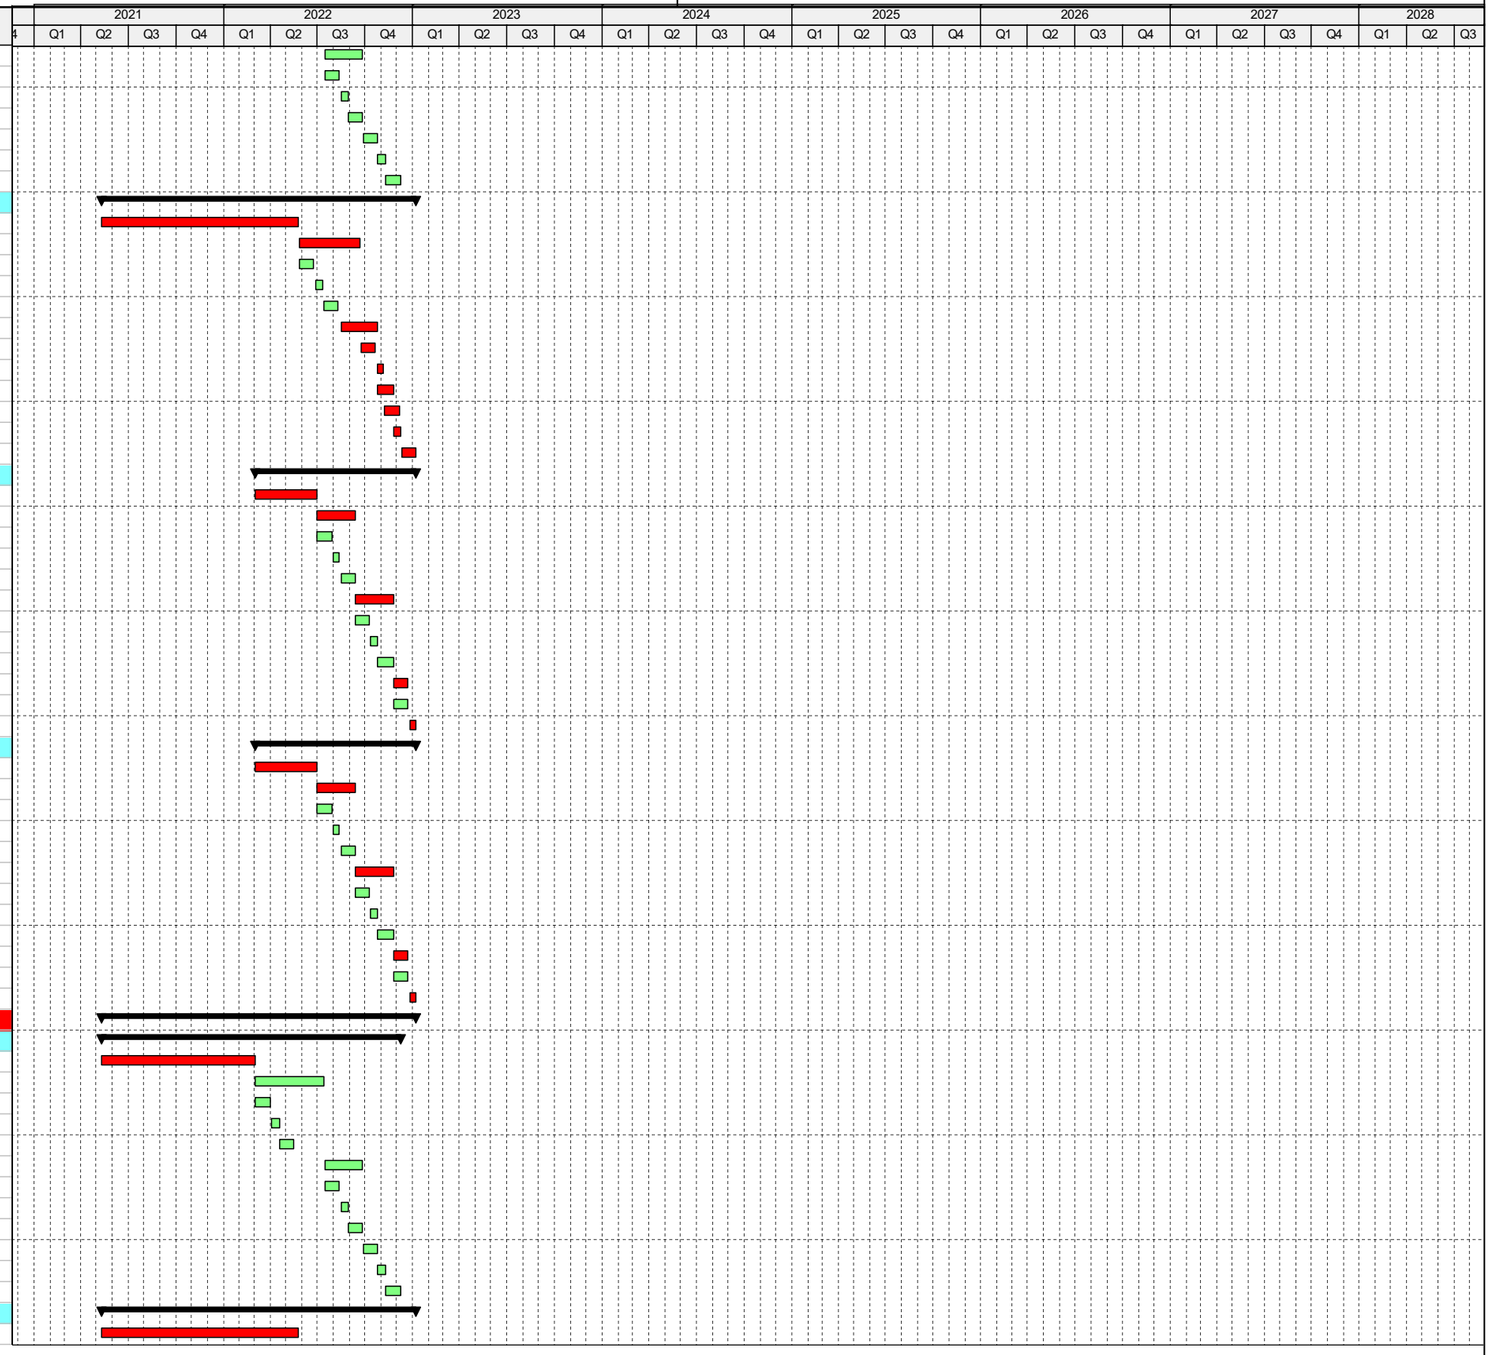

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-42900	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-42910	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47500	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50790	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-59760	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-68010	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73480	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-74800	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76430	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-80750	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82700	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.22.3 MEP		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-30050	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49660	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49670	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57420	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59770	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66750	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66760	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71780	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74810	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80760	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80770	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83200	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.22.4 MISC		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-30060	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49680	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49690	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57430	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59780	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66770	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66780	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71790	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74820	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80780	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80790	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83210	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.23 K15+202-K16+149		412	11-May-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.23.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		392	11-May-21	09-Dec-22
P-7350	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	202	11-May-21	03-Mar-22
P-30070	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	04-Mar-22	14-Jul-22
P-30080	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Mar-22	01-Apr-22
P-35400	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	04-Apr-22	18-Apr-22
P-37260	Revisión de la interventoria R2 60%	20	19-Apr-22	16-May-22
P-51530	Final 100%	50	15-Jul-22	26-Sep-22
P-51540	Revisión de la interventoria R1 90%	20	15-Jul-22	12-Aug-22
P-59790	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	16-Aug-22	29-Aug-22
P-63080	Revisión de la interventoria R2 90%	20	30-Aug-22	26-Sep-22
P-68410	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-Sep-22	25-Oct-22
P-74830	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Oct-22	09-Nov-22
P-77990	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Nov-22	09-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.23.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		412	11-May-21	06-Jan-23
P-7360	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	260	11-May-21	26-May-22
P-42920	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-42930	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47510	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50800	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-59800	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-68020	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73490	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-74840	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76440	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22




Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-80800	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82710	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.23.3 MEP		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-30090	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49700	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49710	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57440	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59810	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66790	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66800	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71800	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74850	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80810	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80820	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83220	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.23.4 MISC		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-30100	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49720	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49730	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57450	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59820	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66810	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66820	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71810	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74860	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80830	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80840	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83230	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.24 K16+149-K16+374		412	11-May-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.24.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		392	11-May-21	09-Dec-22
P-7370	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	202	11-May-21	03-Mar-22
P-30110	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	04-Mar-22	14-Jul-22
P-30120	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Mar-22	01-Apr-22
P-35410	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	04-Apr-22	18-Apr-22
P-37270	Revisión de la interventoria R2 60%	20	19-Apr-22	16-May-22
P-51550	Final 100%	50	15-Jul-22	26-Sep-22
P-51560	Revisión de la interventoria R1 90%	20	15-Jul-22	12-Aug-22
P-59830	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	16-Aug-22	29-Aug-22
P-63090	Revisión de la interventoria R2 90%	20	30-Aug-22	26-Sep-22
P-68420	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-Sep-22	25-Oct-22
P-74870	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Oct-22	09-Nov-22
P-78000	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Nov-22	09-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.24.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		412	11-May-21	06-Jan-23
P-7380	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	260	11-May-21	26-May-22
P-42940	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-42950	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47520	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50810	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-59840	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-68030	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73500	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-74880	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76450	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-80850	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82720	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.24.3 MEP		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-30130	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49740	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49750	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57460	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59850	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66830	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22

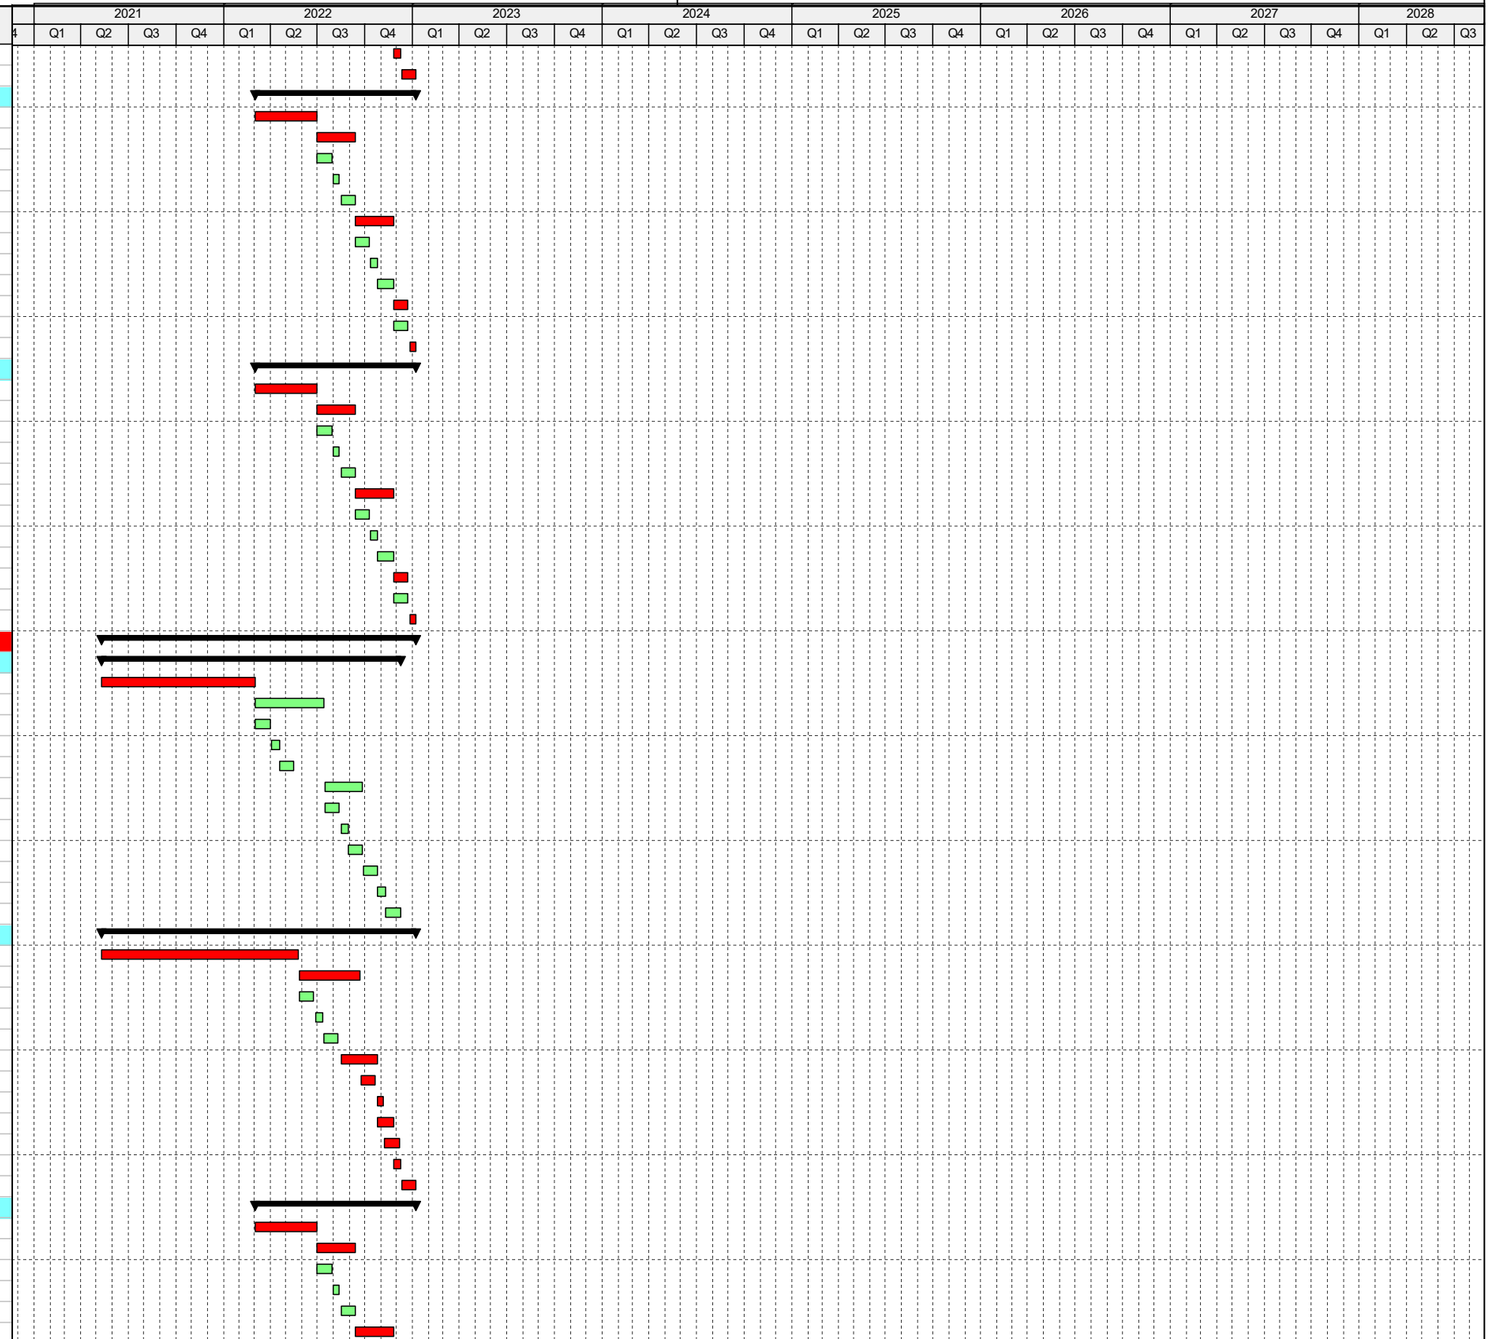

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-66840	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71820	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74890	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80860	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80870	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83240	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.24.4 MISC		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-30140	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49760	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49770	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57470	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59860	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66850	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66860	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71830	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74900	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80880	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80890	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83250	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.25 K16+374-K17+551		412	11-May-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.25.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		392	11-May-21	09-Dec-22
P-7390	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	202	11-May-21	03-Mar-22
P-30150	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	04-Mar-22	14-Jul-22
P-30160	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Mar-22	01-Apr-22
P-35420	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	04-Apr-22	18-Apr-22
P-37280	Revisión de la interventoria R2 60%	20	19-Apr-22	16-May-22
P-51570	Final 100%	50	15-Jul-22	26-Sep-22
P-51580	Revisión de la interventoria R1 90%	20	15-Jul-22	12-Aug-22
P-59870	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	16-Aug-22	29-Aug-22
P-63100	Revisión de la interventoria R2 90%	20	30-Aug-22	26-Sep-22
P-68430	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-Sep-22	25-Oct-22
P-74910	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Oct-22	09-Nov-22
P-78010	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Nov-22	09-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.25.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		412	11-May-21	06-Jan-23
P-7400	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	260	11-May-21	26-May-22
P-42960	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-42970	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47530	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50820	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-59880	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-68040	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73510	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-74920	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76460	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-80900	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82730	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.25.3 MEP		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-30170	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49780	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49790	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57480	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59890	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66870	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66880	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71840	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74930	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80910	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80920	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83260	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.25.4 MISC		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-30180	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49800	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22

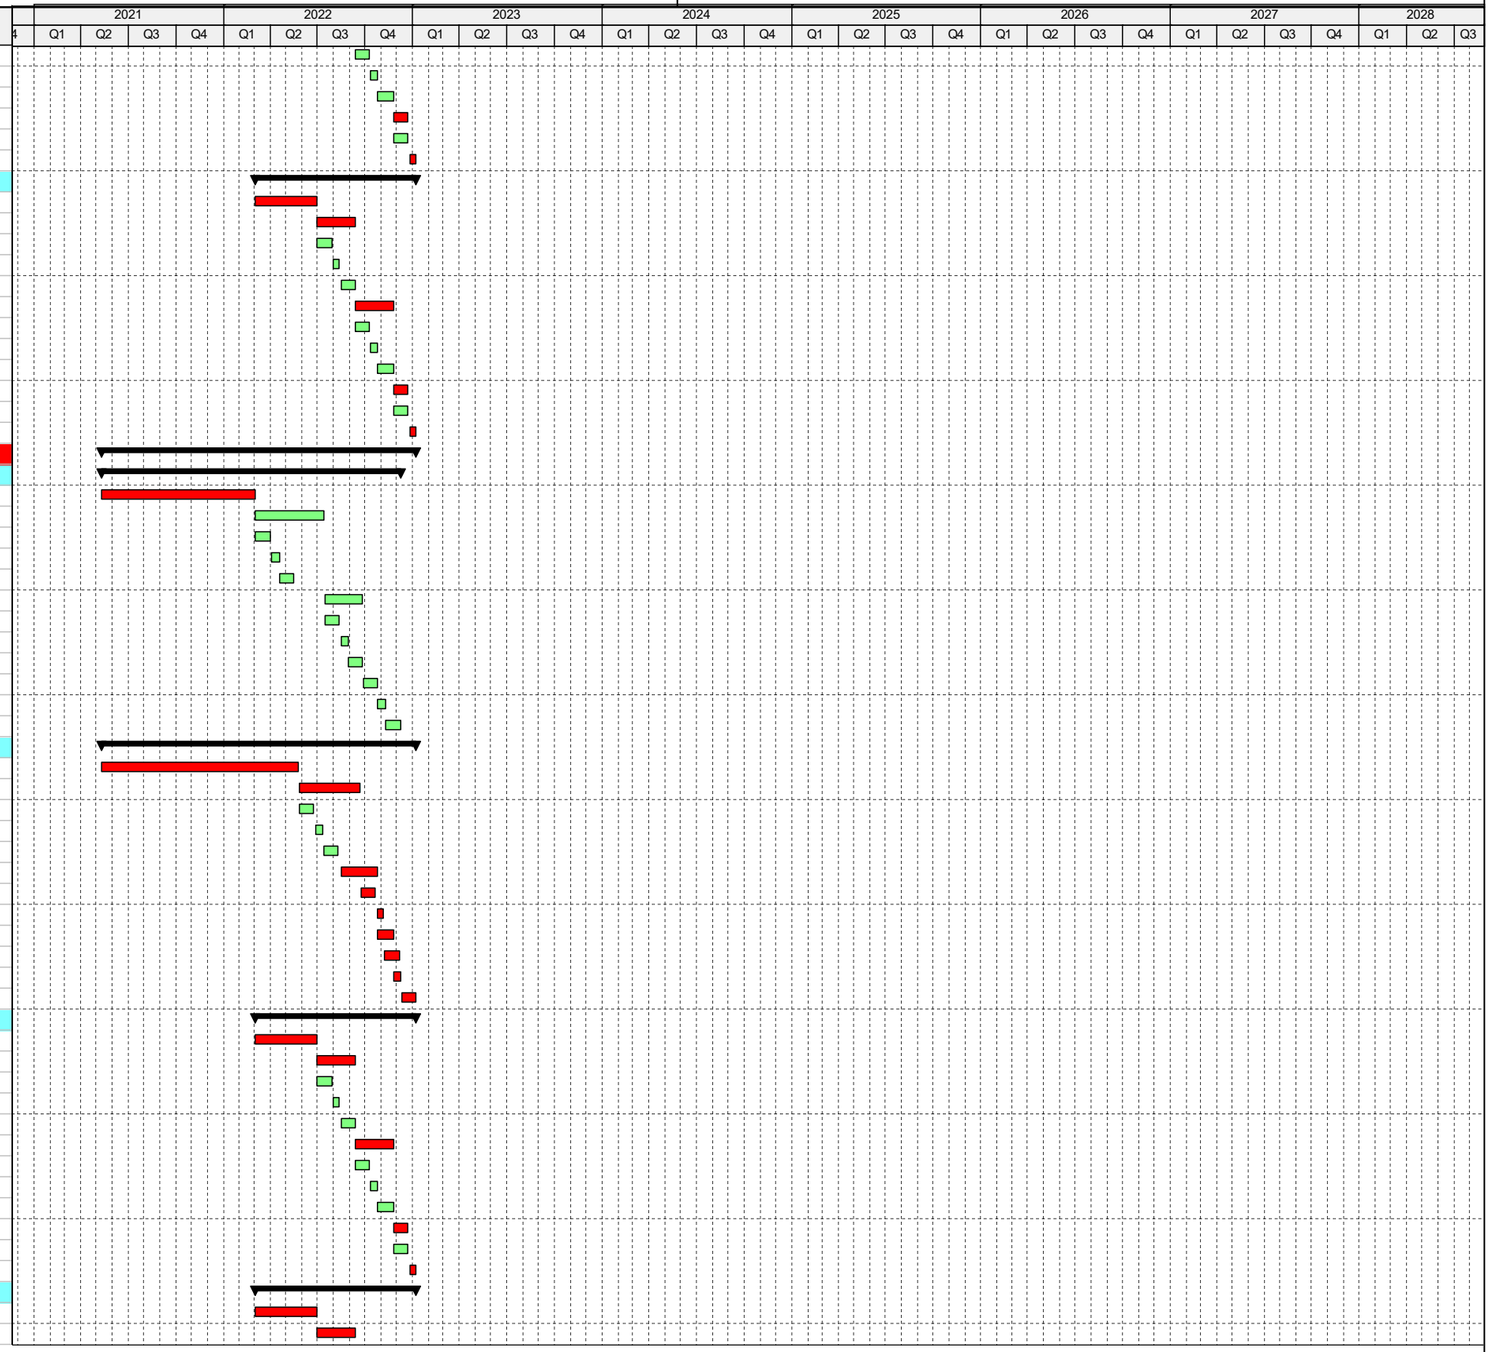


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-49810	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57490	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59900	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66890	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66900	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71850	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74940	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80930	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80940	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83270	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.26 K17+551-K17+761		412	11-May-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.26.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		392	11-May-21	09-Dec-22
P-7410	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	202	11-May-21	03-Mar-22
P-30190	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	04-Mar-22	14-Jul-22
P-30200	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Mar-22	01-Apr-22
P-35430	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	04-Apr-22	18-Apr-22
P-37290	Revisión de la interventoria R2 60%	20	19-Apr-22	16-May-22
P-51590	Final 100%	50	15-Jul-22	26-Sep-22
P-51600	Revisión de la interventoria R1 90%	20	15-Jul-22	12-Aug-22
P-59910	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	16-Aug-22	29-Aug-22
P-63110	Revisión de la interventoria R2 90%	20	30-Aug-22	26-Sep-22
P-68440	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-Sep-22	25-Oct-22
P-74950	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Oct-22	09-Nov-22
P-78020	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Nov-22	09-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.26.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		412	11-May-21	06-Jan-23
P-7420	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	260	11-May-21	26-May-22
P-42980	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-42990	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47540	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50830	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-59920	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-68050	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73520	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-74960	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76470	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-80950	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82740	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.26.3 MEP		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-30210	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49820	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49830	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57500	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59930	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66910	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66920	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71860	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74970	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80960	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80970	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83280	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.26.4 MISC		210	04-Mar-22	06-Jan-23
P-30220	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	80	04-Mar-22	29-Jun-22
P-49840	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49850	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57510	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59940	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66930	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66940	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71870	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-74980	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80980	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-80990	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22

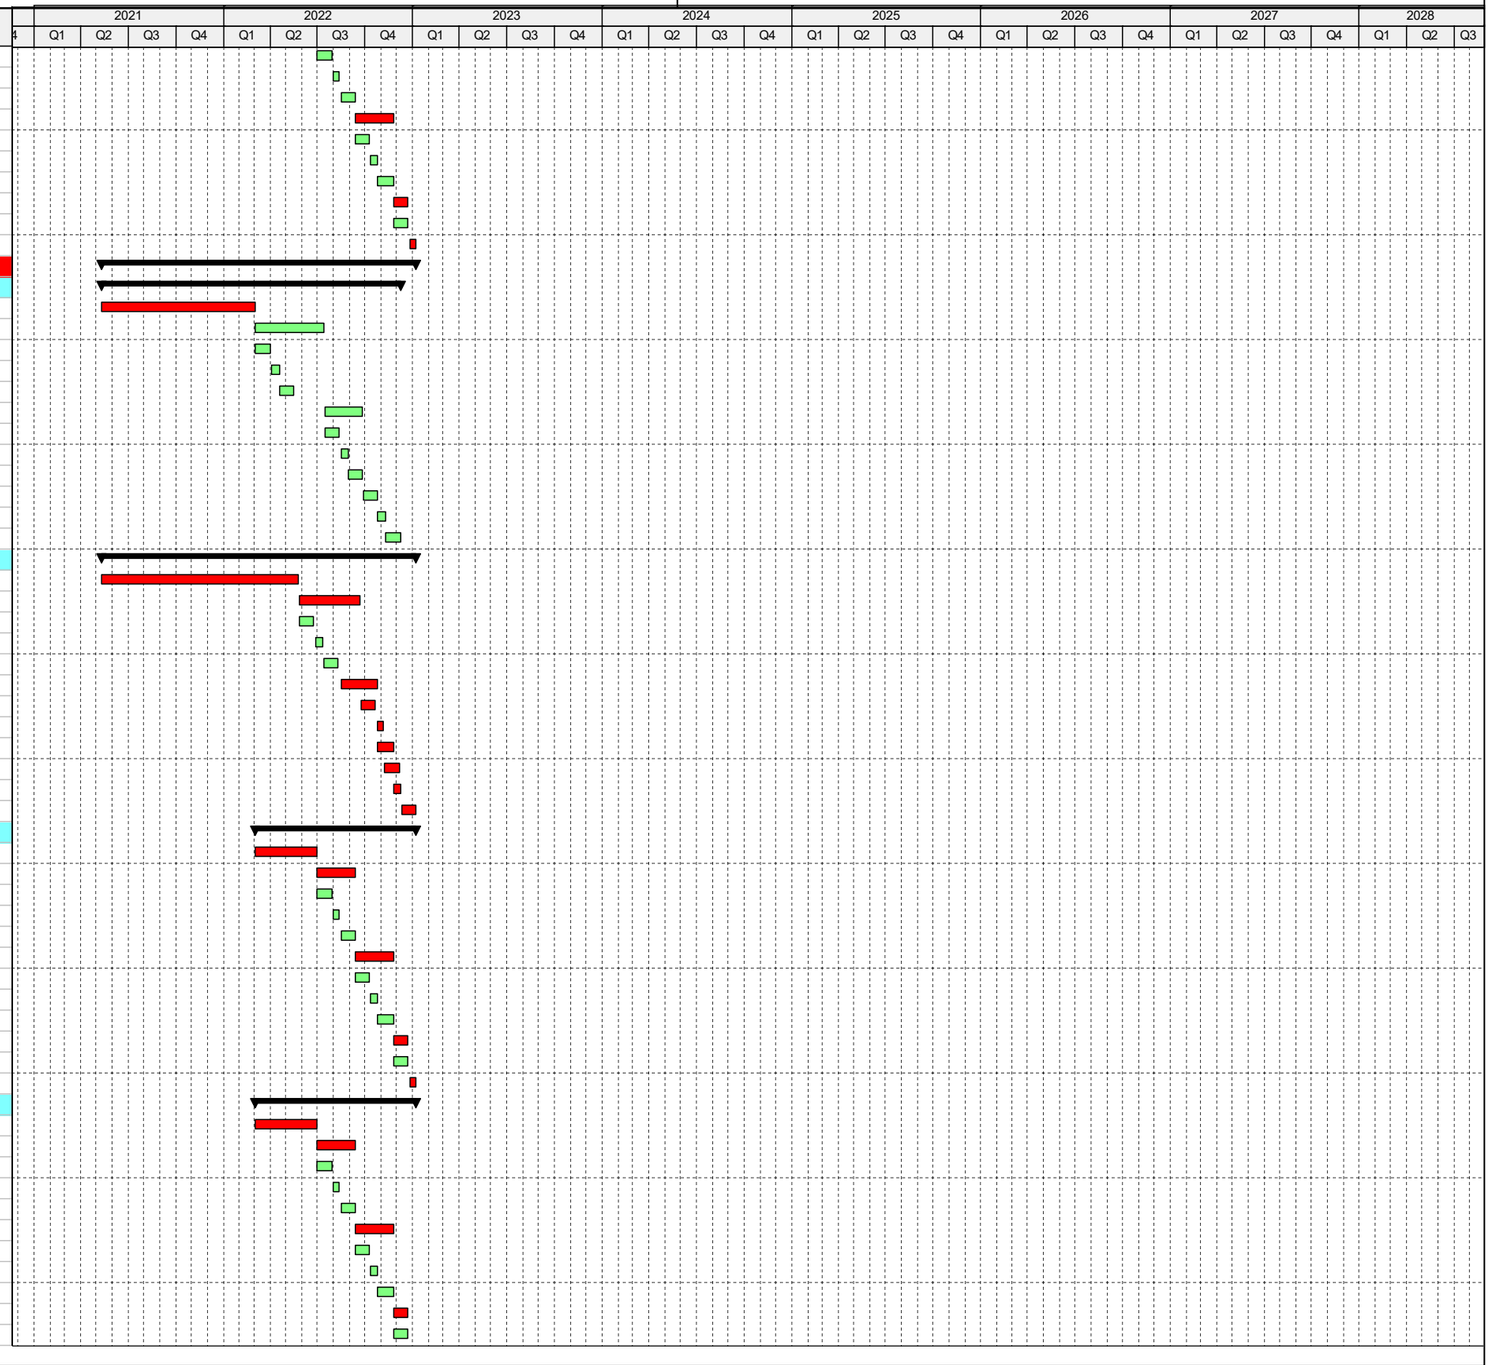


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-83290	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.27 K17+761-K19+615		432	13-Apr-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.27.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		398	26-May-21	02-Jan-23
P-7650	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	26-May-21	28-Mar-22
P-33100	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	29-Mar-22	08-Aug-22
P-33110	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-37580	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-Apr-22	10-May-22
P-40570	Revisión de la interventoria R2 60%	20	11-May-22	08-Jun-22
P-58040	Final 100%	50	09-Aug-22	19-Oct-22
P-58050	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-63830	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Sep-22	20-Sep-22
P-67550	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Sep-22	19-Oct-22
P-72760	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78640	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-82140	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.27.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		402	26-May-21	06-Jan-23
P-7660	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	250	26-May-21	26-May-22
P-43000	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-43010	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47550	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50840	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-59950	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-68060	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73530	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-74990	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76480	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-81000	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82750	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.27.3 MEP		190	29-Mar-22	02-Jan-23
P-33120	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	60	29-Mar-22	22-Jun-22
P-46930	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	23-Jun-22	06-Sep-22
P-46940	Revisión de la interventoria R1 60%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-53260	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-58060	Revisión de la interventoria R2 60%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-63840	Final 100%	50	07-Sep-22	18-Nov-22
P-63850	Revisión de la interventoria R1 90%	20	07-Sep-22	04-Oct-22
P-69180	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	05-Oct-22	19-Oct-22
P-72770	Revisión de la interventoria R2 90%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78650	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Nov-22	19-Dec-22
P-78660	Revisión de la interventoria R2 100%	20	21-Nov-22	19-Dec-22
P-82930	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.27.4 MISC		194	29-Mar-22	06-Jan-23
P-33130	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	64	29-Mar-22	29-Jun-22
P-49860	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49870	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57520	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59960	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66950	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66960	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71880	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-75000	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-81010	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-81020	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83300	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.27.5 Viaducto: STR: Viga Continua 60 + 100 + 60 (Incluye zócalos de carril)		414	13-Apr-21	13-Dec-22
P-5780	60% Elaboracion y entrega del diseño	240	13-Apr-21	30-Mar-22
P-33620	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	80	31-Mar-22	27-Jul-22
P-33630	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-37770	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-40880	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-50030	Final 100%	60	05-Jul-22	28-Sep-22
P-53520	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22

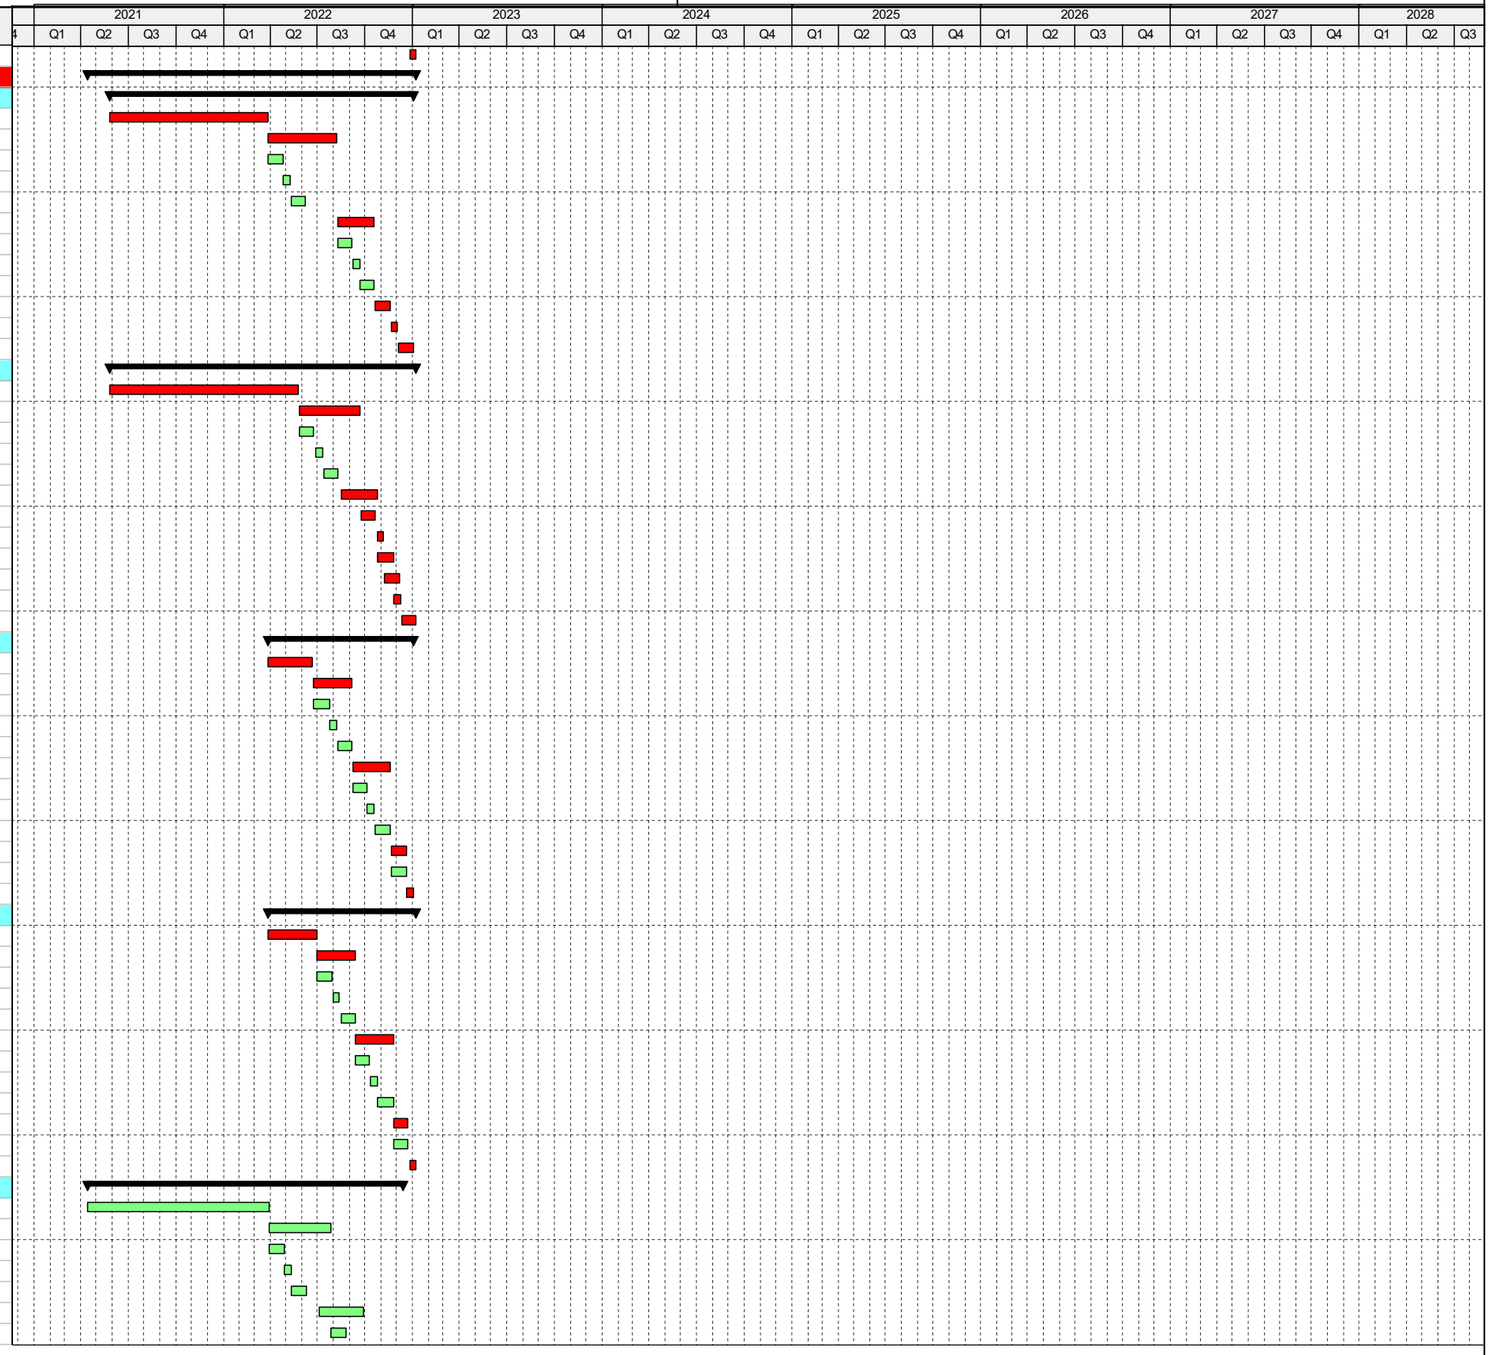


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-61370	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64170	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-68490	Revisión de la interventoria R1 100%	20	29-Sep-22	27-Oct-22
P-75150	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	28-Oct-22	11-Nov-22
P-78080	Revisión de la interventoria R2 100%	20	15-Nov-22	13-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.03.28 K19+615-K19+830		402	26-May-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.28.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		398	26-May-21	02-Jan-23
P-7670	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	26-May-21	28-Mar-22
P-33140	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	29-Mar-22	08-Aug-22
P-33150	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-37590	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-Apr-22	10-May-22
P-40580	Revisión de la interventoria R2 60%	20	11-May-22	08-Jun-22
P-58070	Final 100%	50	09-Aug-22	19-Oct-22
P-58080	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-63860	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Sep-22	20-Sep-22
P-67560	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Sep-22	19-Oct-22
P-72780	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78670	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-82150	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.28.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		402	26-May-21	06-Jan-23
P-7680	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	250	26-May-21	26-May-22
P-43020	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-43030	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47560	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50850	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-59970	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-68070	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73540	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-75010	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76490	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-81030	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82760	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.28.3 MEP		190	29-Mar-22	02-Jan-23
P-33160	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	60	29-Mar-22	22-Jun-22
P-46950	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	23-Jun-22	06-Sep-22
P-46960	Revisión de la interventoria R1 60%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-53270	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-58090	Revisión de la interventoria R2 60%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-63870	Final 100%	50	07-Sep-22	18-Nov-22
P-63880	Revisión de la interventoria R1 90%	20	07-Sep-22	04-Oct-22
P-69190	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	05-Oct-22	19-Oct-22
P-72790	Revisión de la interventoria R2 90%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78680	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Nov-22	19-Dec-22
P-78690	Revisión de la interventoria R2 100%	20	21-Nov-22	19-Dec-22
P-82940	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.28.4 MISC		194	29-Mar-22	06-Jan-23
P-33170	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	64	29-Mar-22	29-Jun-22
P-49880	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49890	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57530	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-59980	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66970	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-66980	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71890	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-75020	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-81040	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-81050	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83310	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.29 K19+830-K21+628		402	26-May-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.29.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		398	26-May-21	02-Jan-23
P-7690	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	26-May-21	28-Mar-22
P-33180	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	29-Mar-22	08-Aug-22

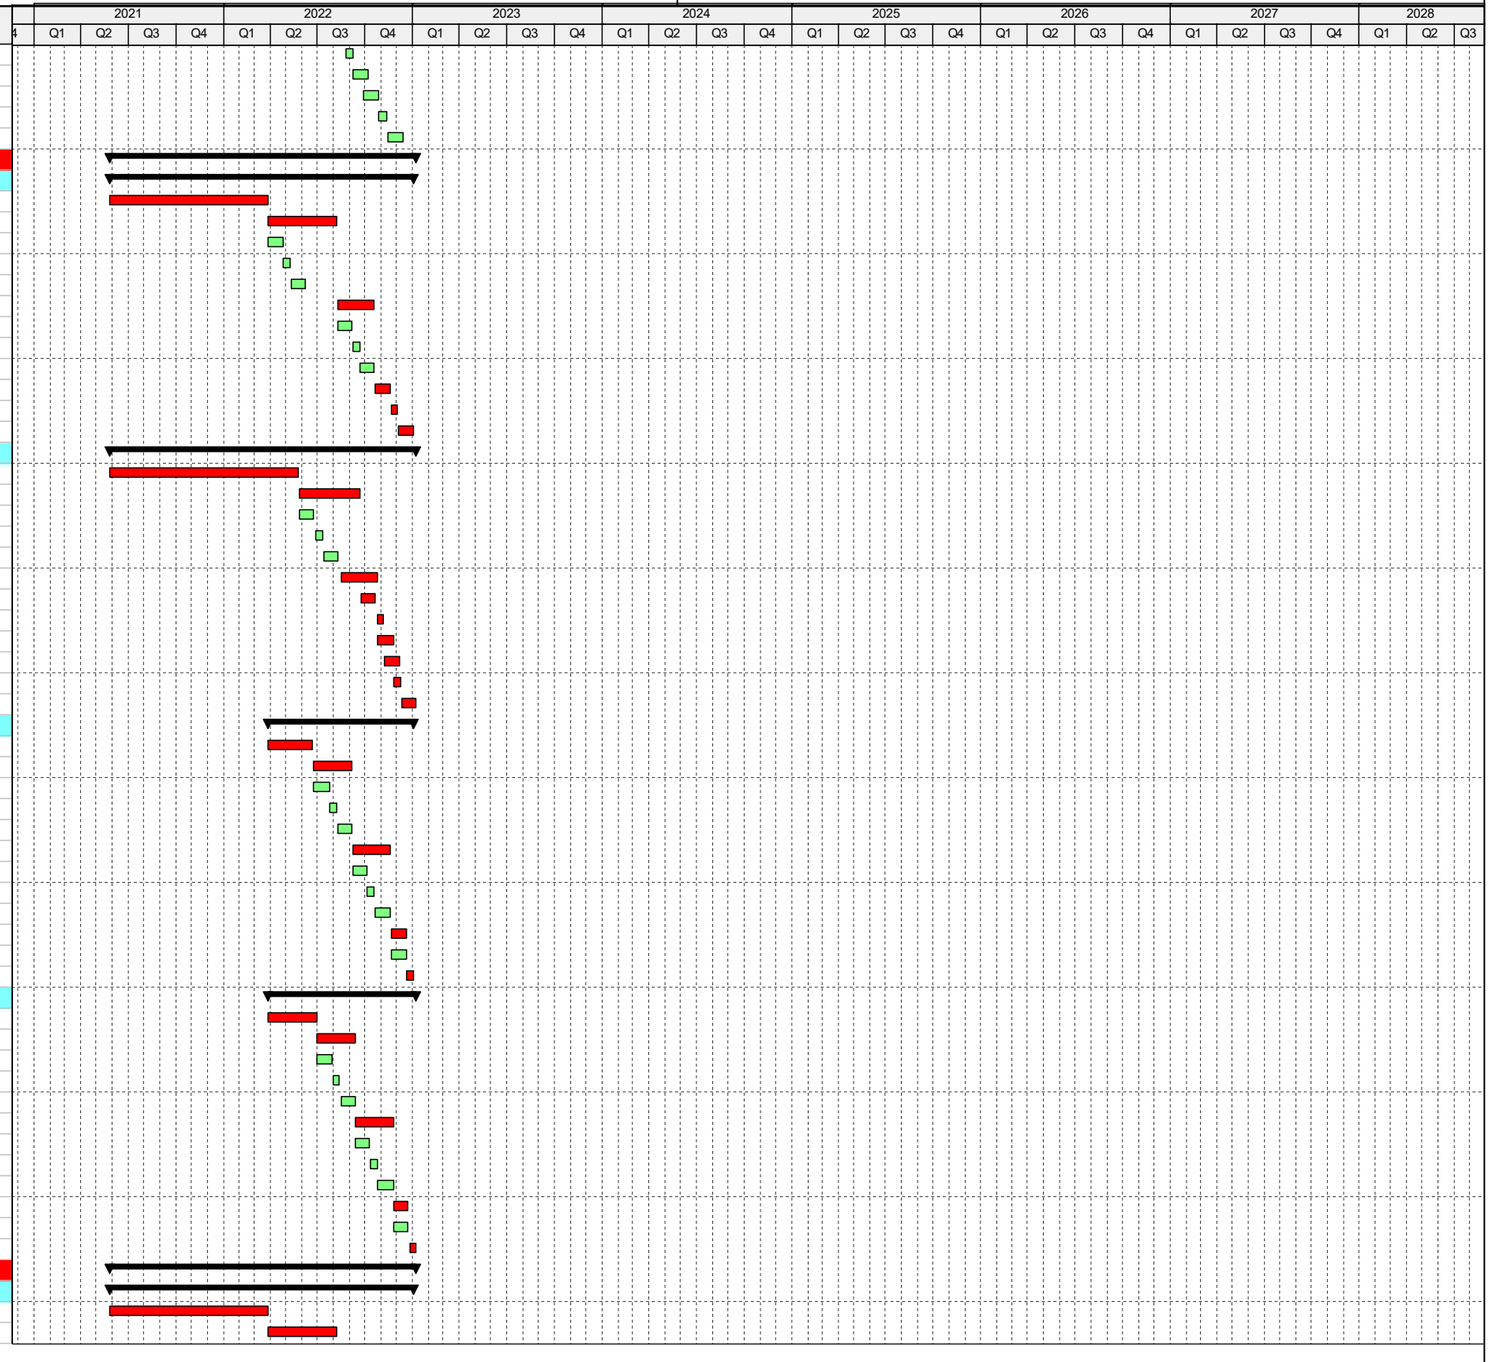

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-33190	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-37600	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-Apr-22	10-May-22
P-40590	Revisión de la interventoria R2 60%	20	11-May-22	08-Jun-22
P-58100	Final 100%	50	09-Aug-22	19-Oct-22
P-58110	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-63890	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Sep-22	20-Sep-22
P-67570	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Sep-22	19-Oct-22
P-72800	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78700	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-82160	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.29.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		402	26-May-21	06-Jan-23
P-7700	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	250	26-May-21	26-May-22
P-43040	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-43050	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47570	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50860	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-59990	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-68080	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73550	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-75030	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76500	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-81060	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82770	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.29.3 MEP		190	29-Mar-22	02-Jan-23
P-33200	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	60	29-Mar-22	22-Jun-22
P-46970	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	23-Jun-22	06-Sep-22
P-46980	Revisión de la interventoria R1 60%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-53280	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-58120	Revisión de la interventoria R2 60%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-63900	Final 100%	50	07-Sep-22	18-Nov-22
P-63910	Revisión de la interventoria R1 90%	20	07-Sep-22	04-Oct-22
P-69200	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	05-Oct-22	19-Oct-22
P-72810	Revisión de la interventoria R2 90%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78710	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Nov-22	19-Dec-22
P-78720	Revisión de la interventoria R2 100%	20	21-Nov-22	19-Dec-22
P-82950	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.29.4 MISC		194	29-Mar-22	06-Jan-23
P-33210	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	64	29-Mar-22	29-Jun-22
P-49900	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49910	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57540	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-60000	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-66990	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-67000	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71900	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-75040	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-81070	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-81080	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83320	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.30 K21+628-K21+843		402	26-May-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.30.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		398	26-May-21	02-Jan-23
P-7710	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	26-May-21	28-Mar-22
P-33220	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	29-Mar-22	08-Aug-22
P-33230	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-37610	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-Apr-22	10-May-22
P-40600	Revisión de la interventoria R2 60%	20	11-May-22	08-Jun-22
P-58130	Final 100%	50	09-Aug-22	19-Oct-22
P-58140	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-63920	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Sep-22	20-Sep-22
P-67580	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Sep-22	19-Oct-22
P-72820	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78730	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22

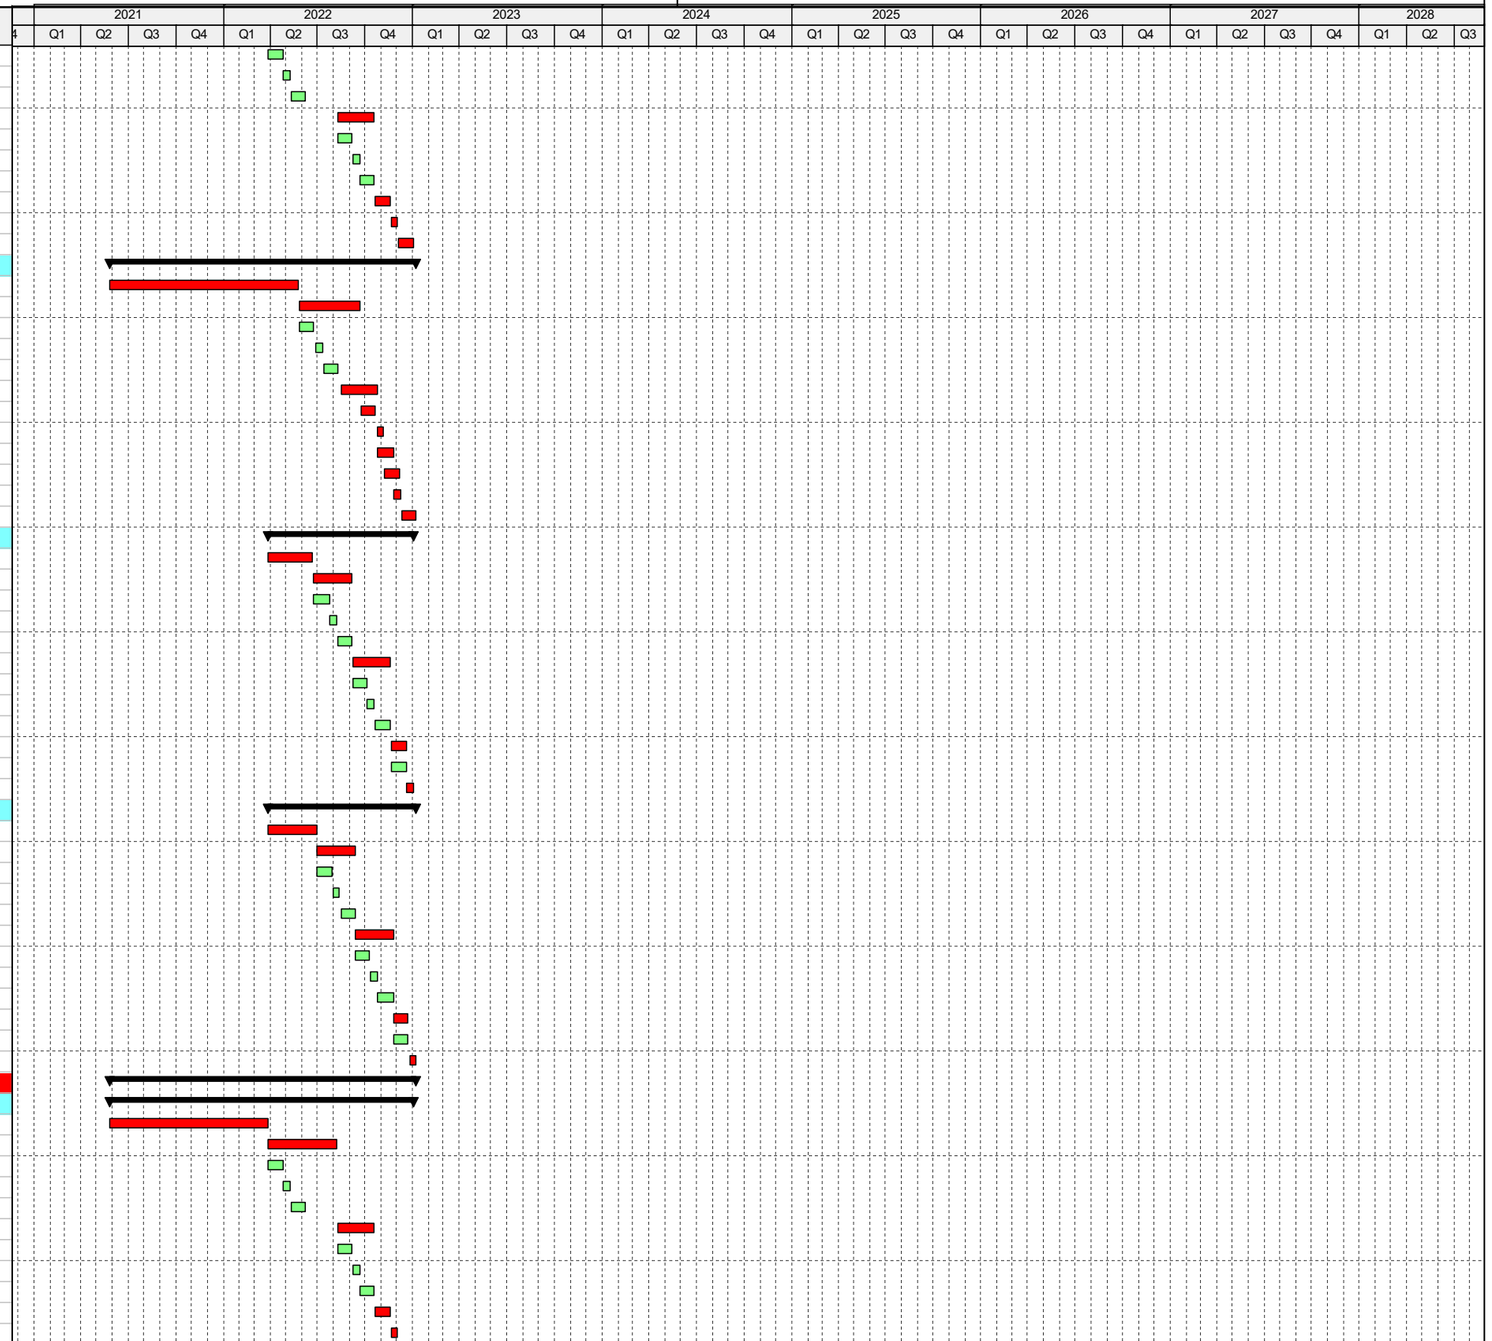

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-82170	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.30.2	**Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z**	**402**	**26-May-21**	**06-Jan-23**
P-7720	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	250	26-May-21	26-May-22
P-43060	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-43070	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47580	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50870	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-60010	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-68090	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73560	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-75050	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76510	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-81090	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82780	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.30.3	**MEP**	**190**	**29-Mar-22**	**02-Jan-23**
P-33240	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	60	29-Mar-22	22-Jun-22
P-46990	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	23-Jun-22	06-Sep-22
P-47000	Revisión de la interventoria R1 60%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-53290	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-58150	Revisión de la interventoria R2 60%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-63930	Final 100%	50	07-Sep-22	18-Nov-22
P-63940	Revisión de la interventoria R1 90%	20	07-Sep-22	04-Oct-22
P-69210	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	05-Oct-22	19-Oct-22
P-72830	Revisión de la interventoria R2 90%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78740	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Nov-22	19-Dec-22
P-78750	Revisión de la interventoria R2 100%	20	21-Nov-22	19-Dec-22
P-82960	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.30.4	**MISC**	**194**	**29-Mar-22**	**06-Jan-23**
P-33250	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	64	29-Mar-22	29-Jun-22
P-49920	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49930	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57550	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-60020	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-67010	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-67020	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71910	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-75060	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-81100	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-81110	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83330	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.31	**K21+843-K22+988**	**402**	**26-May-21**	**06-Jan-23**
PLMB-T1-V04.1.03.03.31.1	**Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope**	**398**	**26-May-21**	**02-Jan-23**
P-7730	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	26-May-21	28-Mar-22
P-33260	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	29-Mar-22	08-Aug-22
P-33270	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-37620	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-Apr-22	10-May-22
P-40610	Revisión de la interventoria R2 60%	20	11-May-22	08-Jun-22
P-58160	Final 100%	50	09-Aug-22	19-Oct-22
P-58170	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-63950	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Sep-22	20-Sep-22
P-67590	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Sep-22	19-Oct-22
P-72840	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78760	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-82180	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.31.2	**Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z**	**402**	**26-May-21**	**06-Jan-23**
P-7740	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	250	26-May-21	26-May-22
P-43080	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-43090	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47590	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50880	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-60030	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-68100	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22




Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-73570	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-75070	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76520	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-81120	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82790	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.31.3 MEP		190	29-Mar-22	02-Jan-23
P-33280	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	60	29-Mar-22	22-Jun-22
P-47010	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	23-Jun-22	06-Sep-22
P-47020	Revisión de la interventoria R1 60%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-53300	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-58180	Revisión de la interventoria R2 60%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-63960	Final 100%	50	07-Sep-22	18-Nov-22
P-63970	Revisión de la interventoria R1 90%	20	07-Sep-22	04-Oct-22
P-69220	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	05-Oct-22	19-Oct-22
P-72850	Revisión de la interventoria R2 90%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78770	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Nov-22	19-Dec-22
P-78780	Revisión de la interventoria R2 100%	20	21-Nov-22	19-Dec-22
P-82970	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.31.4 MISC		194	29-Mar-22	06-Jan-23
P-33290	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	64	29-Mar-22	29-Jun-22
P-49940	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49950	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57560	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-60040	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-67030	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-67040	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71920	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-75080	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-81130	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-81140	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83340	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.32 K22+988-K23+214		402	26-May-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.32.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		398	26-May-21	02-Jan-23
P-7750	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	26-May-21	28-Mar-22
P-33300	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	29-Mar-22	08-Aug-22
P-33310	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-37630	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-Apr-22	10-May-22
P-40620	Revisión de la interventoria R2 60%	20	11-May-22	08-Jun-22
P-58190	Final 100%	50	09-Aug-22	19-Oct-22
P-58200	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-63980	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Sep-22	20-Sep-22
P-67600	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Sep-22	19-Oct-22
P-72860	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78790	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-82190	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.32.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		402	26-May-21	06-Jan-23
P-7760	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	250	26-May-21	26-May-22
P-43100	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-43110	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47600	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50890	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-60050	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-68110	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73580	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-75090	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76530	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-81150	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82800	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.32.3 MEP		190	29-Mar-22	02-Jan-23
P-33320	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	60	29-Mar-22	22-Jun-22
P-47030	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	23-Jun-22	06-Sep-22
P-47040	Revisión de la interventoria R1 60%	20	23-Jun-22	25-Jul-22

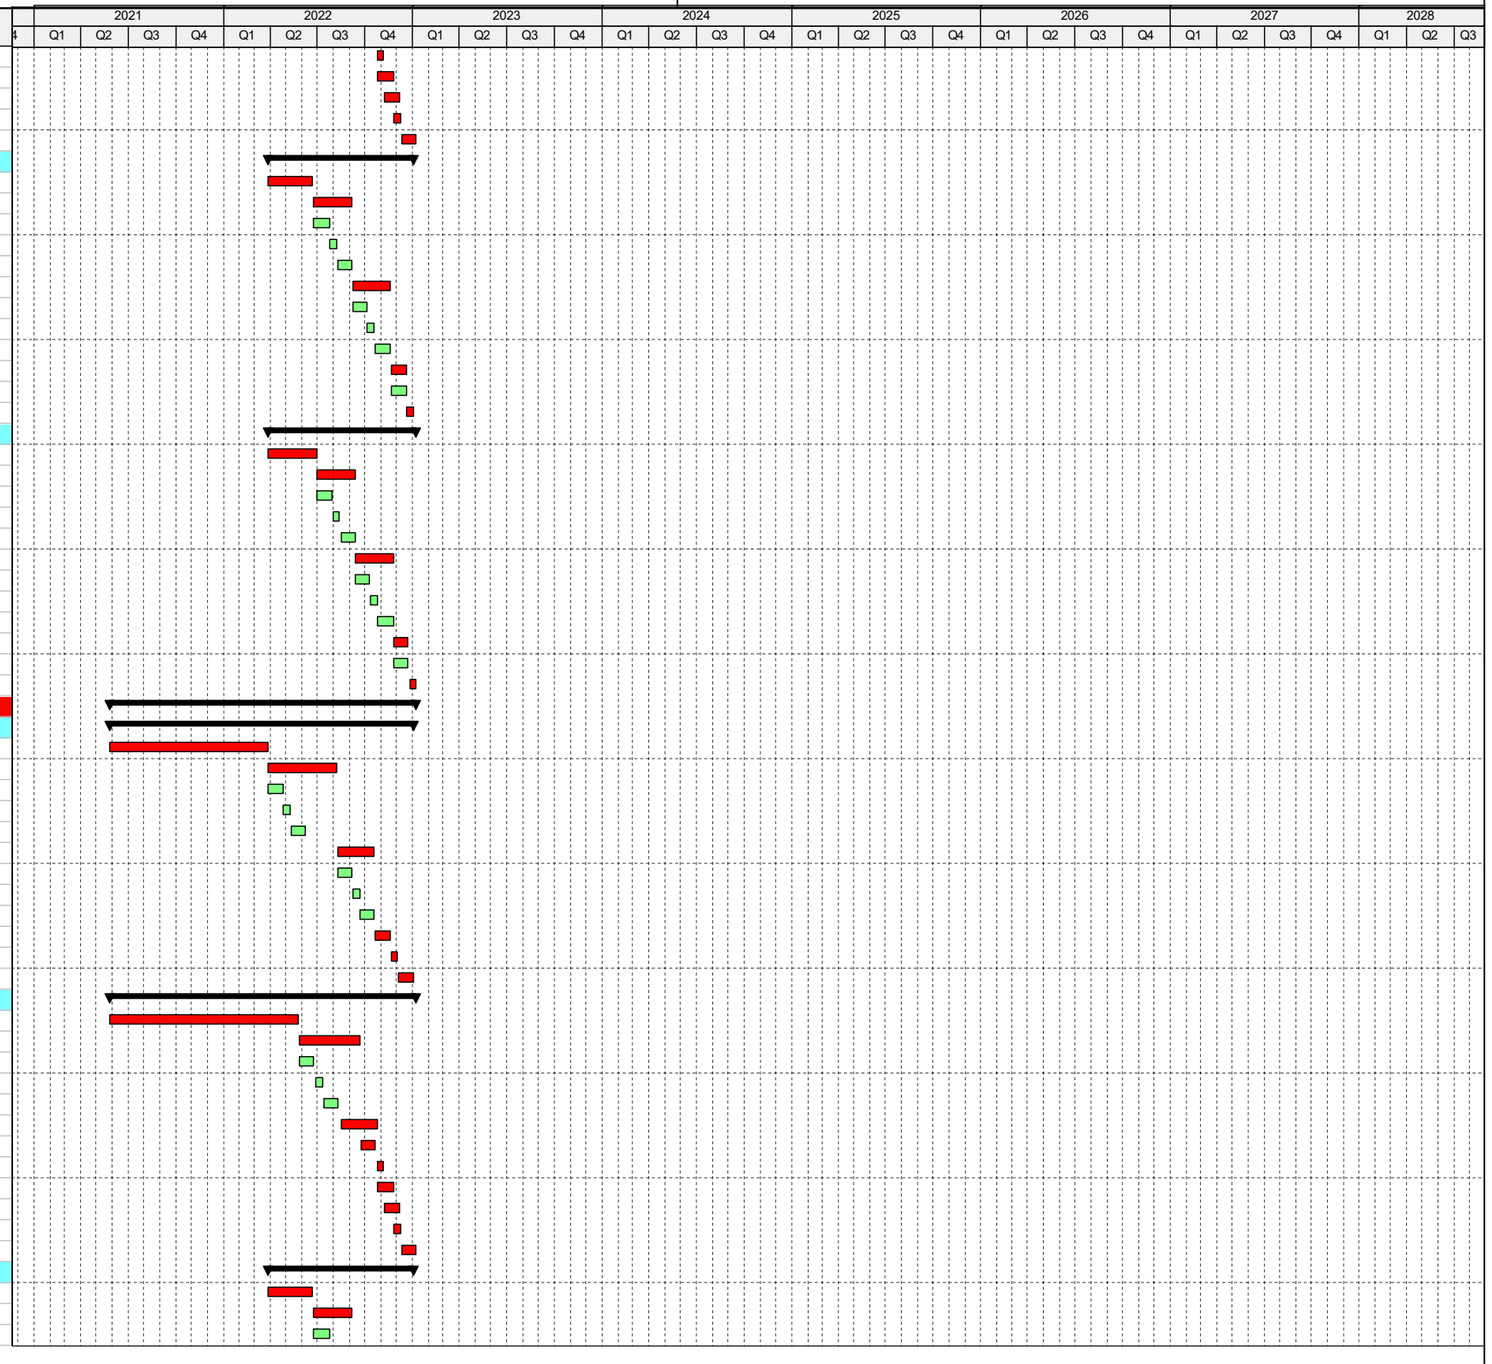


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Summary
Milestone

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-53310	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-58210	Revisión de la interventoria R2 60%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-63990	Final 100%	50	07-Sep-22	18-Nov-22
P-64000	Revisión de la interventoria R1 90%	20	07-Sep-22	04-Oct-22
P-69230	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	05-Oct-22	19-Oct-22
P-72870	Revisión de la interventoria R2 90%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78800	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Nov-22	19-Dec-22
P-78810	Revisión de la interventoria R2 100%	20	21-Nov-22	19-Dec-22
P-82980	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.32.4 MISC		194	29-Mar-22	06-Jan-23
P-33330	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	64	29-Mar-22	29-Jun-22
P-49960	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49970	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57570	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-60060	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-67050	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-67060	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71930	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-75100	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-81160	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-81170	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83350	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.33 K23+214-K23+864		402	26-May-21	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.33.1 Estructura del viaducto_Cimentaciones, pilotes y viga de tope		398	26-May-21	02-Jan-23
P-7770	60% Elaboracion y entrega del diseño(UBICACIÓN DE LOS APOYOS,TABLA DE REF	208	26-May-21	28-Mar-22
P-33340	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (REFUERZO DE CIMENTACIÓN, CC	90	29-Mar-22	08-Aug-22
P-33350	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Mar-22	26-Apr-22
P-37640	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-Apr-22	10-May-22
P-40630	Revisión de la interventoria R2 60%	20	11-May-22	08-Jun-22
P-58220	Final 100%	50	09-Aug-22	19-Oct-22
P-58230	Revisión de la interventoria R1 90%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-64010	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	07-Sep-22	20-Sep-22
P-67610	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Sep-22	19-Oct-22
P-72880	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78820	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-82200	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.33.2 Estructura del viaducto_U-Viga o Bal. Segmento en voladizo (incluye z		402	26-May-21	06-Jan-23
P-7780	60% Elaboracion y entrega del diseño (SECCIONES TÍPICAS)	250	26-May-21	26-May-22
P-43120	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (DETALLE DE REFUERZO,DETALLE	80	27-May-22	22-Sep-22
P-43130	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-47610	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jun-22	12-Jul-22
P-50900	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-60070	Final 100%	50	16-Aug-22	25-Oct-22
P-68120	Revisión de la interventoria R1 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73590	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-75110	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-76540	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
P-81180	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82810	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.03.33.3 MEP		190	29-Mar-22	02-Jan-23
P-33360	60% Elaboracion y entrega (LAYOUT FÍSICO ,LISTA DE PLANOS Y DOCUMENTOS,	60	29-Mar-22	22-Jun-22
P-47050	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO,I	50	23-Jun-22	06-Sep-22
P-47060	Revisión de la interventoria R1 60%	20	23-Jun-22	25-Jul-22
P-53320	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Jul-22	08-Aug-22
P-58240	Revisión de la interventoria R2 60%	20	09-Aug-22	06-Sep-22
P-64020	Final 100%	50	07-Sep-22	18-Nov-22
P-64030	Revisión de la interventoria R1 90%	20	07-Sep-22	04-Oct-22
P-69240	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	05-Oct-22	19-Oct-22
P-72890	Revisión de la interventoria R2 90%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78830	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Nov-22	19-Dec-22
P-78840	Revisión de la interventoria R2 100%	20	21-Nov-22	19-Dec-22
P-82990	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-Dec-22	02-Jan-23

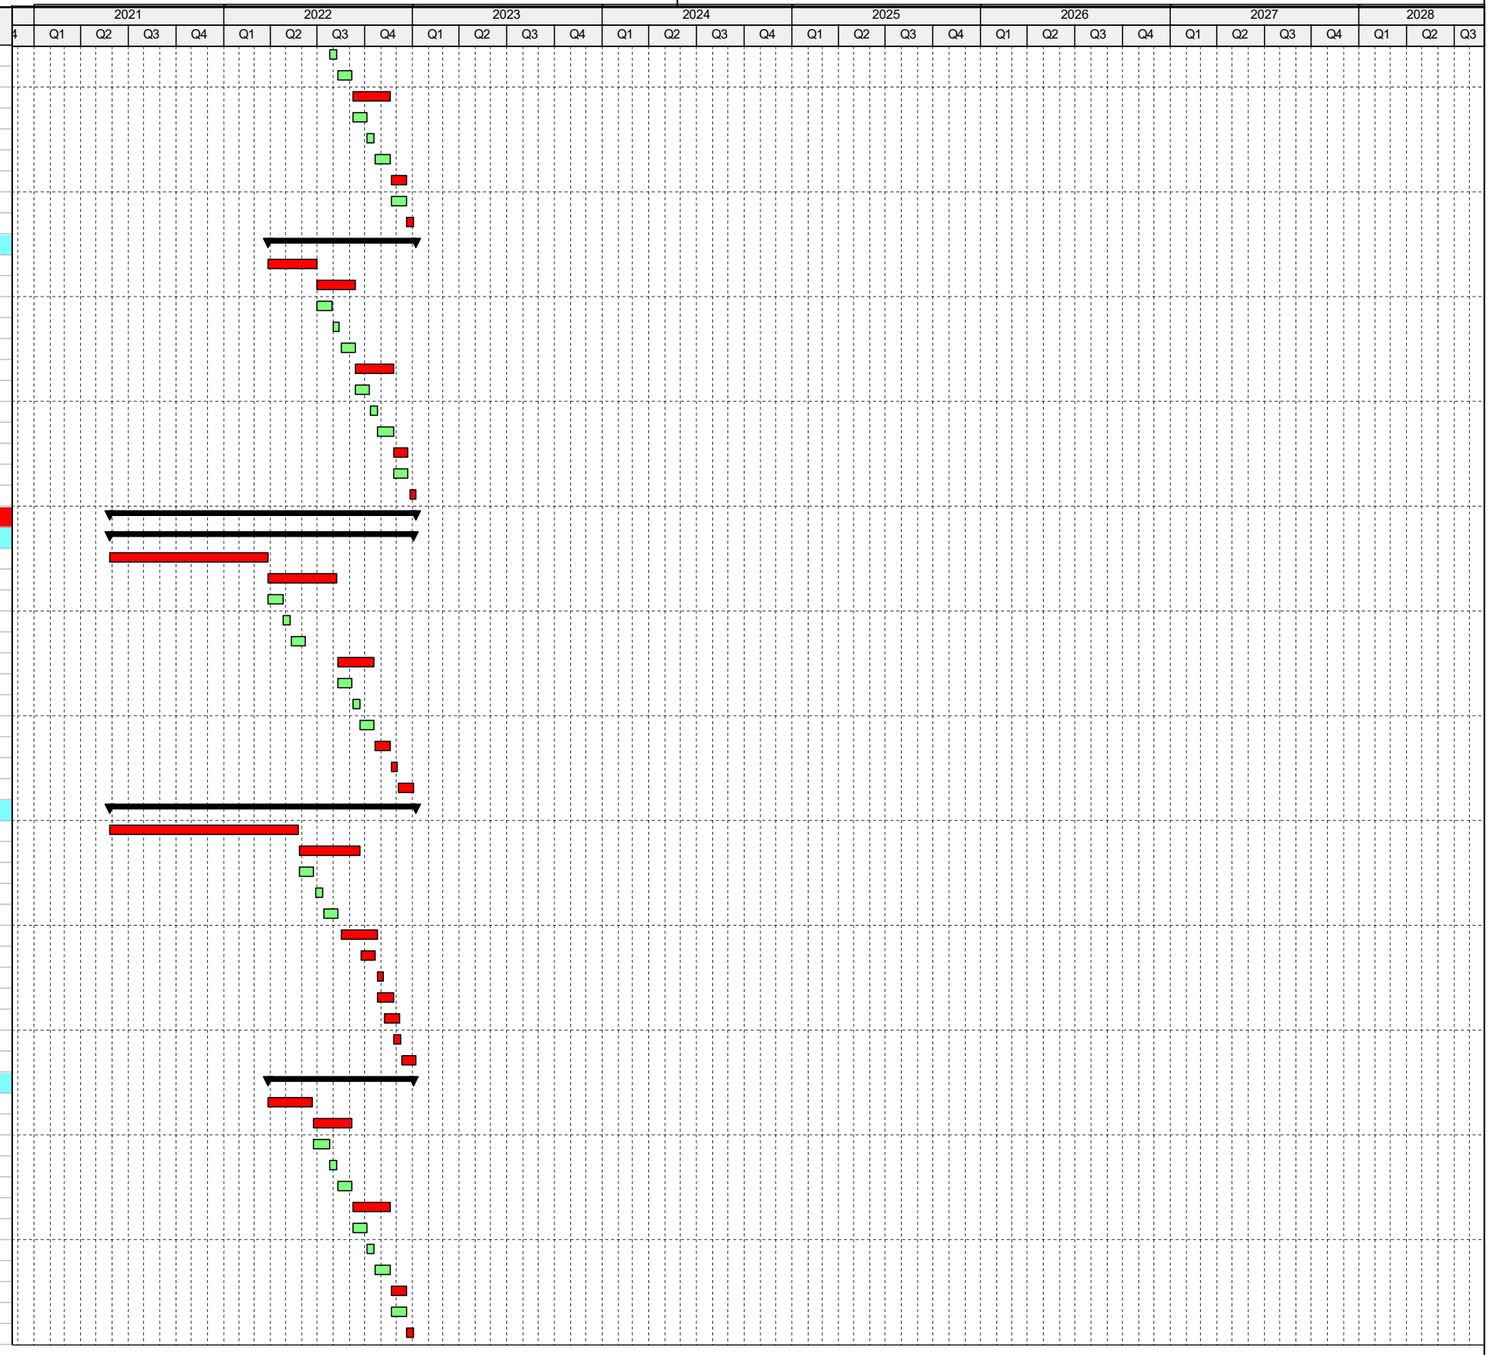


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.1.03.03.33.4 MISC		194	29-Mar-22	06-Jan-23
P-33370	60% Elaboracion y entrega del diseño (PLANO DE EMPLAZAMIENTO)	64	29-Mar-22	29-Jun-22
P-49980	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	30-Jun-22	12-Sep-22
P-49990	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Jun-22	29-Jul-22
P-57580	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Aug-22	12-Aug-22
P-60080	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Aug-22	12-Sep-22
P-67070	Final 100%	50	13-Sep-22	24-Nov-22
P-67080	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71940	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Oct-22	25-Oct-22
P-75120	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-81190	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-81200	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
P-83360	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.04 CORREDOR PRINCIPAL		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.04.01 Datos de entrada para diseños		186	13-Apr-21	12-Jan-22
P-5760	60% Elaboracion y entrega del diseño (Metodología de diseño,CRITERIOS DE DISEÑ	136	13-Apr-21	28-Oct-21
P-13910	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Oct-21	29-Nov-21
P-17470	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	30-Nov-21	14-Dec-21
P-19160	Revisión de la interventoria R2 60%	20	15-Dec-21	12-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.03.04.02 WF1(K0+000 - K3+642)		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.04.02.1 Adecuación malla vial - Calzada Mixta		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-5790	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar(PLANO GENERAL,NIVELES DE PAV	220	13-Apr-21	01-Mar-22
P-29060	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle(PLANO PERFIL ,SECCIONES)	98	02-Mar-22	25-Jul-22
P-29070	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-33640	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	31-Mar-22	13-Apr-22
P-36150	Revisión de la interventoria R2 60%	20	14-Apr-22	12-May-22
P-52740	Final 100%	60	26-Jul-22	19-Oct-22
P-52750	Revisión de la interventoria R1 90%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60620	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Aug-22	06-Sep-22
P-63780	Revisión de la interventoria R2 90%	20	07-Sep-22	04-Oct-22
P-72570	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78450	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-81670	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.04.02.2 Urbanismo y Paisajismo		286	13-Apr-21	06-Jun-22
P-5800	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar(UBICACIÓN GENERAL,PLAN DE DI	136	13-Apr-21	28-Oct-21
P-13920	90% elaboracion y entrega de detalle((SECCIONES TRANSVERSALES, SECCIONES	50	29-Oct-21	12-Jan-22
P-13930	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Oct-21	29-Nov-21
P-17480	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	30-Nov-21	14-Dec-21
P-19170	Revisión de la interventoria R2 60%	20	15-Dec-21	12-Jan-22
P-22850	Final 100%	50	13-Jan-22	24-Mar-22
P-22860	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Jan-22	09-Feb-22
P-26540	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Feb-22	23-Feb-22
P-28700	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Feb-22	24-Mar-22
P-32560	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-37510	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Apr-22	06-May-22
P-40350	Revisión de la interventoria R2 100%	20	09-May-22	06-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.04.02.3 Redes de servicios publicos		160	29-Oct-21	20-Jun-22
P-14040	Elaboracion y entrega diseños 100% Final(Memorias de calculos, planos de redes y pl	110	29-Oct-21	07-Apr-22
P-35680	Revisión de la interventoria R1 100%	20	08-Apr-22	06-May-22
P-40410	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	09-May-22	20-May-22
P-42530	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-May-22	20-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.04.03 WF2(K3+642 - K7+830)		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.04.03.1 Adecuación malla vial - Calzada Mixta		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-5810	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar(PLANO GENERAL,NIVELES DE PAV	220	13-Apr-21	01-Mar-22
P-29080	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle(PLANO PERFIL ,SECCIONES)	98	02-Mar-22	25-Jul-22
P-29090	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-33650	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	31-Mar-22	13-Apr-22
P-36160	Revisión de la interventoria R2 60%	20	14-Apr-22	12-May-22
P-52760	Final 100%	60	26-Jul-22	19-Oct-22
P-52770	Revisión de la interventoria R1 90%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60630	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Aug-22	06-Sep-22
P-63790	Revisión de la interventoria R2 90%	20	07-Sep-22	04-Oct-22

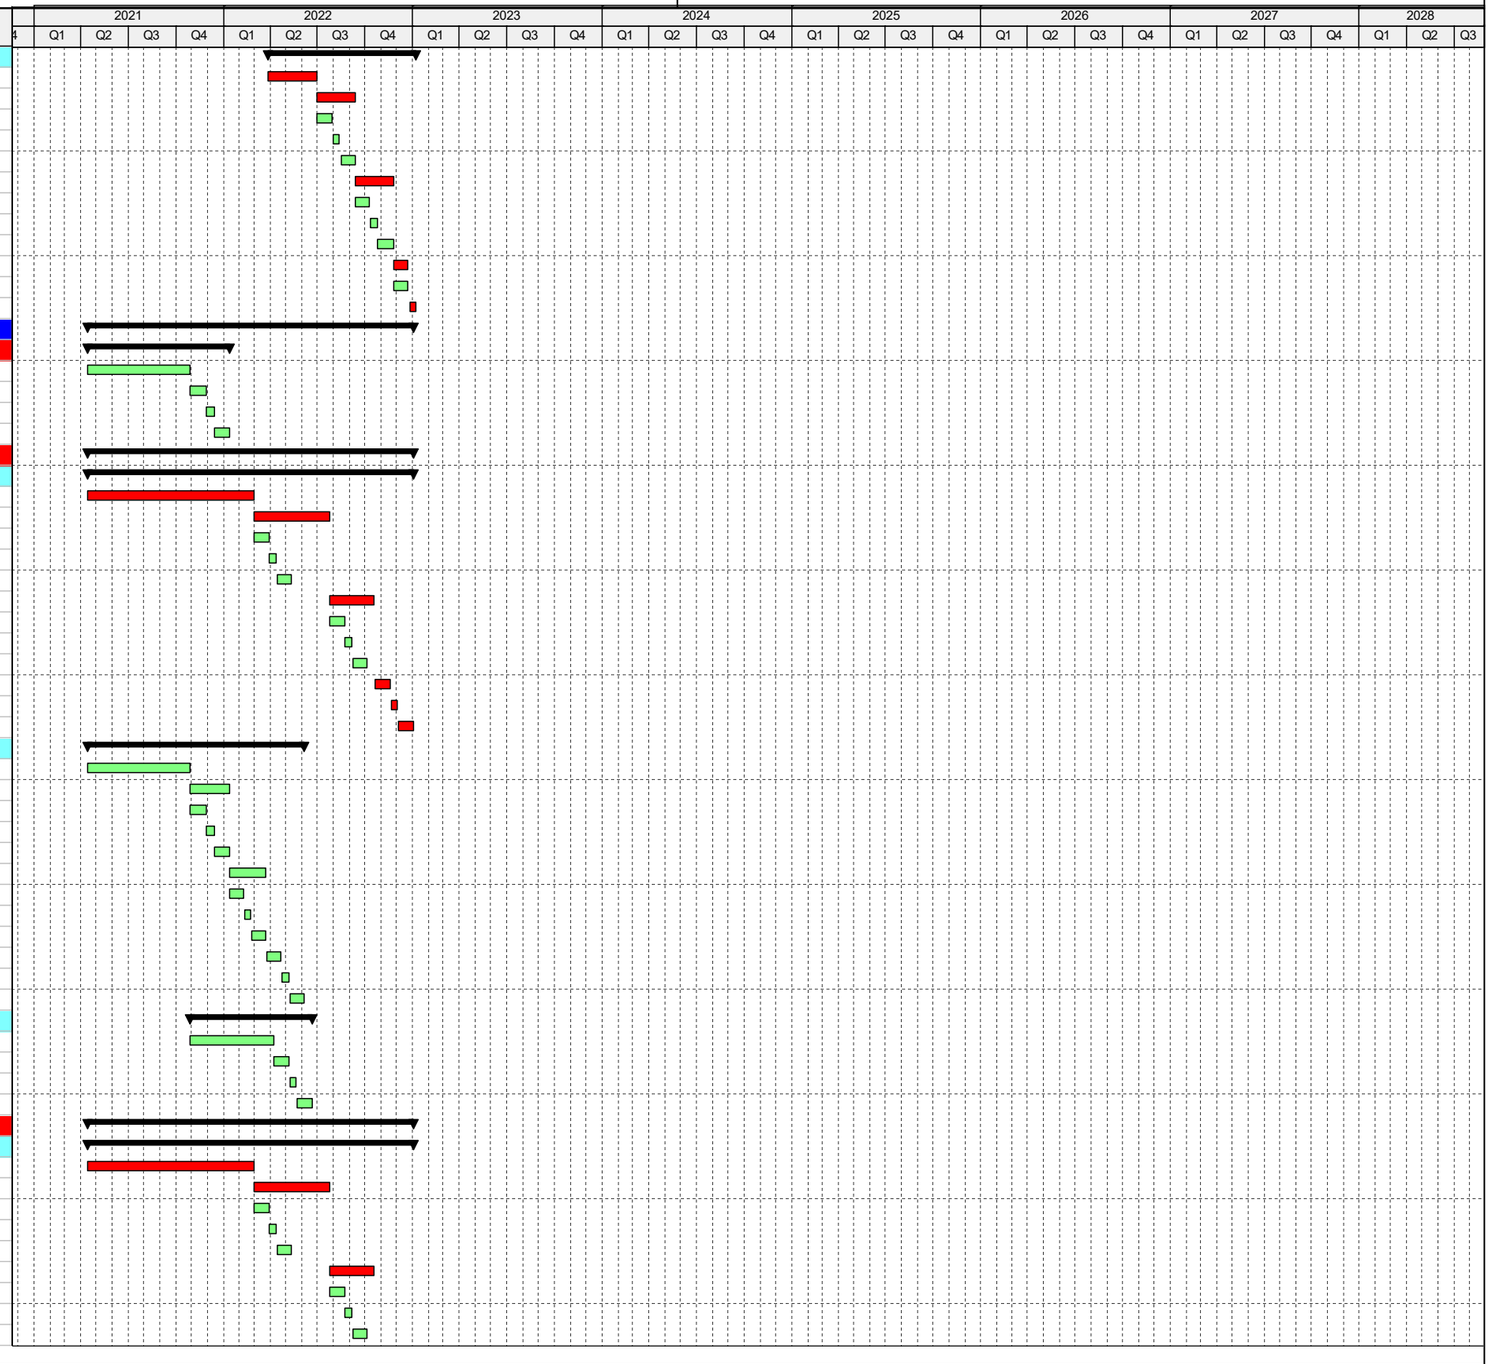


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-72580	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78460	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-81680	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.04.03.2 Urbanismo y Paisajismo		286	13-Apr-21	06-Jun-22
P-5820	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar(UBICACIÓN GENERAL,PLAN DE DI	136	13-Apr-21	28-Oct-21
P-13940	90% elaboracion y entrega de detalle((SECCIONES TRANSVERSALES, SECCIONES	50	29-Oct-21	12-Jan-22
P-13950	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Oct-21	29-Nov-21
P-17490	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	30-Nov-21	14-Dec-21
P-19180	Revisión de la interventoria R2 60%	20	15-Dec-21	12-Jan-22
P-22870	Final 100%	50	13-Jan-22	24-Mar-22
P-22880	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Jan-22	09-Feb-22
P-26550	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Feb-22	23-Feb-22
P-28710	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Feb-22	24-Mar-22
P-32570	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-37520	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Apr-22	06-May-22
P-40360	Revisión de la interventoria R2 100%	20	09-May-22	06-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.04.03.3 Redes de servicios publicos		160	16-Nov-21	06-Jul-22
P-16630	Elaboracion y entrega diseños 100% Final(Memorias de calculos, planos de redes y pl	110	16-Nov-21	22-Apr-22
P-37570	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Apr-22	20-May-22
P-42540	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	23-May-22	06-Jun-22
P-44130	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.04.04 WF3(K7+830 - K12+033)		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.04.04.1 Adecuación malla vial - Calzada Mixta		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-5830	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar(PLANO GENERAL,NIVELES DE PAV	220	13-Apr-21	01-Mar-22
P-29100	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle(PLANO PERFIL ,SECCIONES)	98	02-Mar-22	25-Jul-22
P-29110	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-33660	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	31-Mar-22	13-Apr-22
P-36170	Revisión de la interventoria R2 60%	20	14-Apr-22	12-May-22
P-52780	Final 100%	60	26-Jul-22	19-Oct-22
P-52790	Revisión de la interventoria R1 90%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60640	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Aug-22	06-Sep-22
P-63800	Revisión de la interventoria R2 90%	20	07-Sep-22	04-Oct-22
P-72590	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78470	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-81690	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.04.04.2 Urbanismo y Paisajismo		286	13-Apr-21	06-Jun-22
P-5840	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar(UBICACIÓN GENERAL,PLAN DE DI	136	13-Apr-21	28-Oct-21
P-13960	90% elaboracion y entrega de detalle((SECCIONES TRANSVERSALES, SECCIONES	50	29-Oct-21	12-Jan-22
P-13970	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Oct-21	29-Nov-21
P-17500	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	30-Nov-21	14-Dec-21
P-19190	Revisión de la interventoria R2 60%	20	15-Dec-21	12-Jan-22
P-22890	Final 100%	50	13-Jan-22	24-Mar-22
P-22900	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Jan-22	09-Feb-22
P-26560	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Feb-22	23-Feb-22
P-28720	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Feb-22	24-Mar-22
P-32580	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-37530	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Apr-22	06-May-22
P-40370	Revisión de la interventoria R2 100%	20	09-May-22	06-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.04.04.3 Redes de servicios publicos		160	08-Nov-21	28-Jun-22
P-16210	Elaboracion y entrega diseños 100% Final(Memorias de calculos, planos de redes y pl	110	08-Nov-21	14-Apr-22
P-36460	Revisión de la interventoria R1 100%	20	18-Apr-22	13-May-22
P-42290	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	16-May-22	27-May-22
P-43720	Revisión de la interventoria R2 100%	20	31-May-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.04.05 WF4(K12+033 - K16+374)		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.04.05.1 Adecuación malla vial - Calzada Mixta & BRT		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-5850	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar(PLANO GENERAL,NIVELES DE PAV	220	13-Apr-21	01-Mar-22
P-29120	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle(PLANO PERFIL ,SECCIONES)	98	02-Mar-22	25-Jul-22
P-29130	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-33670	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	31-Mar-22	13-Apr-22
P-36180	Revisión de la interventoria R2 60%	20	14-Apr-22	12-May-22
P-52800	Final 100%	60	26-Jul-22	19-Oct-22
P-52810	Revisión de la interventoria R1 90%	20	26-Jul-22	23-Aug-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-60650	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Aug-22	06-Sep-22
P-63810	Revisión de la interventoria R2 90%	20	07-Sep-22	04-Oct-22
P-72600	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78480	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-81700	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.04.05.2 Urbanismo y Paisajismo		286	13-Apr-21	06-Jun-22
P-5860	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar(UBICACIÓN GENERAL,PLAN DE DI	136	13-Apr-21	28-Oct-21
P-13980	90% elaboracion y entrega de detalle((SECCIONES TRANSVERSALES, SECCIONES	50	29-Oct-21	12-Jan-22
P-13990	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Oct-21	29-Nov-21
P-17510	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	30-Nov-21	14-Dec-21
P-19200	Revisión de la interventoria R2 60%	20	15-Dec-21	12-Jan-22
P-22910	Final 100%	50	13-Jan-22	24-Mar-22
P-22920	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Jan-22	09-Feb-22
P-26570	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Feb-22	23-Feb-22
P-28730	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Feb-22	24-Mar-22
P-32590	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-37540	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Apr-22	06-May-22
P-40380	Revisión de la interventoria R2 100%	20	09-May-22	06-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.04.05.3 Redes de servicios publicos		160	23-Nov-21	13-Jul-22
P-17330	Elaboracion y entrega diseños 100% Final(Memorias de calculos, planos de redes y pla	110	23-Nov-21	29-Apr-22
P-39440	Revisión de la interventoria R1 100%	20	02-May-22	27-May-22
P-43730	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	31-May-22	13-Jun-22
P-45950	Revisión de la interventoria R2 100%	20	14-Jun-22	13-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.04.06 WF5(K16+374 - K19+830)		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.04.06.1 Adecuación malla vial - Calzada Mixta & BRT		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-5870	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar(PLANO GENERAL,NIVELES DE PAV	220	13-Apr-21	01-Mar-22
P-29140	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle(PLANO PERFIL ,SECCIONES)	98	02-Mar-22	25-Jul-22
P-29150	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-33680	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	31-Mar-22	13-Apr-22
P-36190	Revisión de la interventoria R2 60%	20	14-Apr-22	12-May-22
P-52820	Final 100%	60	26-Jul-22	19-Oct-22
P-52830	Revisión de la interventoria R1 90%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-60660	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Aug-22	06-Sep-22
P-63820	Revisión de la interventoria R2 90%	20	07-Sep-22	04-Oct-22
P-72610	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78490	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-81710	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.04.06.2 Urbanismo y Paisajismo		286	13-Apr-21	06-Jun-22
P-5880	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar(UBICACIÓN GENERAL,PLAN DE DI	136	13-Apr-21	28-Oct-21
P-14000	90% elaboracion y entrega de detalle((SECCIONES TRANSVERSALES, SECCIONES	50	29-Oct-21	12-Jan-22
P-14010	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Oct-21	29-Nov-21
P-17520	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	30-Nov-21	14-Dec-21
P-19210	Revisión de la interventoria R2 60%	20	15-Dec-21	12-Jan-22
P-22930	Final 100%	50	13-Jan-22	24-Mar-22
P-22940	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Jan-22	09-Feb-22
P-26580	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Feb-22	23-Feb-22
P-28740	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Feb-22	24-Mar-22
P-32600	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-37550	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Apr-22	06-May-22
P-40390	Revisión de la interventoria R2 100%	20	09-May-22	06-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.04.06.3 Redes de servicios publicos		160	30-Nov-21	21-Jul-22
P-17670	Elaboracion y entrega diseños 100% Final(Memorias de calculos, planos de redes y pla	110	30-Nov-21	06-May-22
P-40420	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-May-22	06-Jun-22
P-44140	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jun-22	20-Jun-22
P-46360	Revisión de la interventoria R2 100%	20	21-Jun-22	21-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.04.07 WF6(K19+830 - K23+864)		428	13-Apr-21	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.04.07.1 Adecuación malla vial - Calzada Mixta & BRT		428	13-Apr-21	02-Jan-23
P-6220	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar(PLANO GENERAL,NIVELES DE PAV	220	13-Apr-21	01-Mar-22
P-29510	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle(PLANO PERFIL ,SECCIONES)	98	02-Mar-22	25-Jul-22
P-29520	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-33850	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	31-Mar-22	13-Apr-22
P-36240	Revisión de la interventoria R2 60%	20	14-Apr-22	12-May-22

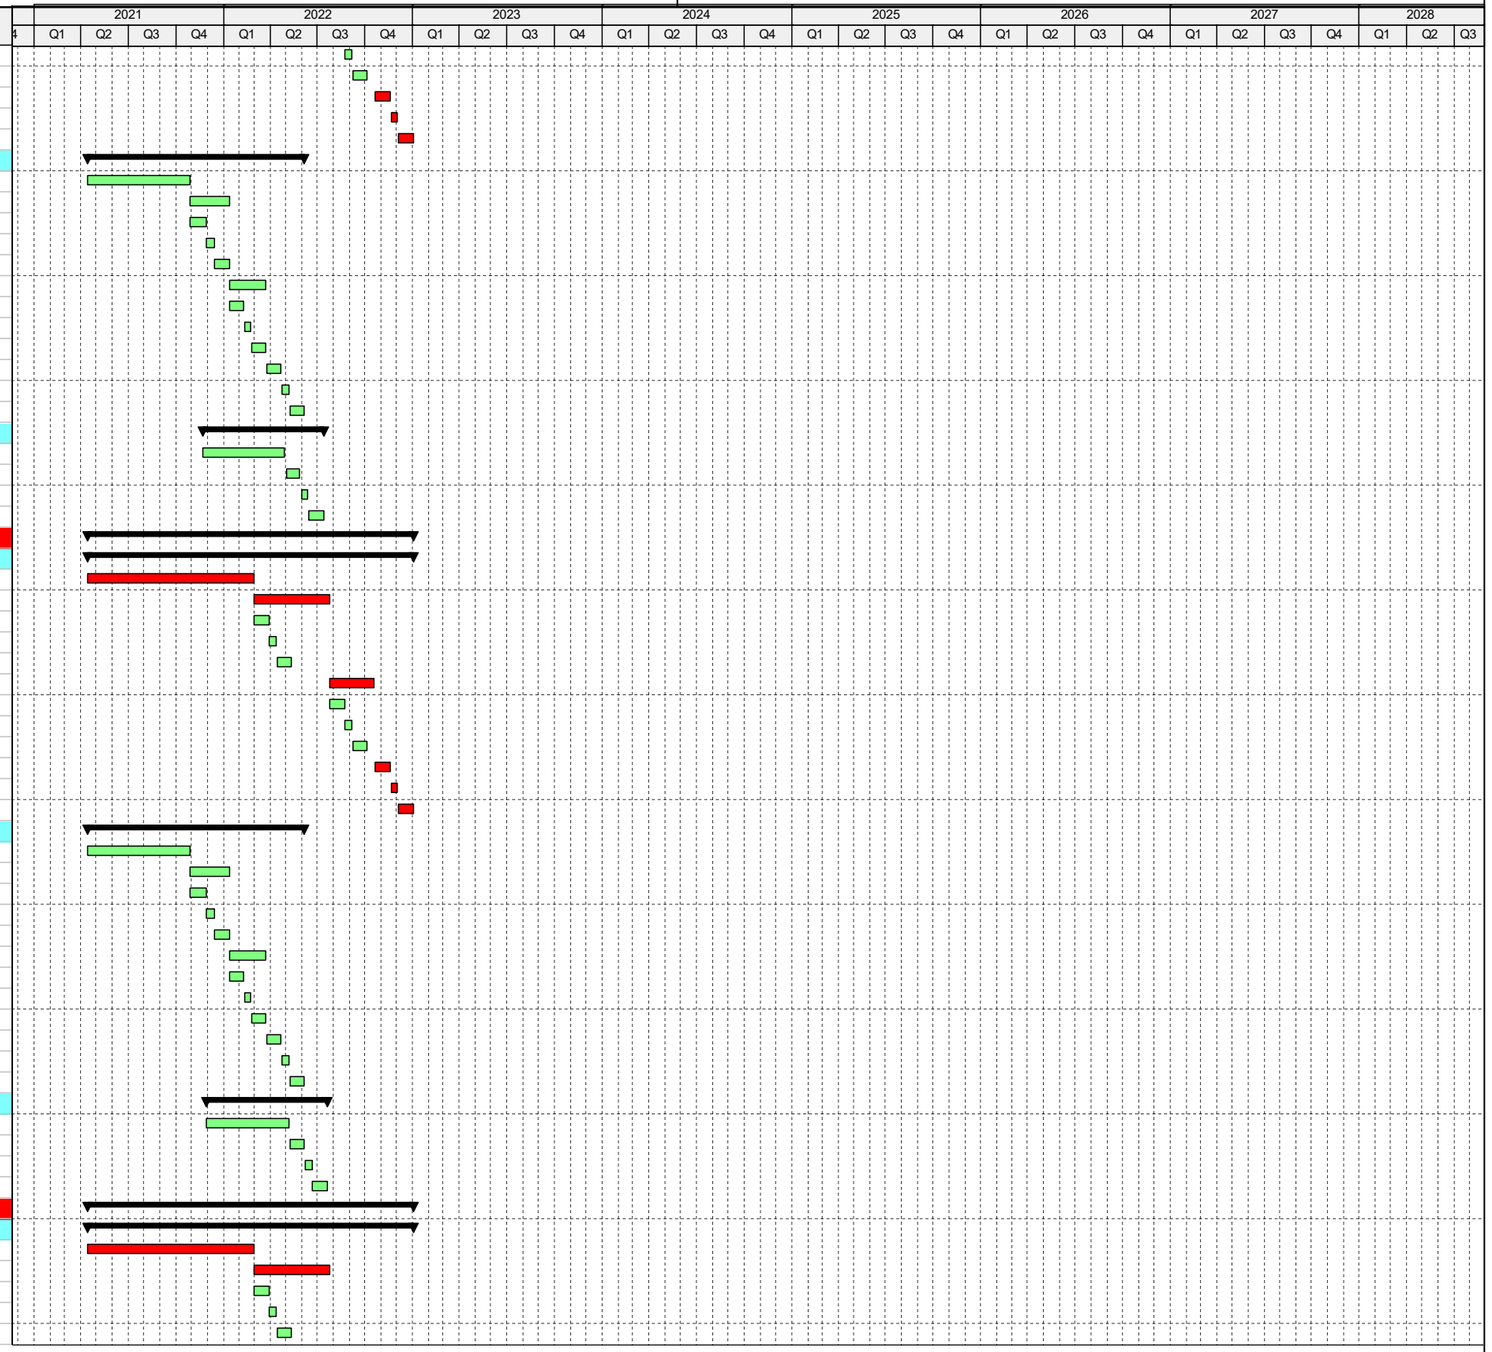


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-53330	Final 100%	60	26-Jul-22	19-Oct-22
P-53340	Revisión de la interventoria R1 90%	20	26-Jul-22	23-Aug-22
P-61240	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	24-Aug-22	06-Sep-22
P-64040	Revisión de la interventoria R2 90%	20	07-Sep-22	04-Oct-22
P-72900	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Oct-22	18-Nov-22
P-78850	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Nov-22	02-Dec-22
P-82210	Revisión de la interventoria R2 100%	20	05-Dec-22	02-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.04.07.2	**Urbanismo y Paisajismo**	286	13-Apr-21	06-Jun-22
P-6230	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar(UBICACIÓN GENERAL,PLAN DE DI	136	13-Apr-21	28-Oct-21
P-14020	90% elaboracion y entrega de detalle((SECCIONES TRANSVERSALES, SECCIONES	50	29-Oct-21	12-Jan-22
P-14030	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Oct-21	29-Nov-21
P-17660	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	30-Nov-21	14-Dec-21
P-19220	Revisión de la interventoria R2 60%	20	15-Dec-21	12-Jan-22
P-22950	Final 100%	50	13-Jan-22	24-Mar-22
P-22960	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Jan-22	09-Feb-22
P-26870	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Feb-22	23-Feb-22
P-28750	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Feb-22	24-Mar-22
P-32750	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-37560	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Apr-22	06-May-22
P-40400	Revisión de la interventoria R2 100%	20	09-May-22	06-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.04.07.3	**Redes de servicios publicos**	160	07-Dec-21	28-Jul-22
P-19030	Elaboracion y entrega diseños 100% Final(Memorias de calculos, planos de redes y pl	110	07-Dec-21	13-May-22
P-42300	Revisión de la interventoria R1 100%	20	16-May-22	13-Jun-22
P-45960	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	14-Jun-22	28-Jun-22
P-49410	Revisión de la interventoria R2 100%	20	29-Jun-22	28-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.05	**INTERSECCIONES ESPECIALES**	496	05-Jan-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.05.01	**Intersección calle 72 x Av Caracas**	147	05-Jan-21	10-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.03.05.01.0	**Datos de entrada para diseños**	84	20-Jan-21	21-May-21
P-3220	Elaboracion y entrega del diseño preliminar (LOCALIZACIÓN ,DISEÑO GEOTECNICO	24	20-Jan-21	22-Feb-21
P-3610	Revisión de la interventoria R1	20	23-Feb-21	23-Mar-21
P-4020	Atencion de comentarios de interventoria	20	24-Mar-21	22-Apr-21
P-5650	Revisión de la interventoria R2	20	23-Apr-21	21-May-21
PLMB-T1-V04.1.03.05.01.1	**Vias Publicas**	127	03-Feb-21	10-Aug-21
P-3360	60% preliminar(Planta general ,Cotas de pavimento, Perfil,Seccion de la calzada,Nivel	32	03-Feb-21	18-Mar-21
P-3930	Final 100%	45	19-Mar-21	26-May-21
P-3940	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Mar-21	20-Apr-21
P-6860	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	5	21-Apr-21	27-Apr-21
P-7800	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-May-21	25-Jun-21
P-8880	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	28-Jun-21	12-Jul-21
P-9050	Revisión de la interventoria R2 100%	20	13-Jul-21	10-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.03.05.01.2	**Deprimido**	121	03-Feb-21	02-Aug-21
P-3370	60% Preliminar(Documento técnico,Información General, notas y especificaciones,Plan	32	03-Feb-21	18-Mar-21
P-3950	Final 100%	39	19-Mar-21	18-May-21
P-3960	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Mar-21	20-Apr-21
P-6870	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	5	21-Apr-21	27-Apr-21
P-7140	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-May-21	17-Jun-21
P-8140	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Jun-21	01-Jul-21
P-8420	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Jul-21	02-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.03.05.01.3	**Drenaje**	131	20-Jan-21	02-Aug-21
P-3230	60% Preliminar(PLANTA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ALTERNATIVA)	32	20-Jan-21	04-Mar-21
P-3770	Final 100%	49	05-Mar-21	18-May-21
P-3780	Revisión de la interventoria R1 60%	20	05-Mar-21	06-Apr-21
P-5620	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	5	07-Apr-21	13-Apr-21
P-6610	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-May-21	17-Jun-21
P-7450	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Jun-21	01-Jul-21
P-7620	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Jul-21	02-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.03.05.01.4	**Redes de Servicios Publicos**	107	23-Feb-21	02-Aug-21
P-3620	Elaboracion y entrega diseños 100% Final (PLANOS RED DE ACUEDUCTO,COMBIN	57	23-Feb-21	18-May-21
P-6560	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-May-21	17-Jun-21
P-7440	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Jun-21	01-Jul-21
P-7790	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Jul-21	02-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.03.05.01.5	**Urbanismo y Paisajismo**	141	05-Jan-21	02-Aug-21




© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-2960	60% preliminar(Informe de Urbanismo,Fomato de Cantidades,Planta de diseño urbanc	34	05-Jan-21	22-Feb-21
P-3630	Final 100%	57	23-Feb-21	18-May-21
P-3640	Revisión de la interventoria R1 60%	20	23-Feb-21	23-Mar-21
P-4030	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	24-Mar-21	08-Apr-21
P-5660	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-May-21	17-Jun-21
P-7170	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Jun-21	01-Jul-21
P-7510	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Jul-21	02-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.03.05.02 Interseccion Av68 x Av. 1 mayo		391	09-Jun-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.05.02.0 Datos de entrada para diseños		264	09-Jun-21	30-Jun-22
P-8260	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (LOCALIZACIÓN ,DISEÑO GEOTECI	214	09-Jun-21	19-Apr-22
P-37300	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-Apr-22	17-May-22
P-42330	Atencion de comentarios de interventoria 60%	10	18-May-22	01-Jun-22
P-43770	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Jun-22	30-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.05.02.1 Vias Publicas		371	09-Jul-21	04-Jan-23
P-9100	60% preliminar(Planta general ,Cotas de pavimento, Perfil,Seccion de la calzada,Nivel	181	09-Jul-21	30-Mar-22
P-33580	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Seccion de la calzada)	90	31-Mar-22	10-Aug-22
P-33590	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-37750	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-40860	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-58360	Final 100%	50	11-Aug-22	21-Oct-22
P-58370	Revisión de la interventoria R1 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64140	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	09-Sep-22	22-Sep-22
P-67820	Revisión de la interventoria R2 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73210	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-79020	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	23-Nov-22	06-Dec-22
P-82390	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.05.02.2 Puente Vehicular		371	09-Jul-21	04-Jan-23
P-9110	60% Preliminar(Criterios de diseño, Documento de apoyo técnico, Lista,Perfil planta, D	181	09-Jul-21	30-Mar-22
P-33690	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (pilotes de refuerzo,Detalles del refue	90	31-Mar-22	10-Aug-22
P-33700	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-37780	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-40890	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-58380	Final 100%	50	11-Aug-22	21-Oct-22
P-58390	Revisión de la interventoria R1 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64180	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	09-Sep-22	22-Sep-22
P-67830	Revisión de la interventoria R2 90%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73220	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-79030	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	23-Nov-22	06-Dec-22
P-82400	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.05.02.3 Redes de Servicios P?blicos		160	31-Mar-22	22-Nov-22
P-35260	Elaboracion y entrega diseños 100% Final (Plan,Memorias,alternativa,Planos del proye	110	31-Mar-22	08-Sep-22
P-65590	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70620	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74450	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.05.03 Deprimido Calle 13 x Av Caracas		410	13-Apr-21	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.05.03.0 Datos de entrada para diseños		264	13-Apr-21	04-May-22
P-6550	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (LOCALIZACIÓN ,DISEÑO GEOTECI	214	13-Apr-21	21-Feb-22
P-28550	Revisión de la interventoria R1 60%	20	22-Feb-22	22-Mar-22
P-32470	Atencion de comentarios de interventoria 60%	10	23-Mar-22	05-Apr-22
P-35460	Revisión de la interventoria R2 60%	20	06-Apr-22	04-May-22
PLMB-T1-V04.1.03.05.03.1 Deprimido		293	22-Sep-21	25-Nov-22
P-11120	60% Elaboracion y entrega del diseño Preliminar(Perfil de Planta,INFORME DE DISEI	85	22-Sep-21	25-Jan-22
P-24780	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle ('Secciones Transversales)	100	26-Jan-22	17-Jun-22
P-24790	Revisión de la interventoria R1 60%	20	26-Jan-22	22-Feb-22
P-28570	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	23-Feb-22	08-Mar-22
P-30330	Revisión de la interventoria R2 60%	20	09-Mar-22	06-Apr-22
P-46230	Final 100%	58	20-Jun-22	13-Sep-22
P-46240	Revisión de la interventoria R1 90%	20	20-Jun-22	19-Jul-22
P-52220	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Jul-22	03-Aug-22
P-57740	Revisión de la interventoria R2 90%	20	04-Aug-22	01-Sep-22
P-67090	Revisión de la interventoria R1 100%	20	14-Sep-22	11-Oct-22
P-71960	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	12-Oct-22	26-Oct-22

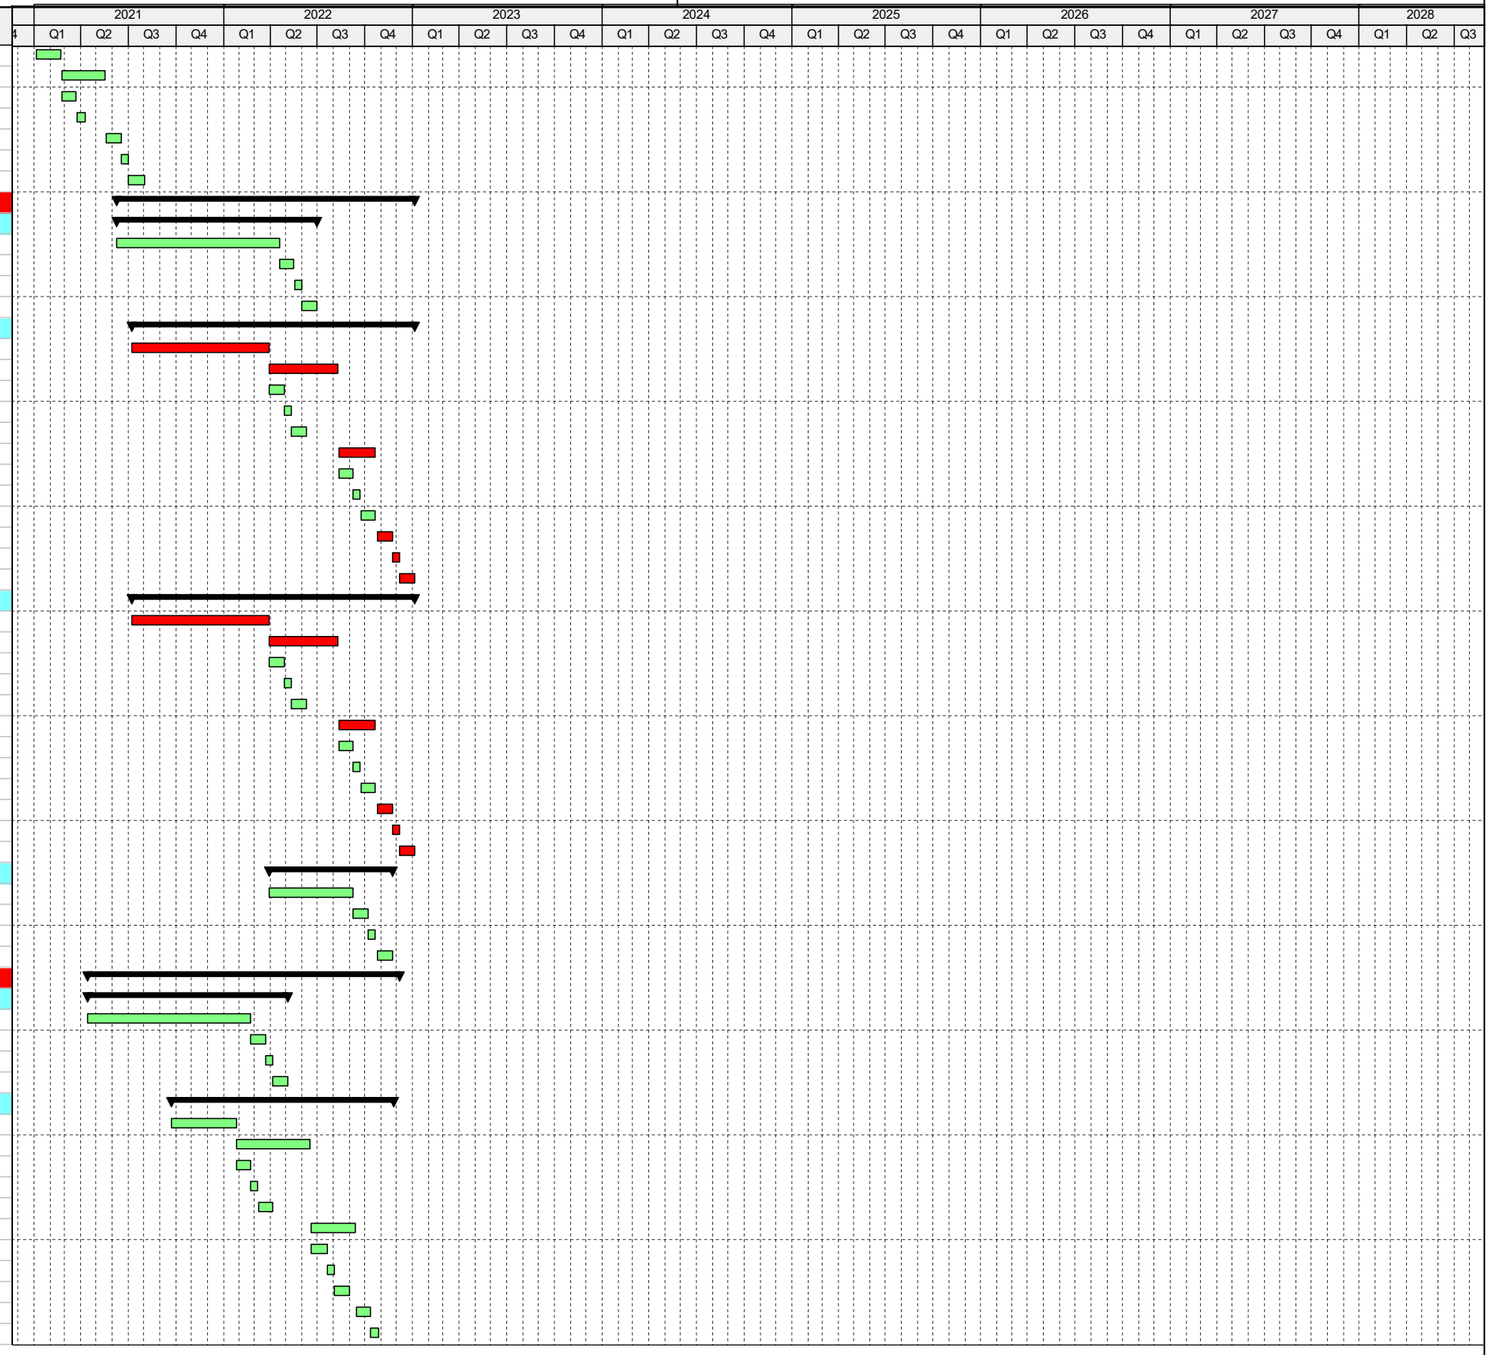

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-75130	Revisión de la interventoria R2 100%	20	27-Oct-22	25-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.05.03.2	**Sistema de Ventilación**	215	26-Jan-22	06-Dec-22
P-24800	60% Elaboracion y entrega del diseño	70	26-Jan-22	05-May-22
P-40260	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	06-May-22	19-Jul-22
P-40270	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-May-22	03-Jun-22
P-43830	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	06-Jun-22	17-Jun-22
P-46250	Revisión de la interventoria R2 60%	20	20-Jun-22	19-Jul-22
P-52230	Final 100%	50	21-Jul-22	29-Sep-22
P-52240	Revisión de la interventoria R1 90%	20	21-Jul-22	18-Aug-22
P-60450	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	19-Aug-22	01-Sep-22
P-63490	Revisión de la interventoria R2 90%	20	02-Sep-22	29-Sep-22
P-68520	Revisión de la interventoria R1 100%	20	30-Sep-22	28-Oct-22
P-75190	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	31-Oct-22	04-Nov-22
P-76220	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.05.03.3	**Sistema Contraincendios**	215	26-Jan-22	06-Dec-22
P-24810	60% Elaboracion y entrega del diseño	80	26-Jan-22	19-May-22
P-42340	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	45	20-May-22	27-Jul-22
P-42350	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-May-22	17-Jun-22
P-46260	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	5	20-Jun-22	24-Jun-22
P-47230	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-53490	Final 100%	45	28-Jul-22	29-Sep-22
P-53500	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61350	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64150	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-68530	Revisión de la interventoria R1 100%	20	30-Sep-22	28-Oct-22
P-75200	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	31-Oct-22	04-Nov-22
P-76230	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.05.03.4	**Sistema Electrico**	215	26-Jan-22	06-Dec-22
P-24820	60% Elaboracion y entrega del diseño	80	26-Jan-22	19-May-22
P-42360	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	45	20-May-22	27-Jul-22
P-42370	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-May-22	17-Jun-22
P-46270	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	5	20-Jun-22	24-Jun-22
P-47240	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-53530	Final 100%	45	28-Jul-22	29-Sep-22
P-53540	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61380	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64190	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-68540	Revisión de la interventoria R1 100%	20	30-Sep-22	28-Oct-22
P-75210	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	31-Oct-22	04-Nov-22
P-76240	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.05.03.5	**Sistemas HYS**	215	26-Jan-22	06-Dec-22
P-24830	60% Elaboracion y entrega del diseño	80	26-Jan-22	19-May-22
P-42380	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	45	20-May-22	27-Jul-22
P-42390	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-May-22	17-Jun-22
P-46280	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	5	20-Jun-22	24-Jun-22
P-47250	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-53550	Final 100%	45	28-Jul-22	29-Sep-22
P-53560	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61390	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64200	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-68550	Revisión de la interventoria R1 100%	20	30-Sep-22	28-Oct-22
P-75220	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	31-Oct-22	04-Nov-22
P-76250	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06	**ESTACIÓN DE METRO**	430	13-Apr-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.0	**Datos de entrada para diseños**	195	13-Apr-21	25-Jan-22
P-6240	60% (criterios de diseño, información general, detalles constructivos, diseño geotécnico	145	13-Apr-21	11-Nov-21
P-16430	Revisión de la interventoria R1 60%	20	12-Nov-21	13-Dec-21
P-19120	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	14-Dec-21	27-Dec-21
P-20750	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Dec-21	25-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.01	**Estación 1 (Cra 96)_Tipo_Mezzanine**	430	13-Apr-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.01.01	**Estructura de la Nave Central**	430	13-Apr-21	04-Jan-23
P-5890	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	200	13-Apr-21	01-Feb-22

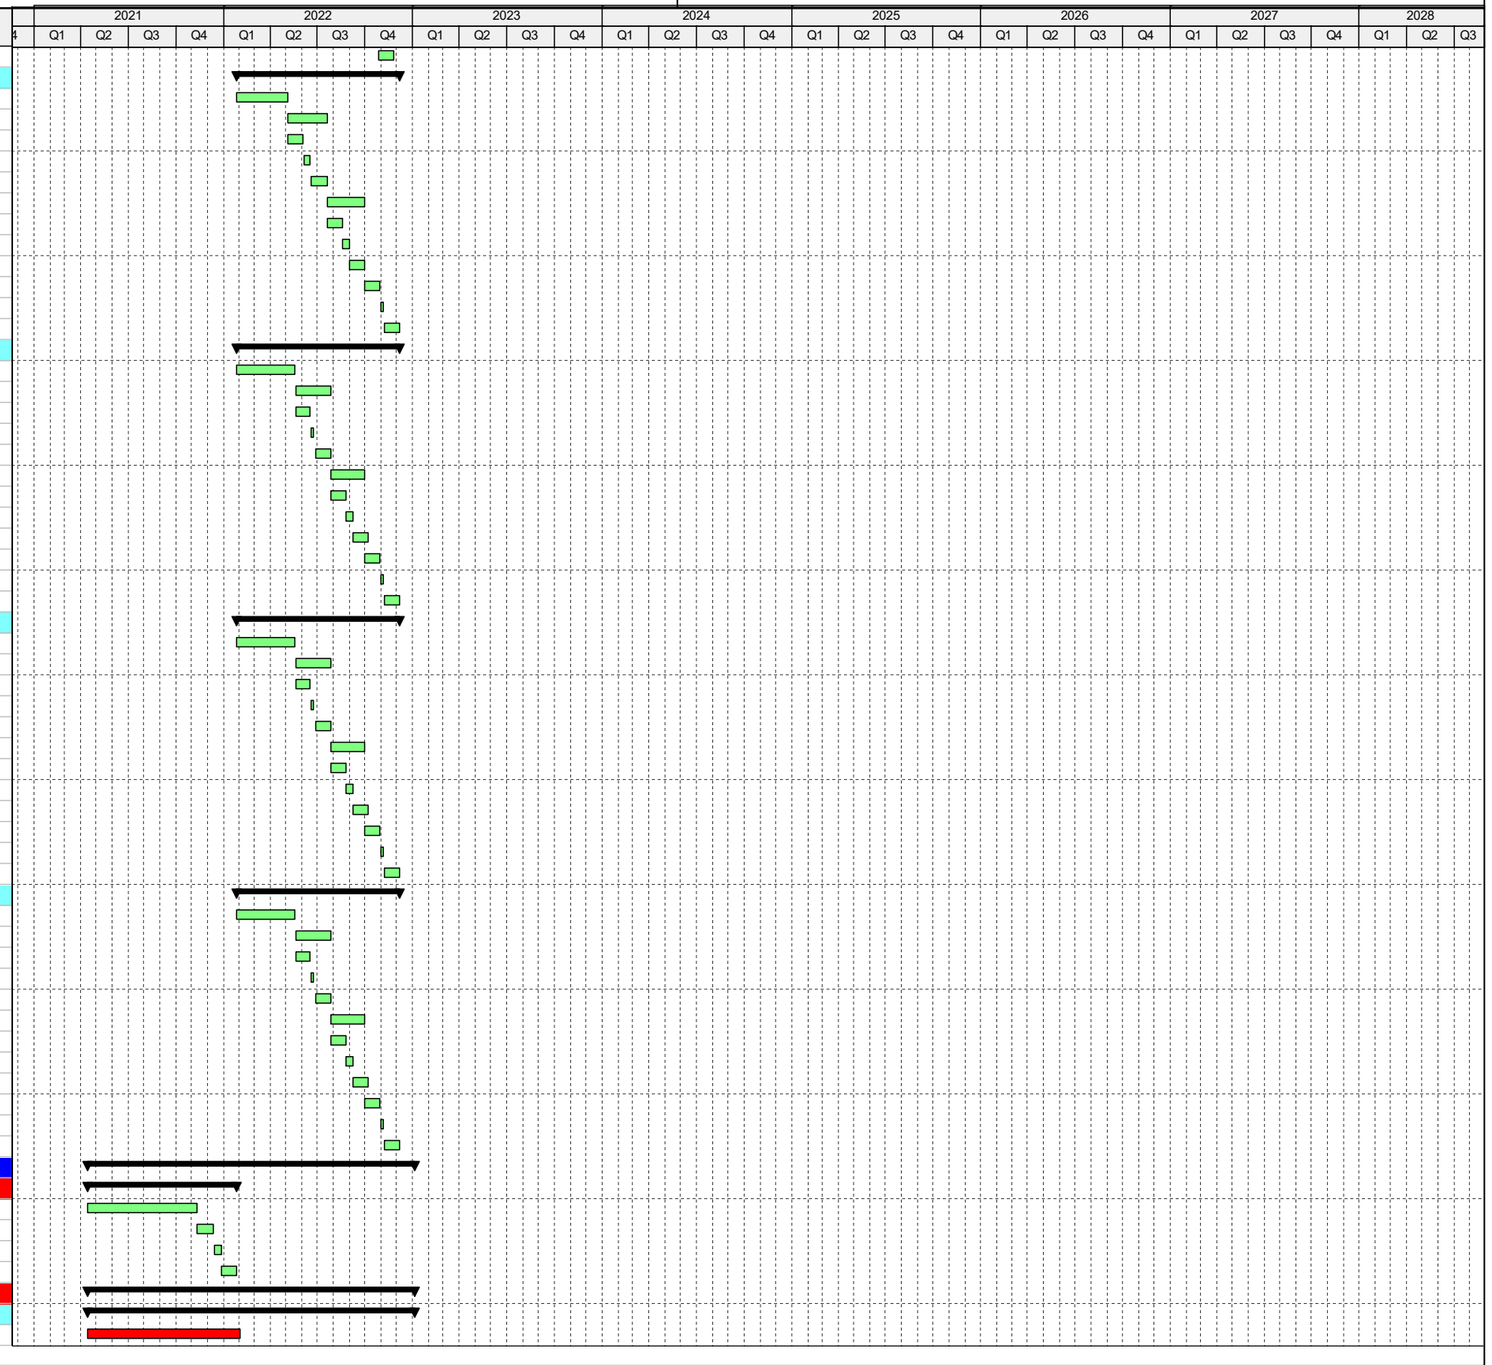


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-25350	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	02-Feb-22	27-Jul-22
P-25360	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-29160	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Mar-22	15-Mar-22
P-30910	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Mar-22	13-Apr-22
P-53570	Final 100%	60	28-Jul-22	21-Oct-22
P-53580	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61400	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64210	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-73230	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-79040	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	23-Nov-22	06-Dec-22
P-82410	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.01.02 Nave Central Diseño Arquitectonico		336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-5900	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21
P-11180	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11190	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21
P-13700	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16250	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-26590	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-26600	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30400	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32610	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-43970	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50080	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52300	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.01.03 MEP Nave Central		220	02-Feb-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.01.03.1 Escaleras Electromecanicas		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25370	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-37790	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-37800	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-42710	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-44910	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-53590	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-53600	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61410	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64220	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69350	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76260	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79050	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.01.03.2 Ascensores		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25380	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-37810	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-37820	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-42720	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-44920	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-53610	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-53620	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61420	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64230	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69360	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76270	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79060	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.01.03.3 Sistema de Ventilación		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25390	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-37830	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-37840	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-42730	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-44930	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-53630	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-53640	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61430	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64240	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69370	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22

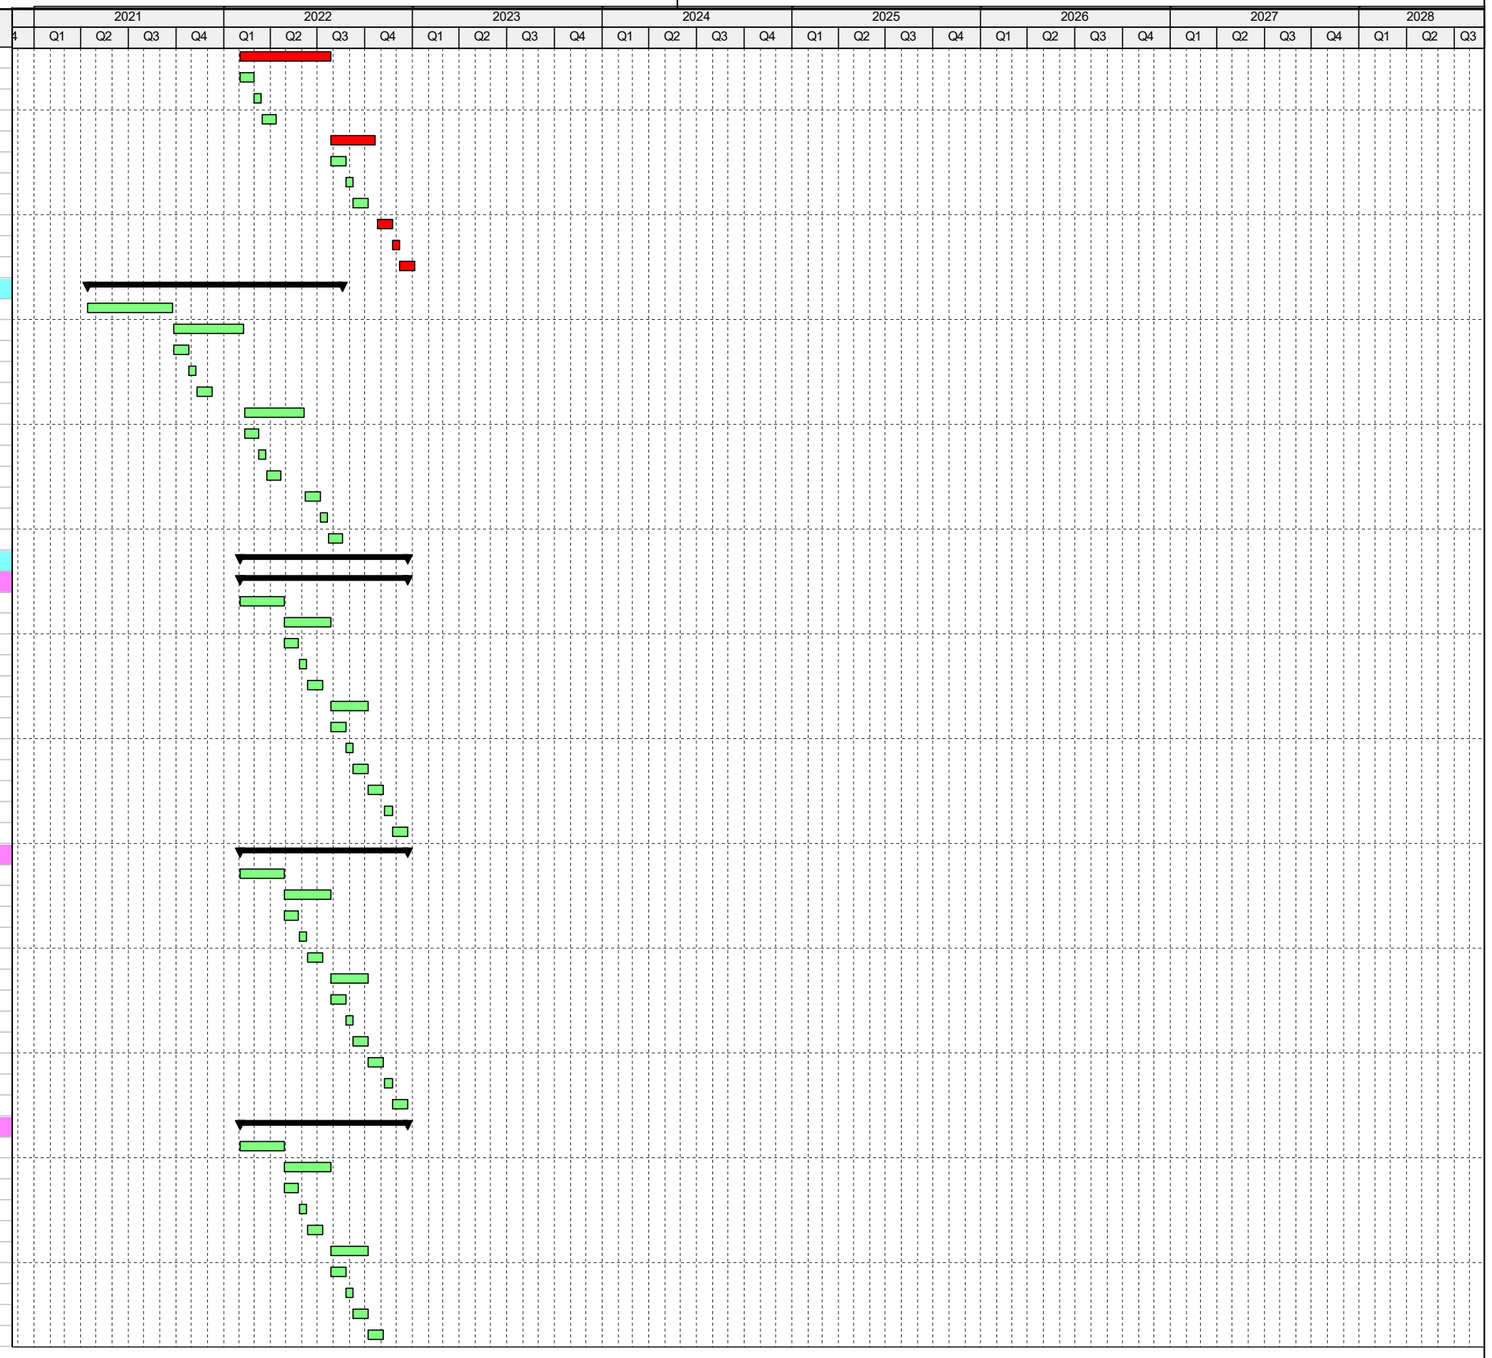


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-76280	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79070	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.01.03.4	**Sistema Contraincendios**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25400	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-37850	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-37860	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-42740	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-44940	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-53650	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-53660	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61440	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64250	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69380	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76290	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79080	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.01.03.5	**Sistemas Electricos**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25410	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-37870	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-37880	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-42750	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-44950	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-53670	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-53680	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61450	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64260	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69390	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76300	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79090	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.01.03.6	**Sistemas HYS**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25420	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-37890	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-37900	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-42760	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-44960	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-53690	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-53700	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61460	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64270	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69400	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76310	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79100	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.01.03.7	**Sistemas SYC**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25430	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-37910	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-37920	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-42770	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-44970	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-53710	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-53720	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61470	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64280	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69410	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76320	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79110	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.02	**Estación 2 (Portal Americas)_Tipo_Mezzanine**	430	13-Apr-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.02.01	**Estructura de la Nave Central**	430	13-Apr-21	04-Jan-23
P-6250	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	200	13-Apr-21	01-Feb-22
P-25640	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	02-Feb-22	27-Jul-22
P-25650	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-29530	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Mar-22	15-Mar-22
P-30960	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Mar-22	13-Apr-22
P-53840	Final 100%	60	28-Jul-22	21-Oct-22

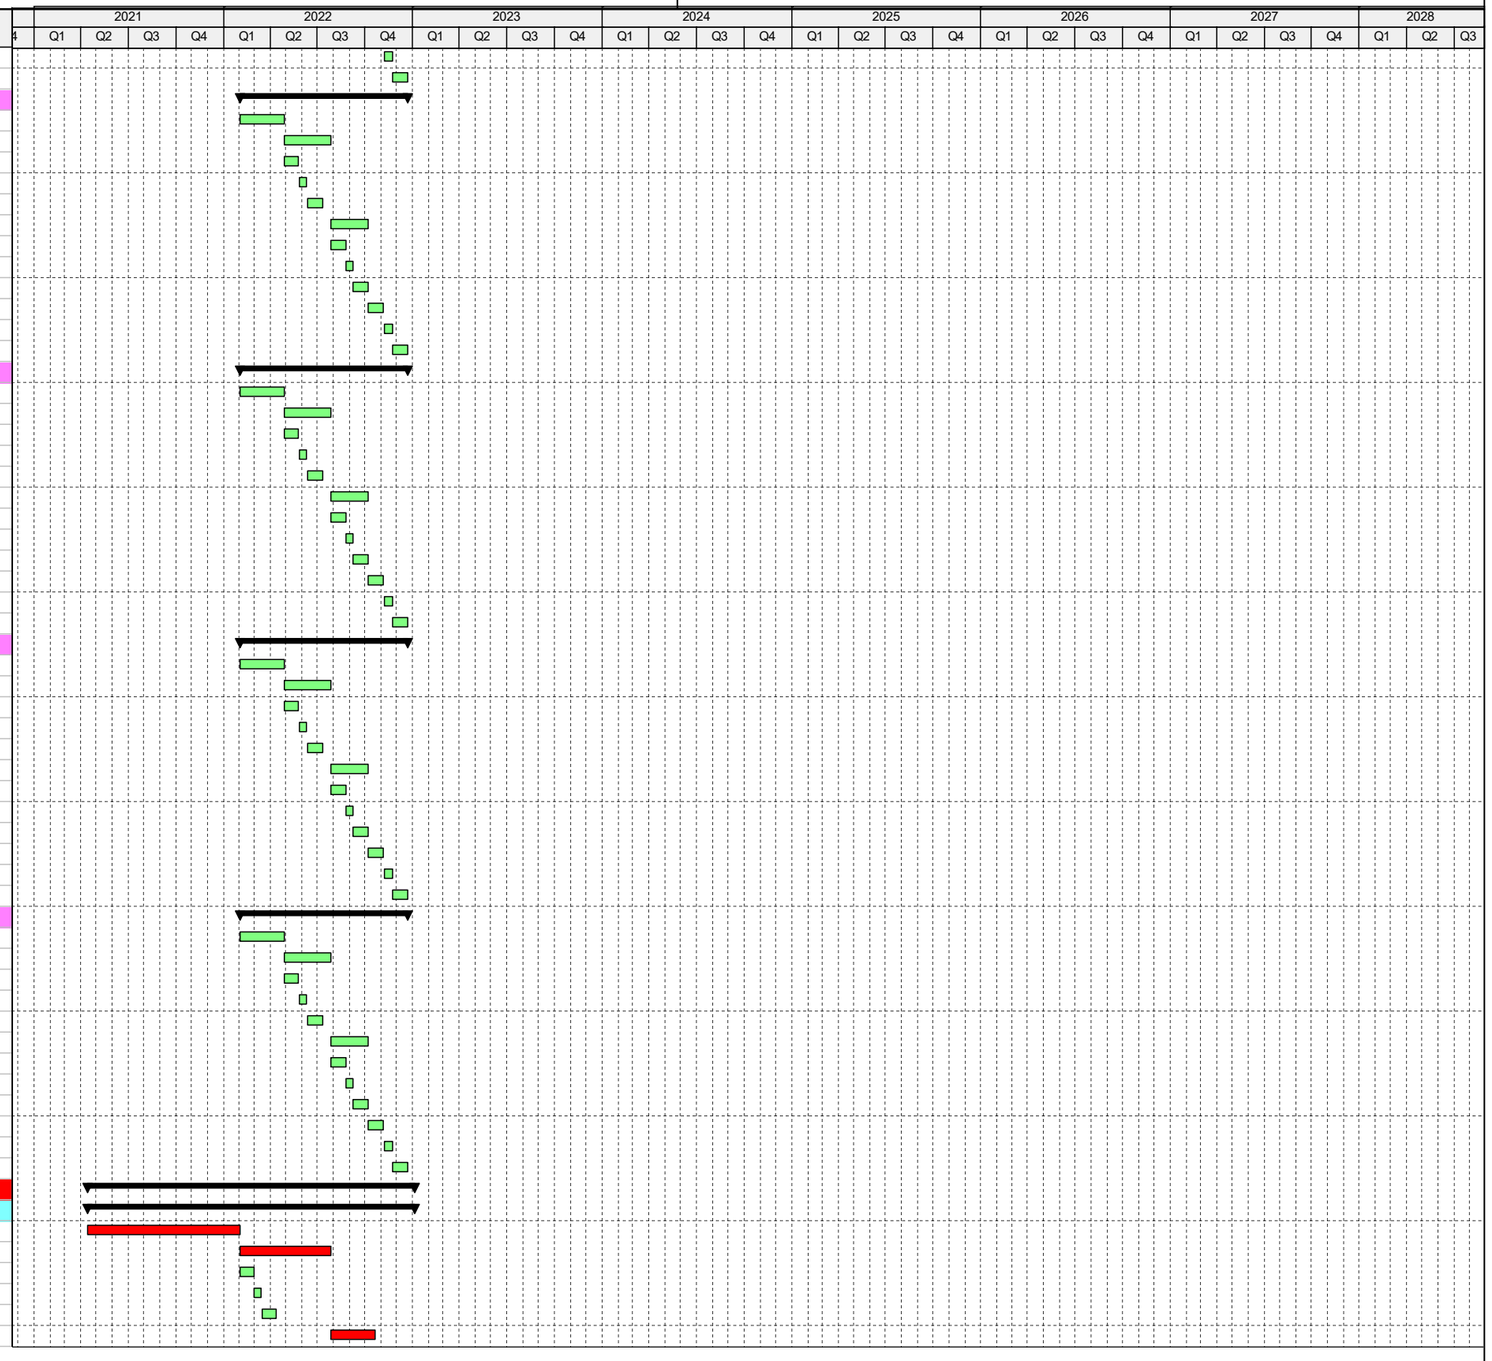

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-53850	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61620	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64490	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-73600	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-79150	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	23-Nov-22	06-Dec-22
P-82450	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.02.02 Nave Central Diseño Arquitectonico		336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-6260	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21
P-11200	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11210	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21
P-13710	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16260	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-26880	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-26890	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30540	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32760	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-43980	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50090	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52370	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.02.03 MEP Nave Central		220	02-Feb-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.02.03.1 Escaleras Electromecanicas		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25660	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-37980	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-37990	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43140	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45240	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-53860	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-53870	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61630	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64500	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69570	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76550	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79160	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.02.03.2 Ascensores		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25670	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38000	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38010	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43150	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45250	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-53880	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-53890	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61640	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64510	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69580	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76560	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79170	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.02.03.3 Sistema de Ventilación		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25680	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38020	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38030	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43160	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45260	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-53900	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-53910	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61650	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64520	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69590	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76570	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79180	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.02.03.4 Sistema Contraincendios		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25690	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38040	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22

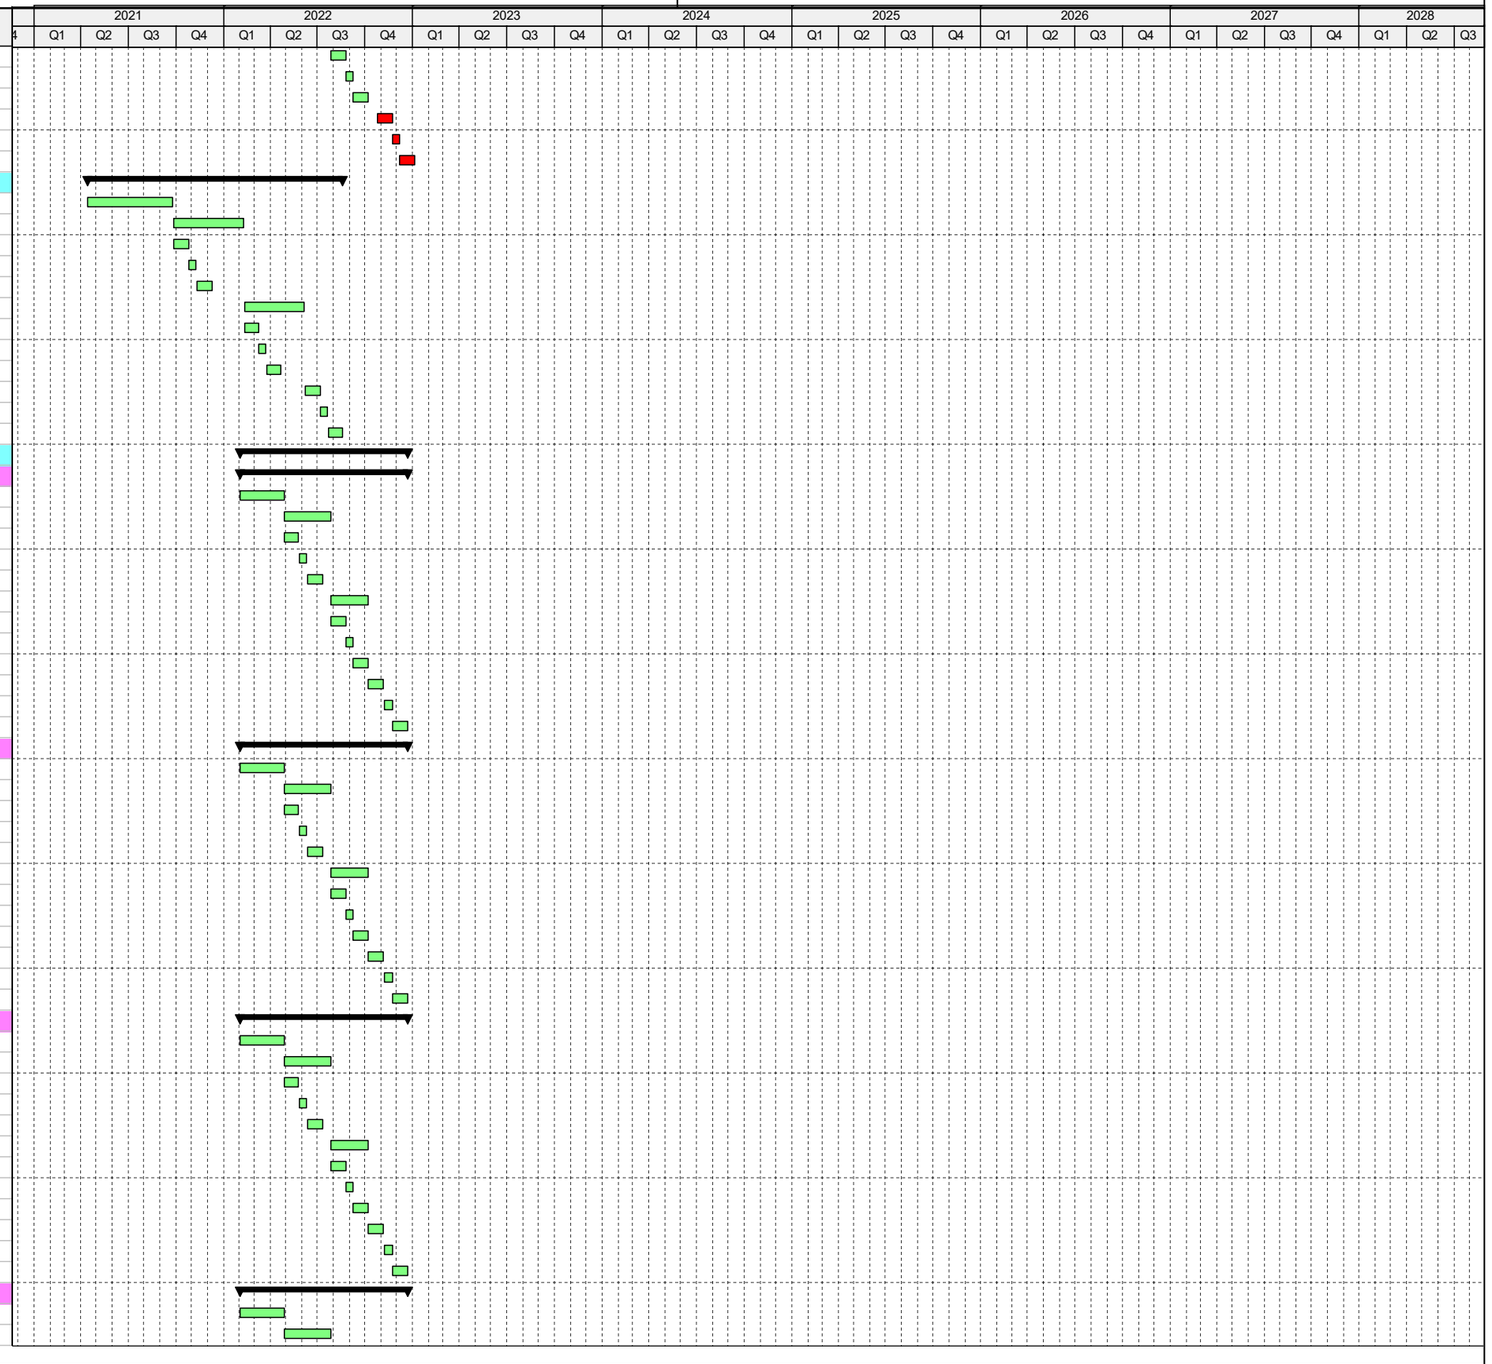

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-38050	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43170	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45270	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-53920	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-53930	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61660	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64530	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69600	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76580	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79190	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.02.03.5 Sistemas Electricos		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25700	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38060	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38070	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43180	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45280	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-53940	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-53950	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61670	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64540	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69610	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76590	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79200	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.02.03.6 Sistemas HYS		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25710	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38080	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38090	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43190	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45290	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-53960	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-53970	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61680	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64550	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69620	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76600	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79210	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.02.03.7 Sistemas SYC		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25720	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38100	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38110	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43200	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45300	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-53980	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-53990	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61690	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64560	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69630	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76610	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79220	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.03 Estación 3 (Cra 80)_Type simple		410	13-Apr-21	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.03.01 Estructura de la Nave Central		410	13-Apr-21	06-Dec-22
P-6270	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	180	13-Apr-21	03-Jan-22
P-21580	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	04-Jan-22	24-Jun-22
P-21590	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Jan-22	01-Feb-22
P-25730	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Feb-22	15-Feb-22
P-28200	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Feb-22	15-Mar-22
P-47620	Final 100%	60	28-Jun-22	22-Sep-22
P-47630	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54000	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58510	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-68130	Revisión de la interventoria R1 100%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73610	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Oct-22	04-Nov-22




Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-76620	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.03.02	**Nave Central Diseño Arquitectonico**	336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-6280	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21
P-11220	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11230	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21
P-13720	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16270	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-26900	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-26910	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30550	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32770	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-43990	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50100	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52380	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.03.03	**MEP Nave Central**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.03.03.1	**Escaleras Electromecanicas**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21600	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-33860	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-33870	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38120	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41310	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47640	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47650	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54010	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58520	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64570	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69640	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73620	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.03.03.2	**Ascensores**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21610	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-33880	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-33890	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38130	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41320	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47660	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47670	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54020	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58530	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64580	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69650	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73630	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.03.03.3	**Sistema de Ventilación**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21620	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-33900	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-33910	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38140	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41330	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47680	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47690	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54030	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58540	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64590	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69660	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73640	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.03.03.4	**Sistema Contraincendios**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21630	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-33920	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-33930	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38150	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41340	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47700	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47710	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22

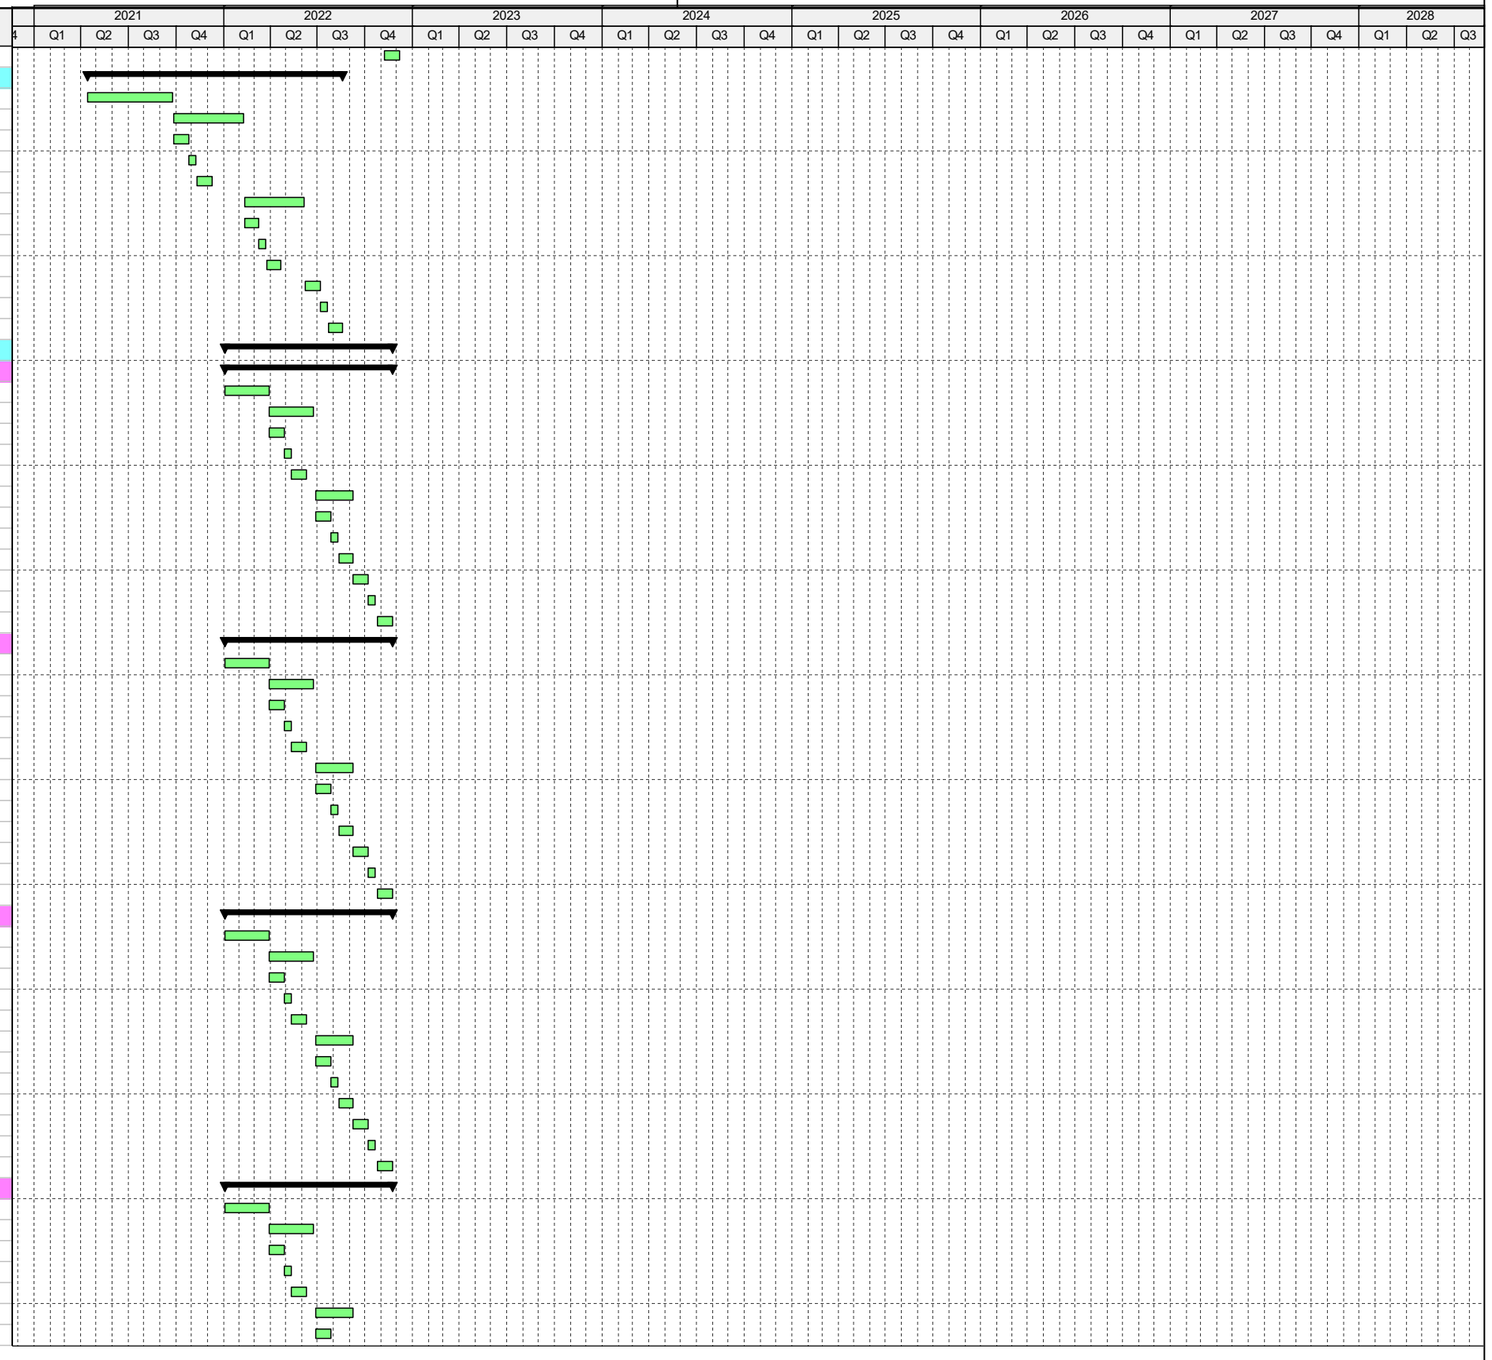


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-54040	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58550	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64600	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69670	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73650	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.03.03.5 Sistemas Electricos		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21640	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-33940	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-33950	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38160	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41350	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47720	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47730	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54050	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58560	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64610	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69680	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73660	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.03.03.6 Sistemas HYS		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21650	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-33960	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-33970	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38170	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41360	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47740	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47750	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54060	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58570	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64620	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69690	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73670	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.03.03.7 Sistemas SYC		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21660	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-33980	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-33990	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38180	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41370	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47760	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47770	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54070	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58580	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64630	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69700	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73680	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.04 Estación 4 (Calle 42S)_Type simple		410	13-Apr-21	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.04.01 Estructura de la Nave Central		410	13-Apr-21	06-Dec-22
P-6290	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	180	13-Apr-21	03-Jan-22
P-21670	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	04-Jan-22	24-Jun-22
P-21680	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Jan-22	01-Feb-22
P-25740	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Feb-22	15-Feb-22
P-28210	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Feb-22	15-Mar-22
P-47780	Final 100%	60	28-Jun-22	22-Sep-22
P-47790	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54080	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58590	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-68140	Revisión de la interventoria R1 100%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73690	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-76630	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.04.02 Nave Central Diseño Arquitectonico		336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-6300	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21
P-11240	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11250	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21

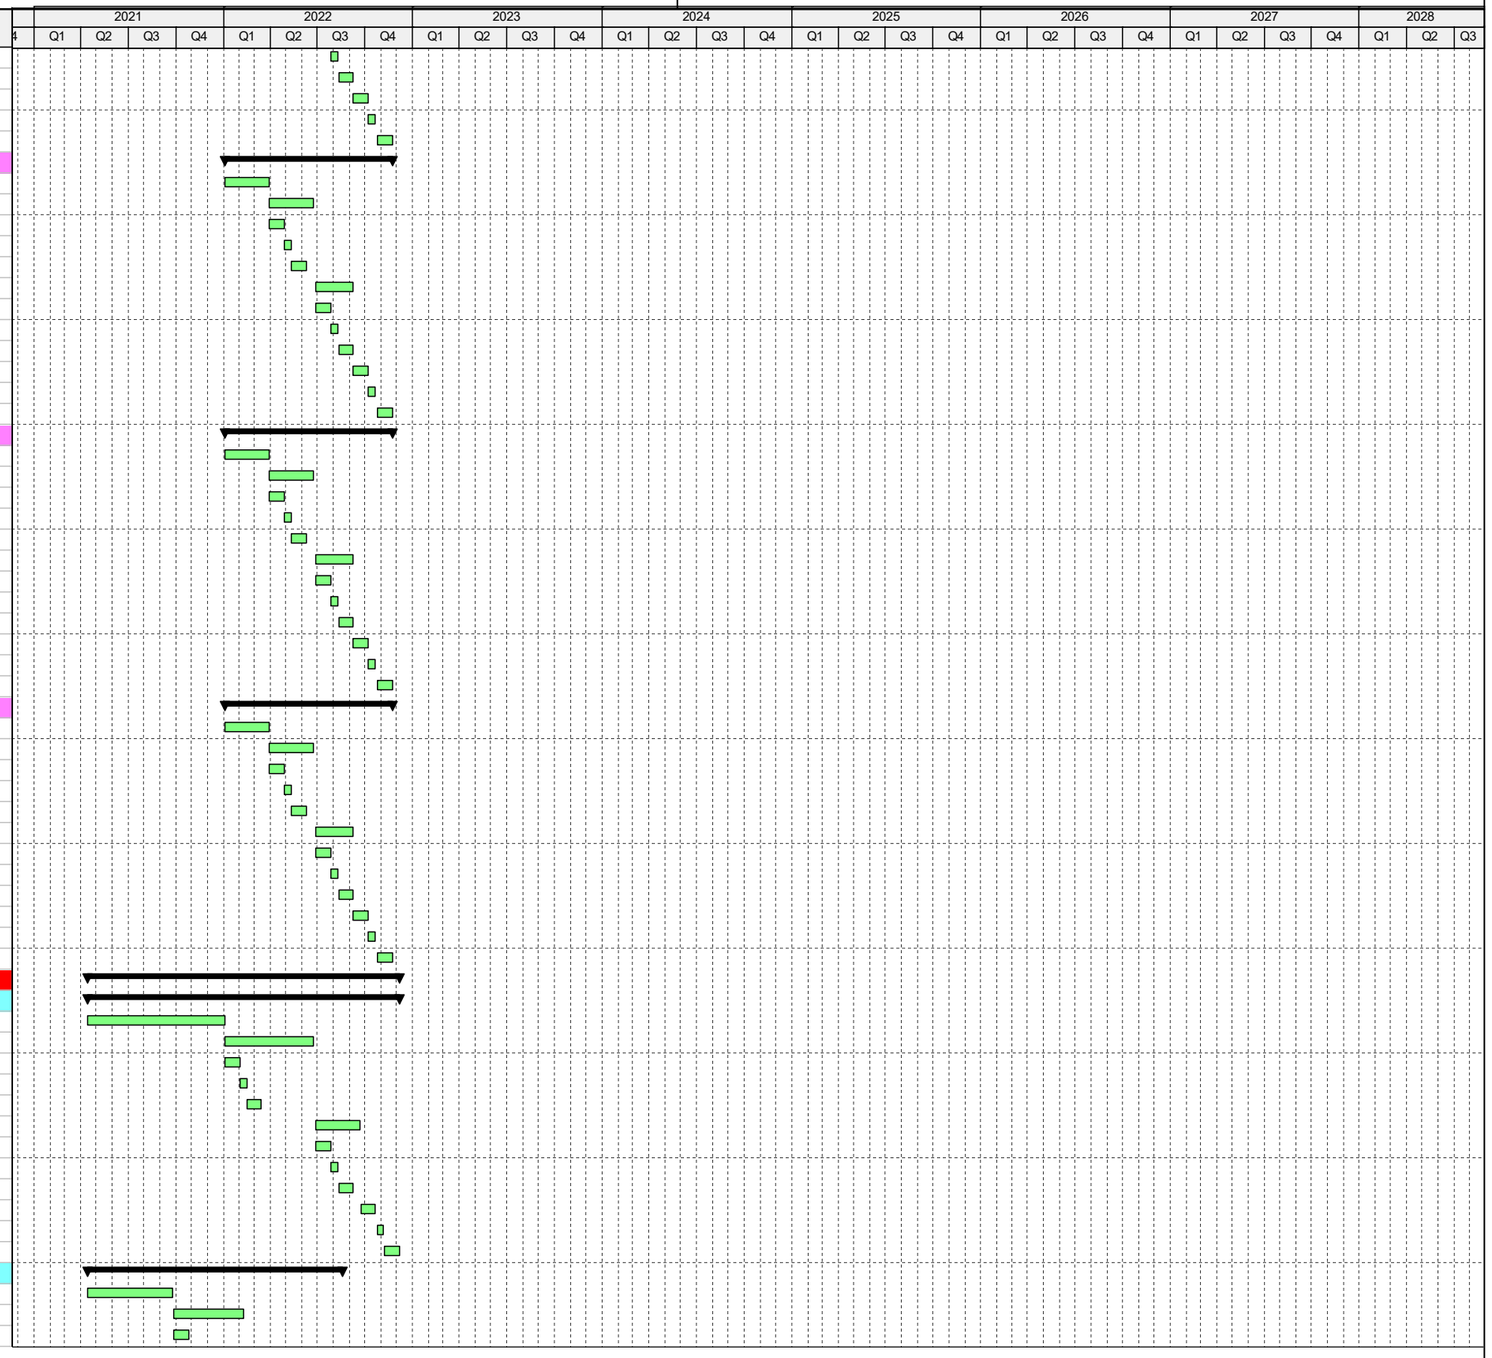

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-13730	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16280	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-26920	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-26930	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30560	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32780	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-44000	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50110	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52390	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.04.03 MEP Nave Central		220	04-Jan-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.04.03.1 Escaleras Electromecanicas		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21690	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34000	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34010	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38190	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41380	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47800	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47810	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54090	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58600	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64640	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69710	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73700	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.04.03.2 Ascensores		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21700	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34020	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34030	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38200	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41390	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47820	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47830	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54100	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58610	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64650	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69720	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73710	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.04.03.3 Sistema de Ventilación		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21710	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34040	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34050	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38210	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41400	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47840	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47850	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54110	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58620	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64660	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69730	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73720	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.04.03.4 Sistema Contraincendios		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21720	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34060	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34070	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38220	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41410	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47860	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47870	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54120	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58630	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64670	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69740	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73730	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22

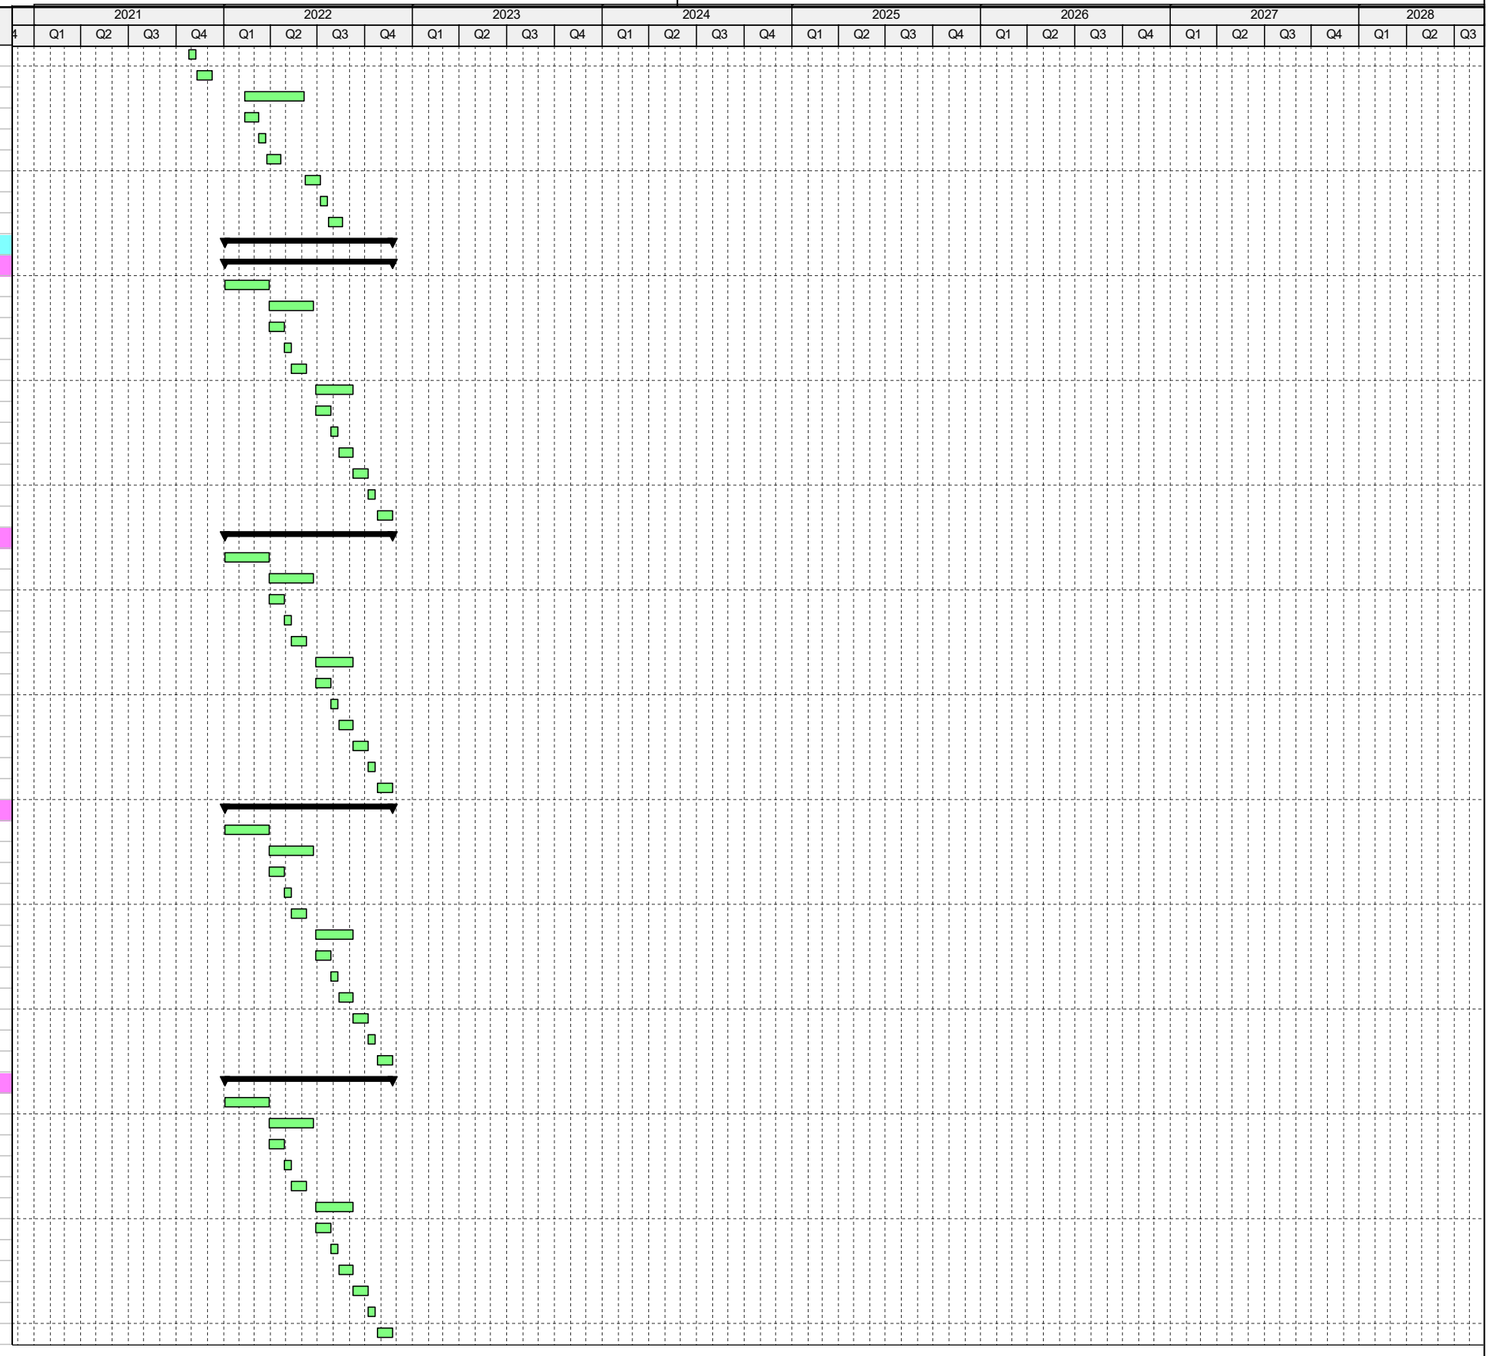


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.1.03.06.04.03.5	**Sistemas Electricos**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21730	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34080	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34090	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38230	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41420	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47880	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47890	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54130	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58640	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64680	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69750	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73740	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.04.03.6	**Sistemas HYS**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21740	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34100	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34110	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38240	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41430	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47900	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47910	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54140	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58650	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64690	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69760	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73750	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.04.03.7	**Sistemas SYC**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21750	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34120	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34130	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38250	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41440	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47920	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47930	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54150	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58660	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64700	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69770	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73760	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.05	**Estación 5 (Kennedy)_Tipo simple**	410	13-Apr-21	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.05.01	**Estructura de la Nave Central**	410	13-Apr-21	06-Dec-22
P-6310	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	180	13-Apr-21	03-Jan-22
P-21760	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	04-Jan-22	24-Jun-22
P-21770	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Jan-22	01-Feb-22
P-25750	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Feb-22	15-Feb-22
P-28220	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Feb-22	15-Mar-22
P-47940	Final 100%	60	28-Jun-22	22-Sep-22
P-47950	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54160	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58670	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-68150	Revisión de la interventoria R1 100%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73770	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-76640	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.05.02	**Nave Central Diseño Arquitectonico**	336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-6320	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21
P-11260	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11270	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21
P-13740	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16290	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-26940	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-26950	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30570	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-32790	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-44010	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50120	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52400	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.05.03 MEP Nave Central		220	04-Jan-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.05.03.1 Escaleras Electromecanicas		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21780	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34140	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34150	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38260	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41450	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47960	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47970	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54170	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58680	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64710	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69780	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73780	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.05.03.2 Ascensores		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21790	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34160	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34170	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38270	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41460	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-47980	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-47990	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54180	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58690	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64720	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69790	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73790	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.05.03.3 Sistema de Ventilación		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21800	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34180	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34190	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38280	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41470	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48000	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48010	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54190	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58700	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64730	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69800	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73800	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.05.03.4 Sistema Contraincendios		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21810	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34200	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34210	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38290	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41480	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48020	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48030	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54200	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58710	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64740	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69810	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73810	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.05.03.5 Sistemas Electricos		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21820	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34220	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34230	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38300	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22

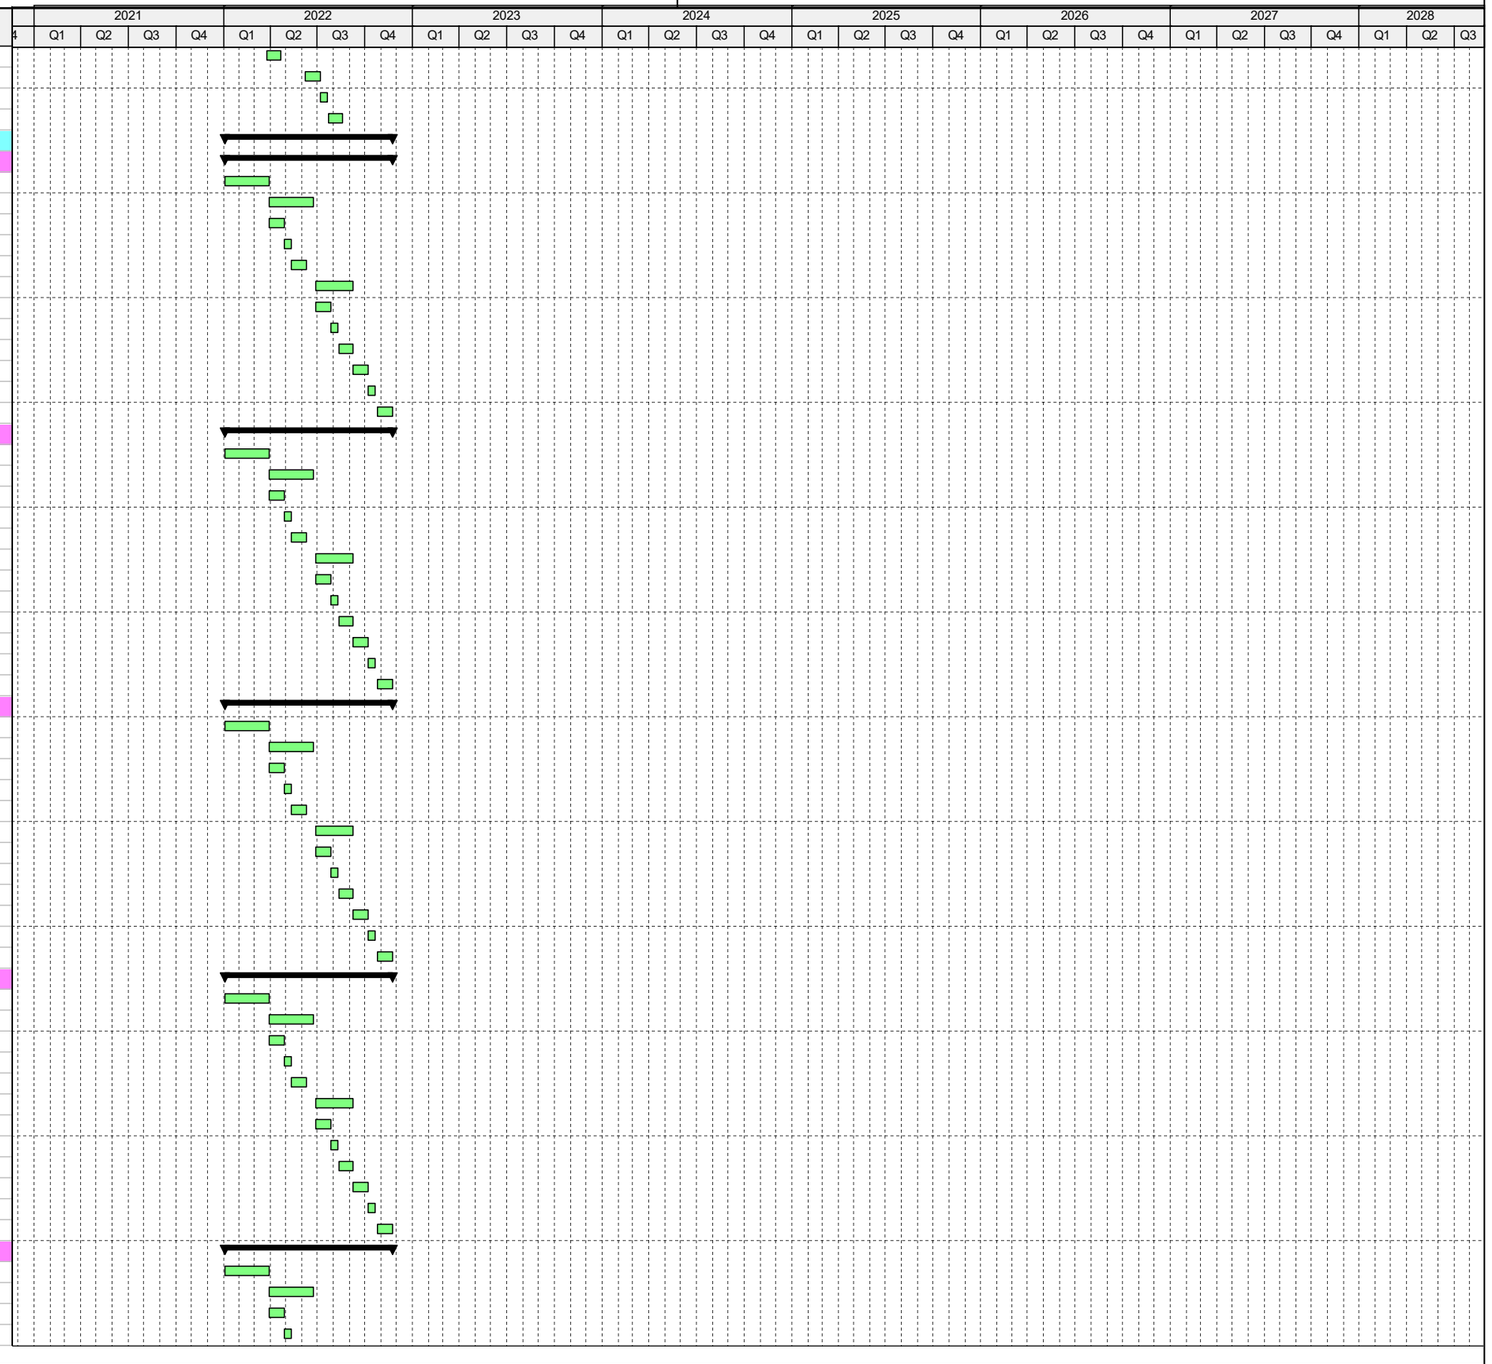

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-41490	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48040	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48050	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54210	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58720	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64750	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69820	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73820	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.05.03.6 Sistemas HYS		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21830	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34240	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34250	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38310	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41500	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48060	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48070	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54220	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58730	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64760	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69830	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73830	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.05.03.7 Sistemas SYC		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21840	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34260	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34270	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38320	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41510	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48080	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48090	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54230	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58740	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64770	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69840	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73840	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.06 Estación 6 (Av. Boyaca)_Tipo_Mezzanine		430	13-Apr-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.06.01 Estructura de la Nave Central		430	13-Apr-21	04-Jan-23
P-6330	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	200	13-Apr-21	01-Feb-22
P-25760	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	02-Feb-22	27-Jul-22
P-25770	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-29540	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Mar-22	15-Mar-22
P-30970	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Mar-22	13-Apr-22
P-54240	Final 100%	60	28-Jul-22	21-Oct-22
P-54250	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61700	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64780	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-73850	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-79230	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	23-Nov-22	06-Dec-22
P-82460	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.06.02 Nave Central Diseño Arquitectonico		336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-6340	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21
P-11280	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11290	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21
P-13750	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16300	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-26960	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-26970	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30580	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32800	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-44020	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50130	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52410	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.06.03 MEP Nave Central		220	02-Feb-22	21-Dec-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.1.03.06.06.03.1	**Escaleras Electromecanicas**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25780	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38330	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38340	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43210	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45310	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-54260	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-54270	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61710	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64790	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69850	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76650	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79240	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.06.03.2	**Ascensores**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25790	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38350	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38360	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43220	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45320	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-54280	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-54290	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61720	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64800	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69860	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76660	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79250	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.06.03.3	**Sistema de Ventilación**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25800	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38370	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38380	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43230	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45330	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-54300	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-54310	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61730	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64810	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69870	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76670	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79260	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.06.03.4	**Sistema Contraincendios**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25810	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38390	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38400	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43240	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45340	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-54320	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-54330	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61740	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64820	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69880	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76680	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79270	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.06.03.5	**Sistemas Electricos**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25820	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38410	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38420	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43250	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45350	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-54340	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-54350	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61750	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64830	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22

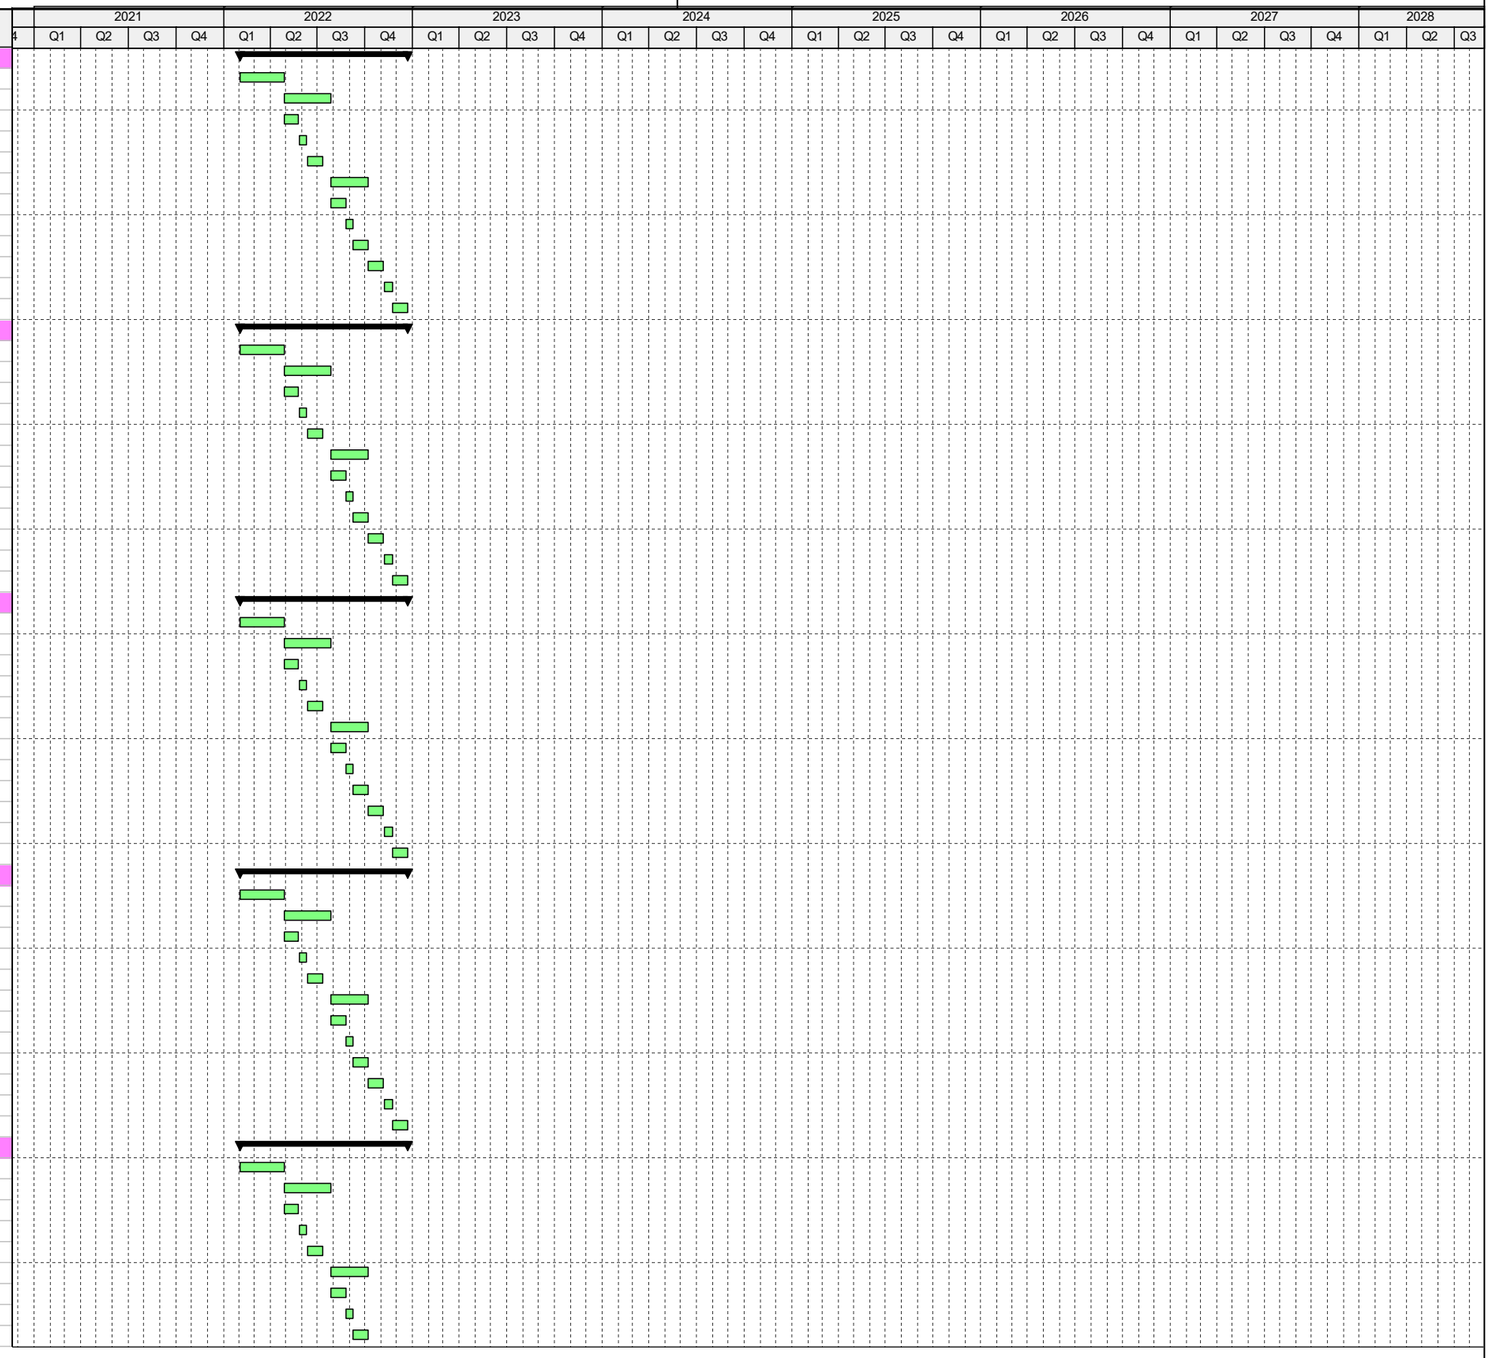

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-69890	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76690	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79280	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.06.03.6	**Sistemas HYS**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25830	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38430	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38440	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43260	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45360	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-54360	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-54370	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61760	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64840	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69900	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76700	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79290	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.06.03.7	**Sistemas SYC**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25840	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38450	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38460	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43270	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45370	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-54380	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-54390	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61770	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64850	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69910	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76710	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79300	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.07	**Estación 7 (Av. 68)_Tipo_ Especial**	410	13-Apr-21	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.07.01	**Estructura de la Nave Central**	410	13-Apr-21	06-Dec-22
P-6350	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	180	13-Apr-21	03-Jan-22
P-21850	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	04-Jan-22	24-Jun-22
P-21860	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Jan-22	01-Feb-22
P-25850	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Feb-22	15-Feb-22
P-28230	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Feb-22	15-Mar-22
P-48100	Final 100%	60	28-Jun-22	22-Sep-22
P-48110	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54400	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58750	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-68160	Revisión de la interventoria R1 100%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73860	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-76720	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.07.02	**Nave Central Diseño Arquitectonico**	336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-6360	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21
P-11300	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11310	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21
P-13760	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16310	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-26980	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-26990	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30590	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32810	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-44030	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50140	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52420	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.07.03	**MEP Nave Central**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.07.03.1	**Escaleras Electromecanicas**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21870	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34280	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34290	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38470	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-41520	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48120	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48130	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54410	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58760	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64860	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69920	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73870	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.07.03.2 Ascensores		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21880	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34300	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34310	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38480	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41530	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48140	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48150	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54420	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58770	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64870	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69930	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73880	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.07.03.3 Sistema de Ventilación		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21890	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34320	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34330	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38490	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41540	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48160	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48170	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54430	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58780	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64880	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69940	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73890	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.07.03.4 Sistema Contraincendios		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21900	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34340	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34350	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38500	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41550	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48180	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48190	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54440	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58790	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64890	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69950	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73900	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.07.03.5 Sistemas Electricos		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21910	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34360	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34370	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38510	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41560	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48200	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48210	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54450	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58800	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64900	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69960	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73910	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.07.03.6 Sistemas HYS		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21920	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22

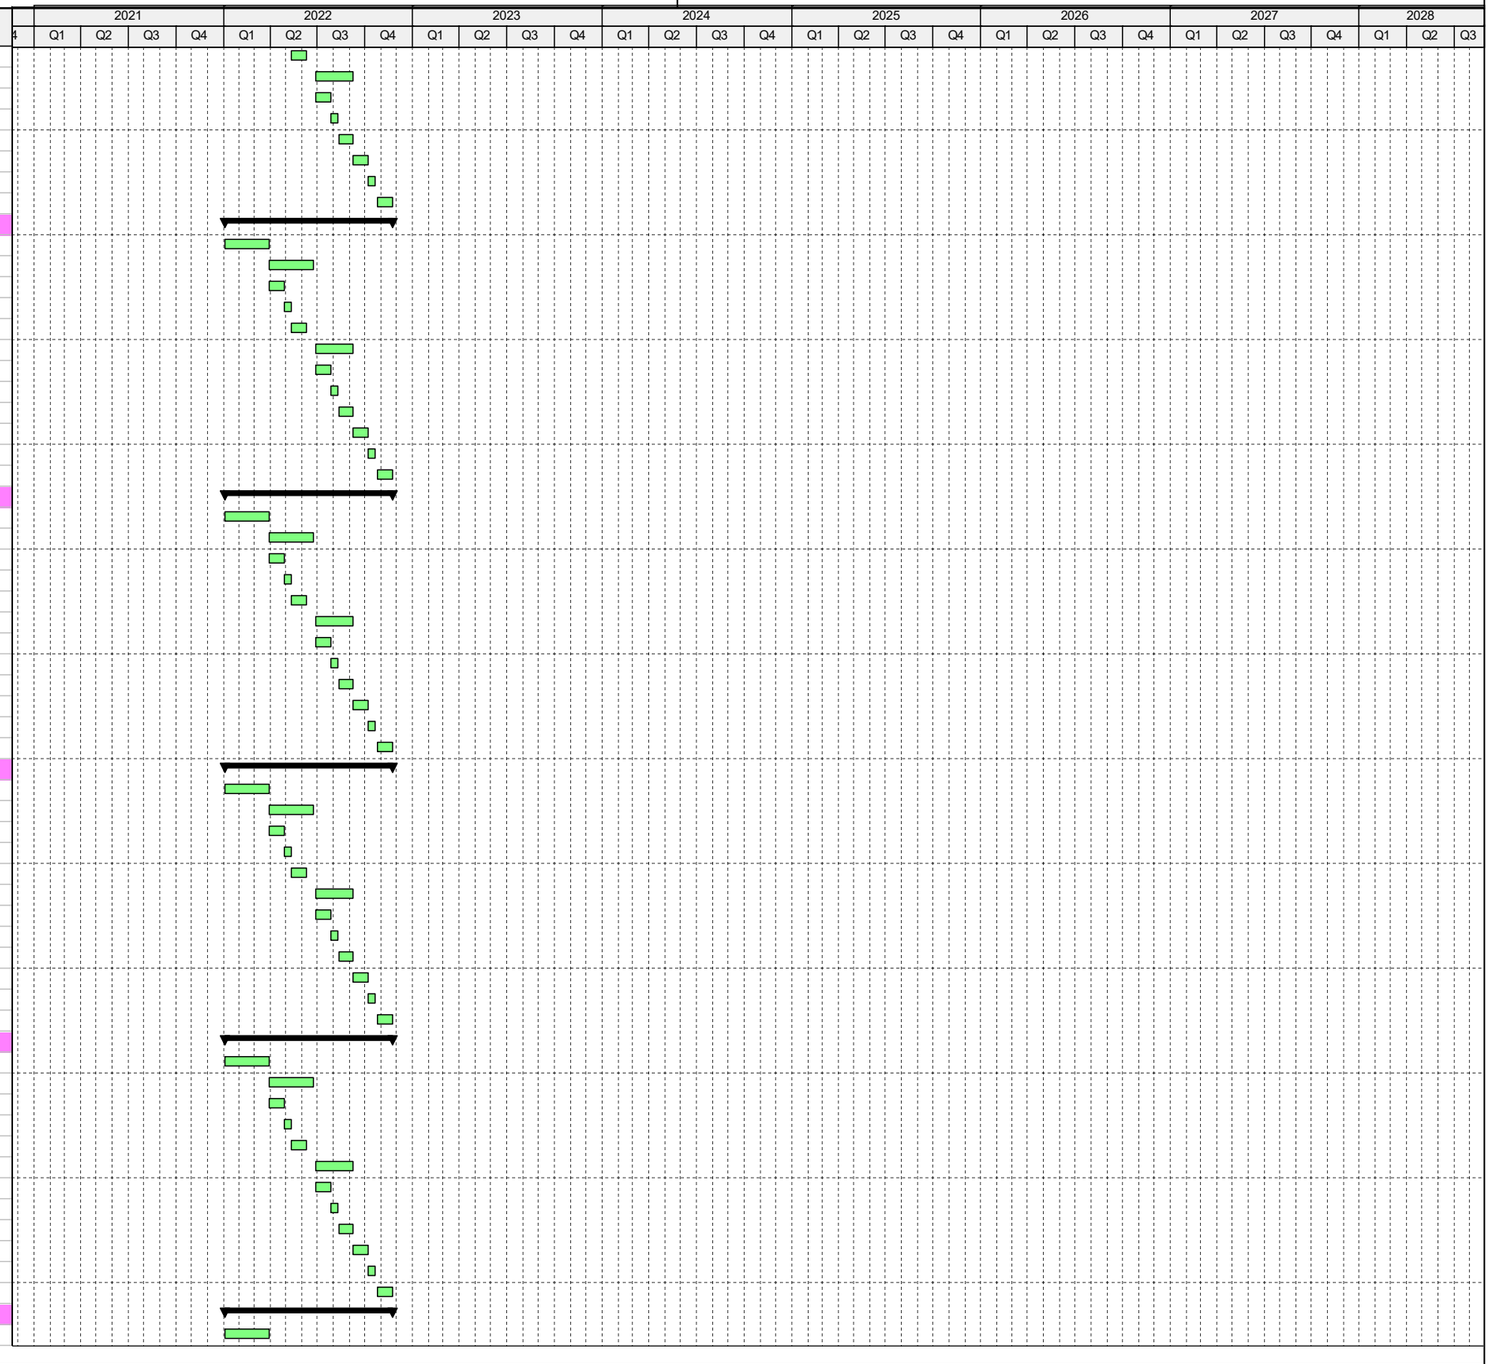

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-34380	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34390	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38520	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41570	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48220	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48230	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54460	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58810	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64910	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69970	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73920	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.07.03.7 Sistemas SYC		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21930	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34400	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34410	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38530	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41580	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48240	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48250	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54470	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58820	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64920	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-69980	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73930	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.08 Estación 8 (Cra 50)_Tipo_Mezzanine		430	13-Apr-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.08.01 Estructura de la Nave Central		430	13-Apr-21	04-Jan-23
P-6370	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	200	13-Apr-21	01-Feb-22
P-25860	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	02-Feb-22	27-Jul-22
P-25870	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-29550	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Mar-22	15-Mar-22
P-30980	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Mar-22	13-Apr-22
P-54480	Final 100%	60	28-Jul-22	21-Oct-22
P-54490	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61780	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64930	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-73940	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-79310	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	23-Nov-22	06-Dec-22
P-82470	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.08.02 Nave Central Diseño Arquitectonico		336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-6380	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21
P-11320	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11330	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21
P-13770	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16320	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-27000	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-27010	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30600	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32820	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-44040	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50150	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52430	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.08.03 MEP Nave Central		220	02-Feb-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.08.03.1 Escaleras Electromecanicas		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25880	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38540	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38550	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43280	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45380	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-54500	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-54510	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61790	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64940	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22




© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-69990	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76730	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79320	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.08.03.2	**Ascensores**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25890	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38560	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38570	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43290	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45390	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-54520	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-54530	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61800	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64950	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70000	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76740	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79330	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.08.03.3	**Sistema de Ventilación**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25900	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38580	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38590	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43300	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45400	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-54540	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-54550	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61810	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64960	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70010	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76750	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79340	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.08.03.4	**Sistema Contraincendios**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25910	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38600	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38610	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43310	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45410	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-54560	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-54570	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61820	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64970	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70020	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76760	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79350	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.08.03.5	**Sistemas Electricos**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25920	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38620	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38630	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43320	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45420	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-54580	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-54590	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61830	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64980	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70030	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76770	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79360	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.08.03.6	**Sistemas HYS**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25930	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38640	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38650	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43330	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45430	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-54600	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22

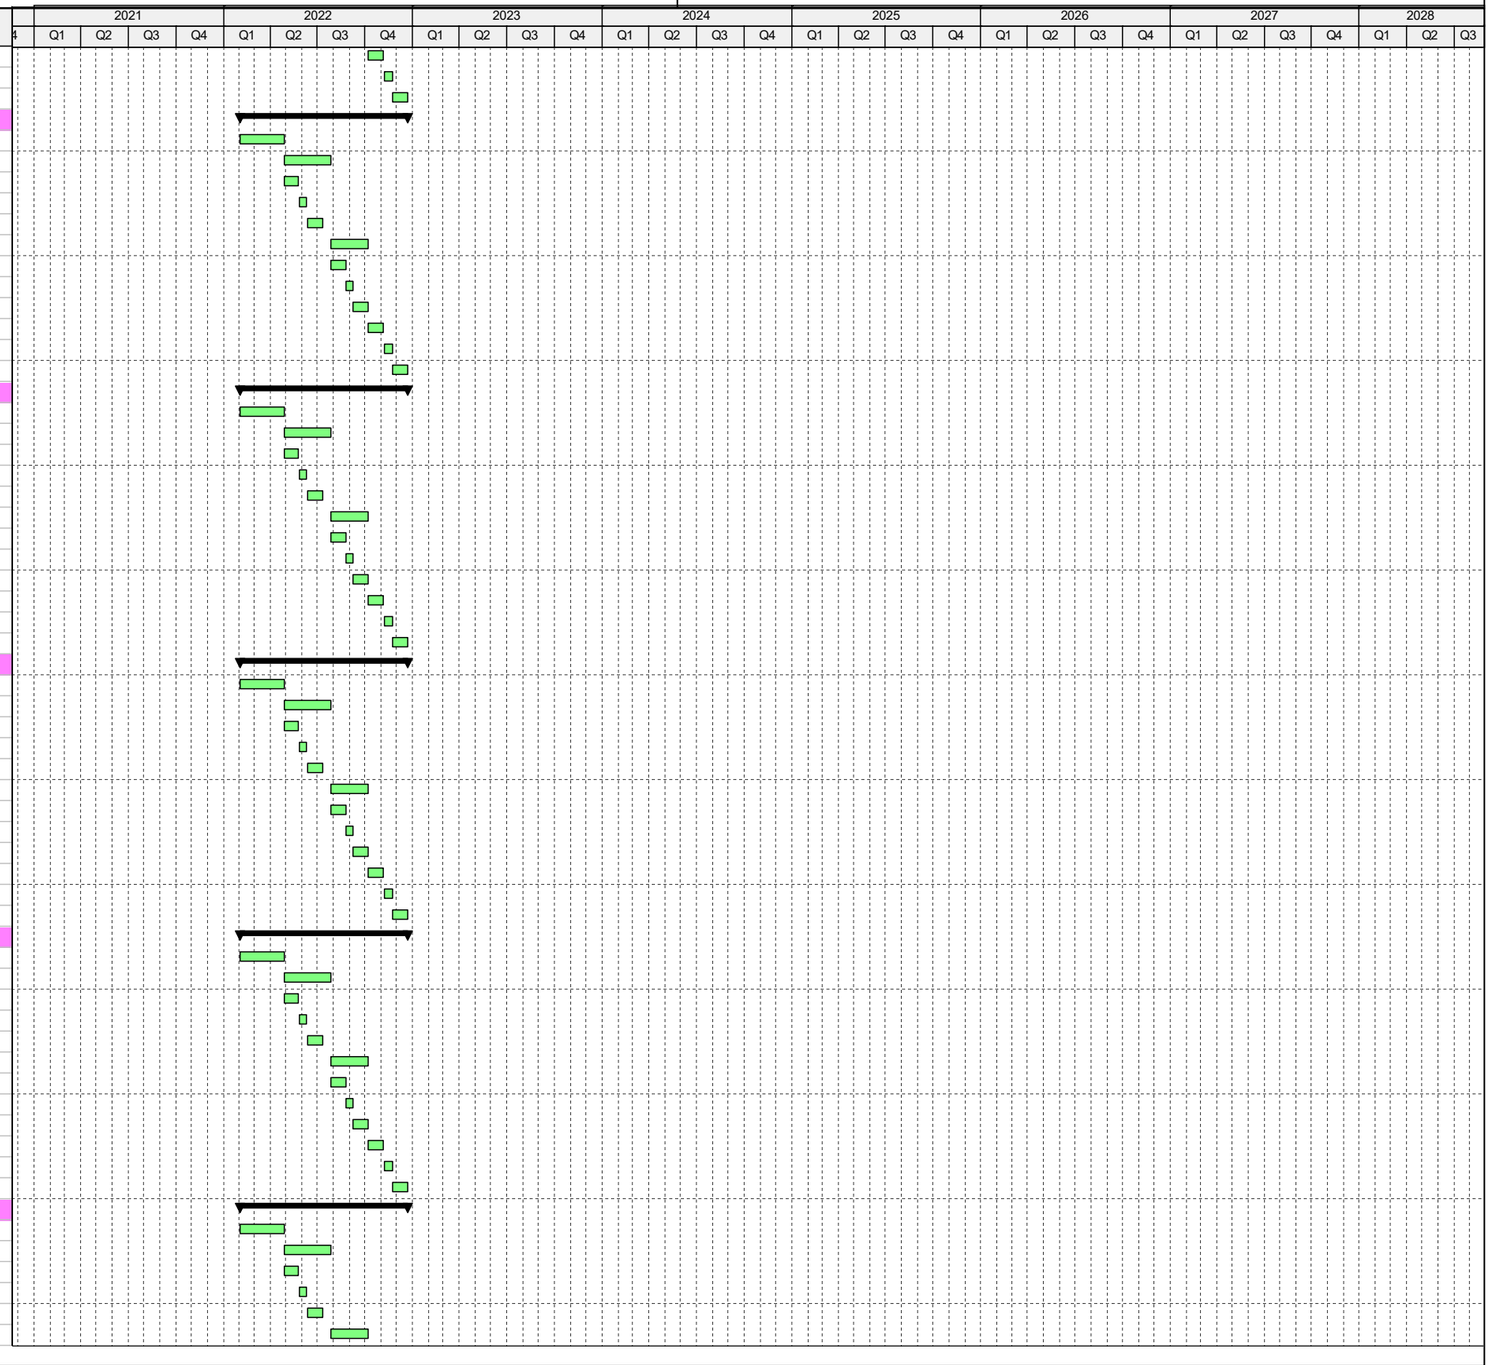


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-54610	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61840	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64990	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70040	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76780	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79370	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.08.03.7	**Sistemas SYC**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-25940	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-38660	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-38670	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43340	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45440	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-54620	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-54630	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61850	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65000	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70050	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76790	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79380	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.09	**Estación 9 (NQS)_Ttipo _ Axial con interconexión**	410	13-Apr-21	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.09.01	**Estructura de la Nave Central**	410	13-Apr-21	06-Dec-22
P-6390	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	180	13-Apr-21	03-Jan-22
P-21940	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	04-Jan-22	24-Jun-22
P-21950	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Jan-22	01-Feb-22
P-25950	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Feb-22	15-Feb-22
P-28240	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Feb-22	15-Mar-22
P-48260	Final 100%	60	28-Jun-22	22-Sep-22
P-48270	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54640	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58830	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-68170	Revisión de la interventoria R1 100%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73950	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-76800	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.09.02	**Nave Central Diseño Arquitectonico**	336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-6400	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21
P-11340	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11350	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21
P-13780	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16330	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-27020	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-27030	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30610	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32830	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-44050	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50160	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52440	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.09.03	**MEP Nave Central**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.09.03.1	**Escaleras Electromecanicas**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21960	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34420	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34430	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38680	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41590	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48280	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48290	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54650	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58840	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65010	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70060	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73960	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.09.03.2	**Ascensores**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21970	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	04-Jan-22	30-Mar-22

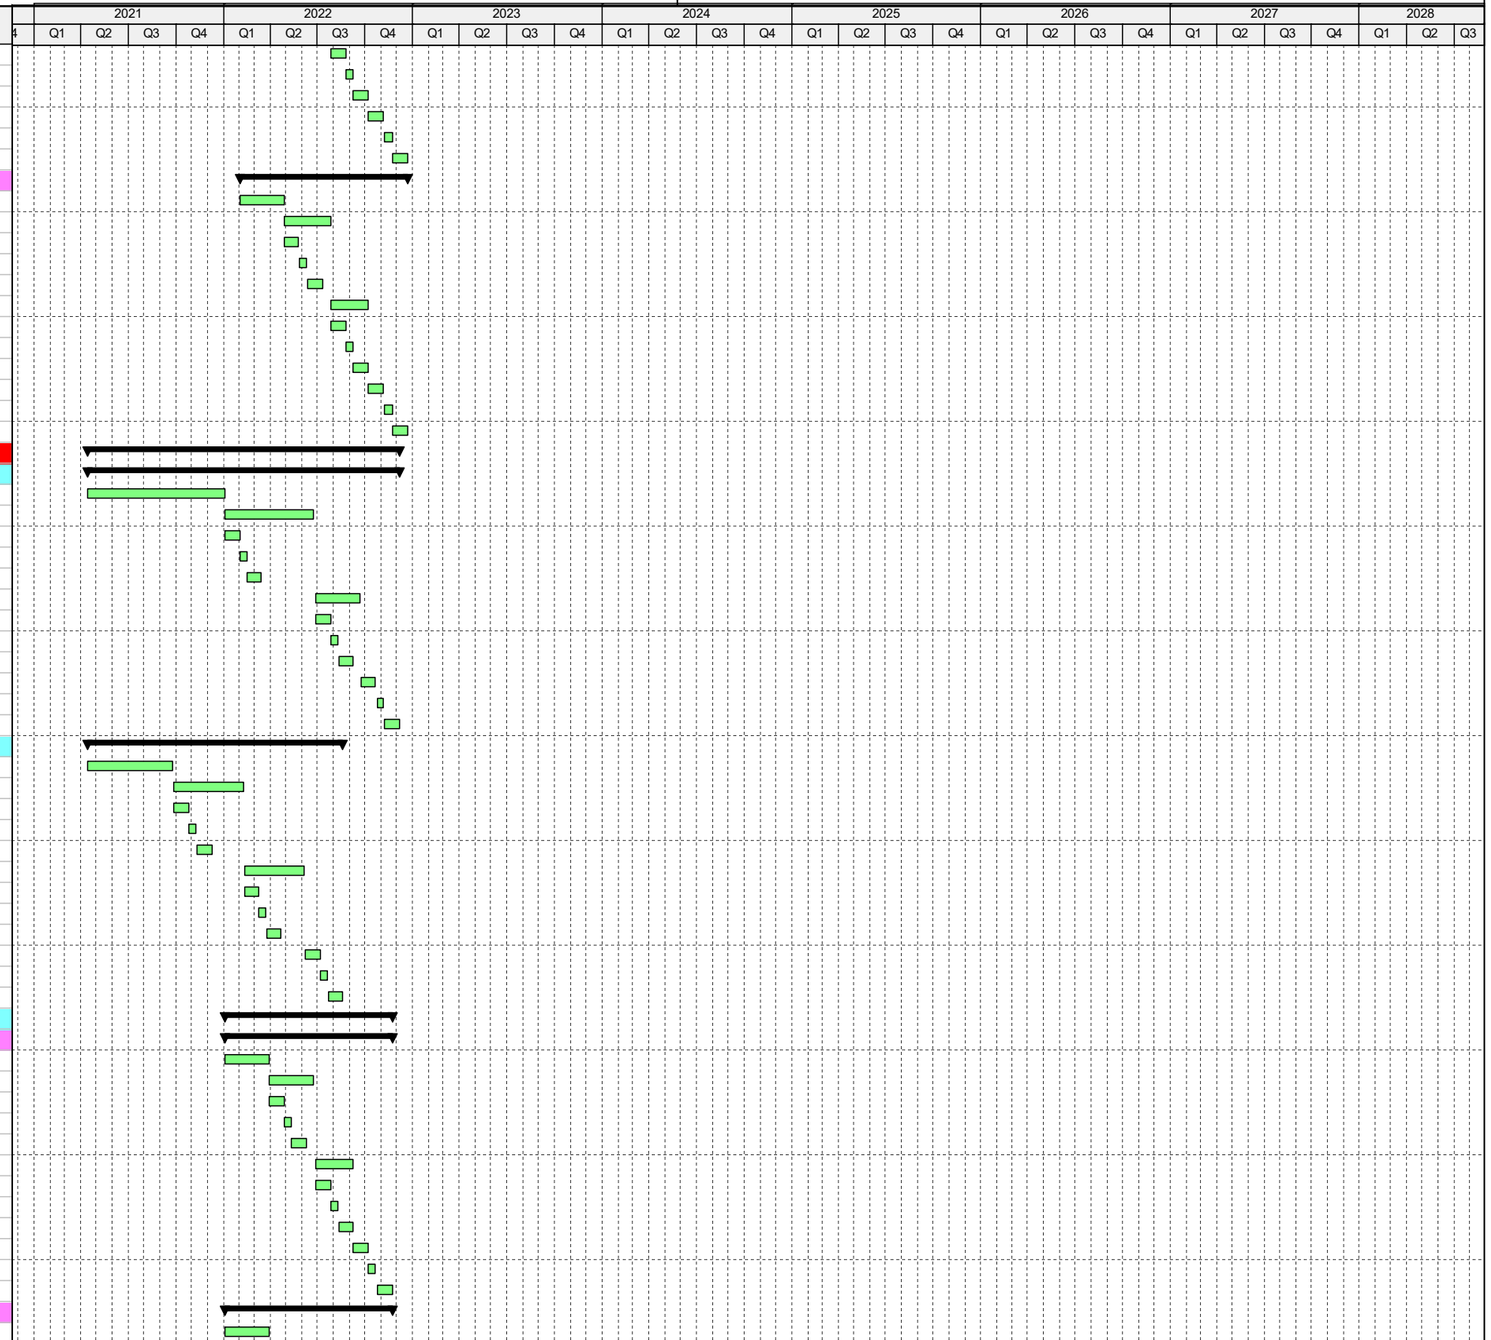


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-34440	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34450	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38690	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41600	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48300	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48310	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54660	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58850	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65020	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70070	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73970	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.09.03.3 Sistema de Ventilación		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21980	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34460	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34470	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38700	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41610	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48320	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48330	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54670	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58860	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65030	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70080	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73980	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.09.03.4 Sistema Contraincendios		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-21990	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34480	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34490	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38710	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41620	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48340	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48350	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54680	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58870	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65040	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70090	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-73990	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.09.03.5 Sistemas Electricos		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22000	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34500	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34510	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38720	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41630	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48360	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48370	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54690	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58880	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65050	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70100	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74000	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.09.03.6 Sistemas HYS		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22010	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34520	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34530	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38730	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41640	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48380	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48390	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54700	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58890	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65060	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70110	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22

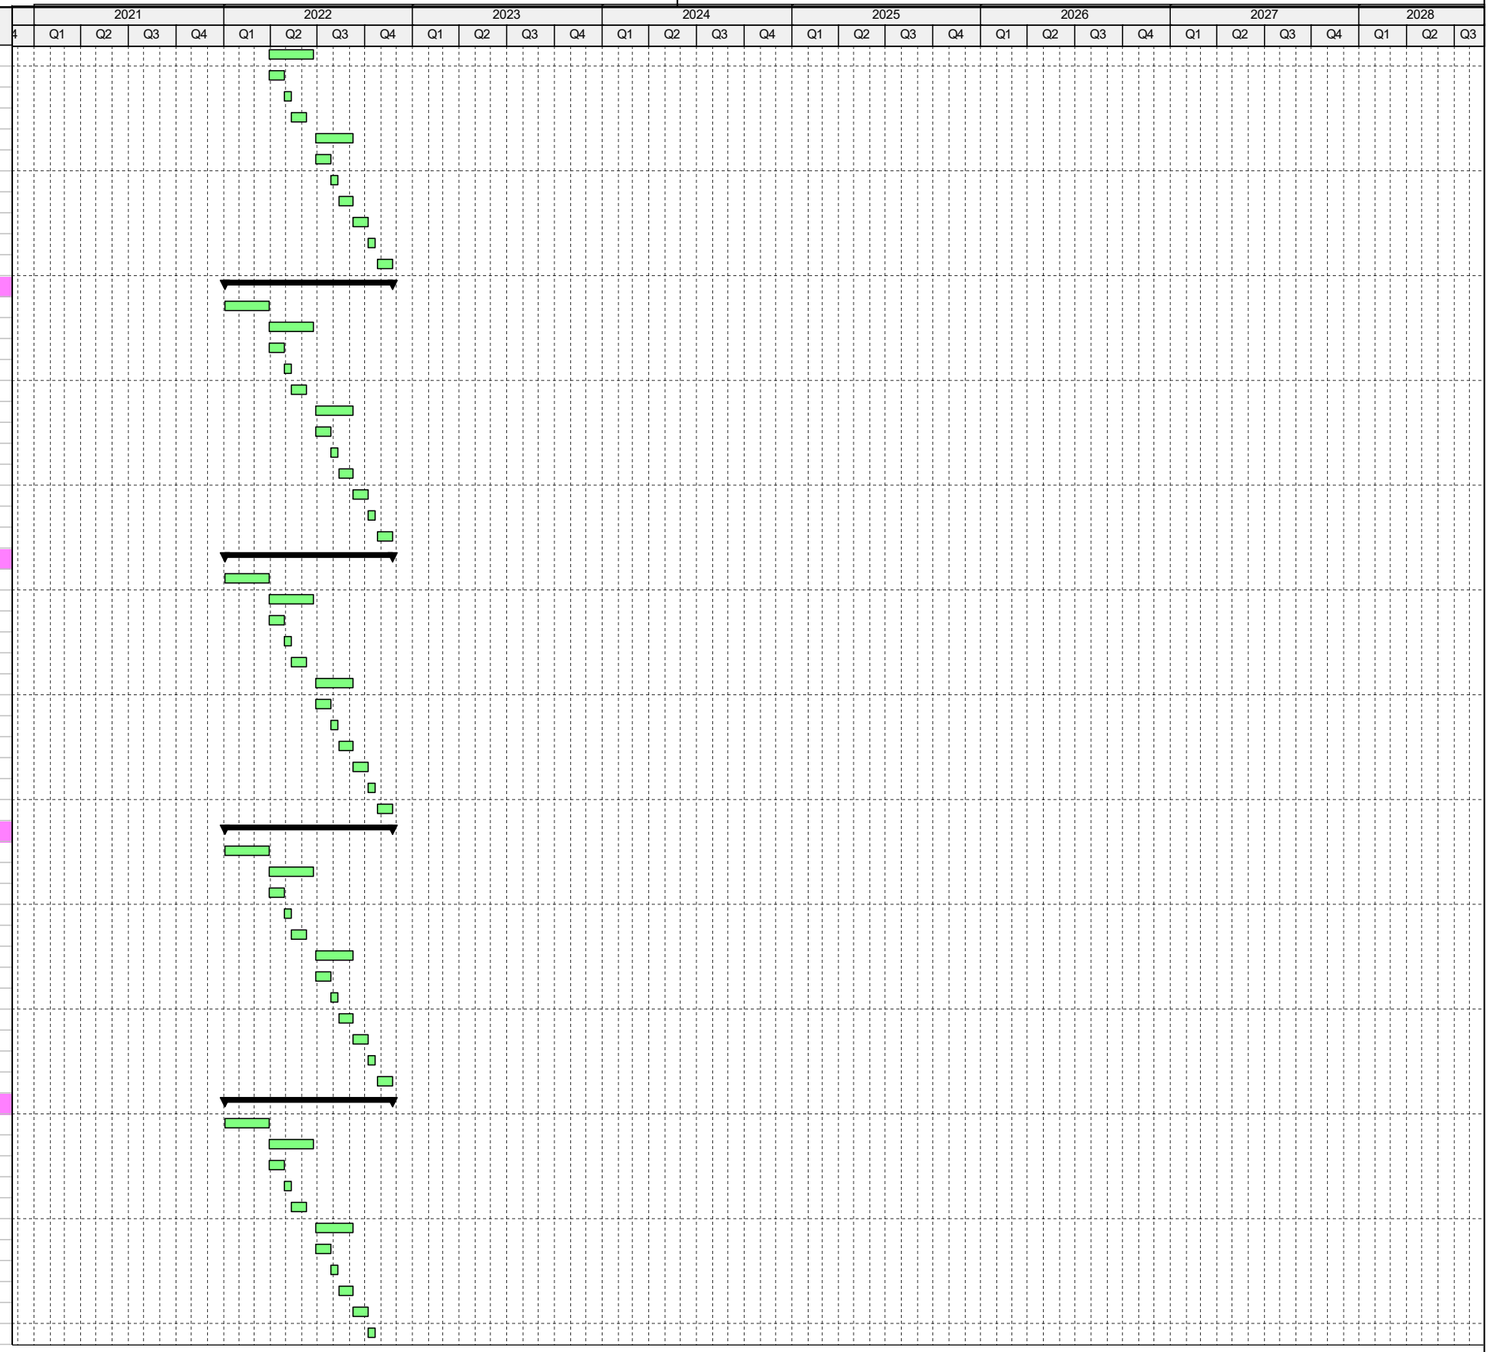

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-74010	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.09.03.7	**Sistemas SYC**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22020	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34540	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34550	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38740	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41650	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48400	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48410	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54710	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58900	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65070	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70120	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74020	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.10	**Estación 10 (Nariño)_Tipo simple**	410	13-Apr-21	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.10.01	**Estructura de la Nave Central**	410	13-Apr-21	06-Dec-22
P-6410	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	180	13-Apr-21	03-Jan-22
P-22030	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	04-Jan-22	24-Jun-22
P-22040	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Jan-22	01-Feb-22
P-25960	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Feb-22	15-Feb-22
P-28250	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Feb-22	15-Mar-22
P-48420	Final 100%	60	28-Jun-22	22-Sep-22
P-48430	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54720	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58910	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-68180	Revisión de la interventoria R1 100%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-74030	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-76810	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.10.02	**Nave Central Diseño Arquitectonico**	336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-6420	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21
P-11360	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11370	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21
P-13790	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16340	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-27040	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-27050	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30620	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32840	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-44060	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50170	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52450	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.10.03	**MEP Nave Central**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.10.03.1	**Escaleras Electromecanicas**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22050	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34560	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34570	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38750	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41660	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48440	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48450	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54730	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58920	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65080	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70130	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74040	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.10.03.2	**Ascensores**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22060	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34580	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34590	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38760	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41670	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48460	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22

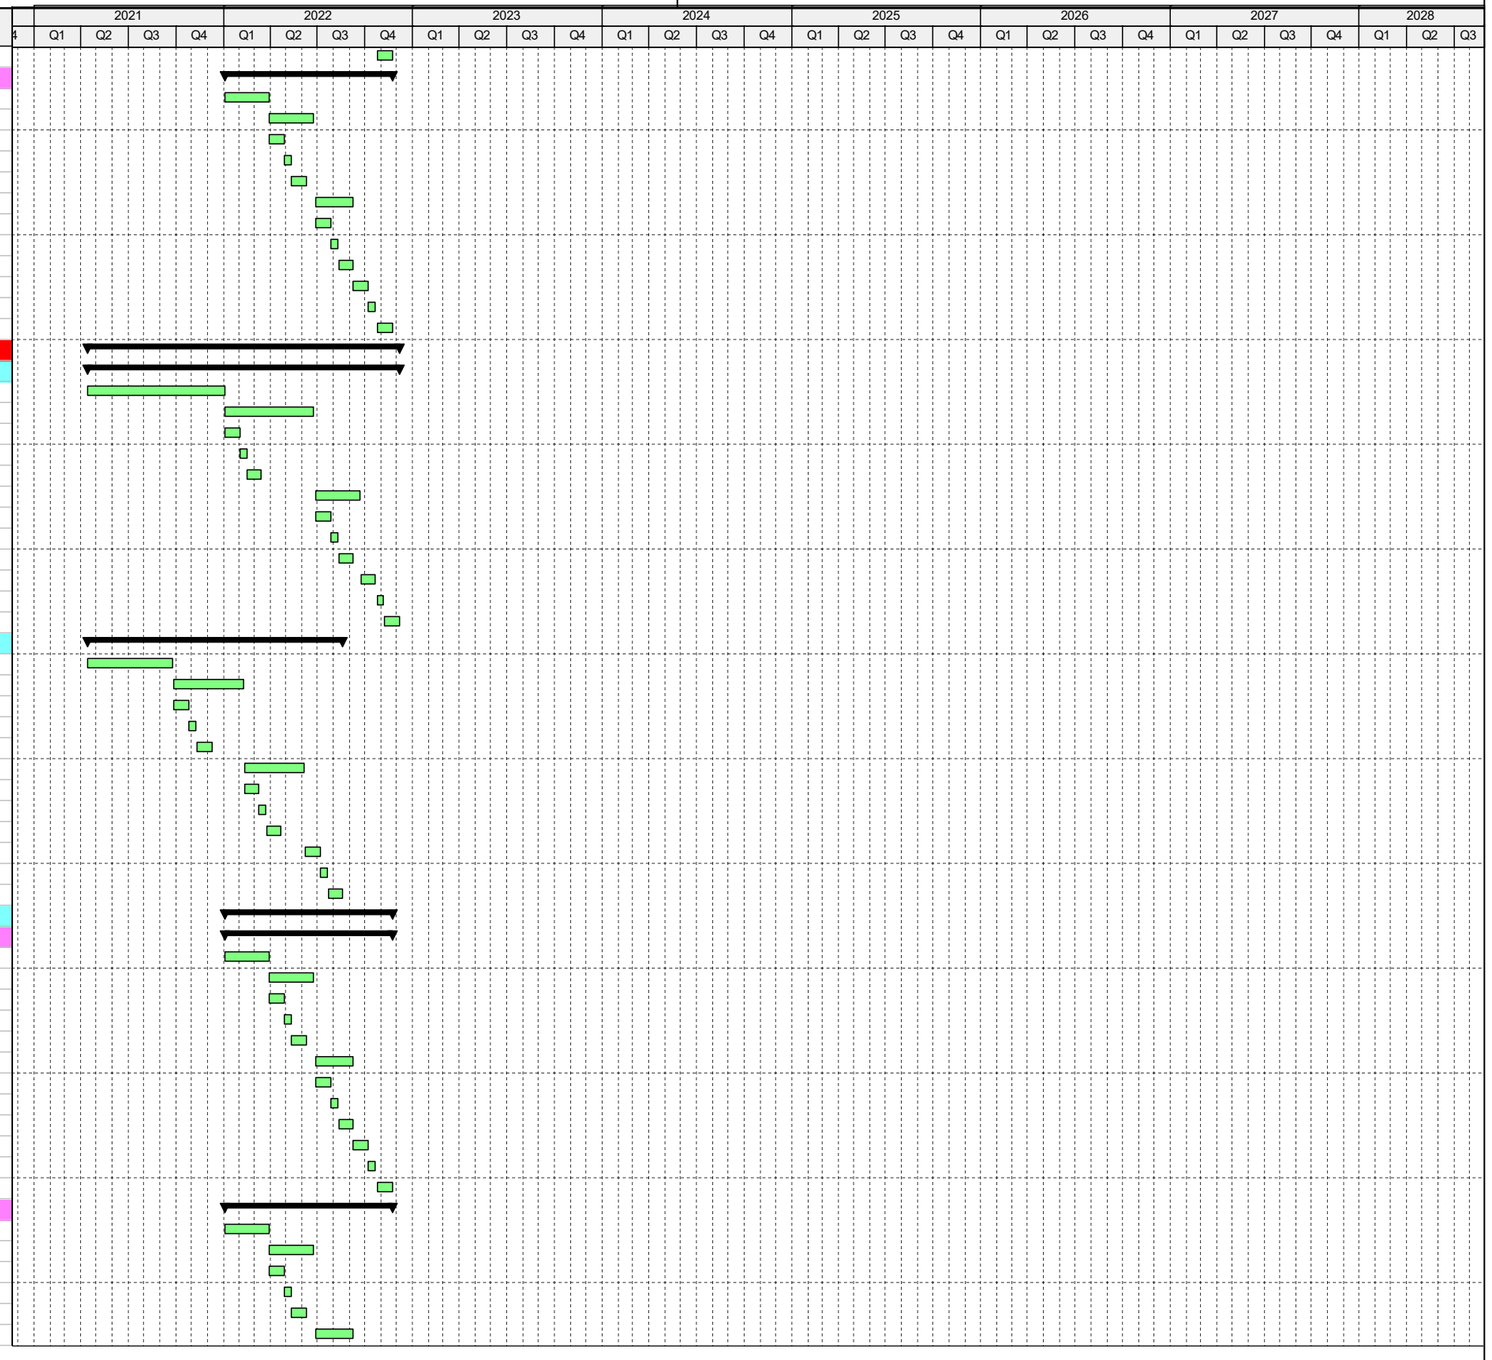


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-48470	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54740	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58930	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65090	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70140	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74050	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.10.03.3	**Sistema de Ventilación**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22070	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34600	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34610	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38770	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41680	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48480	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48490	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54750	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58940	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65100	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70150	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74060	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.10.03.4	**Sistema Contraincendios**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22080	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34620	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34630	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38780	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41690	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48500	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48510	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54760	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58950	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65110	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70160	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74070	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.10.03.5	**Sistemas Electricos**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22090	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34640	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34650	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38790	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41700	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48520	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48530	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54770	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58960	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65120	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70170	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74080	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.10.03.6	**Sistemas HYS**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22100	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34660	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34670	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38800	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41710	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48540	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48550	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54780	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58970	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65130	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70180	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74090	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.10.03.7	**Sistemas SYC**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22110	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34680	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34690	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22

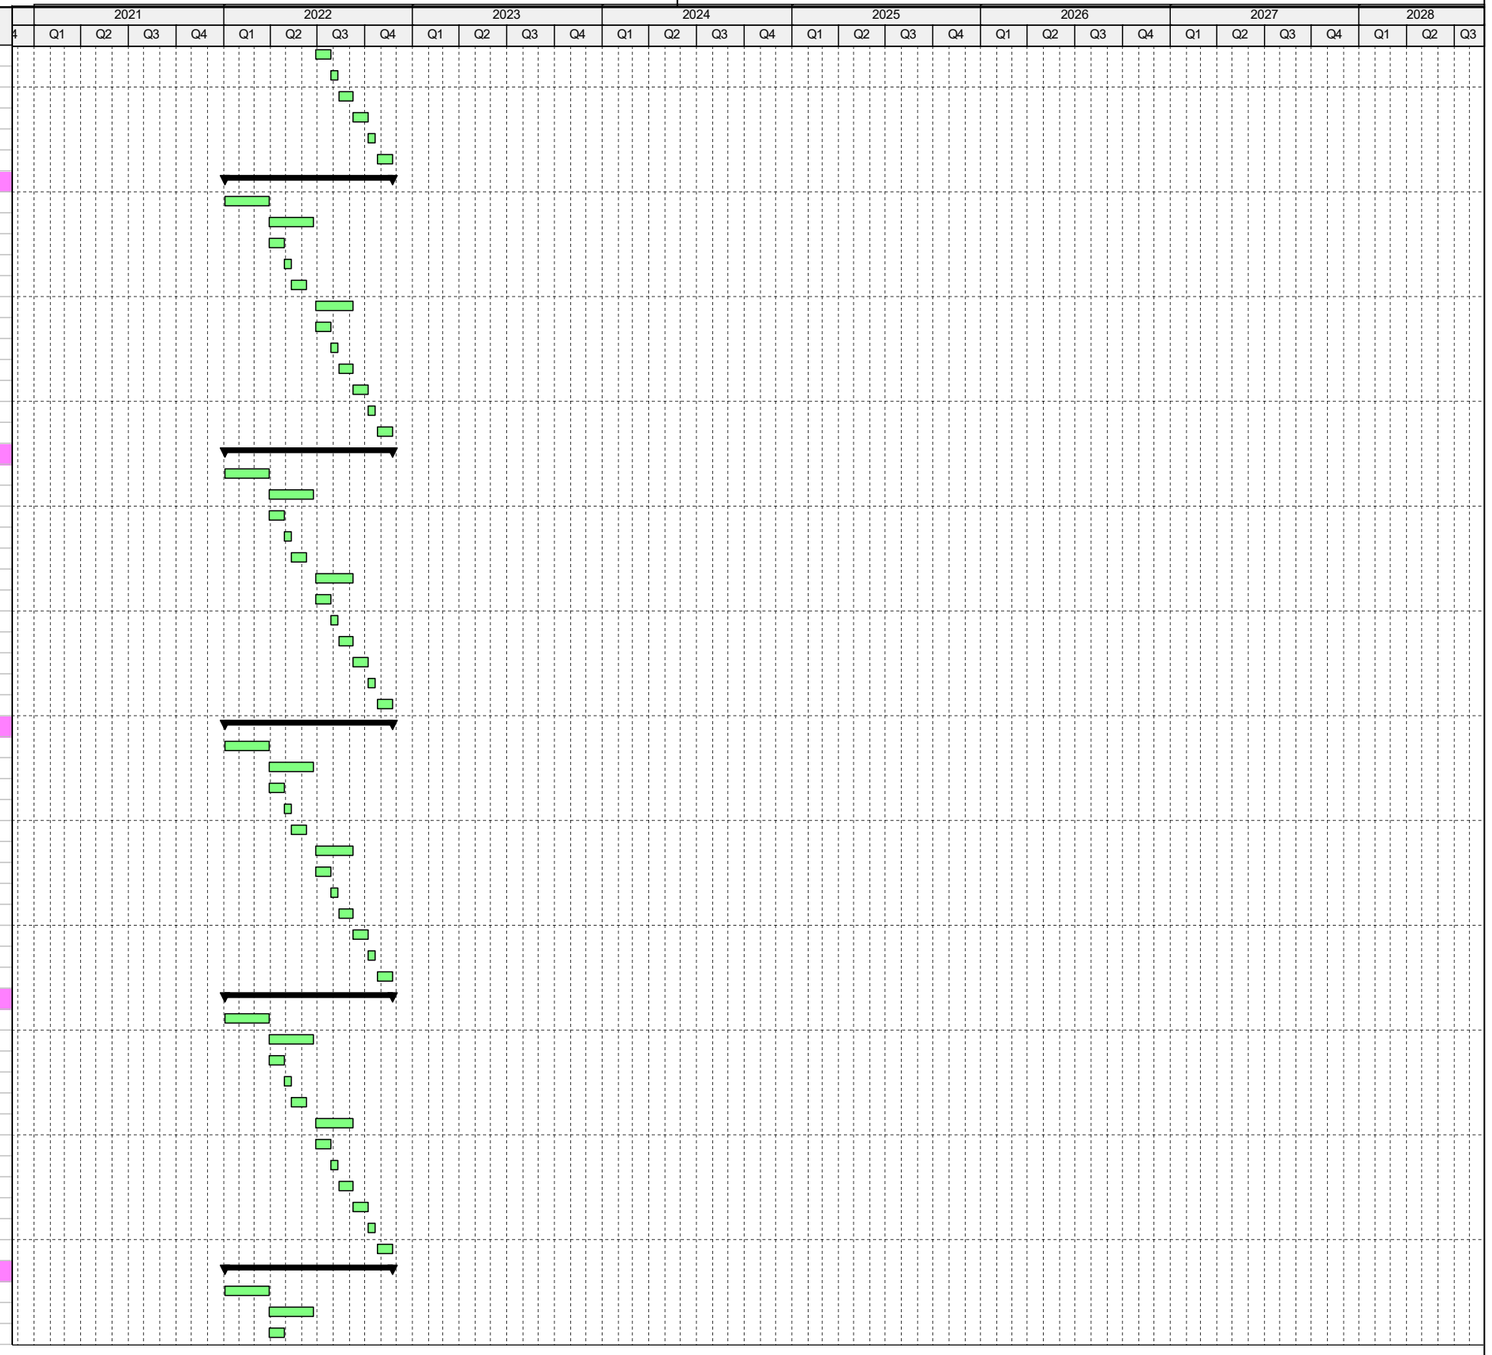


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-38810	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41720	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48560	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48570	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54790	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58980	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65140	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70190	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74100	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.11 Estación 11 (Calle 1a)_Tipo_ Axial con interconexión		410	13-Apr-21	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.11.01 Estructura de la Nave Central		410	13-Apr-21	06-Dec-22
P-6430	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	180	13-Apr-21	03-Jan-22
P-22120	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	04-Jan-22	24-Jun-22
P-22130	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Jan-22	01-Feb-22
P-25970	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Feb-22	15-Feb-22
P-28260	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Feb-22	15-Mar-22
P-48580	Final 100%	60	28-Jun-22	22-Sep-22
P-48590	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54800	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58990	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-68190	Revisión de la interventoria R1 100%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-74110	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-76820	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.11.02 Nave Central Diseño Arquitectonico		336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-6440	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21
P-11380	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11390	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21
P-13800	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16350	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-27060	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-27070	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30630	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32850	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-44070	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50180	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52460	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.11.03 MEP Nave Central		220	04-Jan-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.11.03.1 Escaleras Electromecanicas		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22140	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34700	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34710	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38820	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41730	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48600	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48610	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54810	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59000	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65150	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70200	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74120	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.11.03.2 Ascensores		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22150	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34720	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34730	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38830	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41740	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48620	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48630	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54820	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59010	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65160	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70210	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22

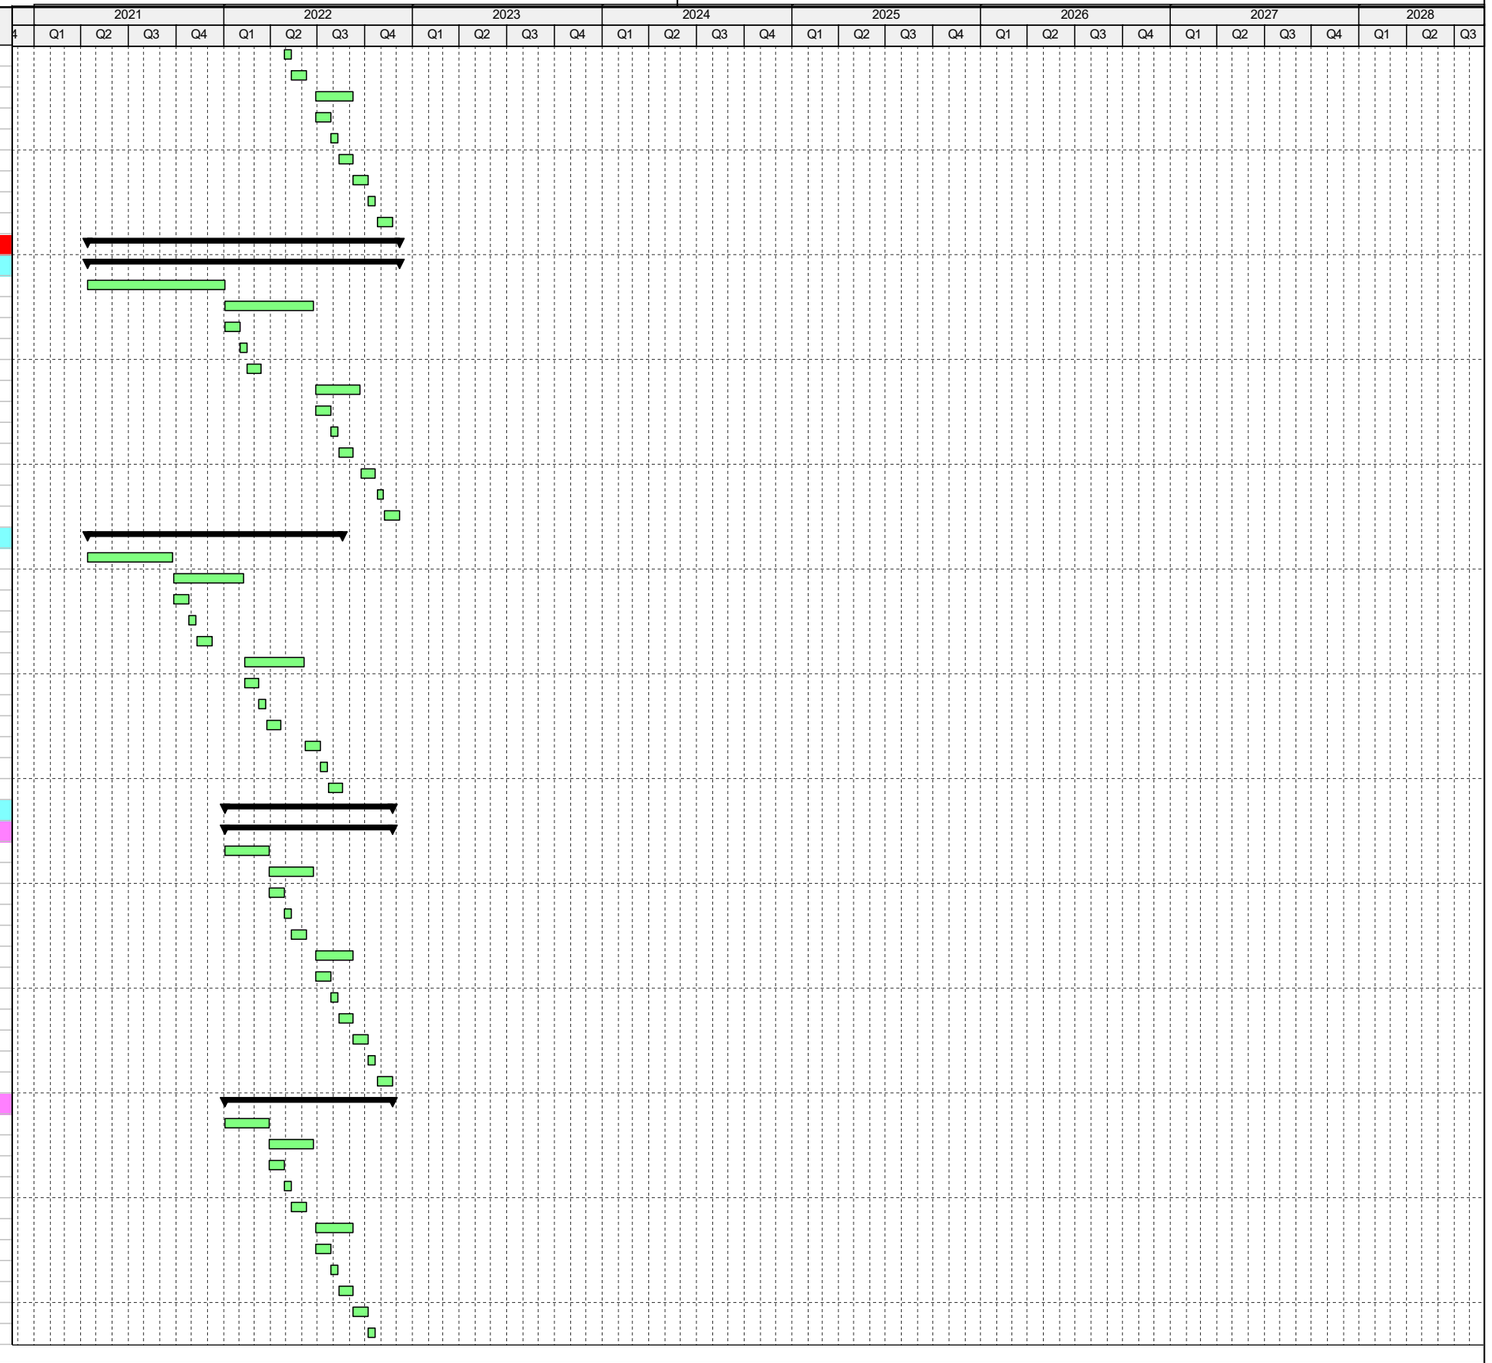

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-74130	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.11.03.3	**Sistema de Ventilación**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22160	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34740	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34750	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38840	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41750	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48640	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48650	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54830	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59020	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65170	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70220	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74140	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.11.03.4	**Sistema Contraincendios**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22170	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34760	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34770	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38850	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41760	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48660	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48670	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54840	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59030	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65180	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70230	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74150	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.11.03.5	**Sistemas Electricos**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22180	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34780	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34790	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38860	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41770	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48680	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48690	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54850	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59040	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65190	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70240	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74160	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.11.03.6	**Sistemas HYS**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22190	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34800	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34810	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38870	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41780	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48700	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48710	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54860	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59050	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65200	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70250	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74170	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.11.03.7	**Sistemas SYC**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22200	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34820	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34830	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38880	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41790	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48720	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48730	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54870	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22

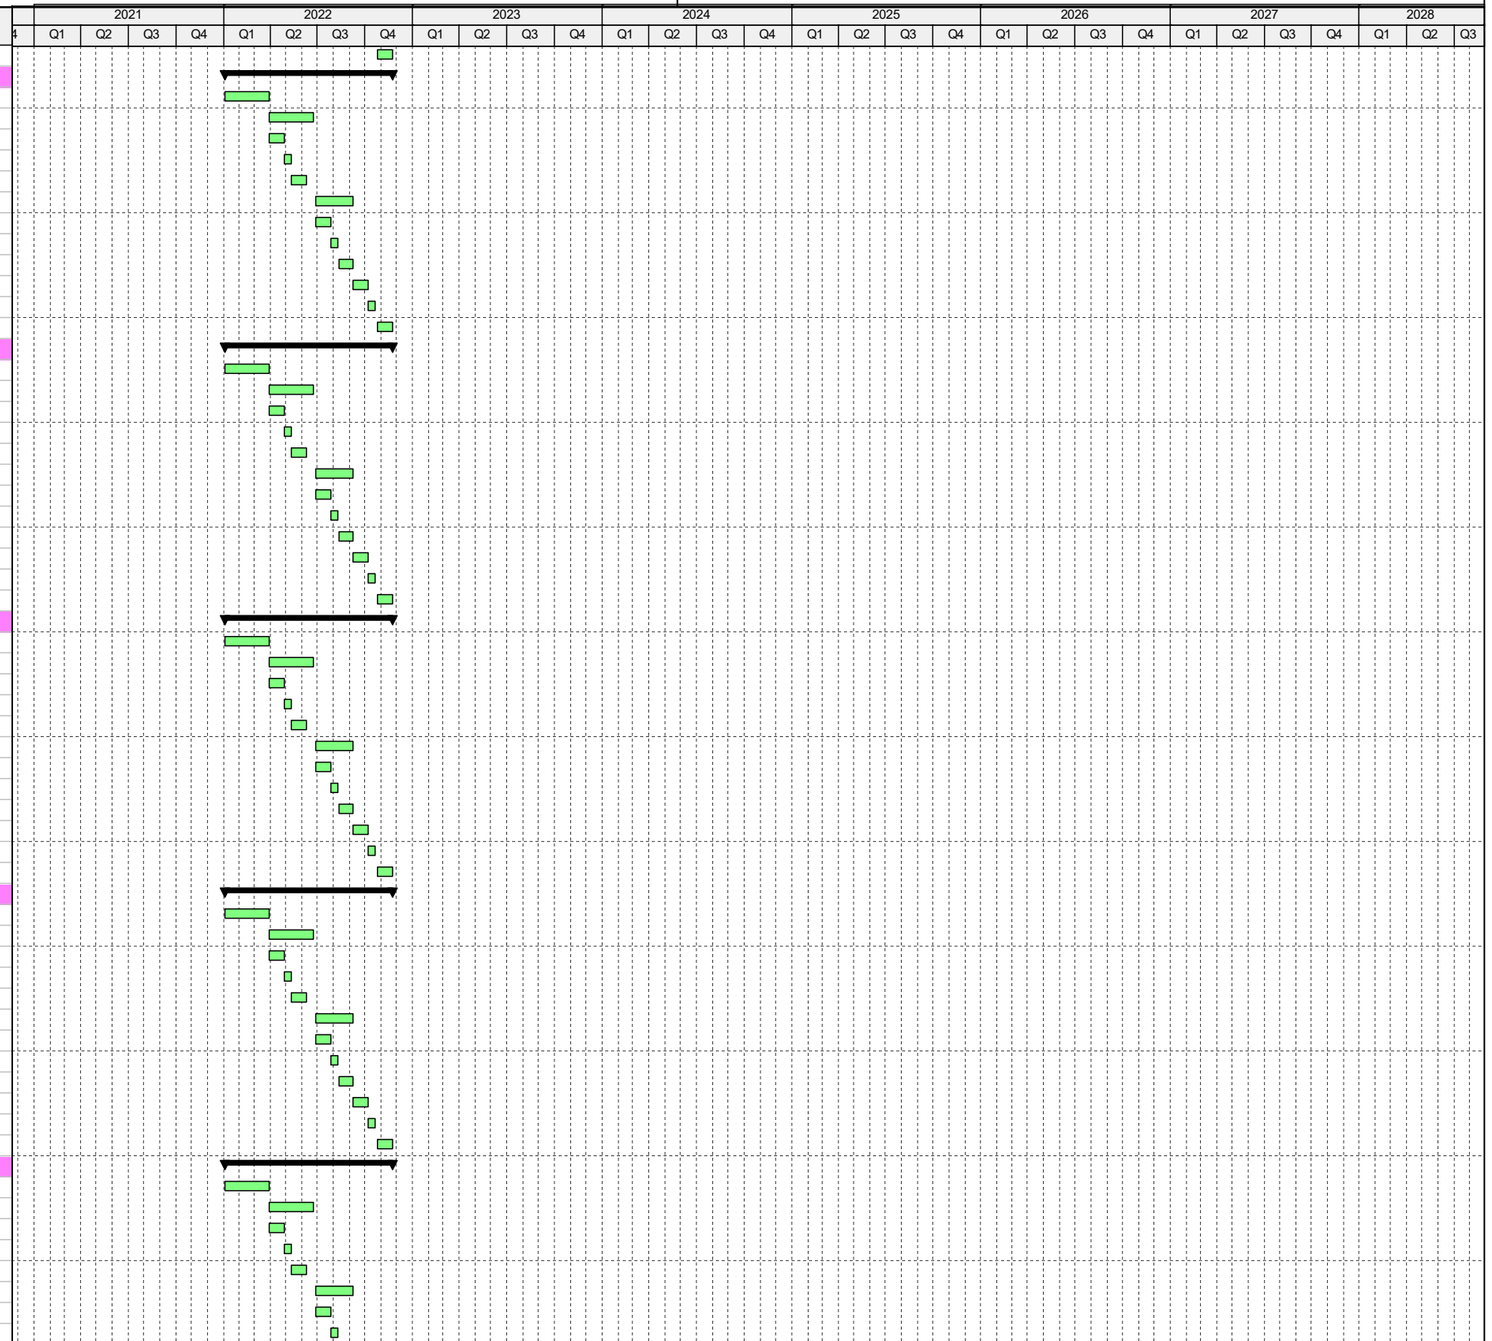

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-59060	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65210	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70260	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74180	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.12 Estación 12 (Calle 10)_Tipo _Axial con interconexión		410	13-Apr-21	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.12.01 Estructura de la Nave Central		410	13-Apr-21	06-Dec-22
P-6450	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	180	13-Apr-21	03-Jan-22
P-22210	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	04-Jan-22	24-Jun-22
P-22220	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Jan-22	01-Feb-22
P-25980	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Feb-22	15-Feb-22
P-28270	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Feb-22	15-Mar-22
P-48740	Final 100%	60	28-Jun-22	22-Sep-22
P-48750	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54880	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59070	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-68200	Revisión de la interventoria R1 100%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-74190	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-76830	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.12.02 Nave Central Diseño Arquitectonico		336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-6460	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21
P-11400	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11410	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21
P-13810	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16360	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-27080	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-27090	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30640	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32860	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-44080	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50190	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52470	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.12.03 MEP Nave Central		220	04-Jan-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.12.03.1 Escaleras Electromecanicas		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22230	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34840	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34850	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38890	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41800	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48760	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48770	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54890	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59080	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65220	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70270	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74200	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.12.03.2 Ascensores		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22240	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34860	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34870	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38900	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41810	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48780	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48790	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54900	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59090	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65230	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70280	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74210	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.12.03.3 Sistema de Ventilación		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22250	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34880	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34890	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22




© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-38910	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41820	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48800	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48810	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54910	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59100	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65240	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70290	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74220	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.12.03.4 Sistema Contraincendios		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22260	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34900	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34910	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38920	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41830	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48820	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48830	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54920	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59110	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65250	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70300	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74230	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.12.03.5 Sistemas Electricos		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22270	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34920	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34930	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38930	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41840	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48840	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48850	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54930	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59120	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65260	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70310	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74240	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.12.03.6 Sistemas HYS		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22280	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34940	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34950	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38940	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41850	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48860	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48870	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54940	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59130	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65270	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70320	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74250	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.12.03.7 Sistemas SYC		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22290	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34960	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34970	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38950	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41860	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48880	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48890	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54950	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59140	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65280	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70330	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74260	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.13 Estación 13 (Calle 26)_ Tipo simple		410	13-Apr-21	06-Dec-22

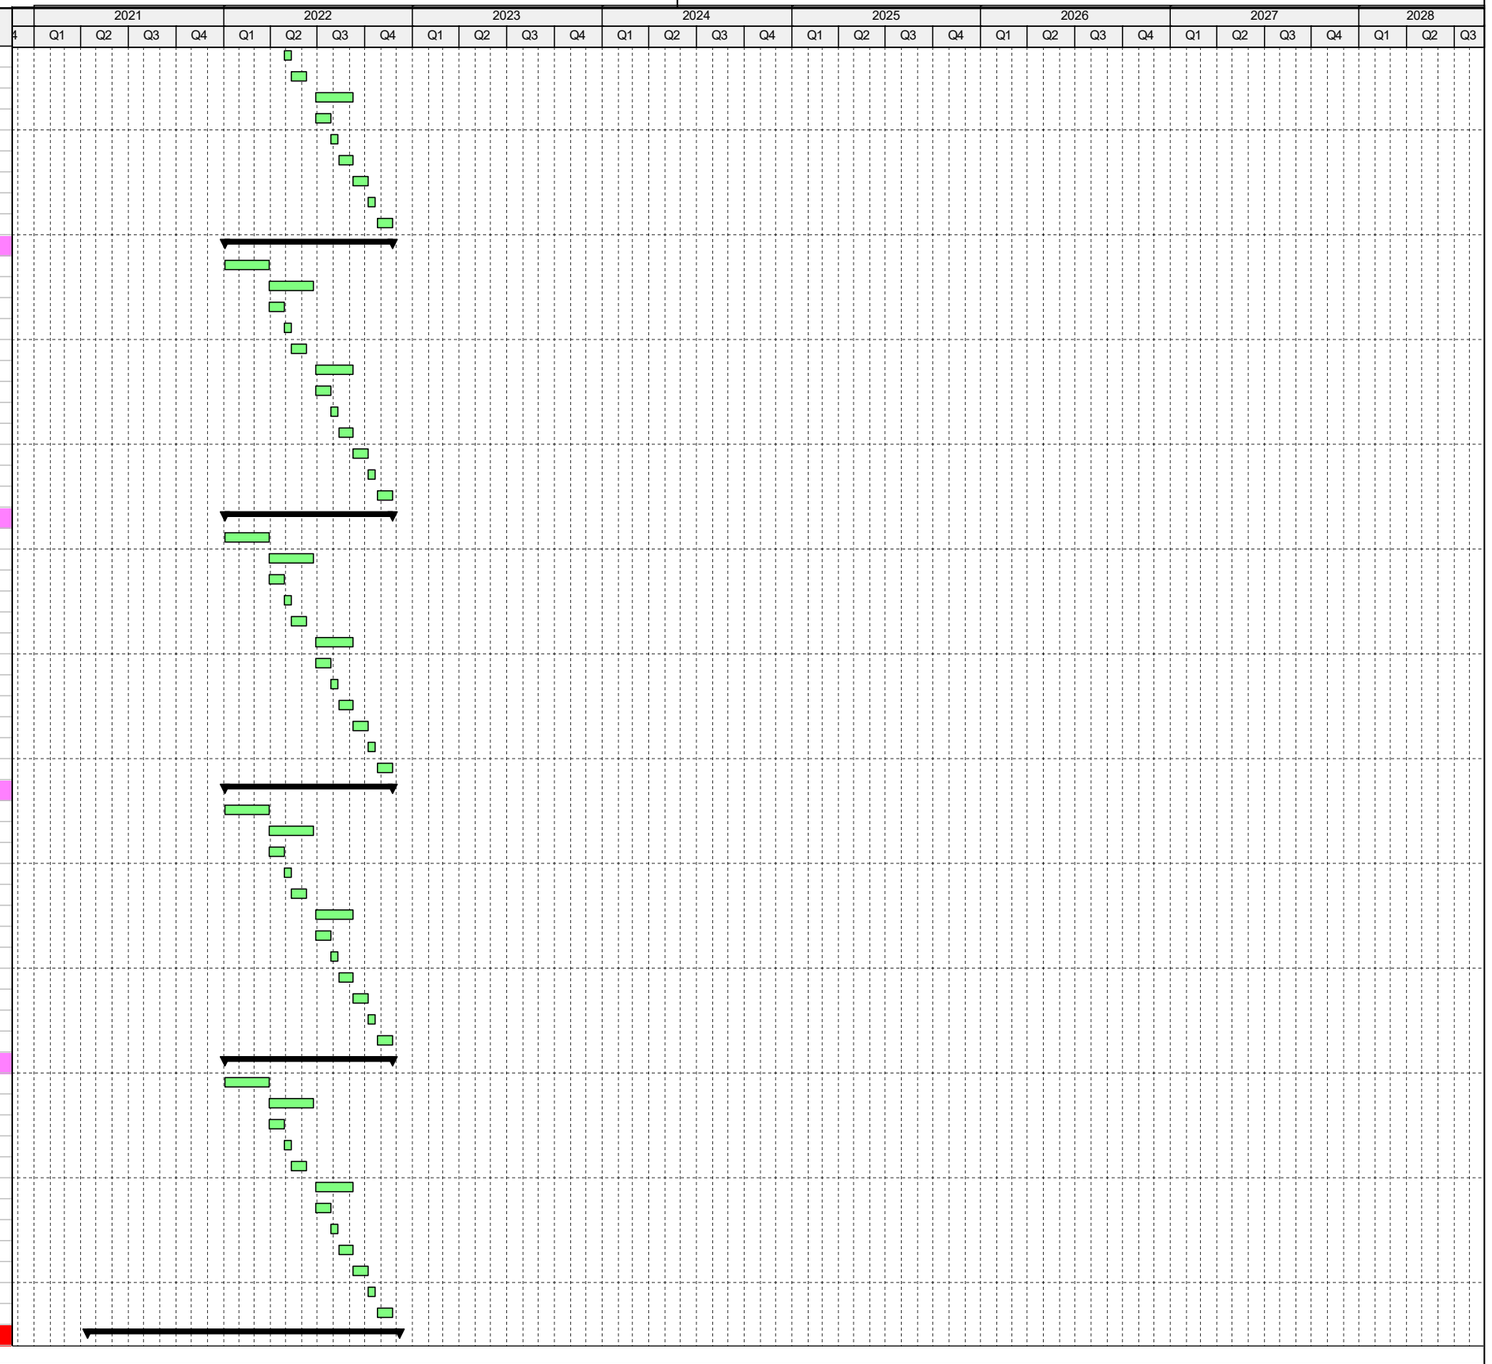

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.1.03.06.13.01	**Estructura de la Nave Central**	410	13-Apr-21	06-Dec-22
P-6470	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	180	13-Apr-21	03-Jan-22
P-22300	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	04-Jan-22	24-Jun-22
P-22310	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Jan-22	01-Feb-22
P-25990	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Feb-22	15-Feb-22
P-28280	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Feb-22	15-Mar-22
P-48900	Final 100%	60	28-Jun-22	22-Sep-22
P-48910	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54960	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59150	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-68210	Revisión de la interventoria R1 100%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-74270	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-76840	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.13.02	**Nave Central Diseño Arquitectonico**	336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-6480	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21
P-11420	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11430	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21
P-13820	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16370	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-27100	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-27110	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30650	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32870	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-44090	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50200	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52480	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.13.03	**MEP Nave Central**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.13.03.1	**Escaleras Electromecanicas**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22320	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-34980	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-34990	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38960	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41870	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48920	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48930	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54970	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59160	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65290	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70340	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74280	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.13.03.2	**Ascensores**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22330	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-35000	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-35010	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38970	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41880	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48940	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48950	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54980	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59170	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65300	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70350	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74290	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.13.03.3	**Sistema de Ventilación**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22340	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-35020	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-35030	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38980	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41890	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48960	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48970	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-54990	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22

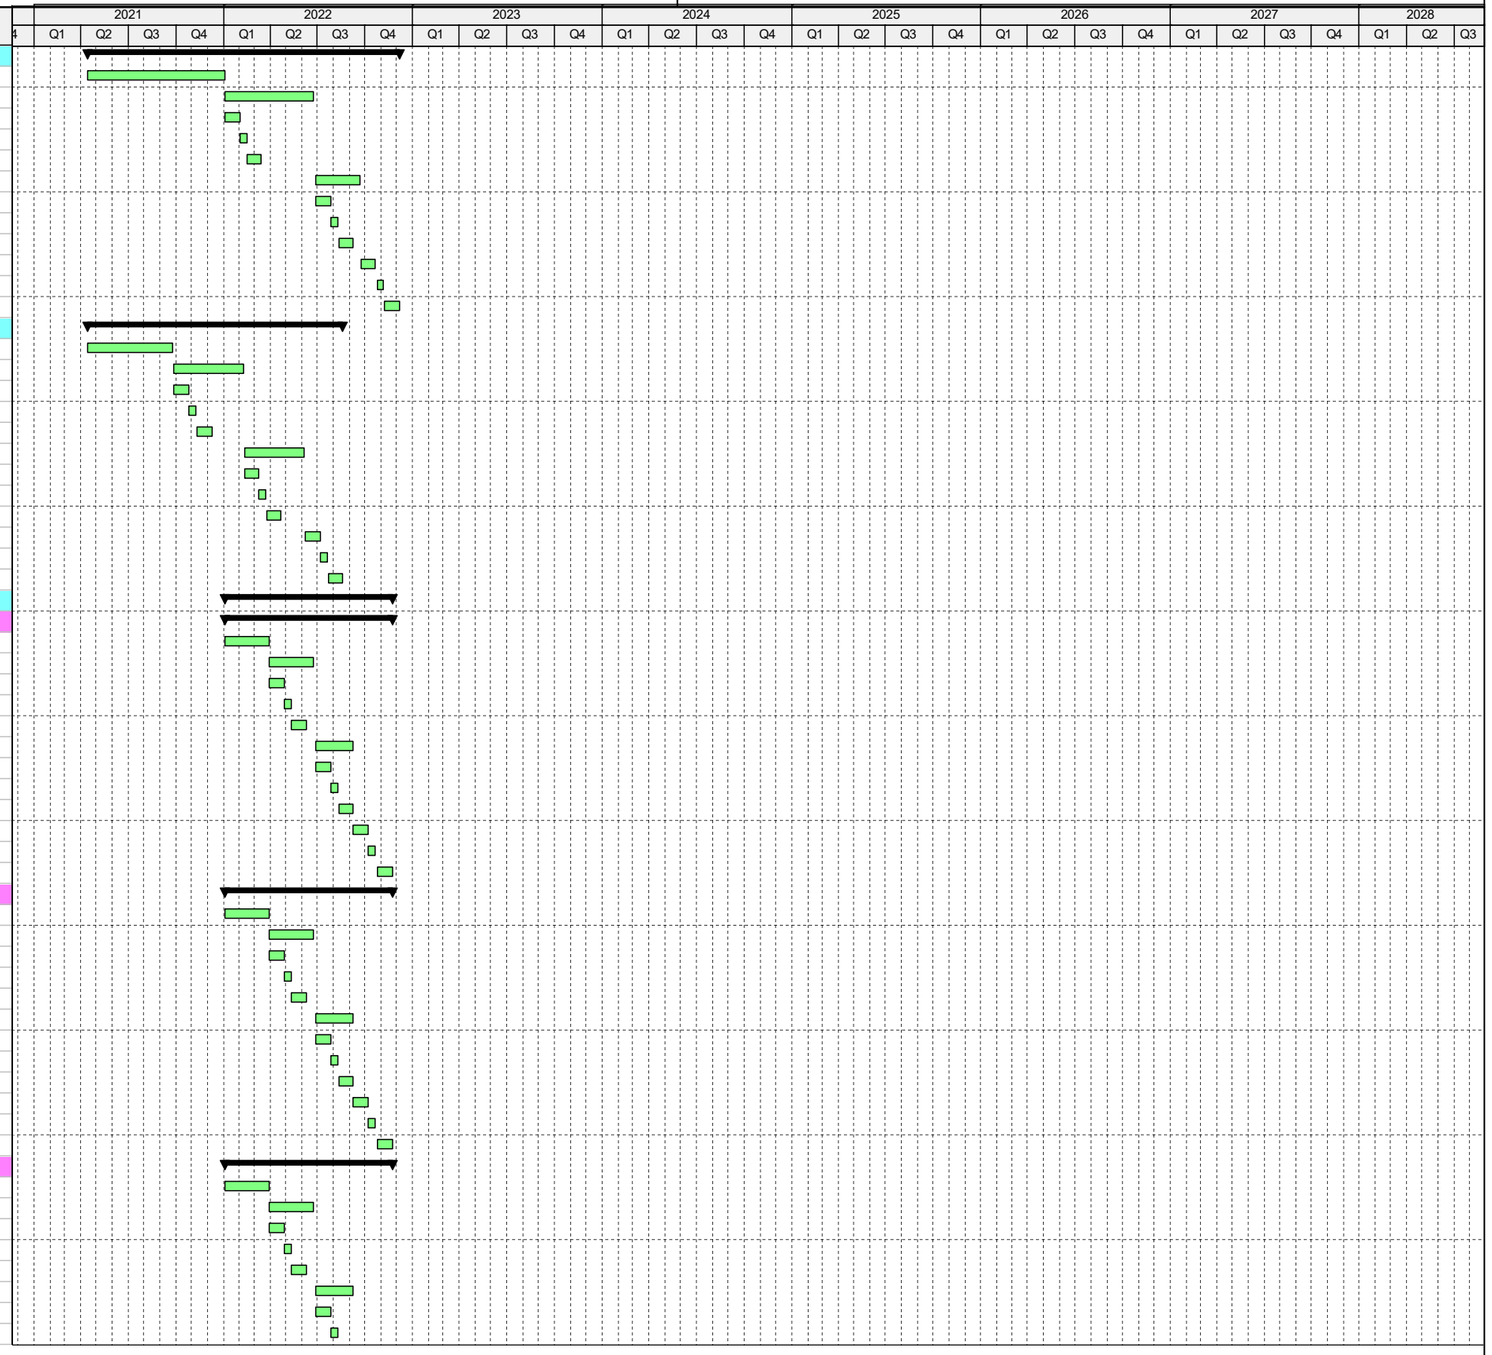

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-59180	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65310	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70360	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74300	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.13.03.4	**Sistema Contraincendios**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22350	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-35040	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-35050	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-38990	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41900	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-48980	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-48990	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55000	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59190	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65320	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70370	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74310	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.13.03.5	**Sistemas Electricos**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22360	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-35060	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-35070	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-39000	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41910	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-49000	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-49010	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55010	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59200	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65330	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70380	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74320	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.13.03.6	**Sistemas HYS**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22370	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-35080	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-35090	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-39010	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41920	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-49020	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-49030	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55020	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59210	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65340	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70390	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74330	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.13.03.7	**Sistemas SYC**	220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22380	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-35100	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-35110	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-39020	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41930	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-49040	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-49050	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55030	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59220	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65350	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70400	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74340	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.14	**Estación 14 (Calle 45)_Tipo _ Axial con interconexión**	410	13-Apr-21	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.14.01	**Estructura de la Nave Central**	410	13-Apr-21	06-Dec-22
P-6490	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	180	13-Apr-21	03-Jan-22
P-22390	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	04-Jan-22	24-Jun-22
P-22400	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Jan-22	01-Feb-22
P-26000	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Feb-22	15-Feb-22




Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-28290	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Feb-22	15-Mar-22
P-49060	Final 100%	60	28-Jun-22	22-Sep-22
P-49070	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55040	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59230	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-68220	Revisión de la interventoria R1 100%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-74350	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-76850	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.14.02 Nave Central Diseño Arquitectonico		336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-6500	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21
P-11440	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11450	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21
P-13830	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16380	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-27120	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-27130	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30660	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32880	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-44100	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50210	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52490	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.14.03 MEP Nave Central		220	04-Jan-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.14.03.1 Escaleras Electromecanicas		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22410	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-35120	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-35130	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-39030	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41940	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-49080	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-49090	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55050	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59240	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65360	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70410	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74360	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.14.03.2 Ascensores		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22420	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-35140	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-35150	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-39040	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41950	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-49100	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-49110	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55060	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59250	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65370	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70420	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74370	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.14.03.3 Sistema de Ventilación		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22430	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-35160	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-35170	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-39050	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41960	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-49120	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-49130	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55070	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59260	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65380	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70430	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74380	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.14.03.4 Sistema Contraincendios		220	04-Jan-22	22-Nov-22

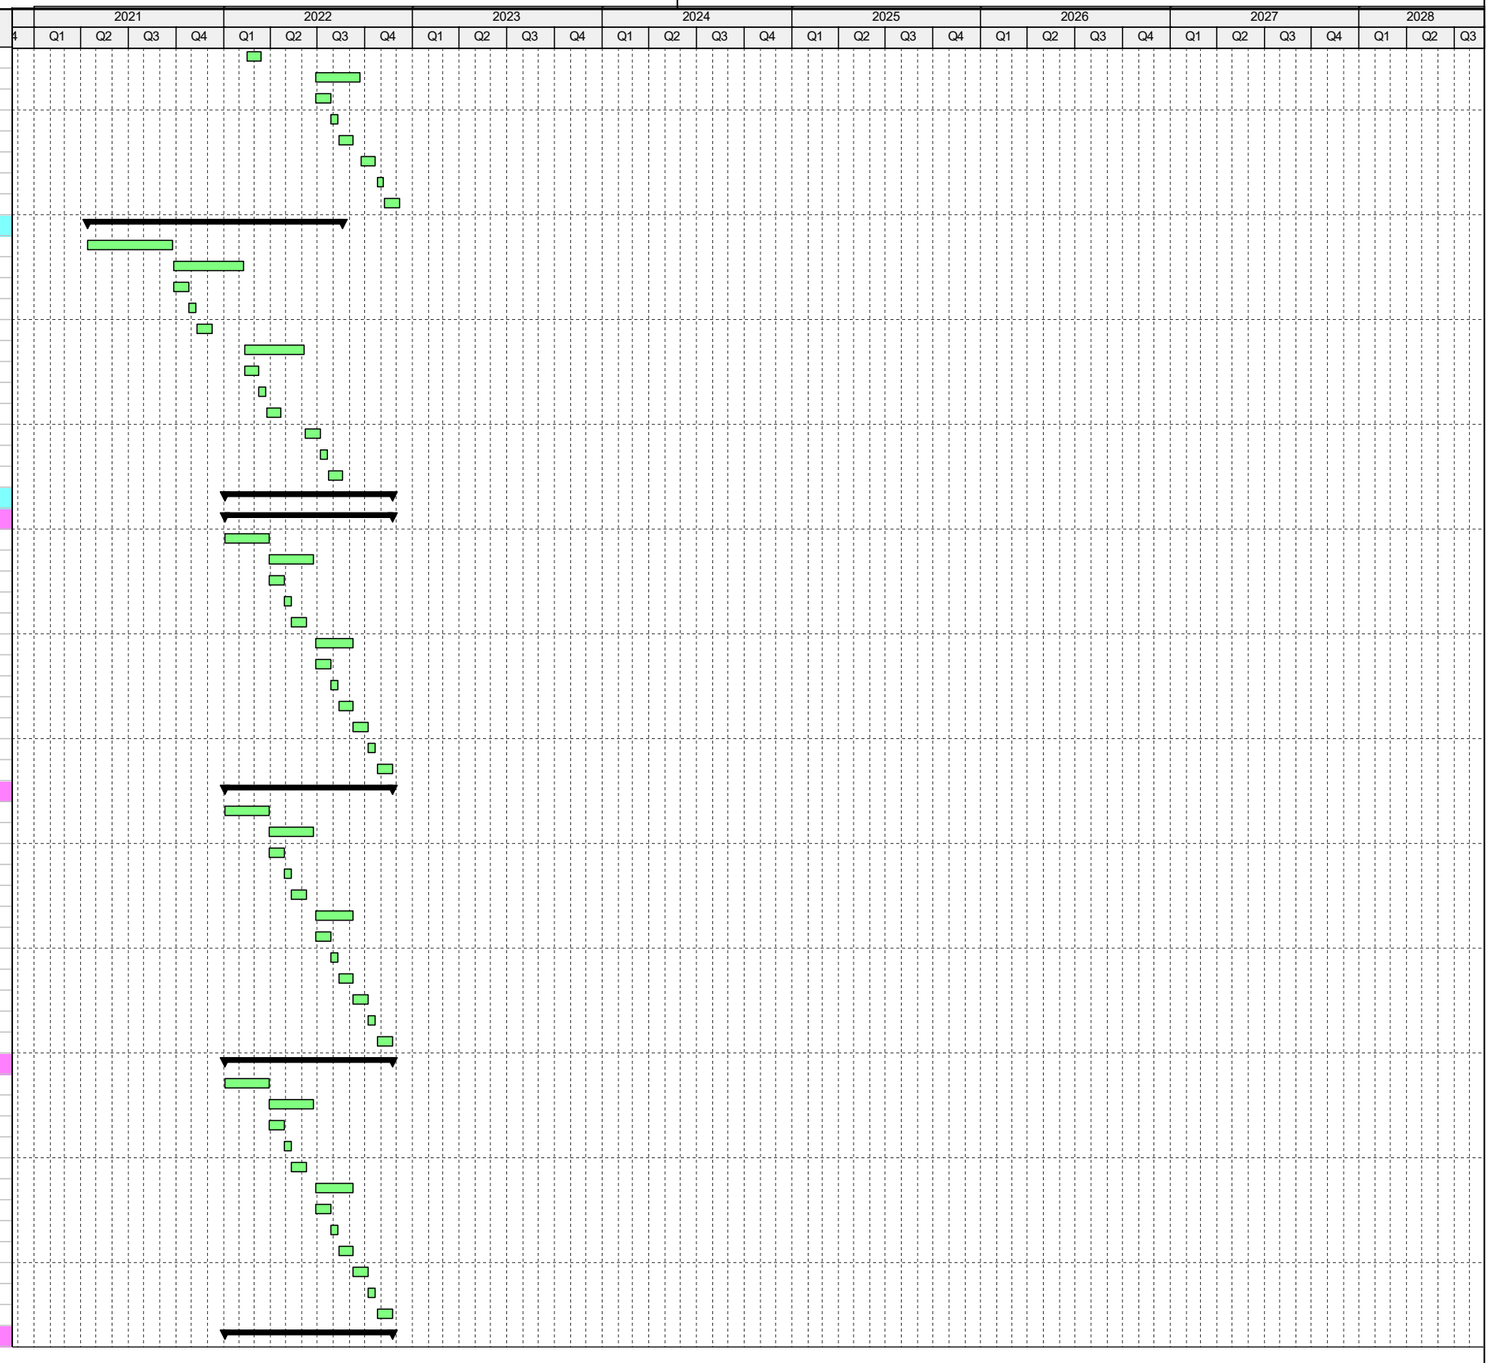

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-22440	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-35180	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-35190	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-39060	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41970	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-49140	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-49150	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55080	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59270	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65390	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70440	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74390	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.14.03.5 Sistemas Electricos		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22450	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-35200	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-35210	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-39070	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41980	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-49160	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-49170	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55090	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59280	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65400	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70450	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74400	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.14.03.6 Sistemas HYS		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22460	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-35220	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-35230	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-39080	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41990	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-49180	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-49190	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55100	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59290	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65410	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70460	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74410	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.14.03.7 Sistemas SYC		220	04-Jan-22	22-Nov-22
P-22470	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	04-Jan-22	30-Mar-22
P-35240	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	31-Mar-22	24-Jun-22
P-35250	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-39090	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-42000	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-49200	Final 100%	50	28-Jun-22	08-Sep-22
P-49210	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55110	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59300	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-65420	Revisión de la interventoria R1 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70470	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Oct-22	21-Oct-22
P-74420	Revisión de la interventoria R2 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.15 Estación 15 (Calle 63)_Type _ Axial con interconexión		430	13-Apr-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.15.01 Estructura de la Nave Central		430	13-Apr-21	04-Jan-23
P-6510	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	200	13-Apr-21	01-Feb-22
P-26010	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	02-Feb-22	27-Jul-22
P-26020	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-29560	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Mar-22	15-Mar-22
P-30990	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Mar-22	13-Apr-22
P-55120	Final 100%	60	28-Jul-22	21-Oct-22
P-55130	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61860	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65430	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-74430	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-79390	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	23-Nov-22	06-Dec-22
P-82480	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.15.02	**Nave Central Diseño Arquitectonico**	336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-6520	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21
P-11460	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11470	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21
P-13840	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16390	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-27140	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-27150	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30670	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32890	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-44110	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50220	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52500	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.15.03	**MEP Nave Central**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.15.03.1	**Escaleras Electromecanicas**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-26030	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-39100	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-39110	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43350	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45450	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-55140	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-55150	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61870	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65440	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70480	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76860	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79400	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.15.03.2	**Ascensores**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-26040	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-39120	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-39130	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43360	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45460	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-55160	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-55170	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61880	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65450	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70490	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76870	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79410	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.15.03.3	**Sistema de Ventilación**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-26050	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-39140	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-39150	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43370	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45470	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-55180	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-55190	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61890	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65460	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70500	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76880	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79420	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.15.03.4	**Sistema Contraincendios**	220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-26060	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-39160	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-39170	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43380	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45480	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22




Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-55200	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-55210	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61900	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65470	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70510	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76890	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79430	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.15.03.5 Sistemas Electricos		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-26070	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-39180	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-39190	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43390	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45490	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-55220	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-55230	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61910	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65480	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70520	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76900	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79440	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.15.03.6 Sistemas HYS		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-26080	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-39200	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-39210	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43400	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45500	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-55240	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-55250	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61920	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65490	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70530	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76910	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79450	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.15.03.7 Sistemas SYC		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-26090	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-39220	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-39230	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43410	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45510	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-55260	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-55270	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61930	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65500	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70540	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76920	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79460	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.16 Estación 16 (Calle 72)_Tipo _Axial con interconexión		430	13-Apr-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.16.01 Estructura de la Nave Central		430	13-Apr-21	04-Jan-23
P-6530	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Ubicación de soportes, Información g	200	13-Apr-21	01-Feb-22
P-26100	90% detalles (Fundacion Columna nave central, Plan de Nivel detalle, Elementos de h	120	02-Feb-22	27-Jul-22
P-26110	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-29570	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Mar-22	15-Mar-22
P-31000	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Mar-22	13-Apr-22
P-55280	Final 100%	60	28-Jul-22	21-Oct-22
P-55290	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61940	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65510	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-74440	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Oct-22	22-Nov-22
P-79470	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	23-Nov-22	06-Dec-22
P-82490	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.16.02 Nave Central Diseño Arquitectonico		336	13-Apr-21	19-Aug-22
P-6540	60% (Información general, Plan de Nivel, Sección Longitudinal&transversal, Cantidade	113	13-Apr-21	24-Sep-21

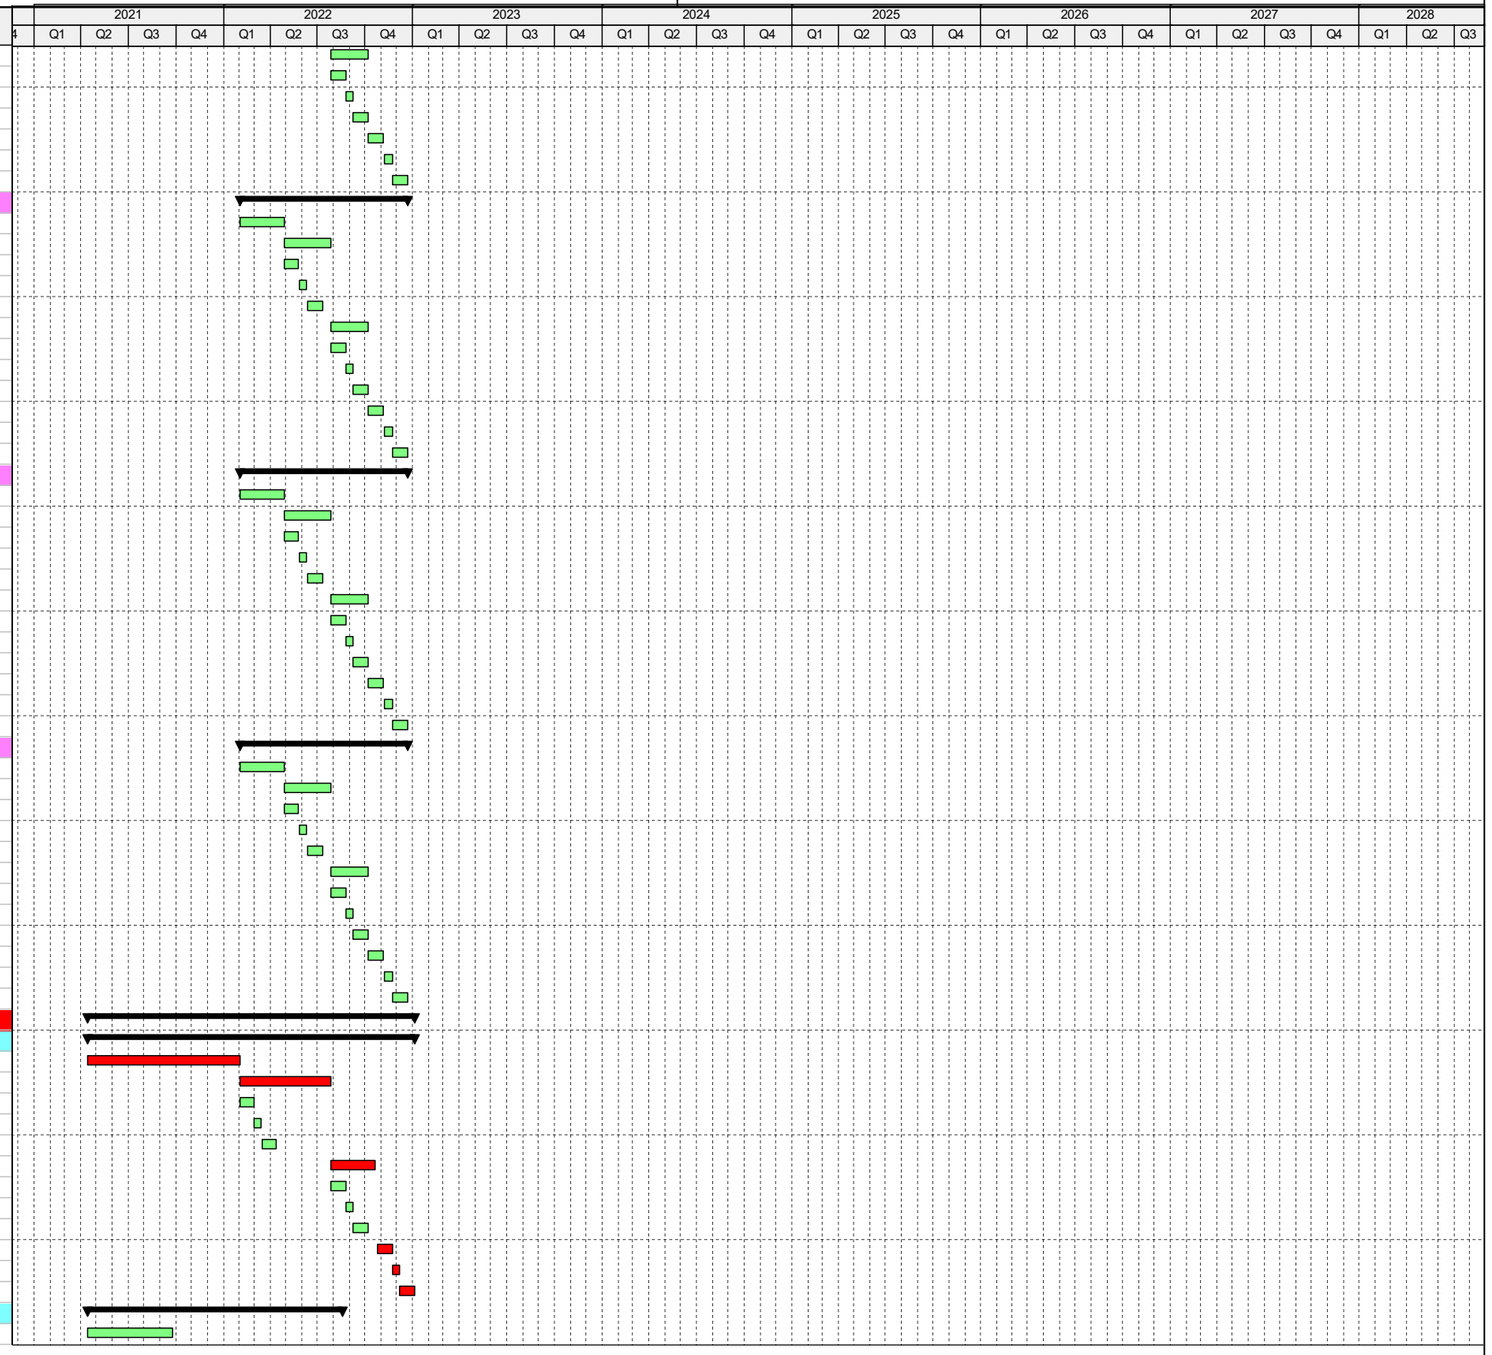


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-11480	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectónica, Informe de a	93	27-Sep-21	09-Feb-22
P-11490	Revisión de la interventoria R1 60%	20	27-Sep-21	25-Oct-21
P-13850	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	26-Oct-21	09-Nov-21
P-16400	Revisión de la interventoria R2 60%	20	10-Nov-21	09-Dec-21
P-27160	Final 100%	80	10-Feb-22	06-Jun-22
P-27170	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30680	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32900	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-44120	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Jun-22	06-Jul-22
P-50230	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	07-Jul-22	21-Jul-22
P-52510	Revisión de la interventoria R2 100%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.16.03 MEP Nave Central		220	02-Feb-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.16.03.1 Escaleras Electromecanicas		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-26120	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Escaleras electromec	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-39240	90% Elaboracion y entrega (Detalles Diseño de escalaeras electromecanicas)	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-39250	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43420	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45520	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-55300	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-55310	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61950	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65520	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70550	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76930	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79480	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.16.03.2 Ascensores		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-26130	60% (Especificaciones Técnicas, Cantidades, Diseño General de Ascensores)	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-39260	90% Elaboracion y entrega del diseño (Detalles Diseño de ascensores)	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-39270	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43430	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45530	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-55320	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-55330	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61960	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65530	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70560	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76940	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79490	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.16.03.3 Sistema de Ventilación		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-26140	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-39280	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-39290	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43440	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45540	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-55340	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-55350	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61970	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65540	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70570	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76950	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79500	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.16.03.4 Sistema Contraincendios		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-26150	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-39300	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-39310	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43450	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45550	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-55360	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-55370	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61980	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65550	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70580	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22

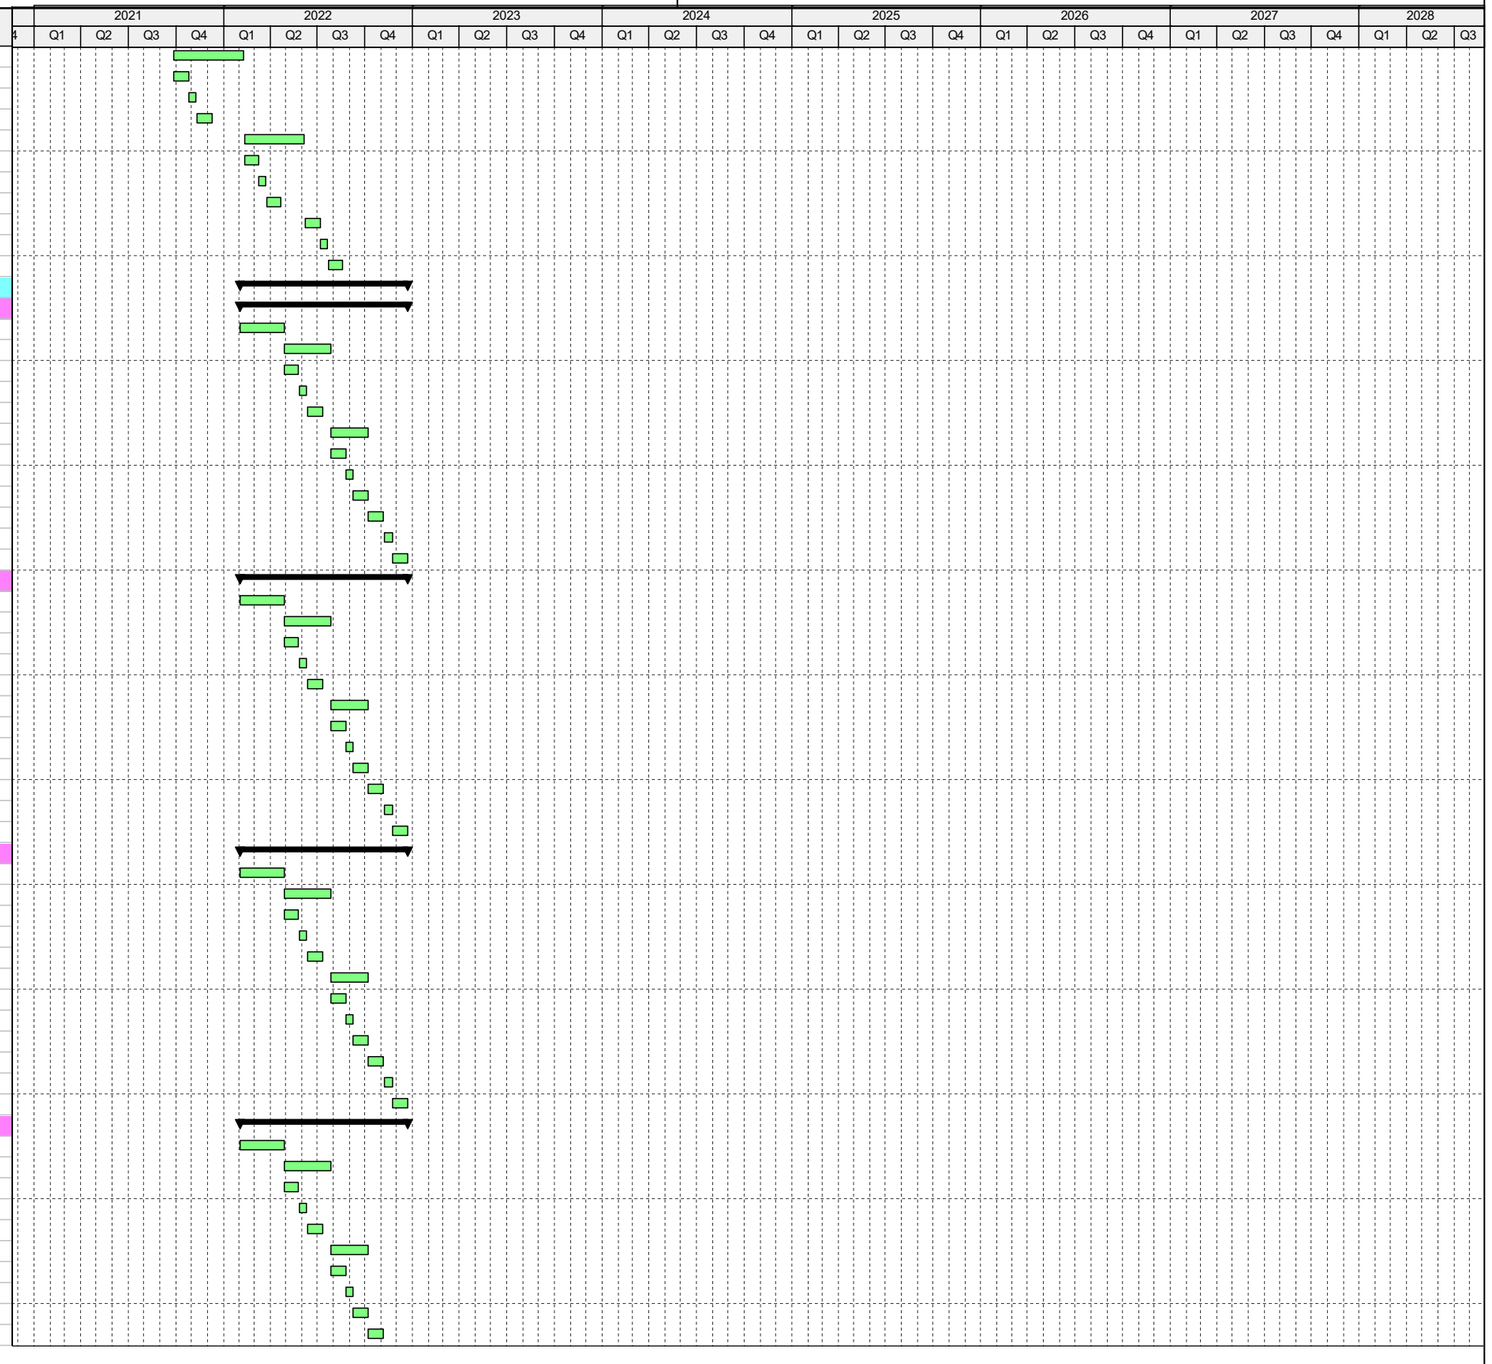

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-76960	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79510	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.16.03.5 Sistemas Electricos		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-26160	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-39320	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-39330	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43460	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45560	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-55380	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-55390	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61990	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65560	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70590	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76970	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79520	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.16.03.6 Sistemas HYS		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-26170	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-39340	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-39350	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43470	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45570	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-55400	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-55410	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-62000	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65570	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70600	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76980	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79530	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.16.03.7 Sistemas SYC		220	02-Feb-22	21-Dec-22
P-26180	60% Elaboracion y entrega del diseño	60	02-Feb-22	28-Apr-22
P-39360	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	60	29-Apr-22	27-Jul-22
P-39370	Revisión de la interventoria R1 60%	20	29-Apr-22	26-May-22
P-43480	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	27-May-22	10-Jun-22
P-45580	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-55420	Final 100%	50	28-Jul-22	06-Oct-22
P-55430	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-62010	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65580	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-70610	Revisión de la interventoria R1 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-76990	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	08-Nov-22	22-Nov-22
P-79540	Revisión de la interventoria R2 100%	20	23-Nov-22	21-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.17 Edificio CCO		335	22-Jul-21	24-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.17.01 Estructura Edificio		335	22-Jul-21	24-Nov-22
P-9390	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Plan de acceso,Plan de cuarto nivel,l	150	22-Jul-21	24-Feb-22
P-28760	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Secciones)	95	25-Feb-22	14-Jul-22
P-28770	Revisión de la interventoria R1 60%	20	25-Feb-22	25-Mar-22
P-32960	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Mar-22	08-Apr-22
P-35760	Revisión de la interventoria R2 60%	20	11-Apr-22	09-May-22
P-51130	Final 100%	45	15-Jul-22	19-Sep-22
P-51140	Revisión de la interventoria R1 90%	20	15-Jul-22	12-Aug-22
P-59490	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	5	16-Aug-22	22-Aug-22
P-60590	Revisión de la interventoria R2 90%	20	23-Aug-22	19-Sep-22
P-67240	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Sep-22	18-Oct-22
P-72190	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	19-Oct-22	25-Oct-22
P-74520	Revisión de la interventoria R2 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.17.02 Arquitectura Edificio		316	22-Jul-21	26-Oct-22
P-9400	60% Elaboracion y entrega del diseño preliminar (Plan de acceso,Plan de cuarto nivel,l	113	22-Jul-21	03-Jan-22
P-20910	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Secciones)	93	04-Jan-22	17-May-22
P-20920	Revisión de la interventoria R1 60%	20	04-Jan-22	01-Feb-22
P-25440	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Feb-22	15-Feb-22
P-27970	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Feb-22	15-Mar-22
P-42310	Final 100%	60	18-May-22	16-Aug-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-42320	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-May-22	15-Jun-22
P-45980	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	16-Jun-22	30-Jun-22
P-50000	Revisión de la interventoria R2 90%	20	01-Jul-22	01-Aug-22
P-60090	Revisión de la interventoria R1 100%	20	17-Aug-22	13-Sep-22
P-67100	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	14-Sep-22	27-Sep-22
P-68450	Revisión de la interventoria R2 100%	20	28-Sep-22	26-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.17.03 Instalaciones edificio		324	22-Jul-21	08-Nov-22
P-9410	60% Elaboracion y entrega del diseño	174	22-Jul-21	31-Mar-22
P-35310	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	01-Apr-22	13-Jun-22
P-35320	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Apr-22	29-Apr-22
P-39430	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-May-22	13-May-22
P-42150	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-May-22	13-Jun-22
P-45710	Final 100%	50	14-Jun-22	26-Aug-22
P-45720	Revisión de la interventoria R1 90%	20	14-Jun-22	13-Jul-22
P-50950	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	14-Jul-22	28-Jul-22
P-55620	Revisión de la interventoria R2 90%	20	29-Jul-22	26-Aug-22
P-62230	Revisión de la interventoria R1 100%	20	29-Aug-22	23-Sep-22
P-68310	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Sep-22	07-Oct-22
P-70780	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Oct-22	08-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.17.04 Equipos		190	18-Feb-22	24-Nov-22
P-28440	60% Elaboracion y entrega del diseño	50	18-Feb-22	02-May-22
P-39450	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	50	03-May-22	14-Jul-22
P-39460	Revisión de la interventoria R1 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-43740	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Jun-22	14-Jun-22
P-45970	Revisión de la interventoria R2 60%	20	15-Jun-22	14-Jul-22
P-51150	Final 100%	45	15-Jul-22	19-Sep-22
P-51160	Revisión de la interventoria R1 90%	20	15-Jul-22	12-Aug-22
P-59500	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	16-Aug-22	29-Aug-22
P-62280	Revisión de la interventoria R2 90%	20	30-Aug-22	26-Sep-22
P-67250	Revisión de la interventoria R1 100%	20	20-Sep-22	18-Oct-22
P-72200	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	19-Oct-22	25-Oct-22
P-74530	Revisión de la interventoria R2 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.18 Edificios de Acceso Estacion 3		350	10-Jun-21	04-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.18.01 Diseño Estructural		330	10-Jun-21	06-Oct-22
P-8270	60% (Apoyo tecnico a los diseños, Ubicacion,Informacion general, Cantidades, Cimen	160	10-Jun-21	01-Feb-22
P-25450	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles constructivos,Estructura de	70	02-Feb-22	12-May-22
P-25460	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-29170	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Mar-22	15-Mar-22
P-30920	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Mar-22	13-Apr-22
P-40900	Final 100%	50	13-May-22	27-Jul-22
P-40910	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-44980	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47260	Revisión de la interventoria R2 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-53730	Revisión de la interventoria R1 100%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61480	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64290	Revisión de la interventoria R2 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.18.02 Diseño Arquitectonico		309	10-Jun-21	07-Sep-22
P-8280	60% (Índice de documentos,Plano del nivel,Cantidades,Elevaciones y leyenda)	159	10-Jun-21	31-Jan-22
P-25260	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Seccion longitudinal,Plan de detalle	50	01-Feb-22	12-Apr-22
P-25270	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Feb-22	28-Feb-22
P-28930	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Mar-22	14-Mar-22
P-30860	Revisión de la interventoria R2 60%	20	15-Mar-22	12-Apr-22
P-36000	Final 100%	50	13-Apr-22	23-Jun-22
P-36010	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Apr-22	11-May-22
P-40640	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	12-May-22	25-May-22
P-42650	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-May-22	23-Jun-22
P-47070	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Jun-22	26-Jul-22
P-53350	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	27-Jul-22	09-Aug-22
P-58250	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Aug-22	07-Sep-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.18.03 MEP		190	02-Feb-22	04-Nov-22
P-26190	60% (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Memorias de Calculo,Diagrama princ	50	02-Feb-22	13-Apr-22
P-36250	90% de detalle(Salas electricas planta general,Diagramas unifilares,Sistema de protec	50	14-Apr-22	24-Jun-22

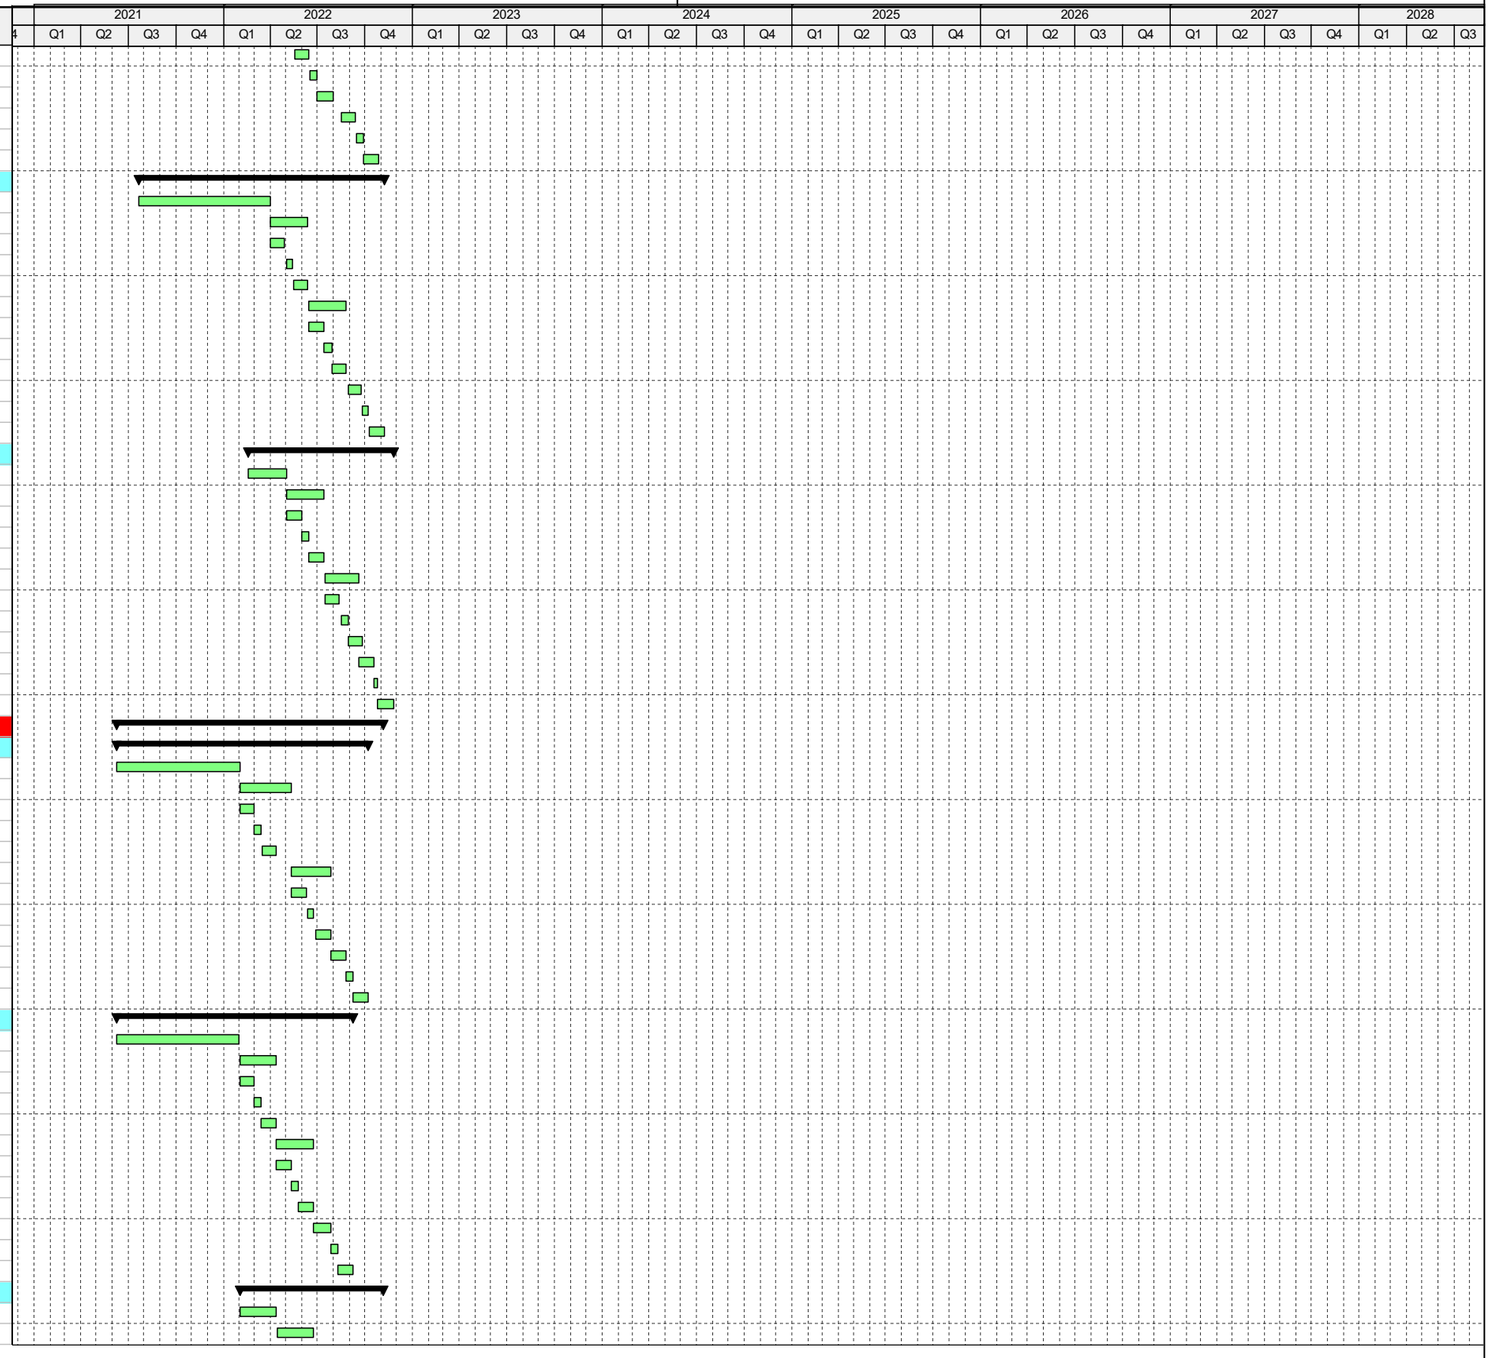

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-36260	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Apr-22	12-May-22
P-42010	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-May-22	26-May-22
P-43490	Revisión de la interventoria R2 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-49220	Final 100%	45	28-Jun-22	01-Sep-22
P-49230	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55440	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59310	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-63500	Revisión de la interventoria R1 100%	20	02-Sep-22	29-Sep-22
P-68570	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	30-Sep-22	06-Oct-22
P-70630	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.19 Edificios de Acceso Estacion 4		350	10-Jun-21	04-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.19.01 Diseño Estructural		330	10-Jun-21	06-Oct-22
P-8290	60% (Apoyo tecnico a los diseños, Ubicacion,Informacion general, Cantidades, Cimen	160	10-Jun-21	01-Feb-22
P-25470	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles constructivos,Estructura de	70	02-Feb-22	12-May-22
P-25480	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-29180	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Mar-22	15-Mar-22
P-30930	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Mar-22	13-Apr-22
P-40920	Final 100%	50	13-May-22	27-Jul-22
P-40930	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-44990	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47270	Revisión de la interventoria R2 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-53740	Revisión de la interventoria R1 100%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61490	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64300	Revisión de la interventoria R2 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.19.02 Diseño Arquitectonico		309	10-Jun-21	07-Sep-22
P-8300	60% (Índice de documentos,Plano del nivel,Cantidades,Elevaciones y leyenda)	159	10-Jun-21	31-Jan-22
P-25280	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Seccion longitudinal,Plan de detalle	50	01-Feb-22	12-Apr-22
P-25290	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Feb-22	28-Feb-22
P-28940	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Mar-22	14-Mar-22
P-30870	Revisión de la interventoria R2 60%	20	15-Mar-22	12-Apr-22
P-36020	Final 100%	50	13-Apr-22	23-Jun-22
P-36030	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Apr-22	11-May-22
P-40650	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	12-May-22	25-May-22
P-42660	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-May-22	23-Jun-22
P-47080	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Jun-22	26-Jul-22
P-53360	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	27-Jul-22	09-Aug-22
P-58260	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Aug-22	07-Sep-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.19.03 MEP		190	02-Feb-22	04-Nov-22
P-26200	60% (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Memorias de Calculo,Diagrama princ	50	02-Feb-22	13-Apr-22
P-36270	90% de detalle(Salas electricas planta general,Diagramas unifilares,Sistema de protec	50	14-Apr-22	24-Jun-22
P-36280	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Apr-22	12-May-22
P-42020	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-May-22	26-May-22
P-43500	Revisión de la interventoria R2 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-49240	Final 100%	45	28-Jun-22	01-Sep-22
P-49250	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55450	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59320	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-63510	Revisión de la interventoria R1 100%	20	02-Sep-22	29-Sep-22
P-68580	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	30-Sep-22	06-Oct-22
P-70640	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.20 Edificios de Acceso Estacion 5		350	10-Jun-21	04-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.20.01 Diseño Estructural		330	10-Jun-21	06-Oct-22
P-8310	60% (Apoyo tecnico a los diseños, Ubicacion,Informacion general, Cantidades, Cimen	160	10-Jun-21	01-Feb-22
P-25490	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles constructivos,Estructura de	70	02-Feb-22	12-May-22
P-25500	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-29190	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Mar-22	15-Mar-22
P-30940	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Mar-22	13-Apr-22
P-40940	Final 100%	50	13-May-22	27-Jul-22
P-40950	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45000	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47280	Revisión de la interventoria R2 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-53750	Revisión de la interventoria R1 100%	20	28-Jul-22	25-Aug-22



Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-61500	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64310	Revisión de la interventoria R2 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.20.02 Diseño Arquitectonico		309	10-Jun-21	07-Sep-22
P-8320	60% (Índice de documentos,Plano del nivel,Cantidades,Elevaciones y leyenda)	159	10-Jun-21	31-Jan-22
P-25300	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Seccion longitudinal,Plan de detalle	50	01-Feb-22	12-Apr-22
P-25310	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Feb-22	28-Feb-22
P-28950	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Mar-22	14-Mar-22
P-30880	Revisión de la interventoria R2 60%	20	15-Mar-22	12-Apr-22
P-36040	Final 100%	50	13-Apr-22	23-Jun-22
P-36050	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Apr-22	11-May-22
P-40660	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	12-May-22	25-May-22
P-42670	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-May-22	23-Jun-22
P-47090	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Jun-22	26-Jul-22
P-53370	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	27-Jul-22	09-Aug-22
P-58270	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Aug-22	07-Sep-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.20.03 MEP		190	02-Feb-22	04-Nov-22
P-26210	60% (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Memorias de Calculo,Diagrama princ	50	02-Feb-22	13-Apr-22
P-36290	90% de detalle(Salas electricas planta general,Diagramas unifilares,Sistema de protec	50	14-Apr-22	24-Jun-22
P-36300	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Apr-22	12-May-22
P-42030	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-May-22	26-May-22
P-43510	Revisión de la interventoria R2 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-49260	Final 100%	45	28-Jun-22	01-Sep-22
P-49270	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55460	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59330	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-63520	Revisión de la interventoria R1 100%	20	02-Sep-22	29-Sep-22
P-68590	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	30-Sep-22	06-Oct-22
P-70650	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.21 Edificios de Acceso Estacion 7		350	10-Jun-21	04-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.21.01 Diseño Estructural		330	10-Jun-21	06-Oct-22
P-8330	60% (Apoyo tecnico a los diseños, Ubicacion,Informacion general, Cantidades, Cimen	160	10-Jun-21	01-Feb-22
P-25510	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles constructivos,Estructura de	70	02-Feb-22	12-May-22
P-25520	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-29200	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	02-Mar-22	15-Mar-22
P-30950	Revisión de la interventoria R2 60%	20	16-Mar-22	13-Apr-22
P-40960	Final 100%	50	13-May-22	27-Jul-22
P-40970	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45010	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-47290	Revisión de la interventoria R2 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-53760	Revisión de la interventoria R1 100%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61510	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64320	Revisión de la interventoria R2 100%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.21.02 Diseño Arquitectonico		309	10-Jun-21	07-Sep-22
P-8340	60% (Índice de documentos,Plano del nivel,Cantidades,Elevaciones y leyenda)	159	10-Jun-21	31-Jan-22
P-25320	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Seccion longitudinal,Plan de detalle	50	01-Feb-22	12-Apr-22
P-25330	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Feb-22	28-Feb-22
P-28960	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Mar-22	14-Mar-22
P-30890	Revisión de la interventoria R2 60%	20	15-Mar-22	12-Apr-22
P-36060	Final 100%	50	13-Apr-22	23-Jun-22
P-36070	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Apr-22	11-May-22
P-40670	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	12-May-22	25-May-22
P-42680	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-May-22	23-Jun-22
P-47100	Revisión de la interventoria R1 100%	20	24-Jun-22	26-Jul-22
P-53380	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	27-Jul-22	09-Aug-22
P-58280	Revisión de la interventoria R2 100%	20	10-Aug-22	07-Sep-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.21.03 MEP		190	02-Feb-22	04-Nov-22
P-26220	60% (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Memorias de Calculo,Diagrama princ	50	02-Feb-22	13-Apr-22
P-36310	90% de detalle(Salas electricas planta general,Diagramas unifilares,Sistema de protec	50	14-Apr-22	24-Jun-22
P-36320	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Apr-22	12-May-22
P-42040	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-May-22	26-May-22
P-43520	Revisión de la interventoria R2 60%	20	27-May-22	24-Jun-22
P-49280	Final 100%	45	28-Jun-22	01-Sep-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-49290	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55470	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-59340	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-63530	Revisión de la interventoria R1 100%	20	02-Sep-22	29-Sep-22
P-68600	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	30-Sep-22	06-Oct-22
P-70660	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.22 Edificios de Acceso Estacion 9		350	12-Jul-21	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.22.01 Diseño Estructural		330	12-Jul-21	04-Nov-22
P-9130	60% (Apoyo tecnico a los diseños, Ubicacion,Informacion general, Cantidades, Cimen	160	12-Jul-21	01-Mar-22
P-29210	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles constructivos,Estructura de	70	02-Mar-22	10-Jun-22
P-29220	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-33710	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	31-Mar-22	13-Apr-22
P-36200	Revisión de la interventoria R2 60%	20	14-Apr-22	12-May-22
P-45020	Final 100%	50	13-Jun-22	25-Aug-22
P-45030	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-50600	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	13-Jul-22	27-Jul-22
P-53770	Revisión de la interventoria R2 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61520	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Aug-22	22-Sep-22
P-67840	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	23-Sep-22	06-Oct-22
P-69420	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.22.02 Diseño Arquitectonico		309	12-Jul-21	05-Oct-22
P-9140	60% (Índice de documentos,Plano del nivel,Cantidades,Elevaciones y leyenda)	159	12-Jul-21	28-Feb-22
P-28970	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Seccion longitudinal,Plan de detalle	50	01-Mar-22	11-May-22
P-28980	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Mar-22	29-Mar-22
P-33420	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	30-Mar-22	12-Apr-22
P-36080	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Apr-22	11-May-22
P-40680	Final 100%	50	12-May-22	26-Jul-22
P-40690	Revisión de la interventoria R1 90%	20	12-May-22	09-Jun-22
P-44760	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Jun-22	23-Jun-22
P-47110	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Jun-22	26-Jul-22
P-53390	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-Jul-22	24-Aug-22
P-61260	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Aug-22	07-Sep-22
P-64080	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Sep-22	05-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.22.03 MEP		190	02-Mar-22	06-Dec-22
P-29580	60% (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Memorias de Calculo,Diagrama princ	50	02-Mar-22	12-May-22
P-42050	90% de detalle(Salas electricas planta general,Diagramas unifilares,Sistema de proteo	50	13-May-22	27-Jul-22
P-42060	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45590	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-49300	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55480	Final 100%	45	28-Jul-22	29-Sep-22
P-55490	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-62020	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65600	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-68610	Revisión de la interventoria R1 100%	20	30-Sep-22	28-Oct-22
P-75240	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	31-Oct-22	04-Nov-22
P-77000	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.23 Edificios de Acceso Estacion 10		350	12-Jul-21	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.23.01 Diseño Estructural		330	12-Jul-21	04-Nov-22
P-9150	60% (Apoyo tecnico a los diseños, Ubicacion,Informacion general, Cantidades, Cimen	160	12-Jul-21	01-Mar-22
P-29230	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles constructivos,Estructura de	70	02-Mar-22	10-Jun-22
P-29240	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-33720	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	31-Mar-22	13-Apr-22
P-36210	Revisión de la interventoria R2 60%	20	14-Apr-22	12-May-22
P-45040	Final 100%	50	13-Jun-22	25-Aug-22
P-45050	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-50610	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	13-Jul-22	27-Jul-22
P-53780	Revisión de la interventoria R2 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61530	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Aug-22	22-Sep-22
P-67850	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	23-Sep-22	06-Oct-22
P-69430	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.23.02 Diseño Arquitectonico		309	12-Jul-21	05-Oct-22
P-9160	60% (Índice de documentos,Plano del nivel,Cantidades,Elevaciones y leyenda)	159	12-Jul-21	28-Feb-22

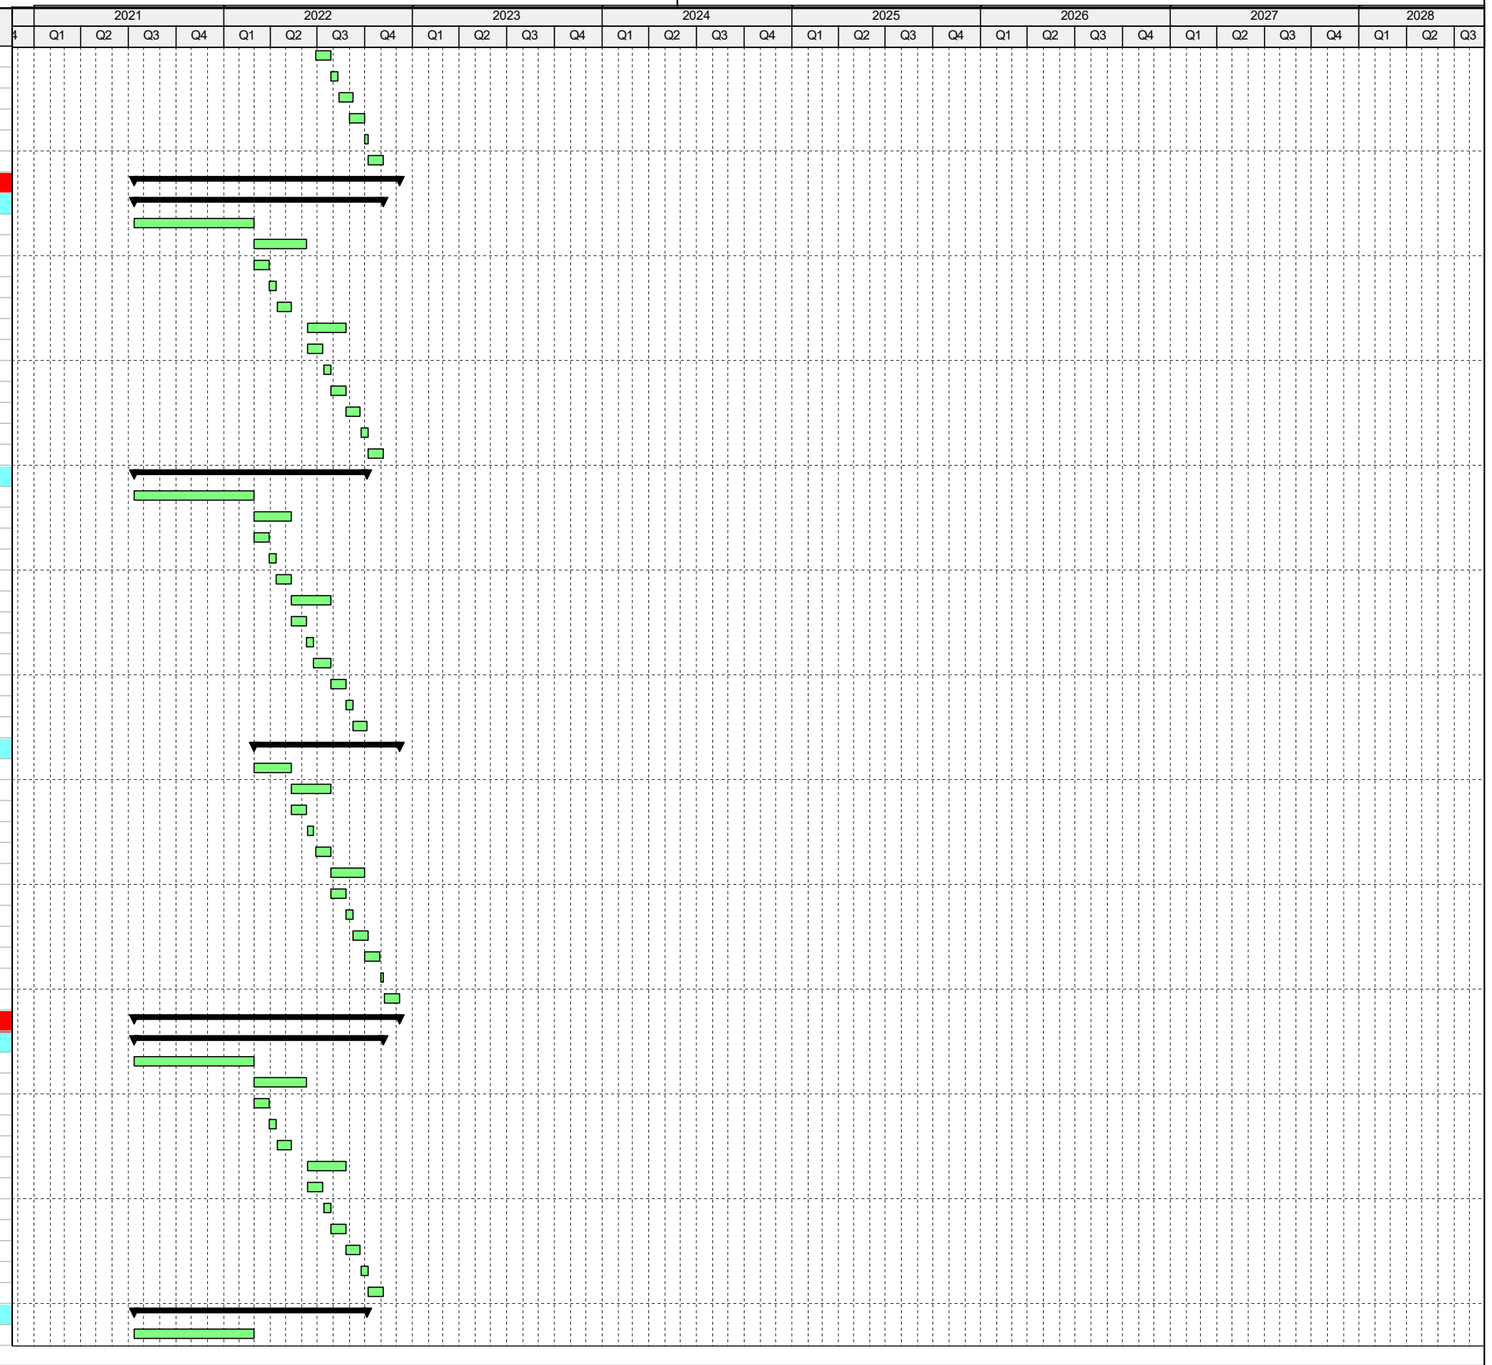


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-28990	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Seccion longitudinal,Plan de detalle	50	01-Mar-22	11-May-22
P-29000	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Mar-22	29-Mar-22
P-33430	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	30-Mar-22	12-Apr-22
P-36090	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Apr-22	11-May-22
P-40700	Final 100%	50	12-May-22	26-Jul-22
P-40710	Revisión de la interventoria R1 90%	20	12-May-22	09-Jun-22
P-44770	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Jun-22	23-Jun-22
P-47120	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Jun-22	26-Jul-22
P-53400	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-Jul-22	24-Aug-22
P-61270	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Aug-22	07-Sep-22
P-64090	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Sep-22	05-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.23.03 MEP		190	02-Mar-22	06-Dec-22
P-29590	60% (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Memorias de Calculo,Diagrama princ	50	02-Mar-22	12-May-22
P-42070	90% de detalle(Salas electricas planta general,Diagramas unifilares,Sistema de proteo	50	13-May-22	27-Jul-22
P-42080	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45600	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-49310	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55500	Final 100%	45	28-Jul-22	29-Sep-22
P-55510	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-62030	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65610	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-68620	Revisión de la interventoria R1 100%	20	30-Sep-22	28-Oct-22
P-75250	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	31-Oct-22	04-Nov-22
P-77010	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.24 Edificios de Acceso Estacion 11		350	12-Jul-21	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.24.01 Diseño Estructural		330	12-Jul-21	04-Nov-22
P-9170	60% (Apoyo tecnico a los diseños, Ubicacion,Informacion general, Cantidades, Cimen	160	12-Jul-21	01-Mar-22
P-29250	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles constructivos,Estructura de	70	02-Mar-22	10-Jun-22
P-29260	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-33730	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	31-Mar-22	13-Apr-22
P-36220	Revisión de la interventoria R2 60%	20	14-Apr-22	12-May-22
P-45060	Final 100%	50	13-Jun-22	25-Aug-22
P-45070	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-50620	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	13-Jul-22	27-Jul-22
P-53790	Revisión de la interventoria R2 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61540	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Aug-22	22-Sep-22
P-67860	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	23-Sep-22	06-Oct-22
P-69440	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.24.02 Diseño Arquitectonico		309	12-Jul-21	05-Oct-22
P-9180	60% (Índice de documentos,Plano del nivel,Cantidades,Elevaciones y leyenda)	159	12-Jul-21	28-Feb-22
P-29010	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Seccion longitudinal,Plan de detalle	50	01-Mar-22	11-May-22
P-29020	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Mar-22	29-Mar-22
P-33440	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	30-Mar-22	12-Apr-22
P-36100	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Apr-22	11-May-22
P-40720	Final 100%	50	12-May-22	26-Jul-22
P-40730	Revisión de la interventoria R1 90%	20	12-May-22	09-Jun-22
P-44780	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Jun-22	23-Jun-22
P-47130	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Jun-22	26-Jul-22
P-53410	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-Jul-22	24-Aug-22
P-61280	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Aug-22	07-Sep-22
P-64100	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Sep-22	05-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.24.03 MEP		190	02-Mar-22	06-Dec-22
P-29600	60% (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Memorias de Calculo,Diagrama princ	50	02-Mar-22	12-May-22
P-42090	90% de detalle(Salas electricas planta general,Diagramas unifilares,Sistema de proteo	50	13-May-22	27-Jul-22
P-42100	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45610	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-49320	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55520	Final 100%	45	28-Jul-22	29-Sep-22
P-55530	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-62040	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65620	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-68630	Revisión de la interventoria R1 100%	20	30-Sep-22	28-Oct-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-75260	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	31-Oct-22	04-Nov-22
P-77020	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.25 Edificios de Acceso Estacion 12		350	12-Jul-21	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.25.01 Diseño Estructural		330	12-Jul-21	04-Nov-22
P-9190	60% (Apoyo tecnico a los diseños, Ubicacion,Informacion general, Cantidades, Cimen	160	12-Jul-21	01-Mar-22
P-29270	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles constructivos,Estructura de	70	02-Mar-22	10-Jun-22
P-29280	Revisión de la interventoria R1 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-33740	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	31-Mar-22	13-Apr-22
P-36230	Revisión de la interventoria R2 60%	20	14-Apr-22	12-May-22
P-45080	Final 100%	50	13-Jun-22	25-Aug-22
P-45090	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-50630	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	13-Jul-22	27-Jul-22
P-53800	Revisión de la interventoria R2 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61550	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Aug-22	22-Sep-22
P-67870	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	23-Sep-22	06-Oct-22
P-69450	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.25.02 Diseño Arquitectonico		309	12-Jul-21	05-Oct-22
P-9200	60% (Índice de documentos,Plano del nivel,Cantidades,Elevaciones y leyenda)	159	12-Jul-21	28-Feb-22
P-29030	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Seccion longitudinal,Plan de detalle	50	01-Mar-22	11-May-22
P-29040	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Mar-22	29-Mar-22
P-33450	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	30-Mar-22	12-Apr-22
P-36110	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Apr-22	11-May-22
P-40740	Final 100%	50	12-May-22	26-Jul-22
P-40750	Revisión de la interventoria R1 90%	20	12-May-22	09-Jun-22
P-44790	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Jun-22	23-Jun-22
P-47140	Revisión de la interventoria R2 90%	20	24-Jun-22	26-Jul-22
P-53420	Revisión de la interventoria R1 100%	20	27-Jul-22	24-Aug-22
P-61290	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Aug-22	07-Sep-22
P-64110	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Sep-22	05-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.25.03 MEP		190	02-Mar-22	06-Dec-22
P-29610	60% (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Memorias de Calculo,Diagrama princ	50	02-Mar-22	12-May-22
P-42110	90% de detalle(Salas electricas planta general,Diagramas unifilares,Sistema de protec	50	13-May-22	27-Jul-22
P-42120	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-45620	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jun-22	24-Jun-22
P-49330	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-55540	Final 100%	45	28-Jul-22	29-Sep-22
P-55550	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-62050	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-65630	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-68640	Revisión de la interventoria R1 100%	20	30-Sep-22	28-Oct-22
P-75270	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	31-Oct-22	04-Nov-22
P-77030	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.26 Edificios de Acceso Estacion 13		350	10-Aug-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.26.01 Diseño Estructural		330	10-Aug-21	06-Dec-22
P-10260	60% (Apoyo tecnico a los diseños, Ubicacion,Informacion general, Cantidades, Cimen	160	10-Aug-21	30-Mar-22
P-33750	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles constructivos,Estructura de	70	31-Mar-22	12-Jul-22
P-33760	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-37930	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-40980	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-50640	Final 100%	50	13-Jul-22	22-Sep-22
P-50650	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-58400	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Aug-22	25-Aug-22
P-61560	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Aug-22	22-Sep-22
P-67880	Revisión de la interventoria R1 100%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73240	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-76330	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.26.02 Diseño Arquitectonico		309	10-Aug-21	03-Nov-22
P-10270	60% (Índice de documentos,Plano del nivel,Cantidades,Elevaciones y leyenda)	159	10-Aug-21	29-Mar-22
P-33460	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Seccion longitudinal,Plan de detalle	50	30-Mar-22	09-Jun-22
P-33470	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Mar-22	27-Apr-22
P-37680	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Apr-22	11-May-22
P-40760	Revisión de la interventoria R2 60%	20	12-May-22	09-Jun-22

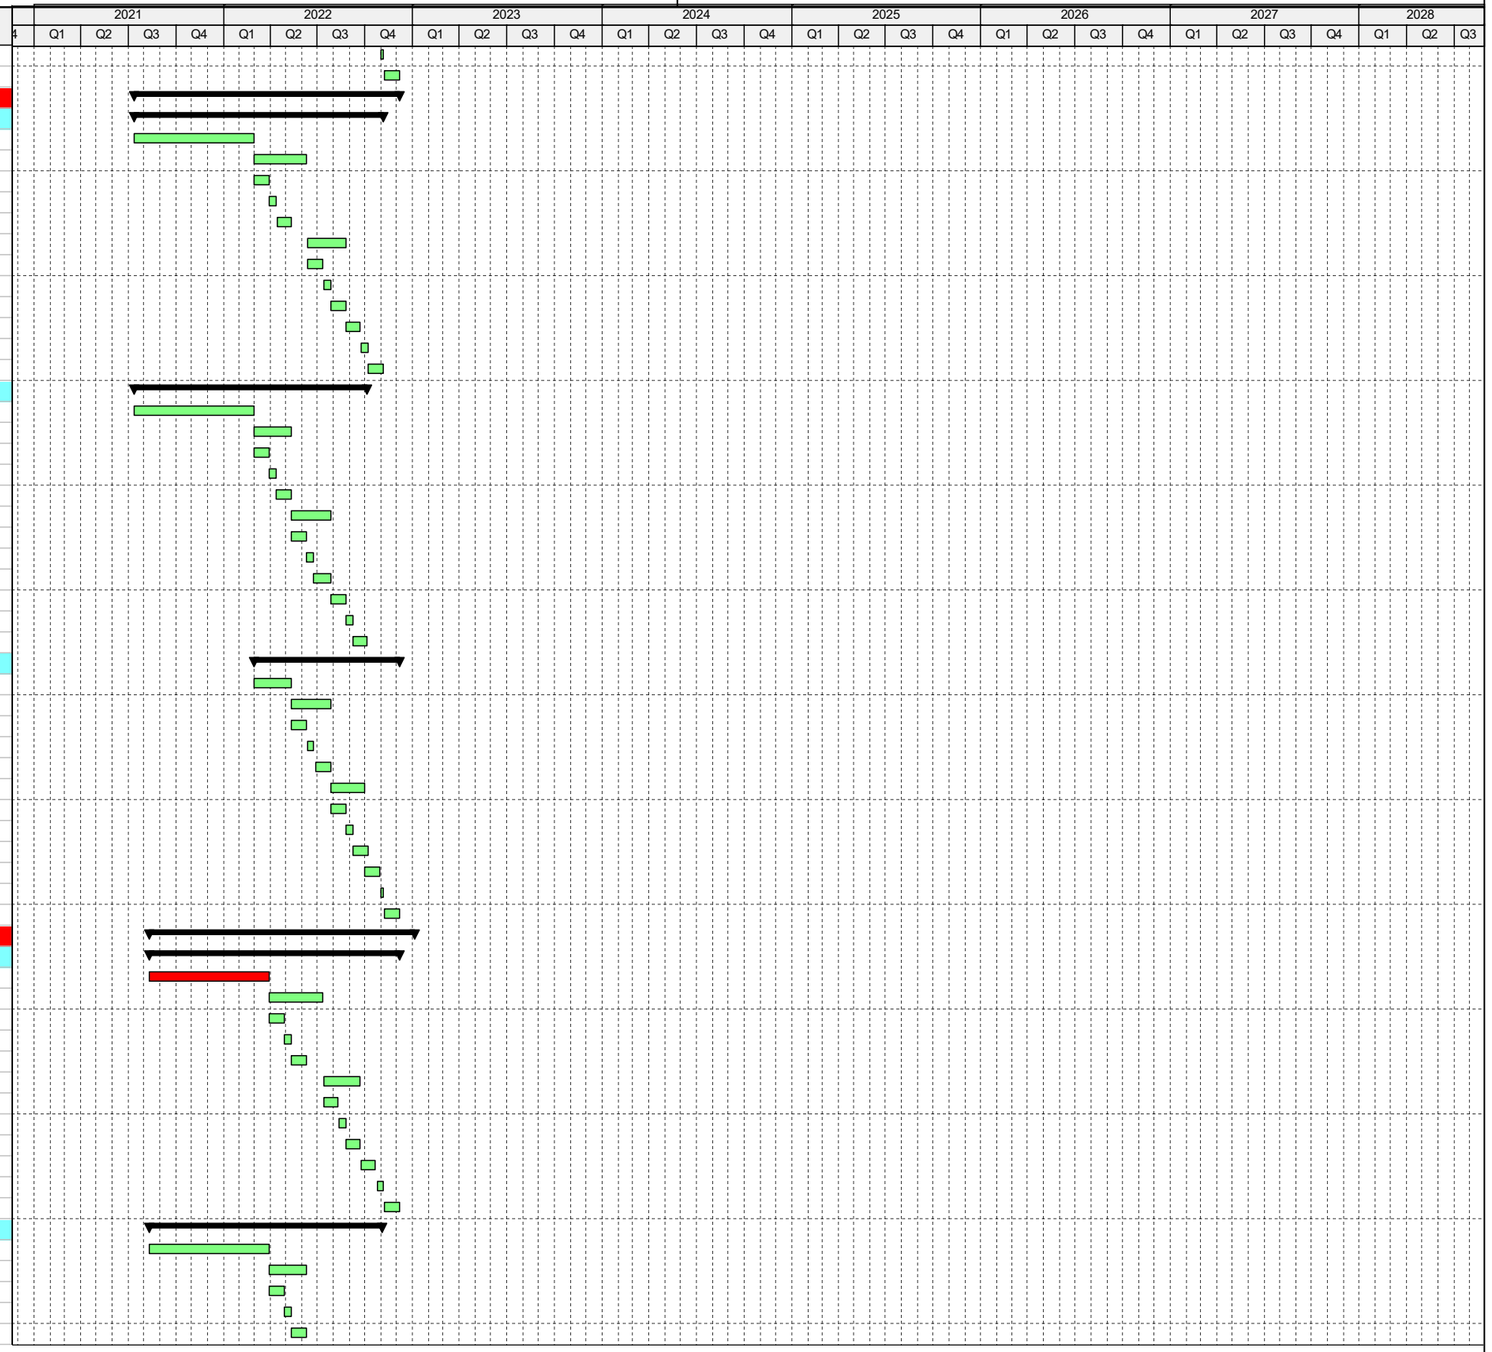

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-44800	Final 100%	50	10-Jun-22	24-Aug-22
P-44810	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Jun-22	11-Jul-22
P-50530	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	12-Jul-22	26-Jul-22
P-53430	Revisión de la interventoria R2 90%	20	27-Jul-22	24-Aug-22
P-61300	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Aug-22	21-Sep-22
P-67640	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Sep-22	05-Oct-22
P-69300	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Oct-22	03-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.26.03 MEP		190	31-Mar-22	04-Jan-23
P-35270	60% (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Memorias de Calculo,Diagrama princ	50	31-Mar-22	10-Jun-22
P-45630	90% de detalle(Salas electricas planta general,Diagramas unifilares,Sistema de protec	50	13-Jun-22	25-Aug-22
P-45640	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-50910	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jul-22	27-Jul-22
P-55560	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-62060	Final 100%	45	26-Aug-22	28-Oct-22
P-62070	Revisión de la interventoria R1 90%	20	26-Aug-22	22-Sep-22
P-68230	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	23-Sep-22	06-Oct-22
P-70670	Revisión de la interventoria R2 90%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-75280	Revisión de la interventoria R1 100%	20	31-Oct-22	29-Nov-22
P-81290	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	30-Nov-22	06-Dec-22
P-82500	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.27 Edificios de Acceso Estacion 14		350	10-Aug-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.27.01 Diseño Estructural		330	10-Aug-21	06-Dec-22
P-10280	60% (Apoyo tecnico a los diseños, Ubicacion,Informacion general, Cantidades, Cimen	160	10-Aug-21	30-Mar-22
P-33770	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles constructivos,Estructura de	70	31-Mar-22	12-Jul-22
P-33780	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-37940	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-40990	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-50660	Final 100%	50	13-Jul-22	22-Sep-22
P-50670	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-58410	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Aug-22	25-Aug-22
P-61570	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Aug-22	22-Sep-22
P-67890	Revisión de la interventoria R1 100%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73250	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-76340	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.27.02 Diseño Arquitectonico		309	10-Aug-21	03-Nov-22
P-10290	60% (Índice de documentos,Plano del nivel,Cantidades,Elevaciones y leyenda)	159	10-Aug-21	29-Mar-22
P-33480	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Seccion longitudinal,Plan de detalle	50	30-Mar-22	09-Jun-22
P-33490	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Mar-22	27-Apr-22
P-37690	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Apr-22	11-May-22
P-40770	Revisión de la interventoria R2 60%	20	12-May-22	09-Jun-22
P-44820	Final 100%	50	10-Jun-22	24-Aug-22
P-44830	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Jun-22	11-Jul-22
P-50540	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	12-Jul-22	26-Jul-22
P-53440	Revisión de la interventoria R2 90%	20	27-Jul-22	24-Aug-22
P-61310	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Aug-22	21-Sep-22
P-67650	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Sep-22	05-Oct-22
P-69310	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Oct-22	03-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.27.03 MEP		190	31-Mar-22	04-Jan-23
P-35280	60% (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Memorias de Calculo,Diagrama princ	50	31-Mar-22	10-Jun-22
P-45650	90% de detalle(Salas electricas planta general,Diagramas unifilares,Sistema de protec	50	13-Jun-22	25-Aug-22
P-45660	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-50920	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jul-22	27-Jul-22
P-55570	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-62080	Final 100%	45	26-Aug-22	28-Oct-22
P-62090	Revisión de la interventoria R1 90%	20	26-Aug-22	22-Sep-22
P-68240	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	23-Sep-22	06-Oct-22
P-70680	Revisión de la interventoria R2 90%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-75290	Revisión de la interventoria R1 100%	20	31-Oct-22	29-Nov-22
P-81300	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	30-Nov-22	06-Dec-22
P-82510	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.28 Edificios de Acceso Estacion 15		350	10-Aug-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.28.01 Diseño Estructural		330	10-Aug-21	06-Dec-22



Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-10300	60% (Apoyo tecnico a los diseños, Ubicacion,Informacion general, Cantidades, Cimen	160	10-Aug-21	30-Mar-22
P-33790	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles constructivos,Estructura de	70	31-Mar-22	12-Jul-22
P-33800	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-37950	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41000	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-50680	Final 100%	50	13-Jul-22	22-Sep-22
P-50690	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-58420	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Aug-22	25-Aug-22
P-61580	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Aug-22	22-Sep-22
P-67900	Revisión de la interventoria R1 100%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73260	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-76350	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.28.02 Diseño Arquitectonico		309	10-Aug-21	03-Nov-22
P-10310	60% (Índice de documentos,Plano del nivel,Cantidades,Elevaciones y leyenda)	159	10-Aug-21	29-Mar-22
P-33500	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Seccion longitudinal,Plan de detalle	50	30-Mar-22	09-Jun-22
P-33510	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Mar-22	27-Apr-22
P-37700	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Apr-22	11-May-22
P-40780	Revisión de la interventoria R2 60%	20	12-May-22	09-Jun-22
P-44840	Final 100%	50	10-Jun-22	24-Aug-22
P-44850	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Jun-22	11-Jul-22
P-50550	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	12-Jul-22	26-Jul-22
P-53450	Revisión de la interventoria R2 90%	20	27-Jul-22	24-Aug-22
P-61320	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Aug-22	21-Sep-22
P-67660	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Sep-22	05-Oct-22
P-69320	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Oct-22	03-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.28.03 MEP		190	31-Mar-22	04-Jan-23
P-35290	60% (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Memorias de Calculo,Diagrama princ	50	31-Mar-22	10-Jun-22
P-45670	90% de detalle(Salas electricas planta general,Diagramas unifilares,Sistema de protec	50	13-Jun-22	25-Aug-22
P-45680	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-50930	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jul-22	27-Jul-22
P-55580	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-62100	Final 100%	45	26-Aug-22	28-Oct-22
P-62110	Revisión de la interventoria R1 90%	20	26-Aug-22	22-Sep-22
P-68250	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	23-Sep-22	06-Oct-22
P-70690	Revisión de la interventoria R2 90%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-75300	Revisión de la interventoria R1 100%	20	31-Oct-22	29-Nov-22
P-81310	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	30-Nov-22	06-Dec-22
P-82520	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.29 Edificios de Acceso Estacion 16		350	10-Aug-21	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.06.29.01 Diseño Estructural		330	10-Aug-21	06-Dec-22
P-10320	60% (Apoyo tecnico a los diseños, Ubicacion,Informacion general, Cantidades, Cimen	160	10-Aug-21	30-Mar-22
P-33810	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles constructivos,Estructura de	70	31-Mar-22	12-Jul-22
P-33820	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Mar-22	28-Apr-22
P-37960	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Apr-22	12-May-22
P-41010	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-May-22	10-Jun-22
P-50700	Final 100%	50	13-Jul-22	22-Sep-22
P-50710	Revisión de la interventoria R1 90%	20	13-Jul-22	10-Aug-22
P-58430	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	11-Aug-22	25-Aug-22
P-61590	Revisión de la interventoria R2 90%	20	26-Aug-22	22-Sep-22
P-67910	Revisión de la interventoria R1 100%	20	23-Sep-22	21-Oct-22
P-73270	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Oct-22	04-Nov-22
P-76360	Revisión de la interventoria R2 100%	20	08-Nov-22	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.29.02 Diseño Arquitectonico		309	10-Aug-21	03-Nov-22
P-10330	60% (Índice de documentos,Plano del nivel,Cantidades,Elevaciones y leyenda)	159	10-Aug-21	29-Mar-22
P-33520	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Seccion longitudinal,Plan de detalle	50	30-Mar-22	09-Jun-22
P-33530	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Mar-22	27-Apr-22
P-37710	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Apr-22	11-May-22
P-40790	Revisión de la interventoria R2 60%	20	12-May-22	09-Jun-22
P-44860	Final 100%	50	10-Jun-22	24-Aug-22
P-44870	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Jun-22	11-Jul-22
P-50560	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	12-Jul-22	26-Jul-22
P-53460	Revisión de la interventoria R2 90%	20	27-Jul-22	24-Aug-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-61330	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Aug-22	21-Sep-22
P-67670	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Sep-22	05-Oct-22
P-69330	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Oct-22	03-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.06.29.03 MEP		190	31-Mar-22	04-Jan-23
P-35300	60% (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Memorias de Calculo,Diagrama princ	50	31-Mar-22	10-Jun-22
P-45690	90% de detalle(Salas electricas planta general,Diagramas unifilares,Sistema de protec	50	13-Jun-22	25-Aug-22
P-45700	Revisión de la interventoria R1 60%	20	13-Jun-22	12-Jul-22
P-50940	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	13-Jul-22	27-Jul-22
P-55590	Revisión de la interventoria R2 60%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-62120	Final 100%	45	26-Aug-22	28-Oct-22
P-62130	Revisión de la interventoria R1 90%	20	26-Aug-22	22-Sep-22
P-68260	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	23-Sep-22	06-Oct-22
P-70700	Revisión de la interventoria R2 90%	20	07-Oct-22	04-Nov-22
P-75310	Revisión de la interventoria R1 100%	20	31-Oct-22	29-Nov-22
P-81320	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	5	30-Nov-22	06-Dec-22
P-82530	Revisión de la interventoria R2 100%	20	07-Dec-22	04-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07 ESTACIONES BRT (13)		438	29-Mar-21	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.0 Datos de entrada para diseños		258	29-Mar-21	12-Apr-22
P-4450	60% (Criterios de diseño,Informacion general,Detalles generales elementos,Diseño ge	208	29-Mar-21	31-Jan-22
P-25340	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Feb-22	28-Feb-22
P-29050	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Mar-22	14-Mar-22
P-30900	Revisión de la interventoria R2 60%	20	15-Mar-22	12-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.01 Estación NQS (SENA)_Tipo_T2M con interconexión		438	29-Mar-21	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.01.1 Estructura estaciones transmilenio		438	29-Mar-21	03-Jan-23
P-4190	60% (Cantidades,Ubicacion general,Informacion general,notas y convenciones,Detalle	200	29-Mar-21	19-Jan-22
P-24370	90% Elaboracion y entrega del diseño (Ubicacion de los cimientos y detalles,Ubicación	123	20-Jan-22	18-Jul-22
P-24380	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-Jan-22	16-Feb-22
P-28300	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Feb-22	02-Mar-22
P-29620	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-Mar-22	31-Mar-22
P-51840	Final 100%	65	19-Jul-22	20-Oct-22
P-51850	Revisión de la interventoria R1 90%	20	19-Jul-22	17-Aug-22
P-60320	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	18-Aug-22	31-Aug-22
P-63340	Revisión de la interventoria R2 90%	20	01-Sep-22	28-Sep-22
P-72920	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Oct-22	21-Nov-22
P-78860	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Nov-22	05-Dec-22
P-82230	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.01.2 Arquitectura estaciones Transmilenio		310	29-Mar-21	28-Jun-22
P-4200	60% Elaboracion y entrega del diseño (Informacion general,Nivel de acceso,Planta de	135	29-Mar-21	13-Oct-21
P-13220	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectonica,Informe Anal	80	14-Oct-21	09-Feb-22
P-13230	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Oct-21	12-Nov-21
P-16500	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Nov-21	29-Nov-21
P-17530	Revisión de la interventoria R2 60%	20	30-Nov-21	28-Dec-21
P-26610	Final 100%	45	10-Feb-22	14-Apr-22
P-26620	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30410	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32620	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-36330	Revisión de la interventoria R1 100%	20	18-Apr-22	13-May-22
P-42160	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	16-May-22	27-May-22
P-43590	Revisión de la interventoria R2 100%	20	31-May-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.01.3 MEP Nave Central		140	27-Jul-21	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.01.3.1 Sistema de Ventilacion		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9470	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-11750	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilacion y climatiz	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-11760	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14200	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14210	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14220	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16670	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-17730	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-17740	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19490	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-20930	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-23170	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.01.3.2	**Sistemas Contraincendios**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9480	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-11770	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de proteccion contra in	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-11780	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14230	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14240	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14250	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16680	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-17750	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-17760	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19500	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-20940	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23180	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.01.3.3	**Sistema Electrico**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9490	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-11790	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-11800	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14260	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14270	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14280	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16690	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-17770	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-17780	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19510	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-20950	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23190	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.01.3.4	**Sistemas HYS**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9500	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-11810	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-11820	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14290	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14300	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14310	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16700	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-17790	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-17800	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19520	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-20960	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23200	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.01.3.5	**Sistemas SYC**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9510	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-11830	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-11840	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14320	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14330	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14340	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16710	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-17810	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-17820	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19530	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-20970	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23210	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.02	**Estación Calle 1a (Hospital)Tipo_T2M con interconexión**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.02.1	**Estructura estaciones transmilenio**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
P-4210	60% (Cantidades,Ubicacion general,Informacion general,notas y convenciones,Detalle	200	29-Mar-21	19-Jan-22
P-24390	90% Elaboracion y entrega del diseño (Ubicacion de los cimientos y detalles,Ubicación	123	20-Jan-22	18-Jul-22
P-24400	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-Jan-22	16-Feb-22
P-28310	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Feb-22	02-Mar-22
P-29630	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-Mar-22	31-Mar-22
P-51860	Final 100%	65	19-Jul-22	20-Oct-22
P-51870	Revisión de la interventoria R1 90%	20	19-Jul-22	17-Aug-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-60330	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	18-Aug-22	31-Aug-22
P-63350	Revisión de la interventoria R2 90%	20	01-Sep-22	28-Sep-22
P-72930	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Oct-22	21-Nov-22
P-78870	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Nov-22	05-Dec-22
P-82240	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.02.2 Arquitectura estaciones Transmilenio		310	29-Mar-21	28-Jun-22
P-4220	60% Elaboracion y entrega del diseño (Informacion general,Nivel de acceso,Planta de	135	29-Mar-21	13-Oct-21
P-13240	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectonica,Informe Ana	80	14-Oct-21	09-Feb-22
P-13250	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Oct-21	12-Nov-21
P-16510	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Nov-21	29-Nov-21
P-17540	Revisión de la interventoria R2 60%	20	30-Nov-21	28-Dec-21
P-26630	Final 100%	45	10-Feb-22	14-Apr-22
P-26640	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30420	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32630	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-36340	Revisión de la interventoria R1 100%	20	18-Apr-22	13-May-22
P-42170	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	16-May-22	27-May-22
P-43600	Revisión de la interventoria R2 100%	20	31-May-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.02.3 MEP Nave Central		140	27-Jul-21	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.02.3.1 Sistema de Ventilacion		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9520	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-11850	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilacion y climatiz	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-11860	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14350	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14360	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14370	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16720	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-17830	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-17840	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19540	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-20980	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23220	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.02.3.2 Sistemas Contraincendios		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9530	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-11870	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de proteccion contra in	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-11880	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14380	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14390	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14400	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16730	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-17850	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-17860	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19550	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-20990	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23230	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.02.3.3 Sistema Electrico		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9540	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-11890	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-11900	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14410	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14420	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14430	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16740	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-17870	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-17880	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19560	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21000	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23240	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.02.3.4 Sistemas HYS		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9550	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-11910	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-11920	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-14440	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14450	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14460	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16750	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-17890	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-17900	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19570	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21010	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23250	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.02.3.5 Sistemas SYC		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9560	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-11930	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-11940	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14470	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14480	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14490	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16760	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-17910	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-17920	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19580	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21020	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23260	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.03 Estación Calle 45_Tipo_T2M con interconexión		438	29-Mar-21	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.03.1 Estructura estaciones transmilenio		438	29-Mar-21	03-Jan-23
P-4230	60% (Cantidades,Ubicacion general,Informacion general,notas y convenciones,Detalle	200	29-Mar-21	19-Jan-22
P-24410	90% Elaboracion y entrega del diseño (Ubicacion de los cimientos y detalles,Ubicación	123	20-Jan-22	18-Jul-22
P-24420	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-Jan-22	16-Feb-22
P-28320	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Feb-22	02-Mar-22
P-29640	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-Mar-22	31-Mar-22
P-51880	Final 100%	65	19-Jul-22	20-Oct-22
P-51890	Revisión de la interventoria R1 90%	20	19-Jul-22	17-Aug-22
P-60340	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	18-Aug-22	31-Aug-22
P-63360	Revisión de la interventoria R2 90%	20	01-Sep-22	28-Sep-22
P-72940	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Oct-22	21-Nov-22
P-78880	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Nov-22	05-Dec-22
P-82250	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.03.2 Arquitectura estaciones Transmilenio		310	29-Mar-21	28-Jun-22
P-4240	60% Elaboracion y entrega del diseño (Informacion general,Nivel de acceso,Planta de	135	29-Mar-21	13-Oct-21
P-13260	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectonica,Informe Anal	80	14-Oct-21	09-Feb-22
P-13270	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Oct-21	12-Nov-21
P-16520	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Nov-21	29-Nov-21
P-17550	Revisión de la interventoria R2 60%	20	30-Nov-21	28-Dec-21
P-26650	Final 100%	45	10-Feb-22	14-Apr-22
P-26660	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30430	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32640	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-36350	Revisión de la interventoria R1 100%	20	18-Apr-22	13-May-22
P-42180	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	16-May-22	27-May-22
P-43610	Revisión de la interventoria R2 100%	20	31-May-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.03.3 MEP Nave Central		140	27-Jul-21	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.03.3.1 Sistema de Ventilacion		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9570	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-11950	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilacion y climatiz	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-11960	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14500	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14510	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14520	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16770	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-17930	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-17940	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19590	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21030	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22



Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Summary
Milestone

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-23270	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.03.3.2	**Sistemas Contraincendios**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9580	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-11970	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de proteccion contra in	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-11980	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14530	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14540	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14550	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16780	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-17950	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-17960	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19600	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21040	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23280	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.03.3.3	**Sistema Electrico**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9590	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-11990	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12000	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14560	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14570	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14580	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16790	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-17970	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-17980	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19610	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21050	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23290	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.03.3.4	**Sistemas HYS**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9600	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12010	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12020	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14590	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14600	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14610	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16800	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-17990	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18000	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19620	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21060	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23300	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.03.3.5	**Sistemas SYC**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9610	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12030	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Deteccion y Ala	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12040	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14620	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14630	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14640	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16810	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18010	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18020	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19630	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21070	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23310	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.04	**Estación Calle 63_Tipo_T2M con interconexión**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.04.1	**Estructura estaciones transmilenio**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
P-4250	60% (Cantidades,Ubicacion general,Informacion general,notas y convenciones,Detalle	200	29-Mar-21	19-Jan-22
P-24430	90% Elaboracion y entrega del diseño (Ubicacion de los cimientos y detalles,Ubicación	123	20-Jan-22	18-Jul-22
P-24440	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-Jan-22	16-Feb-22
P-28330	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Feb-22	02-Mar-22
P-29650	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-Mar-22	31-Mar-22
P-51900	Final 100%	65	19-Jul-22	20-Oct-22
P-51910	Revisión de la interventoria R1 90%	20	19-Jul-22	17-Aug-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-60350	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	18-Aug-22	31-Aug-22
P-63370	Revisión de la interventoria R2 90%	20	01-Sep-22	28-Sep-22
P-72950	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Oct-22	21-Nov-22
P-78890	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Nov-22	05-Dec-22
P-82260	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.04.2 Arquitectura estaciones Transmilenio		310	29-Mar-21	28-Jun-22
P-4260	60% Elaboracion y entrega del diseño (Informacion general,Nivel de acceso,Planta de	135	29-Mar-21	13-Oct-21
P-13280	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectonica,Informe Anal	80	14-Oct-21	09-Feb-22
P-13290	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Oct-21	12-Nov-21
P-16530	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Nov-21	29-Nov-21
P-17560	Revisión de la interventoria R2 60%	20	30-Nov-21	28-Dec-21
P-26670	Final 100%	45	10-Feb-22	14-Apr-22
P-26680	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30440	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32650	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-36360	Revisión de la interventoria R1 100%	20	18-Apr-22	13-May-22
P-42190	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	16-May-22	27-May-22
P-43620	Revisión de la interventoria R2 100%	20	31-May-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.04.3 MEP Nave Central		140	27-Jul-21	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.04.3.1 Sistema de Ventilacion		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9620	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12050	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilacion y climatiz	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12060	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14650	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14660	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14670	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16820	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18030	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18040	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19640	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21080	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23320	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.04.3.2 Sistemas Contraincendios		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9630	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12070	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de proteccion contra in	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12080	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14680	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14690	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14700	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16830	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18050	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18060	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19650	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21090	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23330	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.04.3.3 Sistema Electrico		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9640	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12090	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12100	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14710	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14720	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14730	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16840	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18070	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18080	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19660	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21100	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23340	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.04.3.4 Sistemas HYS		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9650	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12110	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12120	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21

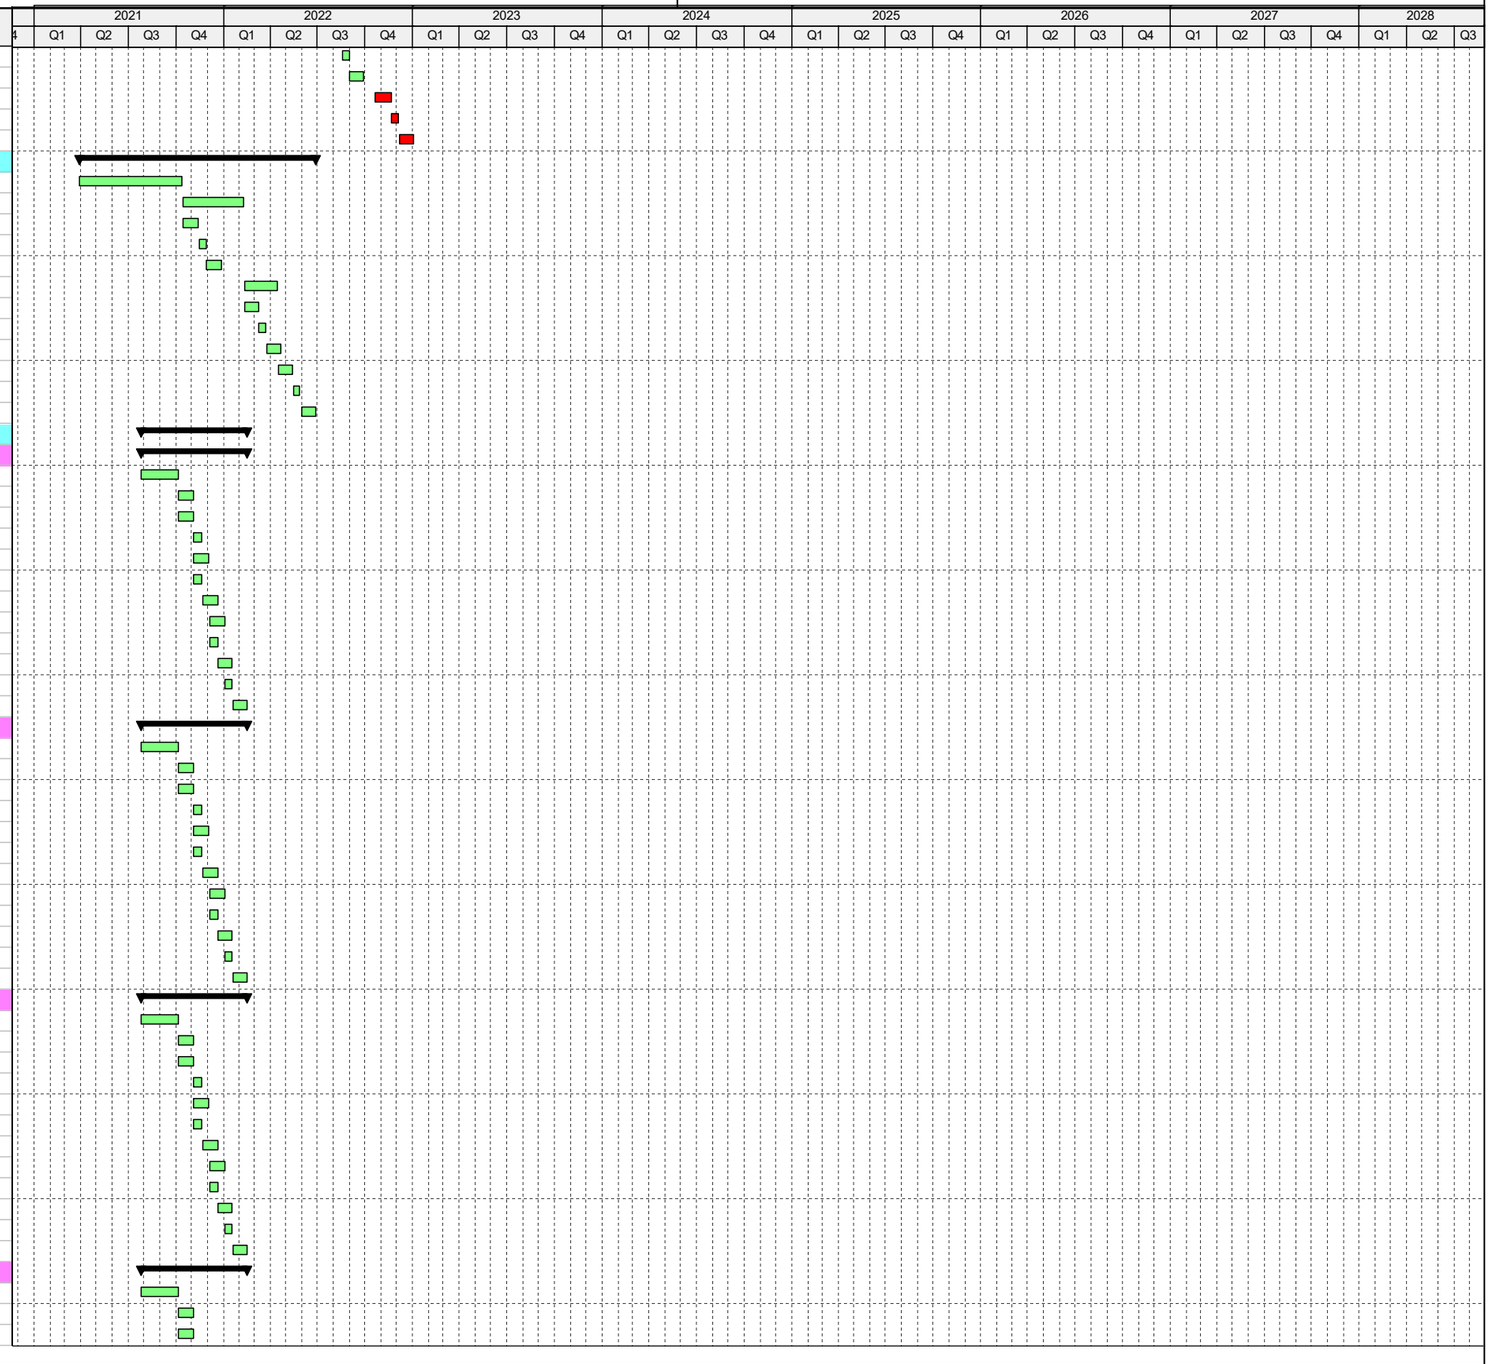

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Summary
Milestone

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-14740	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14750	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14760	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16850	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18090	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18100	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19670	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21110	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23350	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.04.3.5	**Sistemas SYC**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9660	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12130	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12140	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14770	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14780	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14790	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16860	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18110	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18120	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19680	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21120	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23360	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.05	**Estación Las flores_Tipo_T2M sin interconexión**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.05.1	**Estructura estaciones transmilenio**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
P-4270	60% (Cantidades,Ubicacion general,Informacion general,notas y convenciones,Detalle	200	29-Mar-21	19-Jan-22
P-24450	90% Elaboracion y entrega del diseño (Ubicacion de los cimientos y detalles,Ubicación	123	20-Jan-22	18-Jul-22
P-24460	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-Jan-22	16-Feb-22
P-28340	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Feb-22	02-Mar-22
P-29660	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-Mar-22	31-Mar-22
P-51920	Final 100%	65	19-Jul-22	20-Oct-22
P-51930	Revisión de la interventoria R1 90%	20	19-Jul-22	17-Aug-22
P-60360	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	18-Aug-22	31-Aug-22
P-63380	Revisión de la interventoria R2 90%	20	01-Sep-22	28-Sep-22
P-72960	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Oct-22	21-Nov-22
P-78900	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Nov-22	05-Dec-22
P-82270	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.05.2	**Arquitectura estaciones Transmilenio**	310	29-Mar-21	28-Jun-22
P-4280	60% Elaboracion y entrega del diseño (Informacion general,Nivel de acceso,Planta de	135	29-Mar-21	13-Oct-21
P-13300	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectonica,Informe Anal	80	14-Oct-21	09-Feb-22
P-13310	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Oct-21	12-Nov-21
P-16540	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Nov-21	29-Nov-21
P-17570	Revisión de la interventoria R2 60%	20	30-Nov-21	28-Dec-21
P-26690	Final 100%	45	10-Feb-22	14-Apr-22
P-26700	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30450	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32660	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-36370	Revisión de la interventoria R1 100%	20	18-Apr-22	13-May-22
P-42200	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	16-May-22	27-May-22
P-43630	Revisión de la interventoria R2 100%	20	31-May-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.05.3	**MEP Nave Central**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.05.3.1	**Sistema de Ventilacion**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9670	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12150	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilacion y climatiz	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12160	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14800	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14810	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14820	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16870	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18130	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18140	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19690	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21130	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22




© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-23370	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.05.3.2	**Sistemas Contraincendios**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9680	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12170	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de proteccion contra in	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12180	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14830	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14840	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14850	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16880	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18150	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18160	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19700	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21140	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23380	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.05.3.3	**Sistema Electrico**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9690	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12190	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12200	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14860	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14870	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14880	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16890	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18170	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18180	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19710	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21150	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23390	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.05.3.4	**Sistemas HYS**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9700	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12210	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12220	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14890	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14900	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14910	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16900	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18190	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18200	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19720	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21160	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23400	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.05.3.5	**Sistemas SYC**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9710	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12230	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Deteccion y Ala	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12240	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14920	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14930	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14940	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16910	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18210	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18220	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19730	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21170	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23410	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.06	**Estación tercermilenio_Tipo _T2M-E sin interconexión**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.06.1	**Estructura estaciones transmilenio**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
P-4290	60% (Cantidades,Ubicacion general,Informacion general,notas y convenciones,Detalle	200	29-Mar-21	19-Jan-22
P-24470	90% Elaboracion y entrega del diseño (Ubicacion de los cimientos y detalles,Ubicación	123	20-Jan-22	18-Jul-22
P-24480	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-Jan-22	16-Feb-22
P-28350	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Feb-22	02-Mar-22
P-29670	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-Mar-22	31-Mar-22
P-51940	Final 100%	65	19-Jul-22	20-Oct-22
P-51950	Revisión de la interventoria R1 90%	20	19-Jul-22	17-Aug-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-60370	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	18-Aug-22	31-Aug-22
P-63390	Revisión de la interventoria R2 90%	20	01-Sep-22	28-Sep-22
P-72970	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Oct-22	21-Nov-22
P-78910	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Nov-22	05-Dec-22
P-82280	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.06.2	**Arquitectura estaciones Transmilenio**	310	29-Mar-21	28-Jun-22
P-4300	60% Elaboracion y entrega del diseño (Informacion general,Nivel de acceso,Planta de	135	29-Mar-21	13-Oct-21
P-13320	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectonica,Informe Ana	80	14-Oct-21	09-Feb-22
P-13330	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Oct-21	12-Nov-21
P-16550	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Nov-21	29-Nov-21
P-17580	Revisión de la interventoria R2 60%	20	30-Nov-21	28-Dec-21
P-26710	Final 100%	45	10-Feb-22	14-Apr-22
P-26720	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30460	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32670	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-36380	Revisión de la interventoria R1 100%	20	18-Apr-22	13-May-22
P-42210	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	16-May-22	27-May-22
P-43640	Revisión de la interventoria R2 100%	20	31-May-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.06.3	**MEP Nave Central**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.06.3.1	**Sistema de Ventilacion**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9720	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12250	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilacion y climati	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12260	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14950	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14960	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-14970	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16920	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18230	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18240	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19740	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21180	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23420	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.06.3.2	**Sistemas Contraincendios**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9730	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12270	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de proteccion contra in	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12280	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-14980	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-14990	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15000	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16930	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18250	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18260	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19750	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21190	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23430	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.06.3.3	**Sistema Electrico**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9740	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12290	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12300	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15010	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15020	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15030	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16940	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18270	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18280	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19760	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21200	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23440	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.06.3.4	**Sistemas HYS**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9750	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12310	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12320	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21

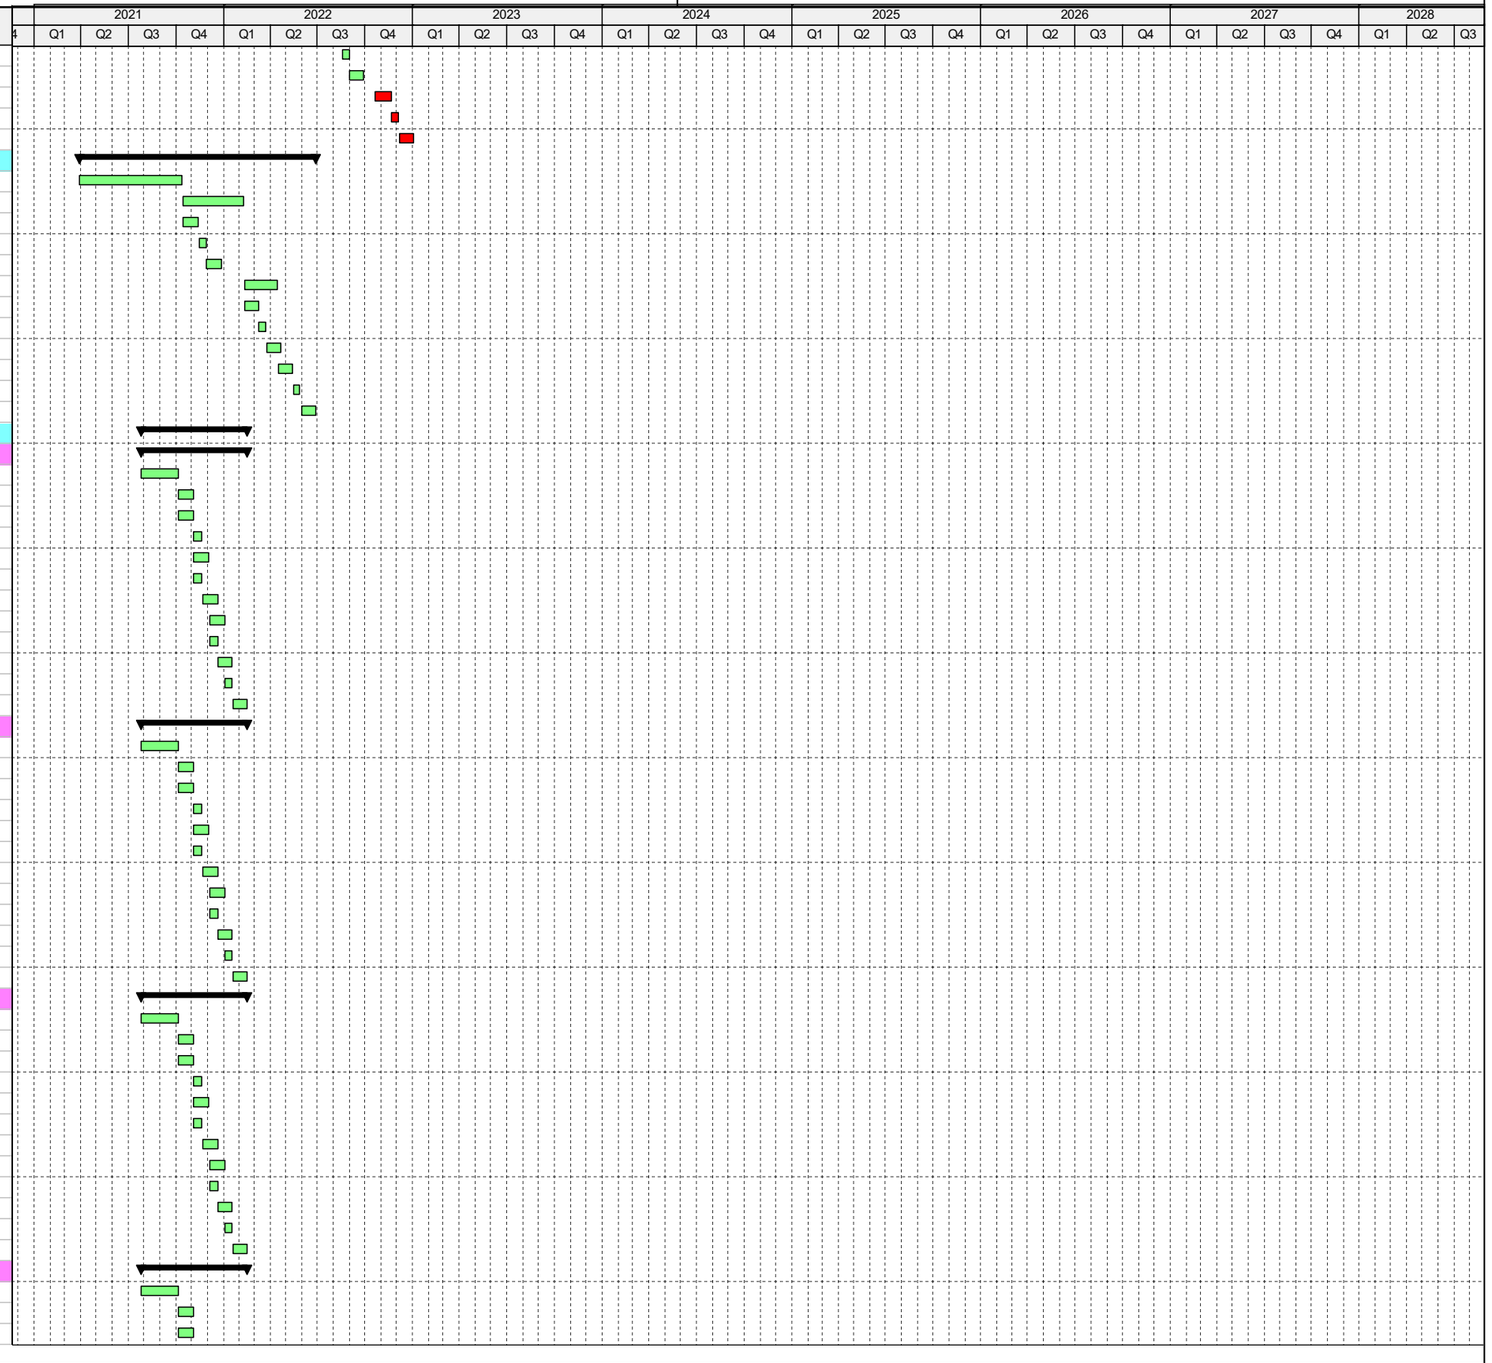

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-15040	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15050	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15060	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16950	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18290	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18300	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19770	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21210	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23450	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.06.3.5	**Sistemas SYC**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9760	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12330	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12340	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15070	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15080	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15090	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16960	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18310	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18320	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19780	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21220	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23460	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.07	**Estación Calle 26_Tipo_T2M-E sin interconexión**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.07.1	**Estructura estaciones transmilenio**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
P-4310	60% (Cantidades,Ubicacion general,Informacion general,notas y convenciones,Detalle	200	29-Mar-21	19-Jan-22
P-24490	90% Elaboracion y entrega del diseño (Ubicacion de los cimientos y detalles,Ubicación	123	20-Jan-22	18-Jul-22
P-24500	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-Jan-22	16-Feb-22
P-28360	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Feb-22	02-Mar-22
P-29680	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-Mar-22	31-Mar-22
P-51960	Final 100%	65	19-Jul-22	20-Oct-22
P-51970	Revisión de la interventoria R1 90%	20	19-Jul-22	17-Aug-22
P-60380	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	18-Aug-22	31-Aug-22
P-63400	Revisión de la interventoria R2 90%	20	01-Sep-22	28-Sep-22
P-72980	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Oct-22	21-Nov-22
P-78920	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Nov-22	05-Dec-22
P-82290	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.07.2	**Arquitectura estaciones Transmilenio**	310	29-Mar-21	28-Jun-22
P-4320	60% Elaboracion y entrega del diseño (Informacion general,Nivel de acceso,Planta de	135	29-Mar-21	13-Oct-21
P-13340	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectonica,Informe Anal	80	14-Oct-21	09-Feb-22
P-13350	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Oct-21	12-Nov-21
P-16560	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Nov-21	29-Nov-21
P-17590	Revisión de la interventoria R2 60%	20	30-Nov-21	28-Dec-21
P-26730	Final 100%	45	10-Feb-22	14-Apr-22
P-26740	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30470	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32680	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-36390	Revisión de la interventoria R1 100%	20	18-Apr-22	13-May-22
P-42220	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	16-May-22	27-May-22
P-43650	Revisión de la interventoria R2 100%	20	31-May-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.07.3	**MEP Nave Central**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.07.3.1	**Sistema de Ventilacion**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9770	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12350	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilacion y climatiz	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12360	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15100	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15110	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15120	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16970	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18330	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18340	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19790	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21230	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22




Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-23470	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.07.3.2	**Sistemas Contraincendios**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9780	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12370	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de proteccion contra in	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12380	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15130	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15140	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15150	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16980	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18350	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18360	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19800	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21240	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23480	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.07.3.3	**Sistema Electrico**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9790	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12390	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12400	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15160	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15170	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15180	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16990	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18370	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18380	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19810	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21250	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23490	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.07.3.4	**Sistemas HYS**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9800	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12410	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12420	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15190	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15200	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15210	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17000	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18390	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18400	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19820	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21260	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23500	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.07.3.5	**Sistemas SYC**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9810	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12430	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Deteccion y Ala	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12440	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15220	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15230	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15240	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17010	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18410	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18420	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19830	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21270	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23510	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.08	**Estación Av Jimenez_Tipo_T3M-H con interconexión**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.08.1	**Estructura estaciones transmilenio**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
P-4330	60% (Cantidades,Ubicacion general,Informacion general,notas y convenciones,Detalle	200	29-Mar-21	19-Jan-22
P-24510	90% Elaboracion y entrega del diseño (Ubicacion de los cimientos y detalles,Ubicación	123	20-Jan-22	18-Jul-22
P-24520	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-Jan-22	16-Feb-22
P-28370	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Feb-22	02-Mar-22
P-29690	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-Mar-22	31-Mar-22
P-51980	Final 100%	65	19-Jul-22	20-Oct-22
P-51990	Revisión de la interventoria R1 90%	20	19-Jul-22	17-Aug-22

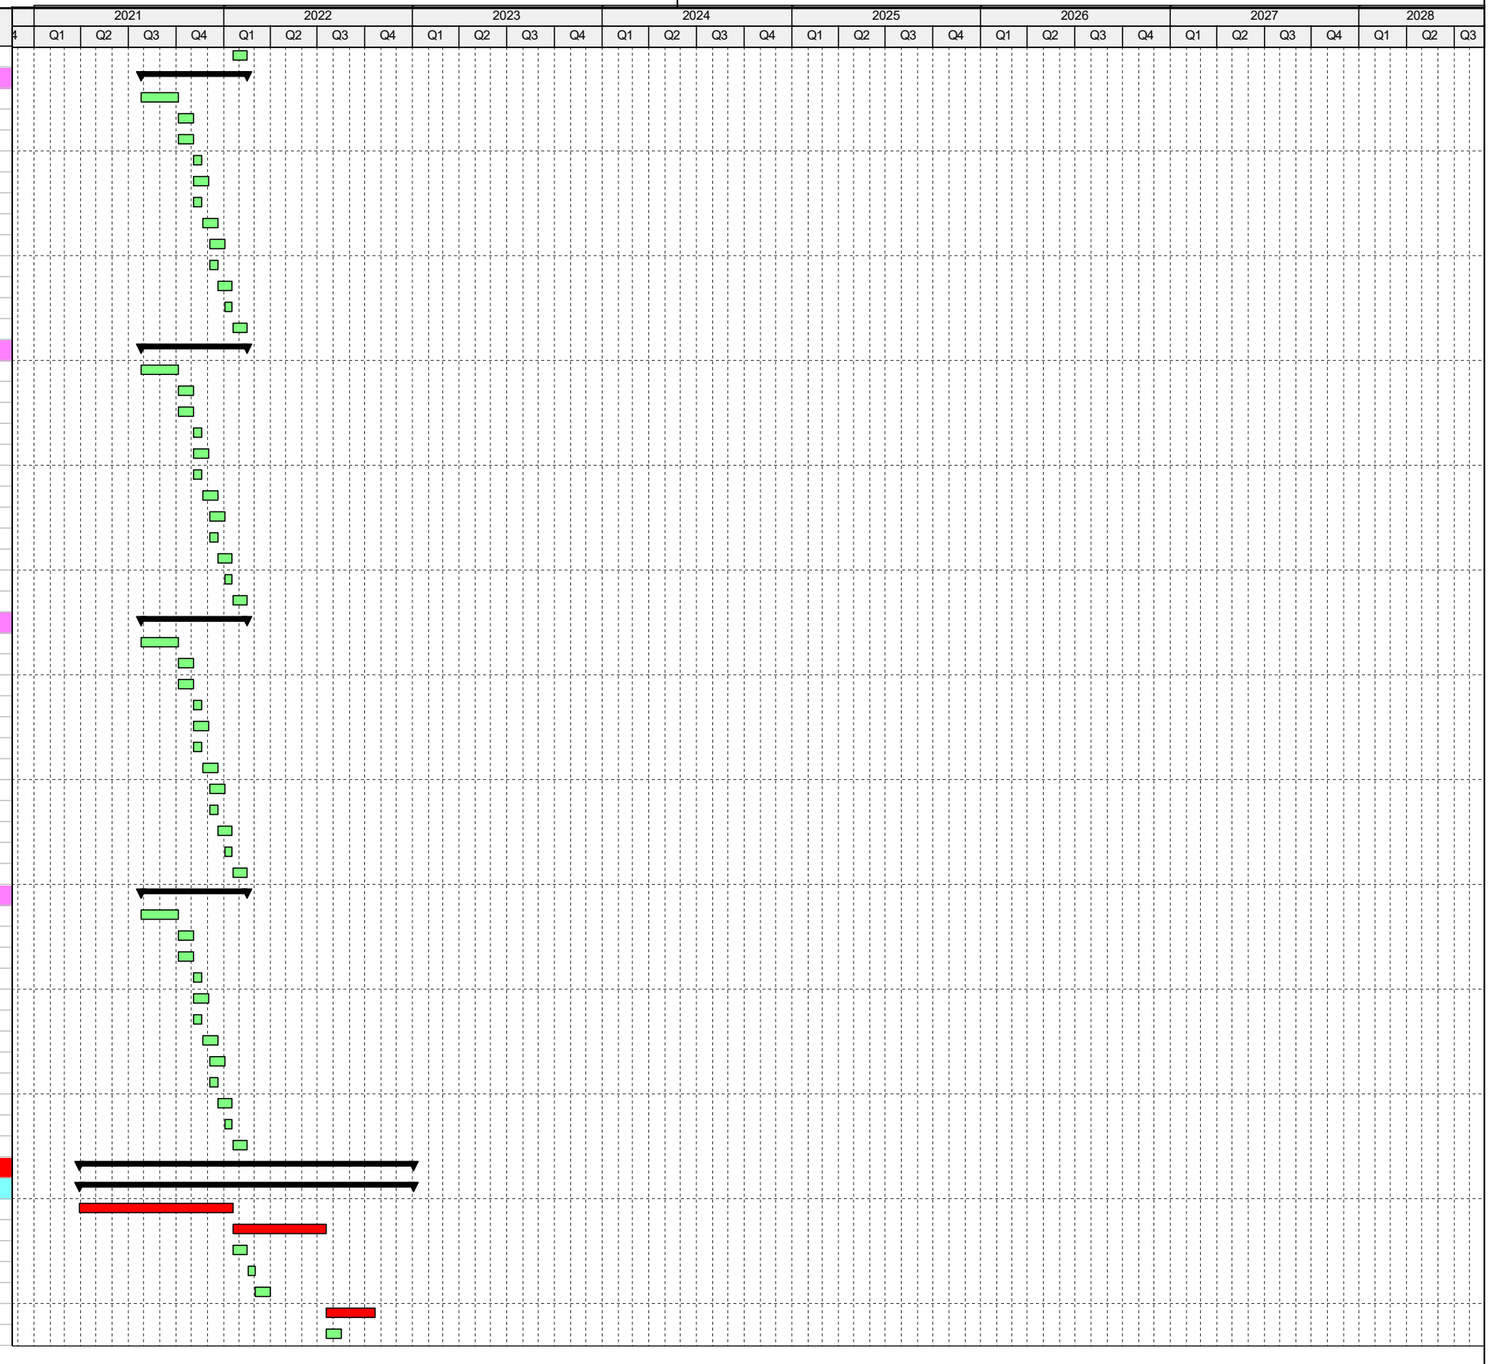

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-60390	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	18-Aug-22	31-Aug-22
P-63410	Revisión de la interventoria R2 90%	20	01-Sep-22	28-Sep-22
P-72990	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Oct-22	21-Nov-22
P-78930	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Nov-22	05-Dec-22
P-82300	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.08.2 Arquitectura estaciones Transmilenio		310	29-Mar-21	28-Jun-22
P-4340	60% Elaboracion y entrega del diseño (Informacion general,Nivel de acceso,Planta de	135	29-Mar-21	13-Oct-21
P-13360	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectonica,Informe Ana	80	14-Oct-21	09-Feb-22
P-13370	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Oct-21	12-Nov-21
P-16570	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Nov-21	29-Nov-21
P-17600	Revisión de la interventoria R2 60%	20	30-Nov-21	28-Dec-21
P-26750	Final 100%	45	10-Feb-22	14-Apr-22
P-26760	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30480	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32690	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-36400	Revisión de la interventoria R1 100%	20	18-Apr-22	13-May-22
P-42230	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	16-May-22	27-May-22
P-43660	Revisión de la interventoria R2 100%	20	31-May-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.08.3 MEP Nave Central		140	27-Jul-21	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.08.3.1 Sistema de Ventilacion		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9820	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12450	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilacion y climatiz	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12460	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15250	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15260	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15270	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17020	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18430	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18440	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19840	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21280	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23520	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.08.3.2 Sistemas Contraincendios		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9830	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12470	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de proteccion contra in	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12480	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15280	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15290	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15300	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17030	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18450	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18460	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19850	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21290	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23530	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.08.3.3 Sistema Electrico		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9840	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12490	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12500	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15310	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15320	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15330	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17040	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18470	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18480	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19860	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21300	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23540	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.08.3.4 Sistemas HYS		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9850	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12510	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12520	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21

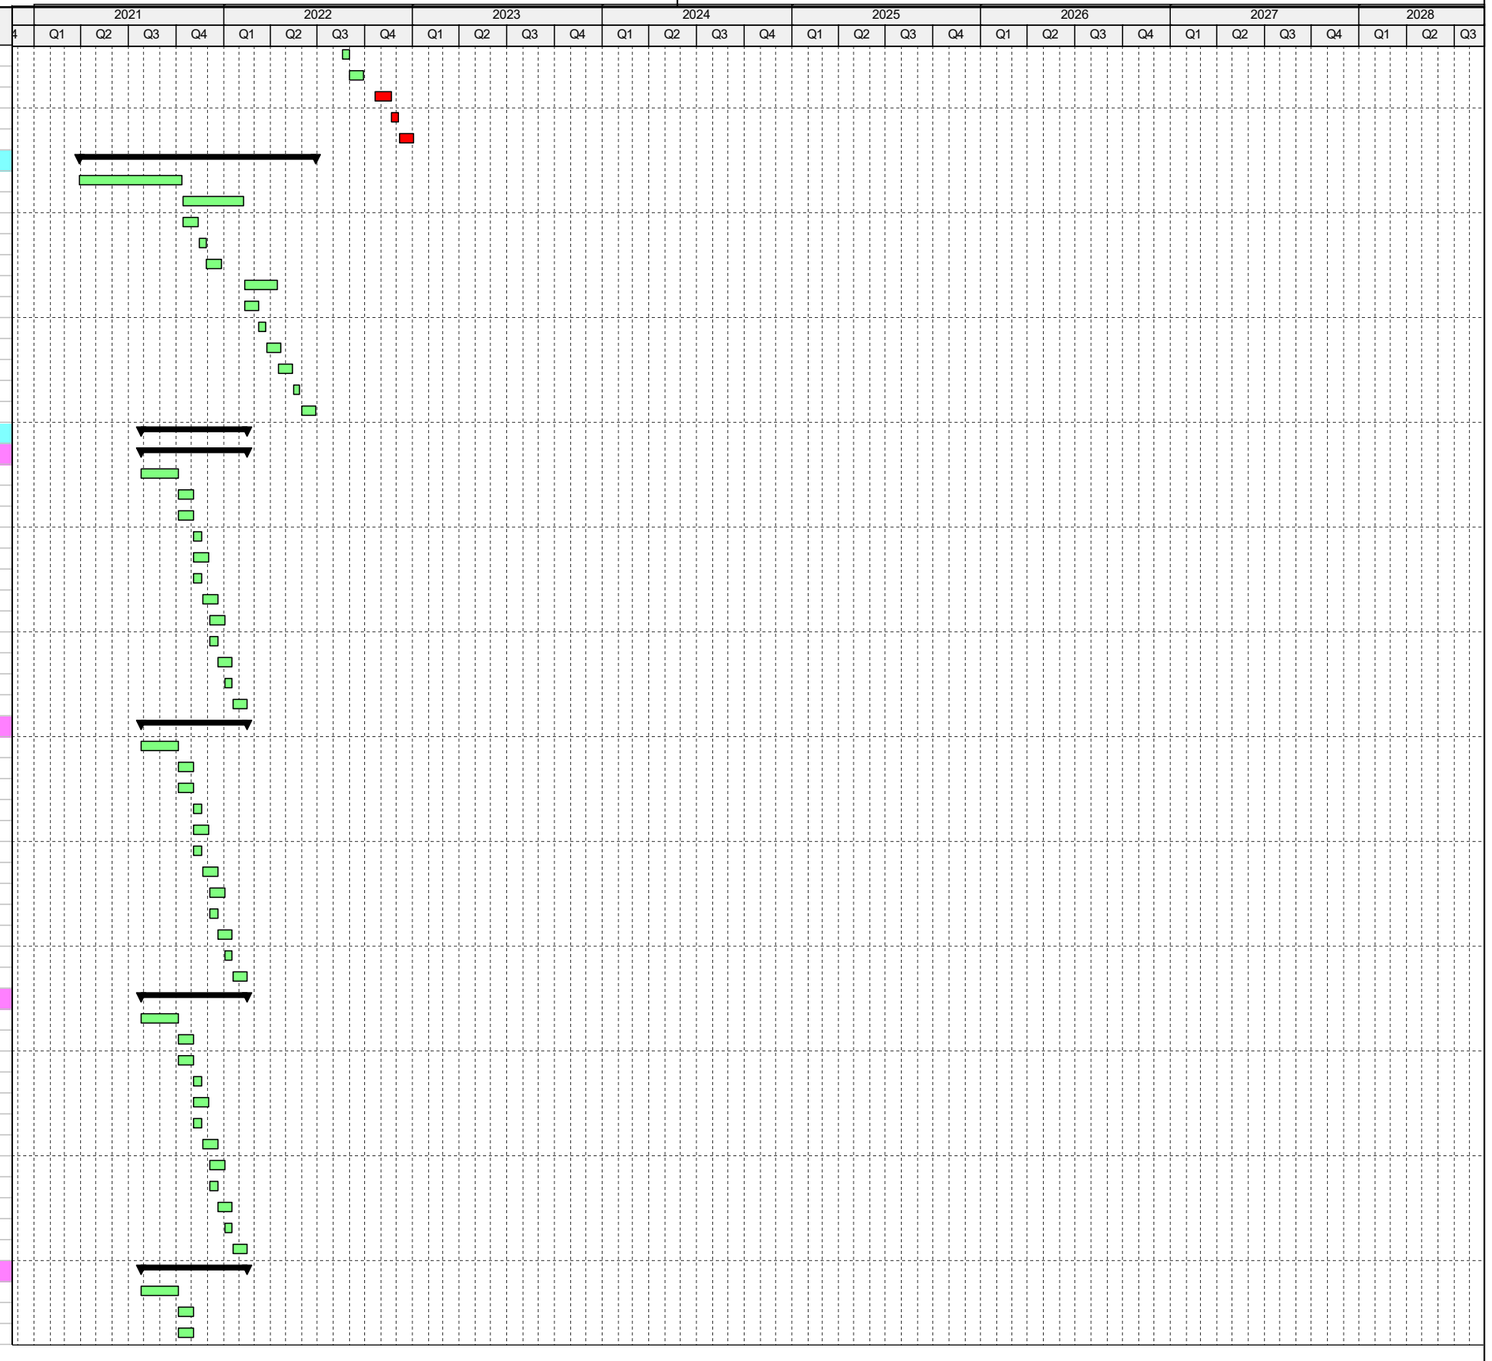

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-15340	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15350	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15360	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17050	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18490	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18500	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19870	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21310	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23550	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.08.3.5	**Sistemas SYC**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9860	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12530	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12540	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15370	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15380	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15390	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17060	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18510	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18520	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19880	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21320	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23560	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.09	**Estación Calle 76_Tipo_T3M con interconexión**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.09.1	**Estructura estaciones transmilenio**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
P-4350	60% (Cantidades,Ubicacion general,Informacion general,notas y convenciones,Detalle	200	29-Mar-21	19-Jan-22
P-24530	90% Elaboracion y entrega del diseño (Ubicacion de los cimientos y detalles,Ubicación	123	20-Jan-22	18-Jul-22
P-24540	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-Jan-22	16-Feb-22
P-28380	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Feb-22	02-Mar-22
P-29700	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-Mar-22	31-Mar-22
P-52000	Final 100%	65	19-Jul-22	20-Oct-22
P-52010	Revisión de la interventoria R1 90%	20	19-Jul-22	17-Aug-22
P-60400	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	18-Aug-22	31-Aug-22
P-63420	Revisión de la interventoria R2 90%	20	01-Sep-22	28-Sep-22
P-73000	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Oct-22	21-Nov-22
P-78940	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Nov-22	05-Dec-22
P-82310	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.09.2	**Arquitectura estaciones Transmilenio**	310	29-Mar-21	28-Jun-22
P-4360	60% Elaboracion y entrega del diseño (Informacion general,Nivel de acceso,Planta de	135	29-Mar-21	13-Oct-21
P-13380	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectonica,Informe Ana	80	14-Oct-21	09-Feb-22
P-13390	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Oct-21	12-Nov-21
P-16580	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Nov-21	29-Nov-21
P-17610	Revisión de la interventoria R2 60%	20	30-Nov-21	28-Dec-21
P-26770	Final 100%	45	10-Feb-22	14-Apr-22
P-26780	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30490	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32700	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-36410	Revisión de la interventoria R1 100%	20	18-Apr-22	13-May-22
P-42240	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	16-May-22	27-May-22
P-43670	Revisión de la interventoria R2 100%	20	31-May-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.09.3	**MEP Nave Central**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.09.3.1	**Sistema de Ventilacion**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9870	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12550	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilacion y climatiz	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12560	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15400	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15410	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15420	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17070	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18530	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18540	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19890	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21330	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22



Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-23570	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.09.3.2	**Sistemas Contraincendios**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9880	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12570	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de proteccion contra in	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12580	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15430	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15440	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15450	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17080	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18550	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18560	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19900	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21340	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23580	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.09.3.3	**Sistema Electrico**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9890	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12590	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12600	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15460	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15470	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15480	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17090	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18570	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18580	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19910	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21350	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23590	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.09.3.4	**Sistemas HYS**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9900	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12610	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12620	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15490	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15500	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15510	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17100	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18590	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18600	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19920	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21360	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23600	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.09.3.5	**Sistemas SYC**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9910	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12630	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Deteccion y Ala	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12640	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15520	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15530	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15540	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17110	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18610	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18620	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19930	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21370	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23610	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.10	**Estación Profamilia-Av 39_Tipo_T3M-E sin interconexión**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.10.1	**Estructura estaciones transmilenio**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
P-4370	60% (Cantidades,Ubicacion general,Informacion general,notas y convenciones,Detalle	200	29-Mar-21	19-Jan-22
P-24550	90% Elaboracion y entrega del diseño (Ubicacion de los cimientos y detalles,Ubicación	123	20-Jan-22	18-Jul-22
P-24560	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-Jan-22	16-Feb-22
P-28390	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Feb-22	02-Mar-22
P-29710	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-Mar-22	31-Mar-22
P-52020	Final 100%	65	19-Jul-22	20-Oct-22
P-52030	Revisión de la interventoria R1 90%	20	19-Jul-22	17-Aug-22



Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Summary
Milestone

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-60410	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	18-Aug-22	31-Aug-22
P-63430	Revisión de la interventoria R2 90%	20	01-Sep-22	28-Sep-22
P-73010	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Oct-22	21-Nov-22
P-78950	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Nov-22	05-Dec-22
P-82320	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.10.2	**Arquitectura estaciones Transmilenio**	310	29-Mar-21	28-Jun-22
P-4380	60% Elaboracion y entrega del diseño (Informacion general,Nivel de acceso,Planta de	135	29-Mar-21	13-Oct-21
P-13400	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectonica,Informe Ana	80	14-Oct-21	09-Feb-22
P-13410	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Oct-21	12-Nov-21
P-16590	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Nov-21	29-Nov-21
P-17620	Revisión de la interventoria R2 60%	20	30-Nov-21	28-Dec-21
P-26790	Final 100%	45	10-Feb-22	14-Apr-22
P-26800	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30500	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32710	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-36420	Revisión de la interventoria R1 100%	20	18-Apr-22	13-May-22
P-42250	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	16-May-22	27-May-22
P-43680	Revisión de la interventoria R2 100%	20	31-May-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.10.3	**MEP Nave Central**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.10.3.1	**Sistema de Ventilacion**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9920	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12650	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilacion y climatiz	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12660	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15550	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15560	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15570	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17120	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18630	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18640	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19940	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21380	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23620	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.10.3.2	**Sistemas Contraincendios**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9930	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12670	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de proteccion contra in	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12680	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15580	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15590	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15600	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17130	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18650	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18660	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19950	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21390	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23630	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.10.3.3	**Sistema Electrico**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9940	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12690	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12700	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15610	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15620	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15630	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17140	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18670	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18680	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19960	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21400	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23640	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.10.3.4	**Sistemas HYS**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9950	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12710	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12720	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-15640	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15650	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15660	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17150	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18690	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18700	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19970	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21410	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23650	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.10.3.5	**Sistemas SYC**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9960	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12730	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12740	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15670	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15680	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15690	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17160	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18710	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18720	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19980	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21420	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23660	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.11	**Estación Calle 19_Tipo_T3M sin interconexión**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.11.1	**Estructura estaciones transmilenio**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
P-4390	60% (Cantidades,Ubicacion general,Informacion general,notas y convenciones,Detalle	200	29-Mar-21	19-Jan-22
P-24570	90% Elaboracion y entrega del diseño (Ubicacion de los cimientos y detalles,Ubicación	123	20-Jan-22	18-Jul-22
P-24580	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-Jan-22	16-Feb-22
P-28400	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Feb-22	02-Mar-22
P-29720	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-Mar-22	31-Mar-22
P-52040	Final 100%	65	19-Jul-22	20-Oct-22
P-52050	Revisión de la interventoria R1 90%	20	19-Jul-22	17-Aug-22
P-60420	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	18-Aug-22	31-Aug-22
P-63440	Revisión de la interventoria R2 90%	20	01-Sep-22	28-Sep-22
P-73020	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Oct-22	21-Nov-22
P-78960	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Nov-22	05-Dec-22
P-82330	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.11.2	**Arquitectura estaciones Transmilenio**	310	29-Mar-21	28-Jun-22
P-4400	60% Elaboracion y entrega del diseño (Informacion general,Nivel de acceso,Planta de	135	29-Mar-21	13-Oct-21
P-13420	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectonica,Informe Ana	80	14-Oct-21	09-Feb-22
P-13430	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Oct-21	12-Nov-21
P-16600	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Nov-21	29-Nov-21
P-17630	Revisión de la interventoria R2 60%	20	30-Nov-21	28-Dec-21
P-26810	Final 100%	45	10-Feb-22	14-Apr-22
P-26820	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30510	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32720	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-36430	Revisión de la interventoria R1 100%	20	18-Apr-22	13-May-22
P-42260	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	16-May-22	27-May-22
P-43690	Revisión de la interventoria R2 100%	20	31-May-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.11.3	**MEP Nave Central**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.11.3.1	**Sistema de Ventilacion**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9970	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12750	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilacion y climatiz	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12760	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15700	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15710	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15720	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17170	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18730	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18740	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-19990	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21430	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-23670	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.11.3.2	**Sistemas Contraincendios**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9980	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12770	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de proteccion contra in	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12780	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15730	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15740	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15750	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17180	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18750	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18760	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-20000	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21440	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23680	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.11.3.3	**Sistema Electrico**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-9990	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12790	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12800	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15760	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15770	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15780	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17190	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18770	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18780	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-20010	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21450	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23690	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.11.3.4	**Sistemas HYS**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-10000	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12810	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12820	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15790	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15800	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15810	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17200	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18790	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18800	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-20020	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21460	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23700	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.11.3.5	**Sistemas SYC**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-10010	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12830	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12840	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15820	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15830	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15840	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17210	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18810	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18820	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-20030	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21470	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23710	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.12	**Estación Marly-Calle 57_Tipo_T3M sin interconexión**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.12.1	**Estructura estaciones transmilenio**	438	29-Mar-21	03-Jan-23
P-4410	60% (Cantidades,Ubicacion general,Informacion general,notas y convenciones,Detalle	200	29-Mar-21	19-Jan-22
P-24590	90% Elaboracion y entrega del diseño (Ubicacion de los cimientos y detalles,Ubicación	123	20-Jan-22	18-Jul-22
P-24600	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-Jan-22	16-Feb-22
P-28410	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Feb-22	02-Mar-22
P-29730	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-Mar-22	31-Mar-22
P-52060	Final 100%	65	19-Jul-22	20-Oct-22
P-52070	Revisión de la interventoria R1 90%	20	19-Jul-22	17-Aug-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-60430	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	18-Aug-22	31-Aug-22
P-63450	Revisión de la interventoria R2 90%	20	01-Sep-22	28-Sep-22
P-73030	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Oct-22	21-Nov-22
P-78970	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Nov-22	05-Dec-22
P-82340	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.12.2 Arquitectura estaciones Transmilenio		310	29-Mar-21	28-Jun-22
P-4420	60% Elaboracion y entrega del diseño (Informacion general,Nivel de acceso,Planta de	135	29-Mar-21	13-Oct-21
P-13440	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectonica,Informe Ana	80	14-Oct-21	09-Feb-22
P-13450	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Oct-21	12-Nov-21
P-16610	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Nov-21	29-Nov-21
P-17640	Revisión de la interventoria R2 60%	20	30-Nov-21	28-Dec-21
P-26830	Final 100%	45	10-Feb-22	14-Apr-22
P-26840	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30520	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32730	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-36440	Revisión de la interventoria R1 100%	20	18-Apr-22	13-May-22
P-42270	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	16-May-22	27-May-22
P-43700	Revisión de la interventoria R2 100%	20	31-May-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.12.3 MEP Nave Central		140	27-Jul-21	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.12.3.1 Sistema de Ventilacion		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-10020	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12850	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilacion y climatiz	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12860	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15850	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15860	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15870	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17220	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18830	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18840	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-20040	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21480	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23720	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.12.3.2 Sistemas Contraincendios		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-10030	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12870	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de proteccion contra in	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12880	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15880	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15890	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15900	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17230	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18850	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18860	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-20050	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21490	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23730	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.12.3.3 Sistema Electrico		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-10040	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12890	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12900	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15910	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15920	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15930	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17240	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18870	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18880	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-20060	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21500	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23740	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.12.3.4 Sistemas HYS		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-10050	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12910	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12920	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-15940	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15950	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15960	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17250	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18890	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18900	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-20070	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21510	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23750	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.12.3.5 Sistemas SYC		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-10060	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12930	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12940	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-15970	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-15980	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-15990	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17260	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18910	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18920	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-20080	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21520	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23760	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.13 Estación Calle 72_Tipo_ T3M sin interconexión		438	29-Mar-21	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.13.1 Estructura estaciones transmilenio		438	29-Mar-21	03-Jan-23
P-4430	60% (Cantidades,Ubicacion general,Informacion general,notas y convenciones,Detalle	200	29-Mar-21	19-Jan-22
P-24610	90% Elaboracion y entrega del diseño (Ubicacion de los cimientos y detalles,Ubicación	123	20-Jan-22	18-Jul-22
P-24620	Revisión de la interventoria R1 60%	20	20-Jan-22	16-Feb-22
P-28420	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Feb-22	02-Mar-22
P-29740	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-Mar-22	31-Mar-22
P-52080	Final 100%	65	19-Jul-22	20-Oct-22
P-52090	Revisión de la interventoria R1 90%	20	19-Jul-22	17-Aug-22
P-60440	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	18-Aug-22	31-Aug-22
P-63460	Revisión de la interventoria R2 90%	20	01-Sep-22	28-Sep-22
P-73040	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Oct-22	21-Nov-22
P-78980	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Nov-22	05-Dec-22
P-82350	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.07.13.2 Arquitectura estaciones Transmilenio		310	29-Mar-21	28-Jun-22
P-4440	60% Elaboracion y entrega del diseño (Informacion general,Nivel de acceso,Planta de	135	29-Mar-21	13-Oct-21
P-13460	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria arquitectonica,Informe Ana	80	14-Oct-21	09-Feb-22
P-13470	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Oct-21	12-Nov-21
P-16620	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Nov-21	29-Nov-21
P-17650	Revisión de la interventoria R2 60%	20	30-Nov-21	28-Dec-21
P-26850	Final 100%	45	10-Feb-22	14-Apr-22
P-26860	Revisión de la interventoria R1 90%	20	10-Feb-22	09-Mar-22
P-30530	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	10-Mar-22	24-Mar-22
P-32740	Revisión de la interventoria R2 90%	20	25-Mar-22	22-Apr-22
P-36450	Revisión de la interventoria R1 100%	20	18-Apr-22	13-May-22
P-42280	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	16-May-22	27-May-22
P-43710	Revisión de la interventoria R2 100%	20	31-May-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.13.3 MEP Nave Central		140	27-Jul-21	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.13.3.1 Sistema de Ventilacion		140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-10070	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12950	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilacion y climatiz	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12960	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-16000	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16010	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-16020	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17270	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18930	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18940	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-20090	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21530	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22




Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-23770	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.13.3.2	**Sistemas Contraincendios**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-10080	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12970	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de proteccion contra in	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-12980	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-16030	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16040	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-16050	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17280	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18950	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18960	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-20100	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21540	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23780	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.13.3.3	**Sistema Electrico**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-10090	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-12990	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-13000	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-16060	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16070	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-16080	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17290	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18970	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-18980	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-20110	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21550	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23790	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.13.3.4	**Sistemas HYS**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-10100	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-13010	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-13020	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-16090	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16100	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-16110	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17300	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-18990	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-19000	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-20120	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21560	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23800	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.07.13.3.5	**Sistemas SYC**	140	27-Jul-21	15-Feb-22
P-10110	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones tecnicas,Bases de Diseño,Me	50	27-Jul-21	05-Oct-21
P-13030	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Deteccion y Ala	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-13040	Revisión de la interventoria R1 60%	20	06-Oct-21	04-Nov-21
P-16120	Final 100%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-16130	Revisión de la interventoria R1 90%	20	05-Nov-21	03-Dec-21
P-16140	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	05-Nov-21	19-Nov-21
P-17310	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Nov-21	20-Dec-21
P-19010	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Dec-21	03-Jan-22
P-19020	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	06-Dec-21	20-Dec-21
P-20130	Revisión de la interventoria R2 90%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-21570	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Jan-22	18-Jan-22
P-23810	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.03.08	**PATIO TALLER**	450	03-Mar-21	27-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.01	**Datos de entrada para diseños**	170	16-Jul-21	22-Mar-22
P-9250	60% (Criterios de diseño,Detalles generales elementos,Diseño geotécnico,Documentc	120	16-Jul-21	07-Jan-22
P-22600	Revisión de la interventoria R1 60%	20	11-Jan-22	07-Feb-22
P-26380	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	08-Feb-22	21-Feb-22
P-28560	Revisión de la interventoria R2 60%	20	22-Feb-22	22-Mar-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.02	**Diseño Geotecnico**	90	03-Mar-21	15-Jul-21
PLMB-T1-V04.1.03.08.02.01	**Diseño Geotecnico**	90	03-Mar-21	15-Jul-21
P-3740	60% Elaboracion y entrega del diseño (Memorias de cálculo,Plan de fotometría, Serie	20	03-Mar-21	31-Mar-21

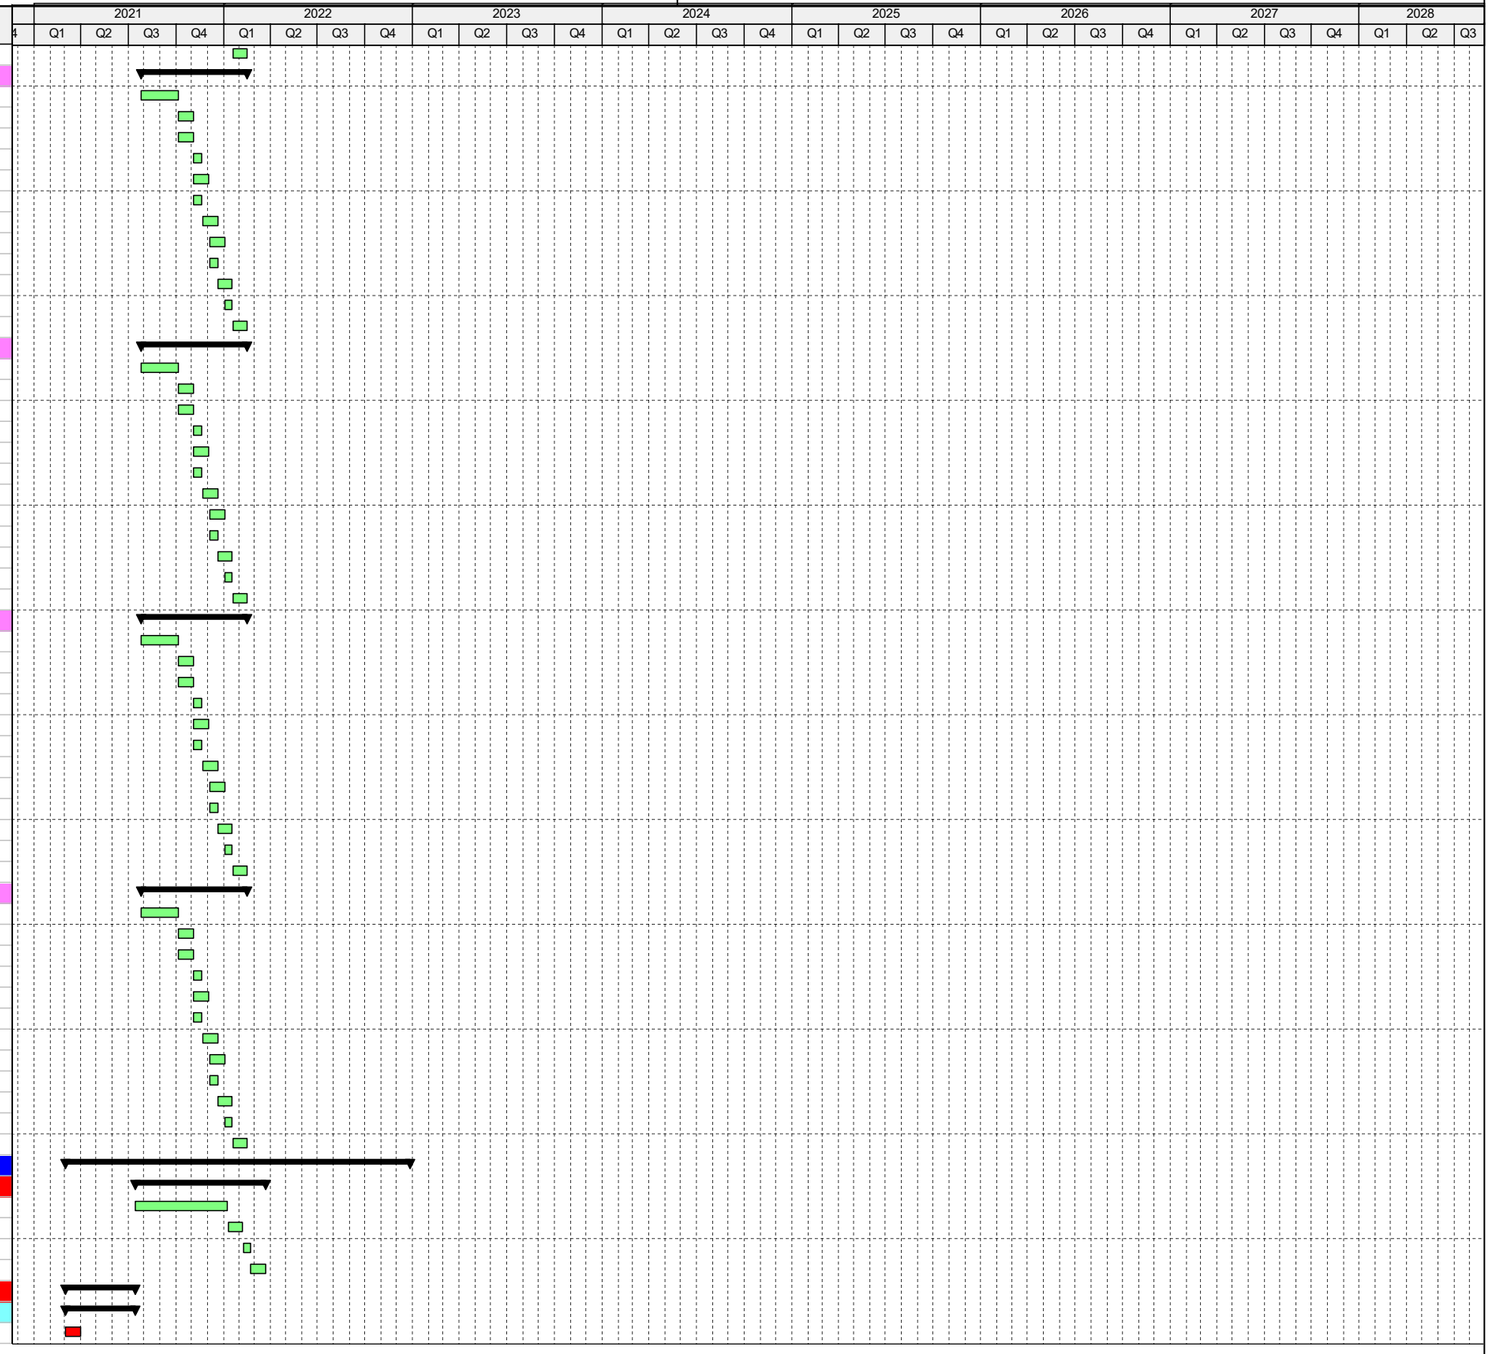


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-7060	Revisión de la interventoria R1 60%	20	03-May-21	31-May-21
P-8010	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	01-Jun-21	16-Jun-21
P-8830	Revisión de la interventoria R2 60%	20	17-Jun-21	15-Jul-21
PLMB-T1-V04.1.03.08.03 Edificios- Edificio Administrativo		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.03.01 Diseño Estructura		422	05-Apr-21	15-Dec-22
P-4620	60% Elaboracion y entrega del diseño (Información general,Ubicación de los apoyos,C	184	05-Apr-21	30-Dec-21
P-20880	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Plantas de cimentación,Detalles de l	123	31-Dec-21	28-Jun-22
P-20890	Revisión de la interventoria R1 60%	20	31-Dec-21	28-Jan-22
P-25130	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	31-Jan-22	11-Feb-22
P-27380	Revisión de la interventoria R2 60%	20	14-Feb-22	11-Mar-22
P-49390	Final 100%	65	29-Jun-22	30-Sep-22
P-49400	Revisión de la interventoria R1 90%	20	29-Jun-22	28-Jul-22
P-55630	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	29-Jul-22	11-Aug-22
P-59430	Revisión de la interventoria R2 90%	20	12-Aug-22	09-Sep-22
P-68720	Revisión de la interventoria R1 100%	20	03-Oct-22	31-Oct-22
P-75320	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	01-Nov-22	16-Nov-22
P-78130	Revisión de la interventoria R2 100%	20	17-Nov-22	15-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.03.02 Diseño Arquitectonico		311	05-Apr-21	05-Jul-22
P-4630	60% Elaboracion y entrega del diseño (Plano del edificio de nivel,Cantidades)	101	05-Apr-21	31-Aug-21
P-10730	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Informe Análisis bioclimático,Seccion	80	01-Sep-21	27-Dec-21
P-10740	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Sep-21	28-Sep-21
P-11540	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Sep-21	12-Oct-21
P-13090	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Oct-21	11-Nov-21
P-20500	Final 100%	80	28-Dec-21	21-Apr-22
P-20510	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Dec-21	25-Jan-22
P-24840	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jan-22	08-Feb-22
P-26390	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Feb-22	08-Mar-22
P-37340	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Apr-22	19-May-22
P-42400	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-May-22	03-Jun-22
P-43840	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Jun-22	05-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.03.03 MEP		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.03.03.1 Ascensores		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4640	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Cantidades de traba	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31010	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles Ascensor)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31020	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36470	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39470	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-55750	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-55760	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62290	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65790	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70830	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77090	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79610	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.03.03.2 Sistema de Ventilación		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4650	60% (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Inst	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31030	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilación y aire ac	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31040	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36480	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39480	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-55770	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-55780	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62300	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65800	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70840	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77100	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79620	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.03.03.3 Sistema Contraincendios		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4660	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31050	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de protección contra in	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31060	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36490	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22

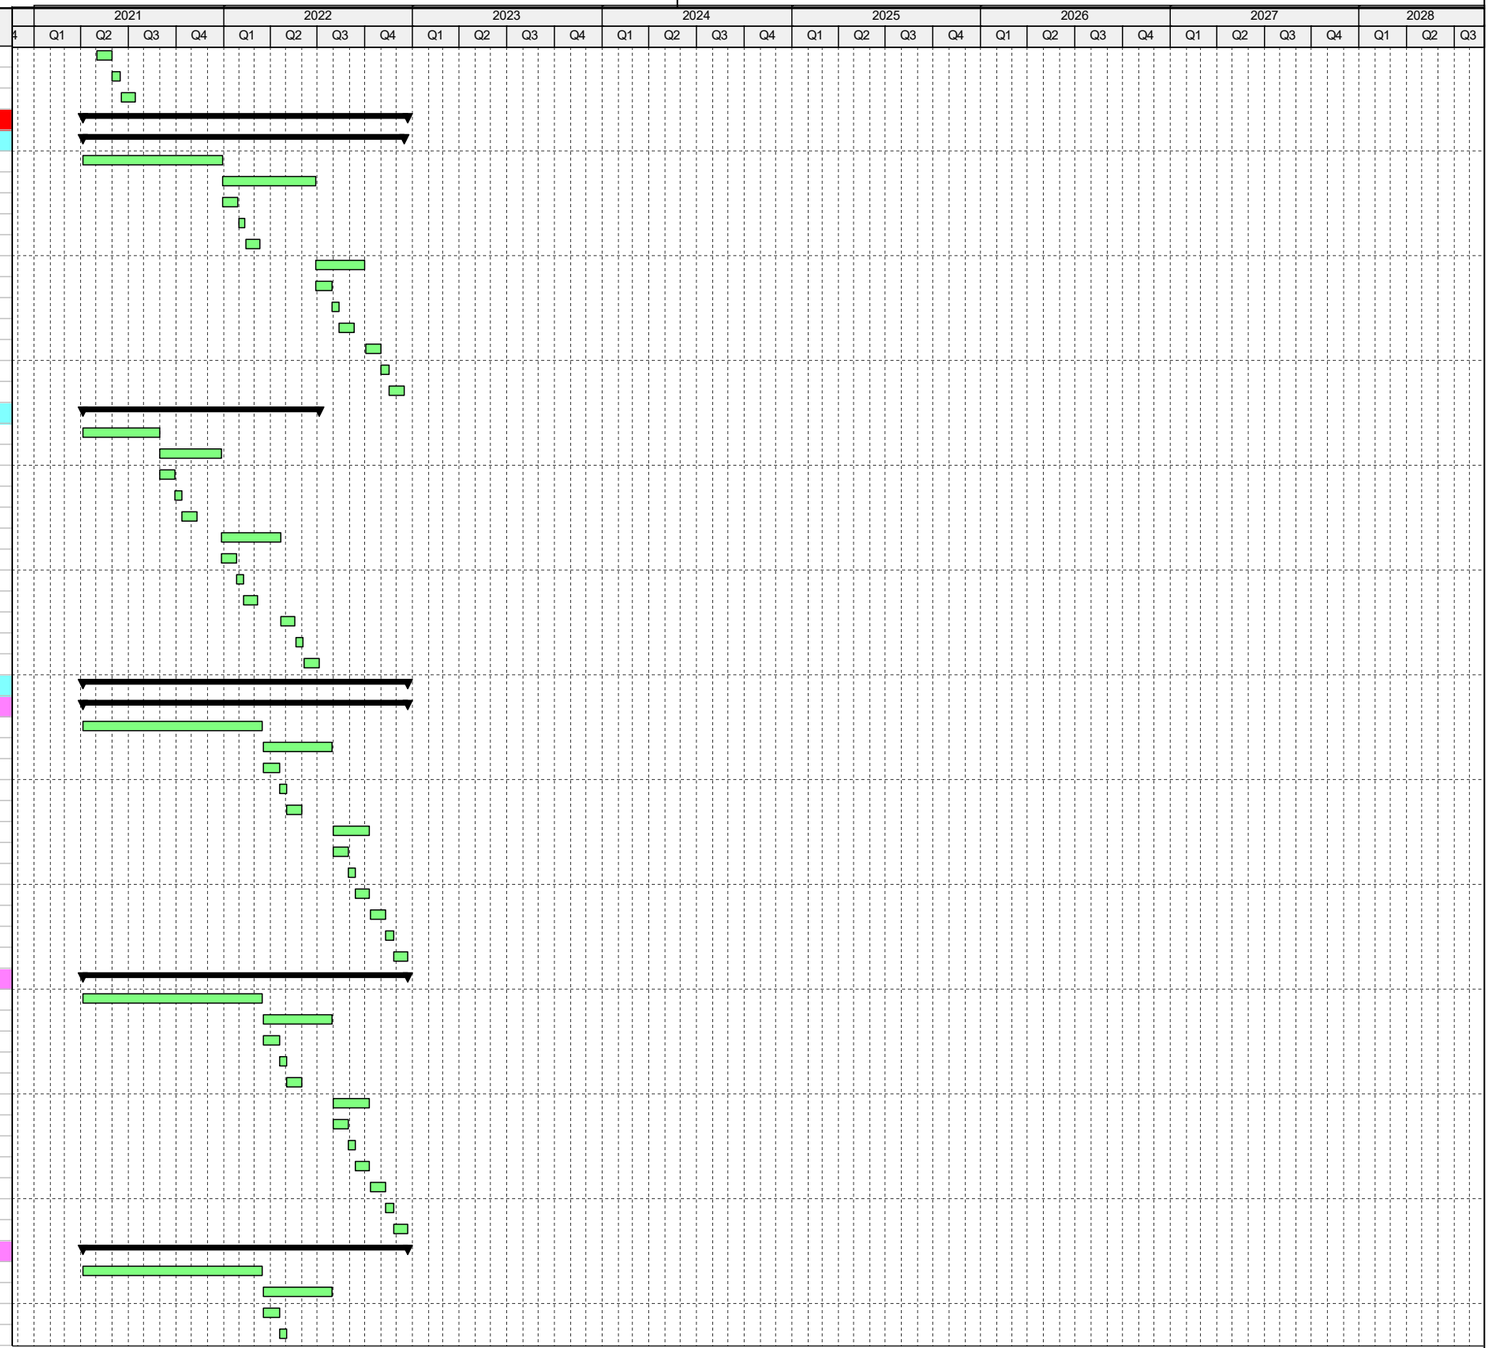

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-39490	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-55790	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-55800	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62310	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65810	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70850	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77110	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79630	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.03.03.4 Sistemas electricos		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4670	60% (Esp. técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Tomas de corrie	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31070	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,Distribución)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31080	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36500	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39500	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-55810	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-55820	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62320	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65820	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70860	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77120	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79640	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.03.03.5 Sistemas HYS		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4680	60% Elaboracion y entrega del diseño (Cantidades,Instalación)	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31090	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31100	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36510	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39510	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-55830	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-55840	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62330	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65830	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70870	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77130	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79650	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.03.03.6 Sistemas SYC		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4690	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31110	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31120	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36520	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39520	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-55850	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-55860	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62340	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65840	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70880	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77140	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79660	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.04 Edificios- Caseta de Control de Acceso y Vigilancia		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.04.01 Diseño Estructura		412	05-Apr-21	30-Nov-22
P-5500	60% Elaboracion y entrega del diseño (Información general,Ubicación de los apoyos,C	174	05-Apr-21	16-Dec-21
P-19430	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Plantas de cimentación,Detalles de l	123	17-Dec-21	13-Jun-22
P-19440	Revisión de la interventoria R1 60%	20	17-Dec-21	14-Jan-22
P-23150	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Jan-22	28-Jan-22
P-25240	Revisión de la interventoria R2 60%	20	31-Jan-22	25-Feb-22
P-45930	Final 100%	65	14-Jun-22	16-Sep-22
P-45940	Revisión de la interventoria R1 90%	20	14-Jun-22	13-Jul-22
P-51060	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	14-Jul-22	28-Jul-22
P-55740	Revisión de la interventoria R2 90%	20	29-Jul-22	26-Aug-22
P-67230	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Sep-22	14-Oct-22
P-72160	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Oct-22	31-Oct-22
P-75430	Revisión de la interventoria R2 100%	20	01-Nov-22	30-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.04.02 Diseño Arquitectonico		311	05-Apr-21	05-Jul-22

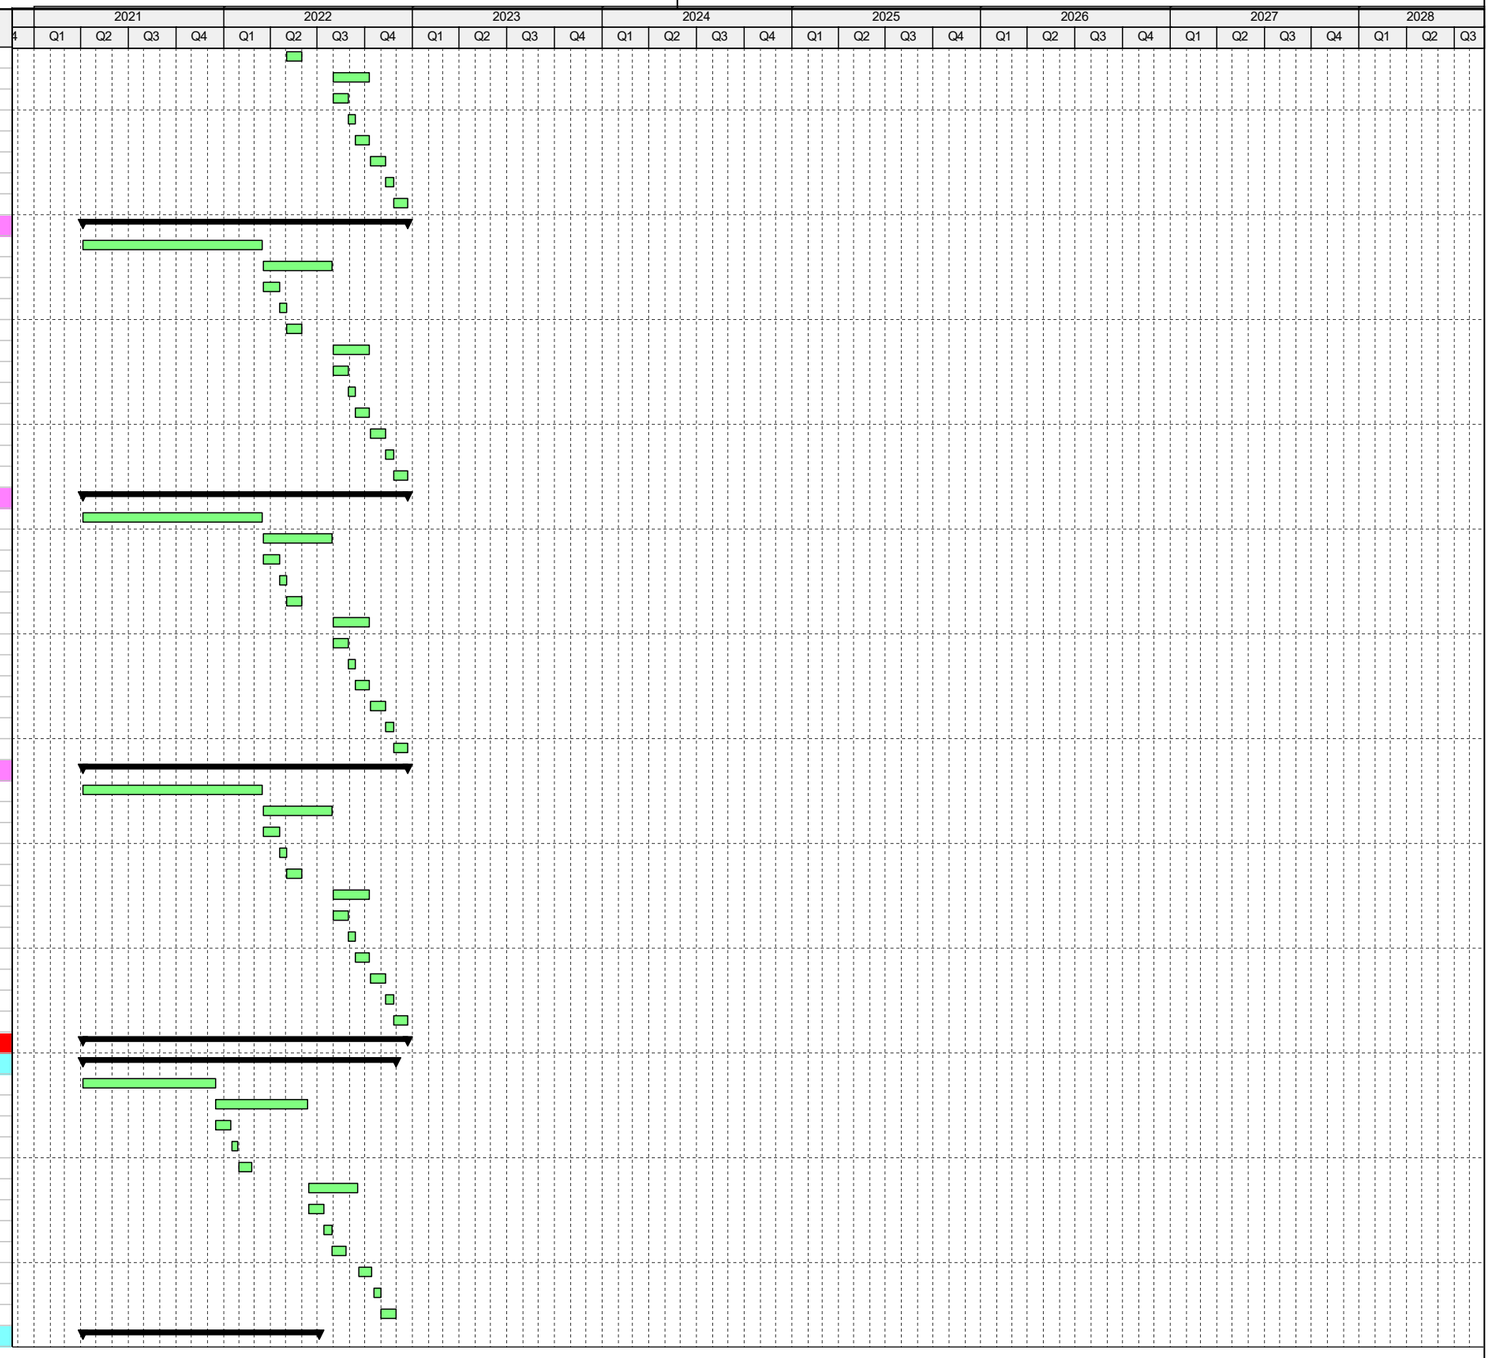

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-5510	60% Elaboracion y entrega del diseño (Plano del edificio de nivel,Cantidades)	101	05-Apr-21	31-Aug-21
P-10950	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Informe Análisis bioclimático,Seccion	80	01-Sep-21	27-Dec-21
P-10960	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Sep-21	28-Sep-21
P-11650	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Sep-21	12-Oct-21
P-13200	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Oct-21	11-Nov-21
P-20720	Final 100%	80	28-Dec-21	21-Apr-22
P-20730	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Dec-21	25-Jan-22
P-24950	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jan-22	08-Feb-22
P-26500	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Feb-22	08-Mar-22
P-37450	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Apr-22	19-May-22
P-42510	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-May-22	03-Jun-22
P-43950	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Jun-22	05-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.04.03 MEP		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.04.03.1 Ascensores		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5520	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Cantidades de traba	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32330	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles Ascensor)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32340	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37130	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40130	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-57070	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-57080	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62950	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66450	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71490	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77750	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80270	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.04.03.2 Sistema de Ventilación		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5530	60% (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Inst	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32350	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilación y aire ac	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32360	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37140	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40140	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-57090	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-57100	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62960	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66460	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71500	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77760	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80280	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.04.03.3 Sistema Contraincendios		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5540	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32370	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de protección contra ir	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32380	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37150	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40150	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-57110	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-57120	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62970	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66470	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71510	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77770	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80290	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.04.03.4 Sistemas electricos		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5550	60% (Esp. técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Tomas de corrie	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32390	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,Distribución)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32400	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37160	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40160	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-57130	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-57140	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62980	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66480	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22




Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Summary
Milestone

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-71520	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77780	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80300	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.04.03.5	**Sistemas HYS**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5560	Elaboracion y entrega del diseño (Cantidades,Instalación)	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32410	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32420	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37170	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40170	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-57150	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-57160	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62990	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66490	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71530	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77790	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80310	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.04.03.6	**Sistemas SYC**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5570	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32430	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Deteccion y Ala	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32440	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37180	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40180	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-57170	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-57180	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-63000	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66500	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71540	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77800	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80320	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.05	**Edificio- Hall de cocheras**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.05.01	**Diseño Estructura**	412	05-Apr-21	30-Nov-22
P-4700	60% Elaboracion y entrega del diseño (Información general,Ubicación de los apoyos,C	174	05-Apr-21	16-Dec-21
P-19230	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Plantas de cimentación,Detalles de l	123	17-Dec-21	13-Jun-22
P-19240	Revisión de la interventoria R1 60%	20	17-Dec-21	14-Jan-22
P-23050	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Jan-22	28-Jan-22
P-25140	Revisión de la interventoria R2 60%	20	31-Jan-22	25-Feb-22
P-45730	Final 100%	65	14-Jun-22	16-Sep-22
P-45740	Revisión de la interventoria R1 90%	20	14-Jun-22	13-Jul-22
P-50960	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	14-Jul-22	28-Jul-22
P-55640	Revisión de la interventoria R2 90%	20	29-Jul-22	26-Aug-22
P-67130	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Sep-22	14-Oct-22
P-72060	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Oct-22	31-Oct-22
P-75330	Revisión de la interventoria R2 100%	20	01-Nov-22	30-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.05.02	**Diseño Arquitectonico**	311	05-Apr-21	05-Jul-22
P-4710	60% Elaboracion y entrega del diseño (Plano del edificio de nivel,Cantidades)	101	05-Apr-21	31-Aug-21
P-10750	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Informe Análisis bioclimático,Seccion	80	01-Sep-21	27-Dec-21
P-10760	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Sep-21	28-Sep-21
P-11550	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Sep-21	12-Oct-21
P-13100	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Oct-21	11-Nov-21
P-20520	Final 100%	80	28-Dec-21	21-Apr-22
P-20530	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Dec-21	25-Jan-22
P-24850	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jan-22	08-Feb-22
P-26400	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Feb-22	08-Mar-22
P-37350	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Apr-22	19-May-22
P-42410	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-May-22	03-Jun-22
P-43850	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Jun-22	05-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.05.03	**MEP**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.05.03.1	**Ascensores**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4720	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Cantidades de traba	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31130	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles Ascensor)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31140	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36530	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22

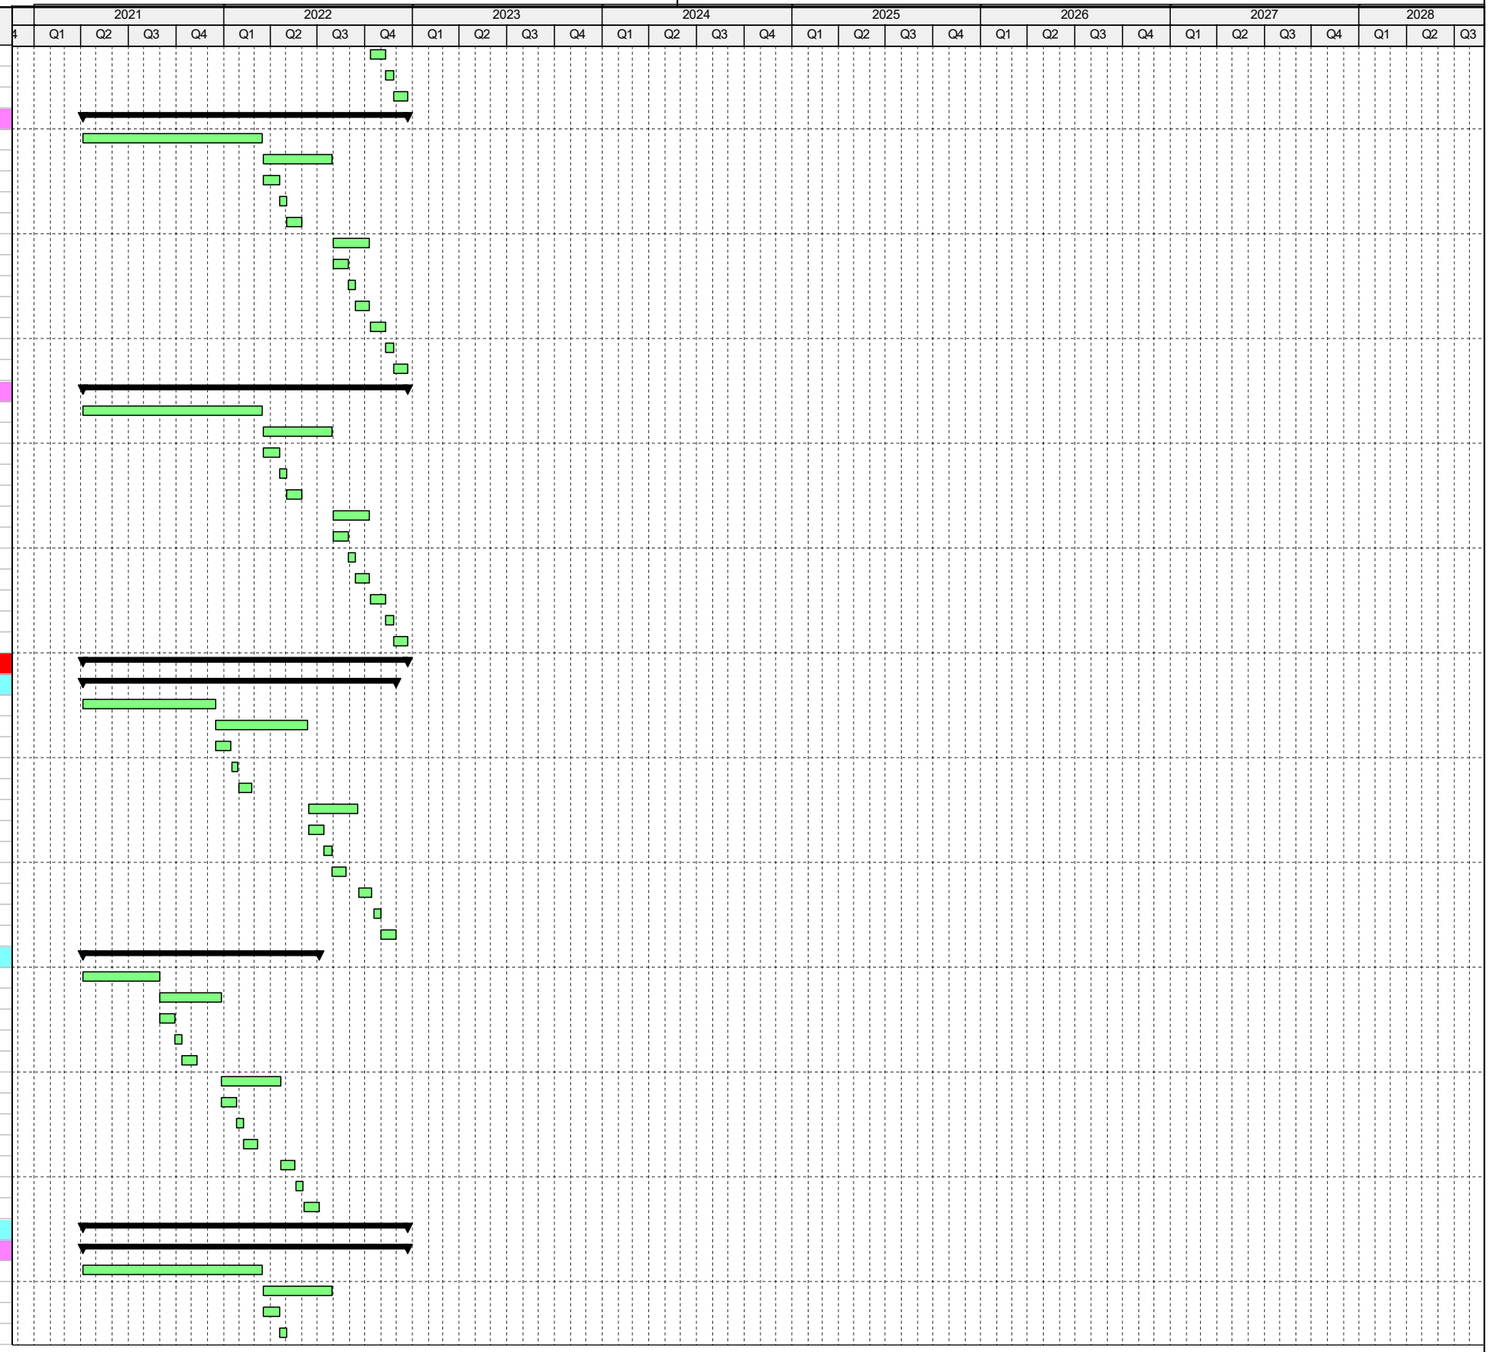


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-39530	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-55870	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-55880	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62350	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65850	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70890	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77150	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79670	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.05.03.2	**Sistema de Ventilación**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4730	60% (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Inst	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31150	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilación y aire ac	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31160	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36540	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39540	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-55890	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-55900	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62360	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65860	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70900	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77160	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79680	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.05.03.3	**Sistema Contraincendios**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4740	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31170	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de protección contra ir	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31180	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36550	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39550	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-55910	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-55920	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62370	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65870	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70910	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77170	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79690	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.05.03.4	**Sistemas electricos**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4750	60% (Esp. técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Tomas de corrie	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31190	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,Distribución)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31200	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36560	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39560	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-55930	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-55940	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62380	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65880	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70920	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77180	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79700	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.05.03.5	**Sistemas HYS**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4760	60% Elaboracion y entrega del diseño (Cantidades,Instalación)	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31210	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31220	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36570	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39570	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-55950	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-55960	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62390	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65890	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70930	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77190	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79710	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.05.03.6	**Sistemas SYC**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4770	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22

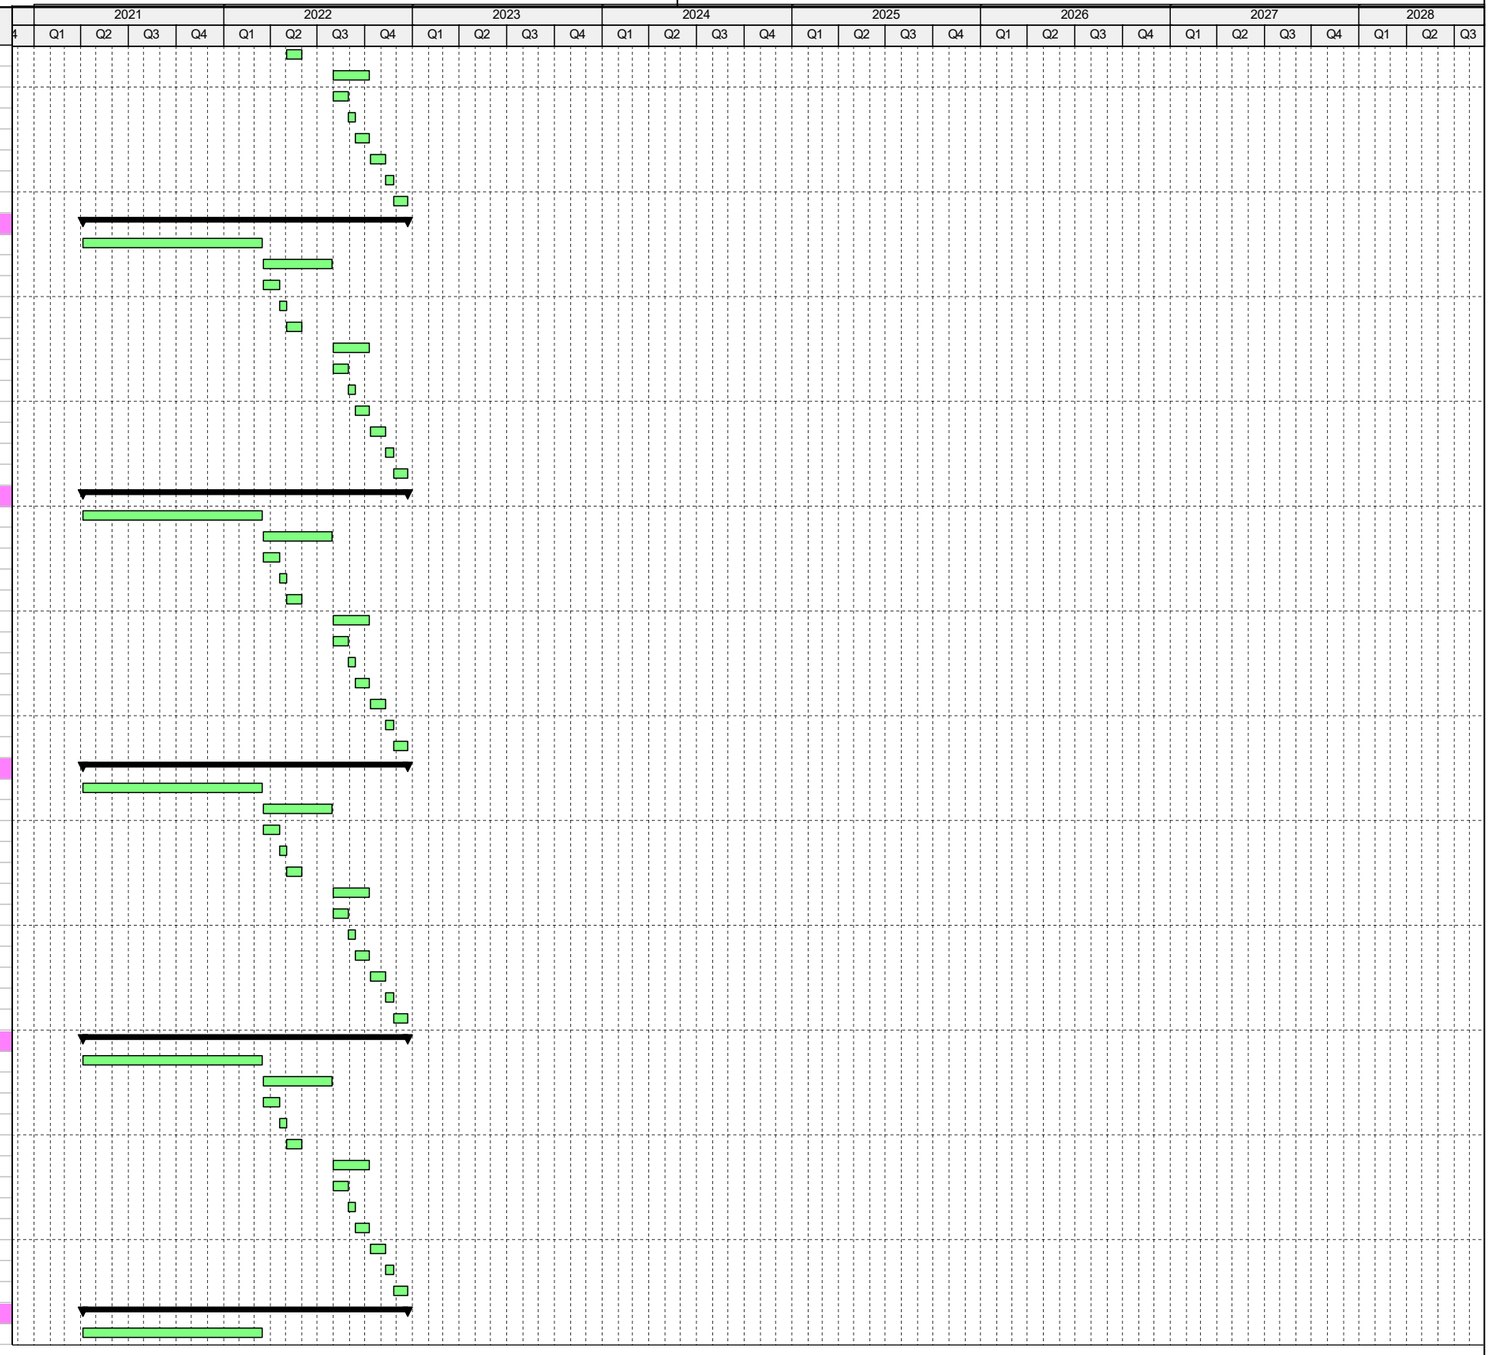

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-31230	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31240	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36580	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39580	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-55970	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-55980	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62400	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65900	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70940	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77200	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79720	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.06 Edificios- Locales tecnicos		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.06.01 Diseño Estructura		412	05-Apr-21	30-Nov-22
P-4780	60% Elaboracion y entrega del diseño (Información general,Ubicación de los apoyos,C	174	05-Apr-21	16-Dec-21
P-19250	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Plantas de cimentación,Detalles de l	123	17-Dec-21	13-Jun-22
P-19260	Revisión de la interventoria R1 60%	20	17-Dec-21	14-Jan-22
P-23060	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Jan-22	28-Jan-22
P-25150	Revisión de la interventoria R2 60%	20	31-Jan-22	25-Feb-22
P-45750	Final 100%	65	14-Jun-22	16-Sep-22
P-45760	Revisión de la interventoria R1 90%	20	14-Jun-22	13-Jul-22
P-50970	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	14-Jul-22	28-Jul-22
P-55650	Revisión de la interventoria R2 90%	20	29-Jul-22	26-Aug-22
P-67140	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Sep-22	14-Oct-22
P-72070	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Oct-22	31-Oct-22
P-75340	Revisión de la interventoria R2 100%	20	01-Nov-22	30-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.06.02 Diseño Arquitectonico		311	05-Apr-21	05-Jul-22
P-4790	60% Elaboracion y entrega del diseño (Plano del edificio de nivel,Cantidades)	101	05-Apr-21	31-Aug-21
P-10770	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Informe Análisis bioclimático,Seccion	80	01-Sep-21	27-Dec-21
P-10780	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Sep-21	28-Sep-21
P-11560	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Sep-21	12-Oct-21
P-13110	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Oct-21	11-Nov-21
P-20540	Final 100%	80	28-Dec-21	21-Apr-22
P-20550	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Dec-21	25-Jan-22
P-24860	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jan-22	08-Feb-22
P-26410	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Feb-22	08-Mar-22
P-37360	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Apr-22	19-May-22
P-42420	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-May-22	03-Jun-22
P-43860	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Jun-22	05-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.06.03 MEP		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.06.03.1 Ascensores		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4800	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Cantidades de traba	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31250	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles Ascensor)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31260	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36590	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39590	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-55990	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56000	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62410	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65910	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70950	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77210	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79730	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.06.03.2 Sistema de Ventilación		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4810	60% (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Inst	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31270	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilación y aire ac	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31280	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36600	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39600	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56010	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56020	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62420	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65920	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22

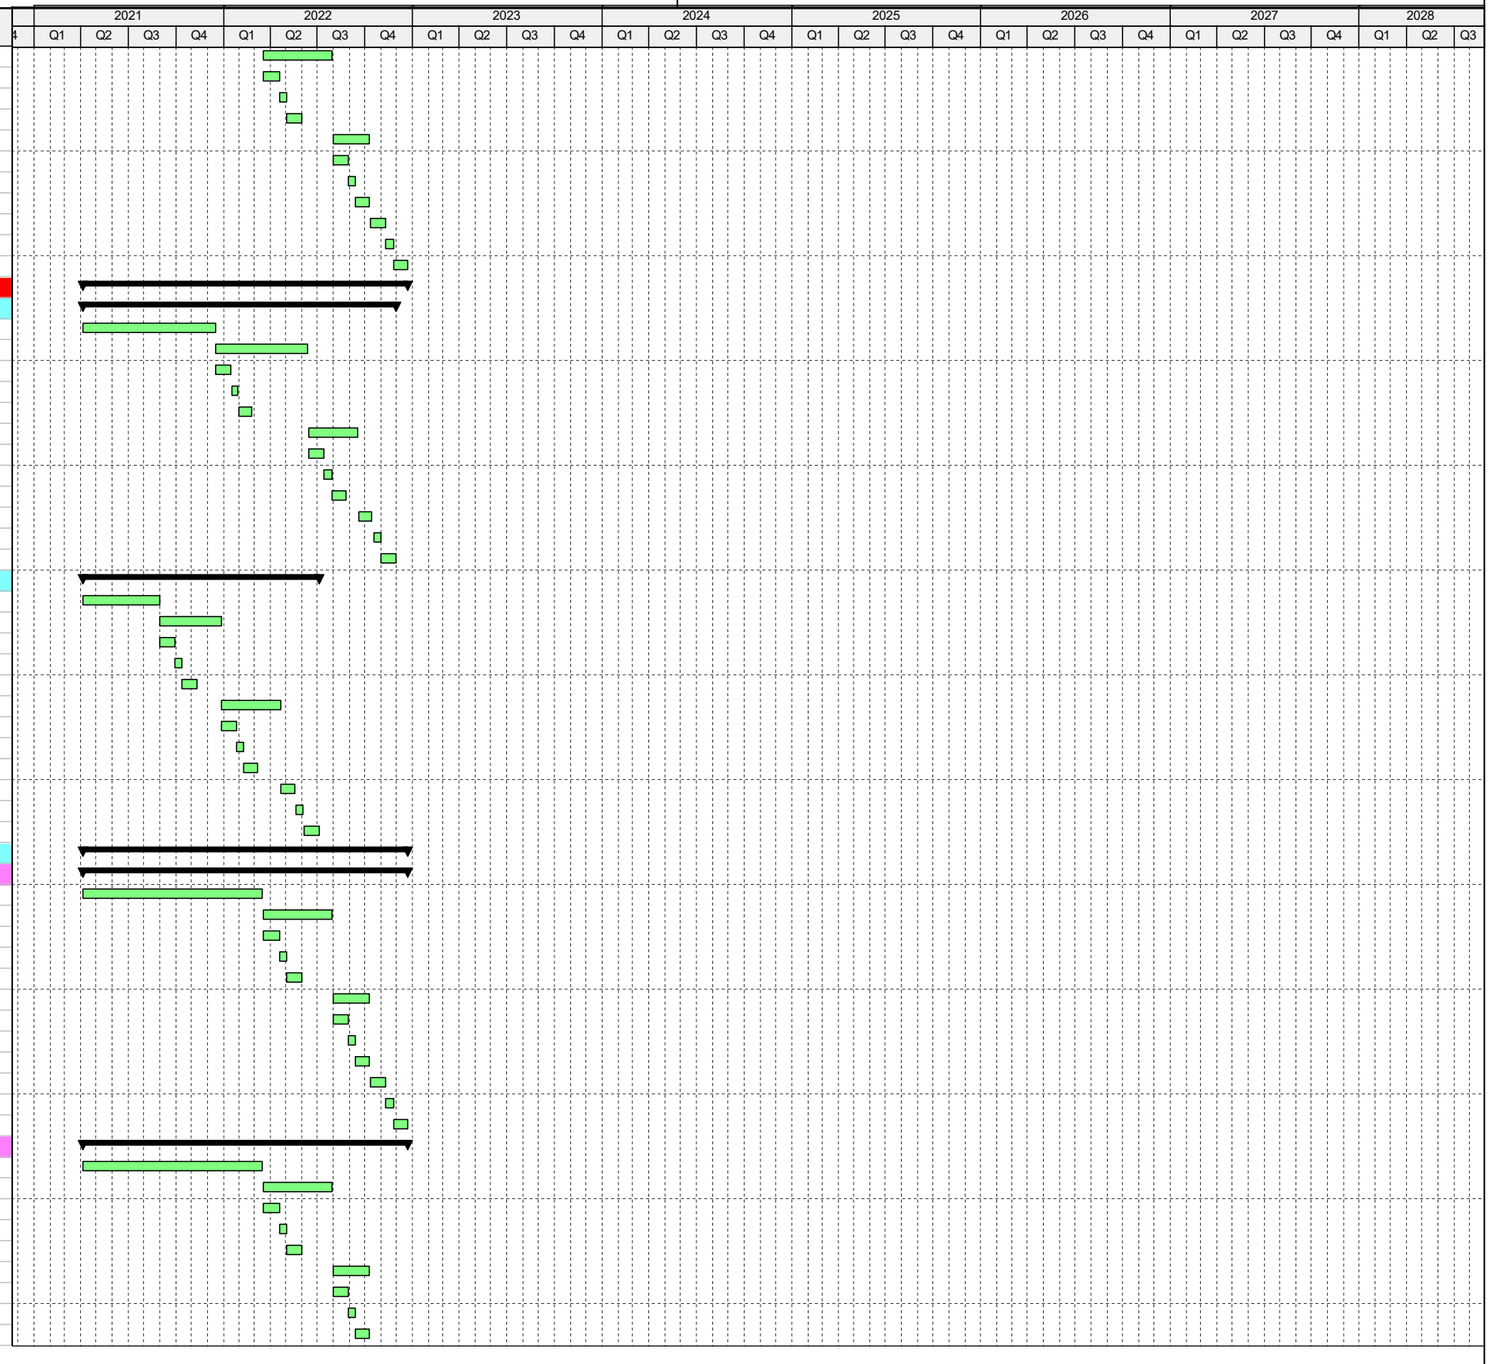


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-70960	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77220	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79740	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.06.03.3	**Sistema Contraincendios**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4820	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31290	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de protección contra ir	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31300	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36610	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39610	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56030	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56040	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62430	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65930	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70970	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77230	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79750	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.06.03.4	**Sistemas electricos**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4830	60% (Esp. técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Tomas de corrie	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31310	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,Distribución)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31320	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36620	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39620	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56050	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56060	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62440	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65940	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70980	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77240	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79760	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.06.03.5	**Sistemas HYS**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4840	60% Elaboracion y entrega del diseño (Cantidades,Instalación)	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31330	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31340	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36630	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39630	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56070	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56080	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62450	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65950	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-70990	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77250	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79770	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.06.03.6	**Sistemas SYC**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4850	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31350	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31360	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36640	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39640	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56090	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56100	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62460	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65960	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71000	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77260	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79780	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.07	**Edificios-Maquina de lavado**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.07.01	**Diseño Estructura**	412	05-Apr-21	30-Nov-22
P-4860	60% Elaboracion y entrega del diseño (Información general,Ubicación de los apoyos,C	174	05-Apr-21	16-Dec-21
P-19270	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Plantas de cimentación,Detalles de l	123	17-Dec-21	13-Jun-22
P-19280	Revisión de la interventoria R1 60%	20	17-Dec-21	14-Jan-22
P-23070	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Jan-22	28-Jan-22
P-25160	Revisión de la interventoria R2 60%	20	31-Jan-22	25-Feb-22

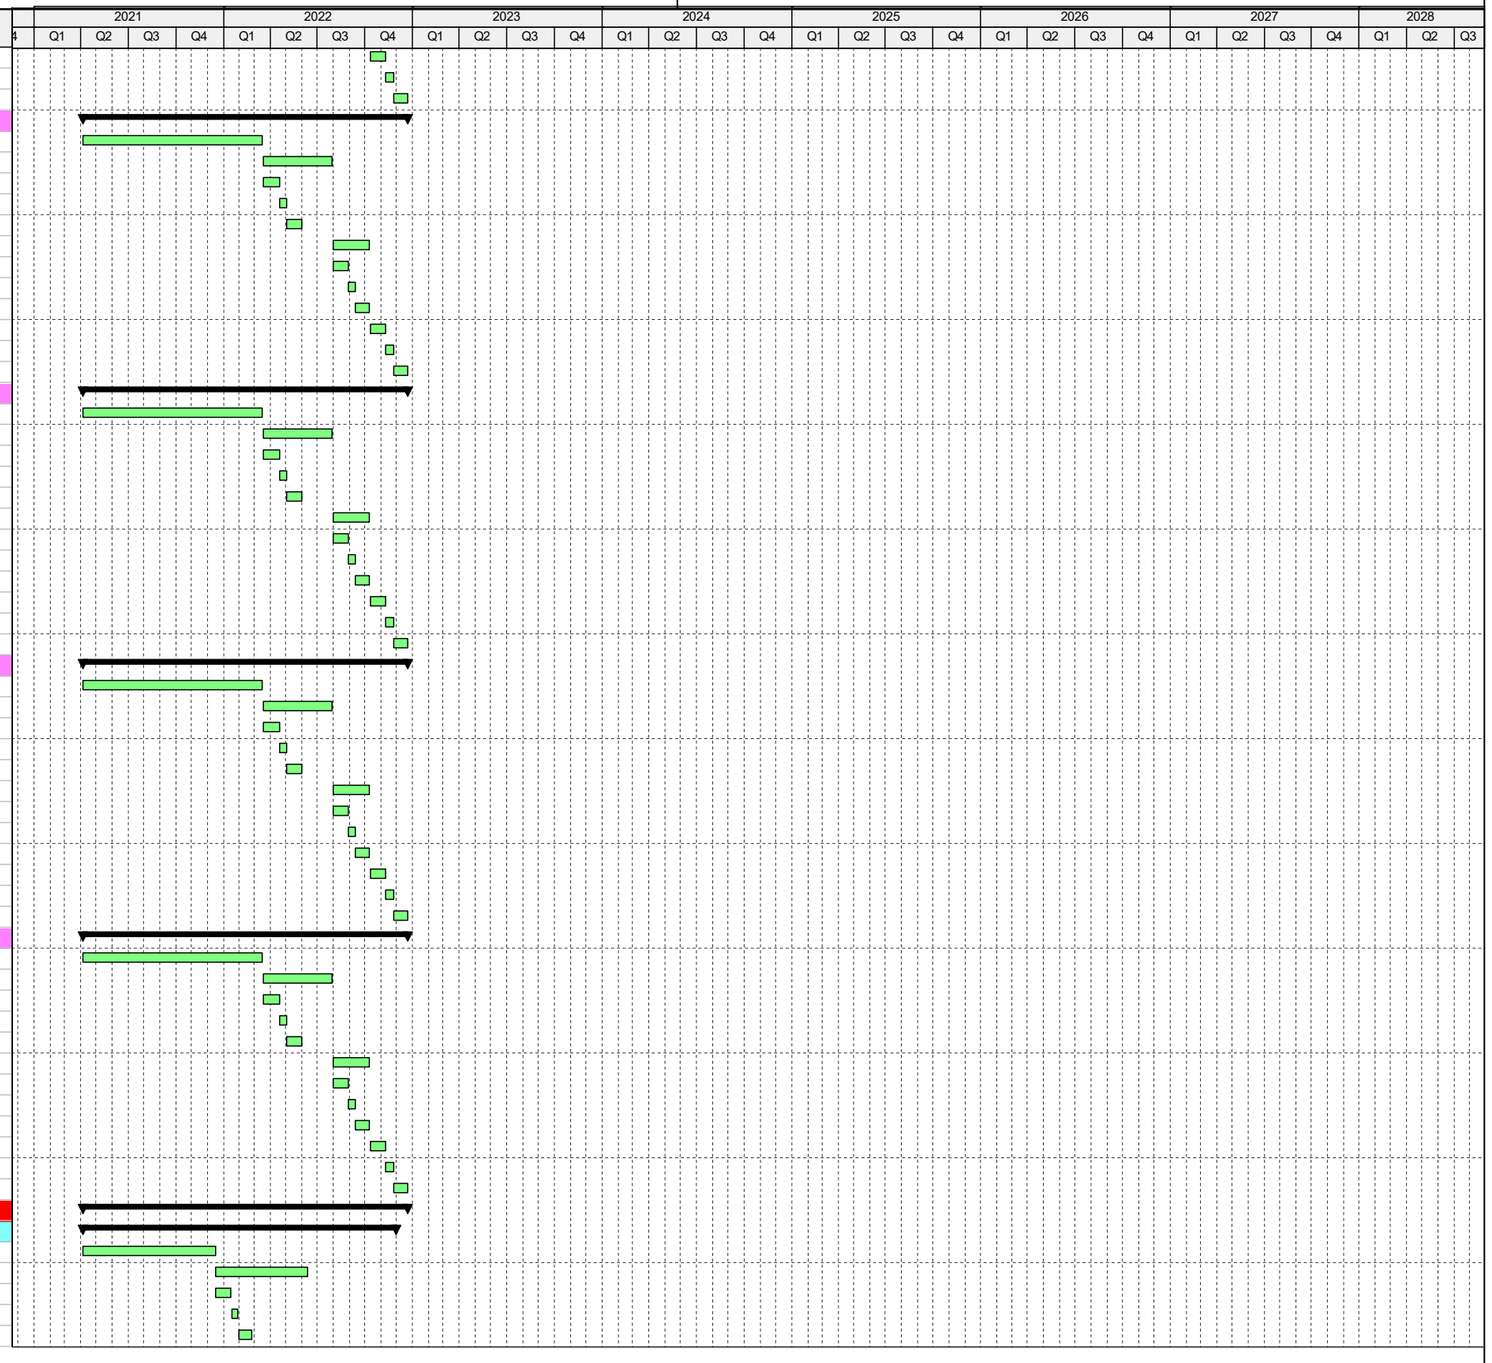


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-45770	Final 100%	65	14-Jun-22	16-Sep-22
P-45780	Revisión de la interventoria R1 90%	20	14-Jun-22	13-Jul-22
P-50980	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	14-Jul-22	28-Jul-22
P-55660	Revisión de la interventoria R2 90%	20	29-Jul-22	26-Aug-22
P-67150	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Sep-22	14-Oct-22
P-72080	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Oct-22	31-Oct-22
P-75350	Revisión de la interventoria R2 100%	20	01-Nov-22	30-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.07.02 Diseño Arquitectonico		311	05-Apr-21	05-Jul-22
P-4870	60% Elaboracion y entrega del diseño (Plano del edificio de nivel,Cantidades)	101	05-Apr-21	31-Aug-21
P-10790	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Informe Análisis bioclimático,Seccion	80	01-Sep-21	27-Dec-21
P-10800	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Sep-21	28-Sep-21
P-11570	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Sep-21	12-Oct-21
P-13120	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Oct-21	11-Nov-21
P-20560	Final 100%	80	28-Dec-21	21-Apr-22
P-20570	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Dec-21	25-Jan-22
P-24870	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jan-22	08-Feb-22
P-26420	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Feb-22	08-Mar-22
P-37370	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Apr-22	19-May-22
P-42430	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-May-22	03-Jun-22
P-43870	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Jun-22	05-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.07.03 MEP		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.07.03.1 Ascensores		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4880	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Cantidades de traba	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31370	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles Ascensor)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31380	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36650	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39650	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56110	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56120	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62470	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65970	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71010	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77270	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79790	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.07.03.2 Sistema de Ventilación		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4890	60% (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Inst	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31390	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilación y aire ac	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31400	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36660	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39660	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56130	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56140	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62480	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65980	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71020	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77280	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79800	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.07.03.3 Sistema Contraincendios		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4900	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31410	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de protección contra ir	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31420	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36670	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39670	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56150	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56160	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62490	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-65990	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71030	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77290	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79810	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.07.03.4 Sistemas electricos		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4910	60% (Esp. técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Tomas de corrie	238	05-Apr-21	17-Mar-22

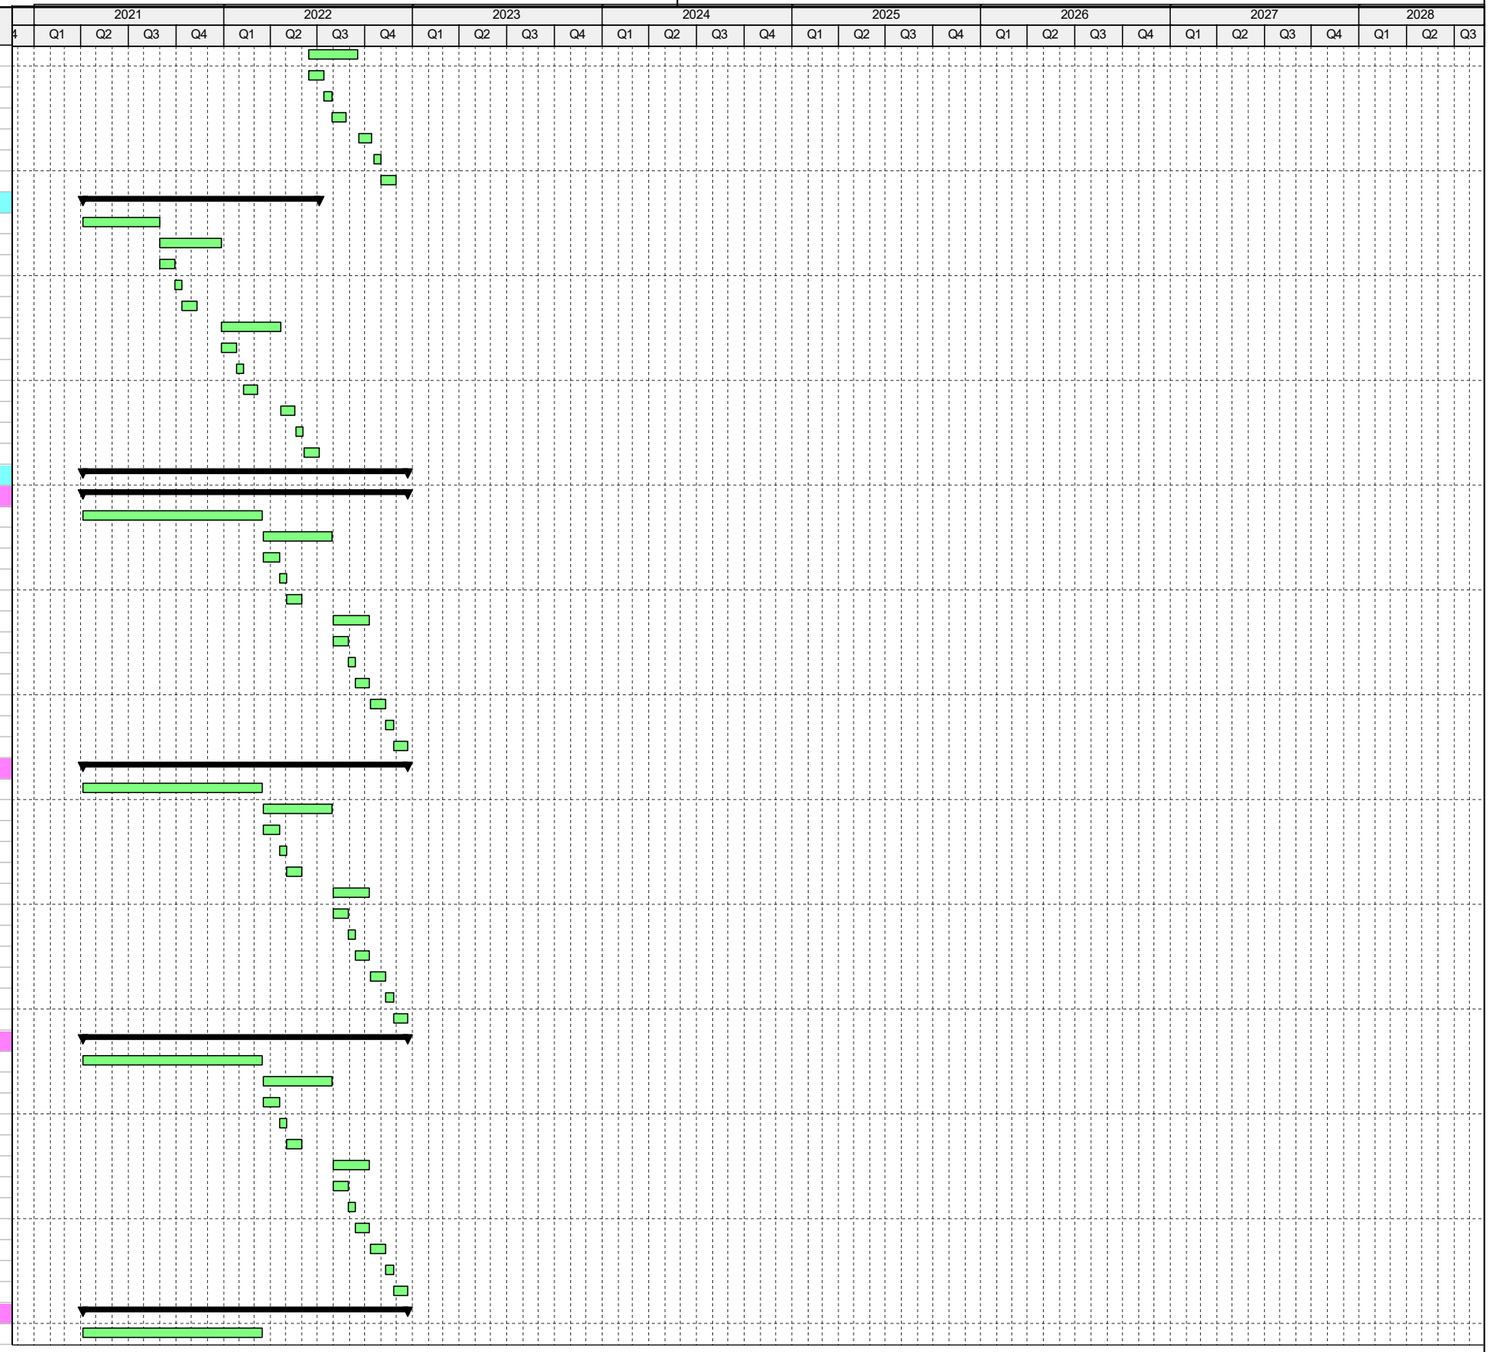


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-31430	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,Distribución)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31440	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36680	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39680	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56170	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56180	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62500	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66000	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71040	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77300	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79820	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.07.03.5 Sistemas HYS		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4920	60% Elaboracion y entrega del diseño (Cantidades,Instalación)	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31450	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31460	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36690	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39690	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56190	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56200	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62510	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66010	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71050	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77310	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79830	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.07.03.6 Sistemas SYC		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4930	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31470	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31480	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36700	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39700	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56210	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56220	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62520	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66020	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71060	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77320	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79840	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.08 Edificios-Taller de mantenimiento infraestructura		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.08.01 Diseño Estructura		412	05-Apr-21	30-Nov-22
P-4940	60% Elaboracion y entrega del diseño (Información general,Ubicación de los apoyos,C	174	05-Apr-21	16-Dec-21
P-19290	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Plantas de cimentación,Detalles de l	123	17-Dec-21	13-Jun-22
P-19300	Revisión de la interventoria R1 60%	20	17-Dec-21	14-Jan-22
P-23080	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Jan-22	28-Jan-22
P-25170	Revisión de la interventoria R2 60%	20	31-Jan-22	25-Feb-22
P-45790	Final 100%	65	14-Jun-22	16-Sep-22
P-45800	Revisión de la interventoria R1 90%	20	14-Jun-22	13-Jul-22
P-50990	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	14-Jul-22	28-Jul-22
P-55670	Revisión de la interventoria R2 90%	20	29-Jul-22	26-Aug-22
P-67160	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Sep-22	14-Oct-22
P-72090	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Oct-22	31-Oct-22
P-75360	Revisión de la interventoria R2 100%	20	01-Nov-22	30-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.08.02 Diseño Arquitectonico		311	05-Apr-21	05-Jul-22
P-4950	60% Elaboracion y entrega del diseño (Plano del edificio de nivel,Cantidades)	101	05-Apr-21	31-Aug-21
P-10810	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Informe Análisis bioclimático,Seccion	80	01-Sep-21	27-Dec-21
P-10820	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Sep-21	28-Sep-21
P-11580	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Sep-21	12-Oct-21
P-13130	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Oct-21	11-Nov-21
P-20580	Final 100%	80	28-Dec-21	21-Apr-22
P-20590	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Dec-21	25-Jan-22
P-24880	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jan-22	08-Feb-22
P-26430	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Feb-22	08-Mar-22
P-37380	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Apr-22	19-May-22

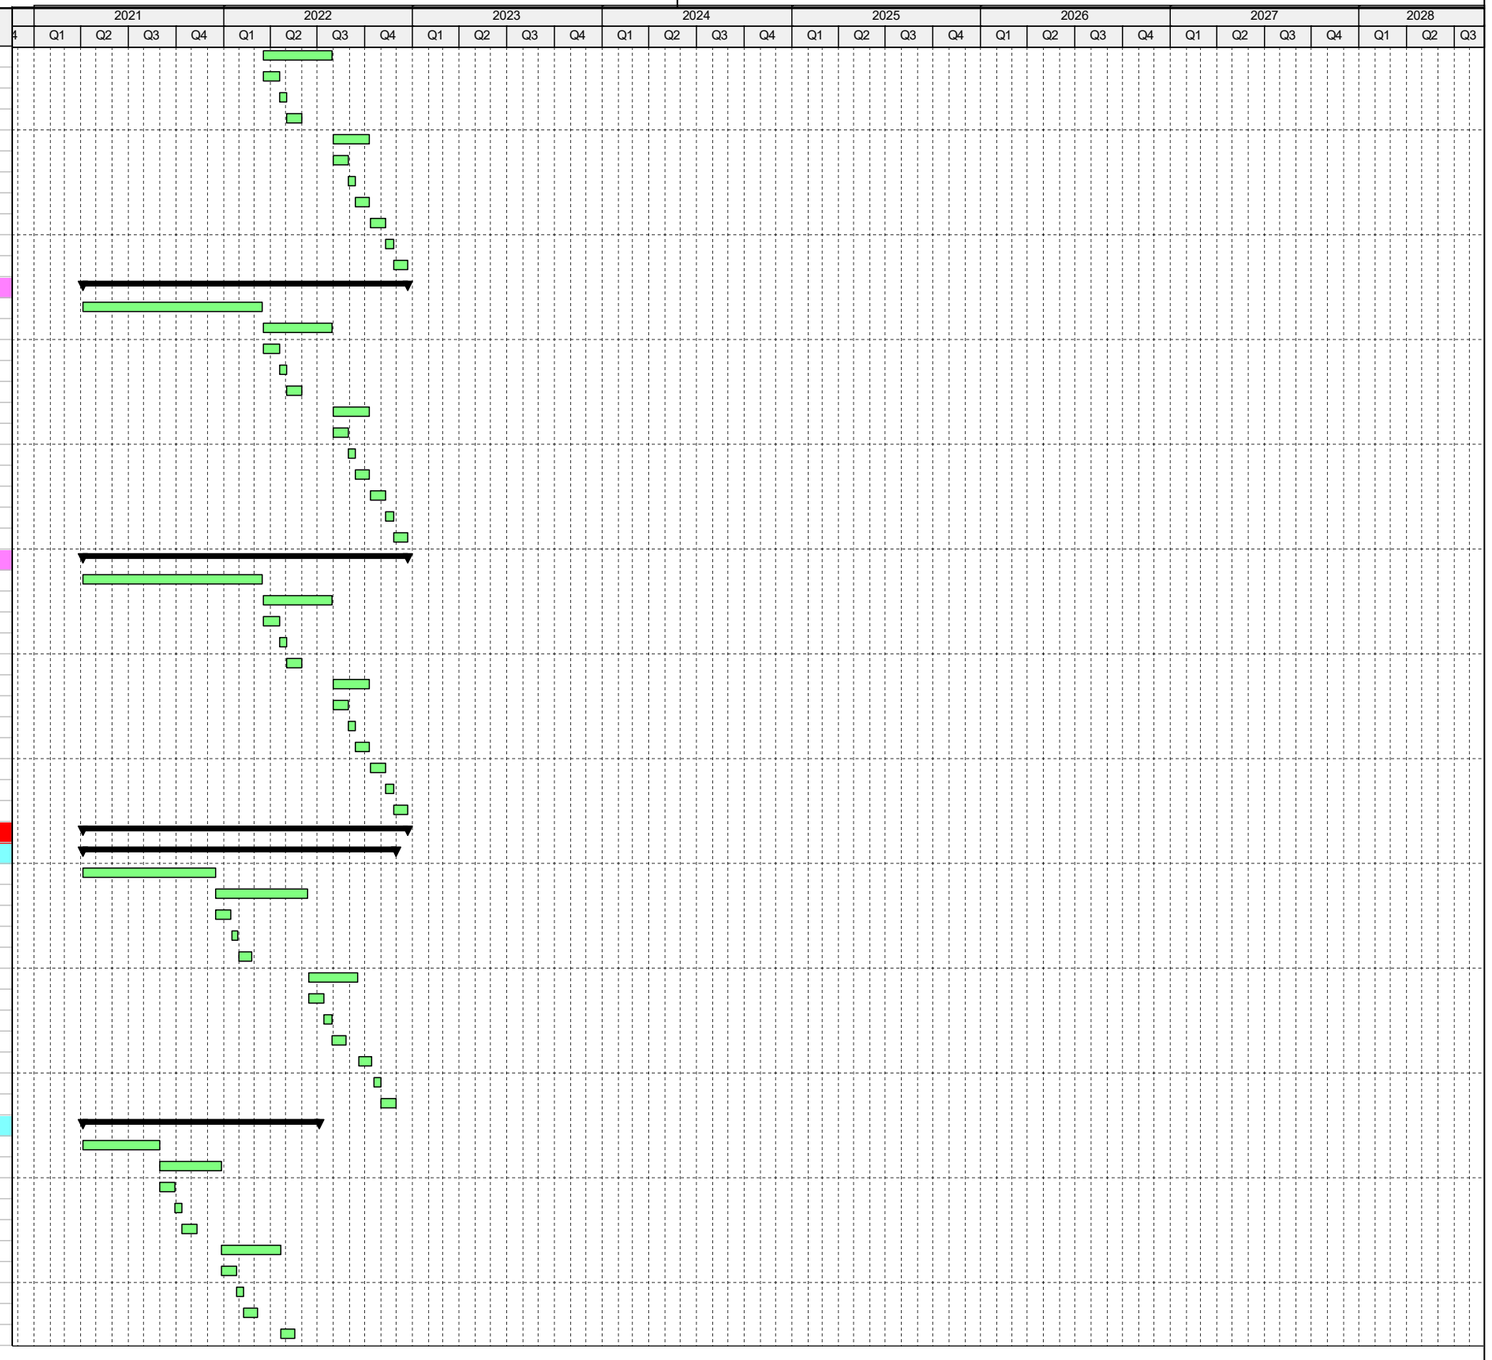

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-42440	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-May-22	03-Jun-22
P-43880	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Jun-22	05-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.08.03 MEP		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.08.03.1 Ascensores		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4960	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Cantidades de traba	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31490	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles Ascensor)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31500	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36710	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39710	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56230	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56240	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62530	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66030	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71070	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77330	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79850	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.08.03.2 Sistema de Ventilación		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4970	60% (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Inst	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31510	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilación y aire ac	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31520	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36720	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39720	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56250	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56260	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62540	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66040	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71080	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77340	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79860	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.08.03.3 Sistema Contraincendios		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4980	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31530	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de protección contra ir	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31540	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36730	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39730	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56270	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56280	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62550	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66050	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71090	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77350	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79870	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.08.03.4 Sistemas electricos		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-4990	60% (Esp. técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Tomas de corrie	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31550	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,Distribución)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31560	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36740	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39740	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56290	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56300	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62560	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66060	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71100	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77360	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79880	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.08.03.5 Sistemas HYS		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5000	60% Elaboracion y entrega del diseño (Cantidades,Instalación)	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31570	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31580	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36750	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39750	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56310	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22

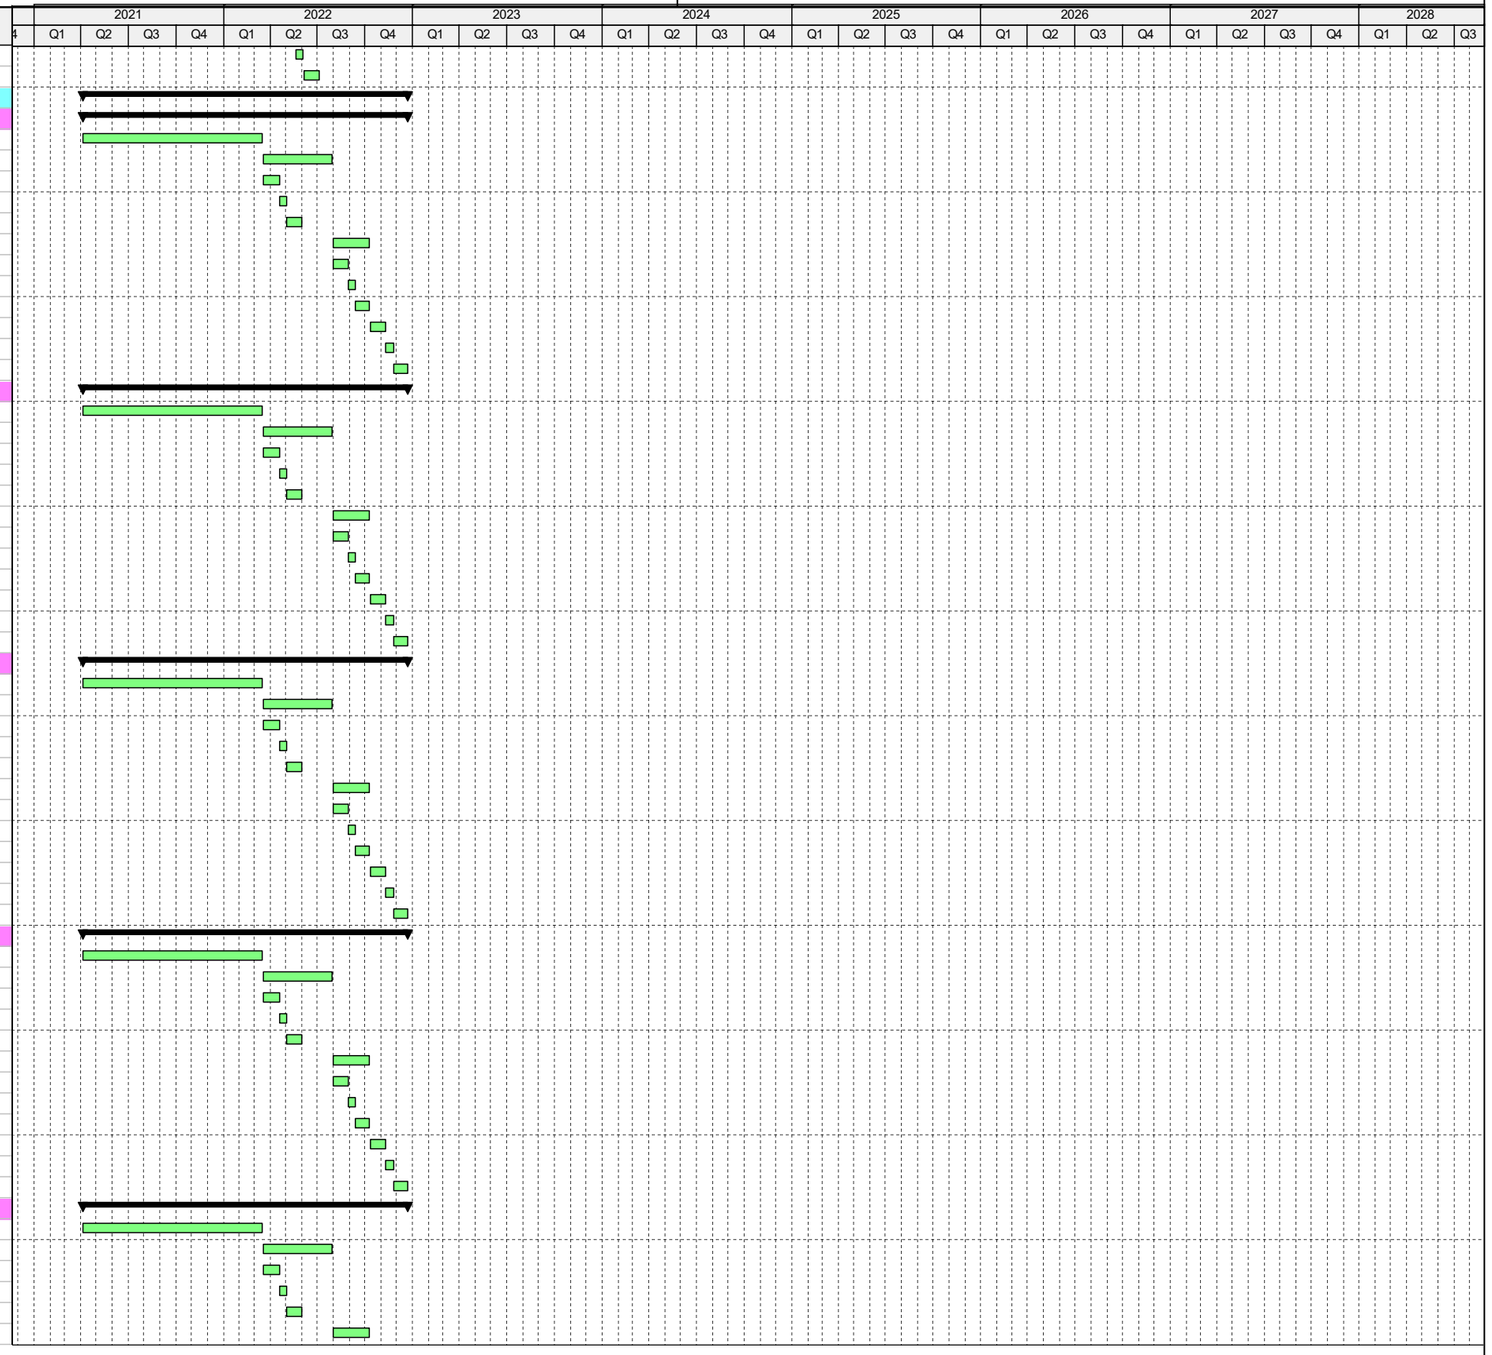


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-56320	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62570	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66070	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71110	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77370	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79890	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.08.03.6 Sistemas SYC		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5010	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31590	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31600	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36760	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39760	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56330	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56340	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62580	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66080	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71120	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77380	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79900	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.09 Edificios-Taller de mantenimiento mayor y menor		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.09.01 Diseño Estructura		412	05-Apr-21	30-Nov-22
P-5020	60% Elaboracion y entrega del diseño (Información general,Ubicación de los apoyos,C	174	05-Apr-21	16-Dec-21
P-19310	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Plantas de cimentación,Detalles de l	123	17-Dec-21	13-Jun-22
P-19320	Revisión de la interventoria R1 60%	20	17-Dec-21	14-Jan-22
P-23090	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Jan-22	28-Jan-22
P-25180	Revisión de la interventoria R2 60%	20	31-Jan-22	25-Feb-22
P-45810	Final 100%	65	14-Jun-22	16-Sep-22
P-45820	Revisión de la interventoria R1 90%	20	14-Jun-22	13-Jul-22
P-51000	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	14-Jul-22	28-Jul-22
P-55680	Revisión de la interventoria R2 90%	20	29-Jul-22	26-Aug-22
P-67170	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Sep-22	14-Oct-22
P-72100	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Oct-22	31-Oct-22
P-75370	Revisión de la interventoria R2 100%	20	01-Nov-22	30-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.09.02 Diseño Arquitectonico		311	05-Apr-21	05-Jul-22
P-5030	60% Elaboracion y entrega del diseño (Plano del edificio de nivel,Cantidades)	101	05-Apr-21	31-Aug-21
P-10830	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Informe Análisis bioclimático,Seccion	80	01-Sep-21	27-Dec-21
P-10840	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Sep-21	28-Sep-21
P-11590	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Sep-21	12-Oct-21
P-13140	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Oct-21	11-Nov-21
P-20600	Final 100%	80	28-Dec-21	21-Apr-22
P-20610	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Dec-21	25-Jan-22
P-24890	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jan-22	08-Feb-22
P-26440	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Feb-22	08-Mar-22
P-37390	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Apr-22	19-May-22
P-42450	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-May-22	03-Jun-22
P-43890	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Jun-22	05-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.09.03 MEP		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.09.03.1 Ascensores		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5040	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Cantidades de traba	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31610	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles Ascensor)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31620	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36770	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39770	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56350	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56360	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62590	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66090	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71130	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77390	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79910	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.09.03.2 Sistema de Ventilación		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5050	60% (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Inst	238	05-Apr-21	17-Mar-22

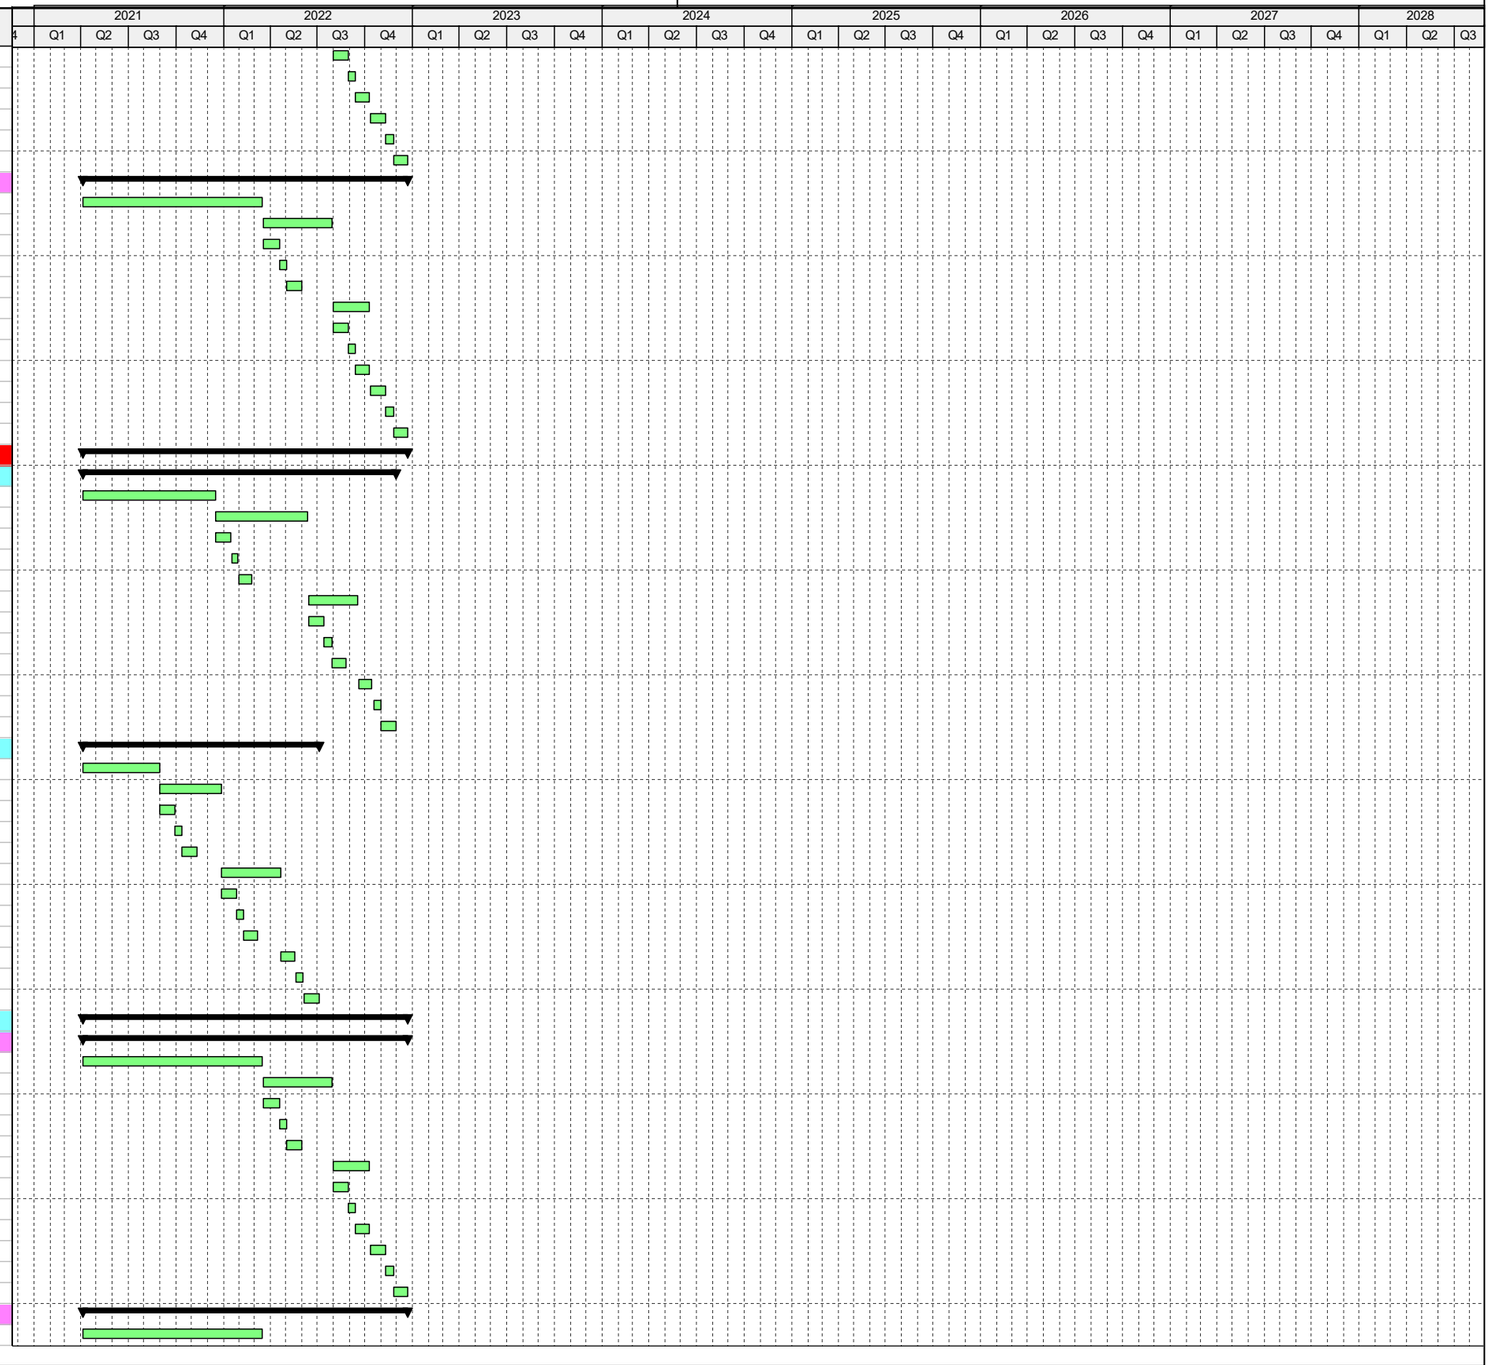


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-31630	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilación y aire ac	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31640	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36780	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39780	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56370	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56380	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62600	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66100	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71140	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77400	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79920	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.09.03.3 Sistema Contraincendios		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5060	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31650	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de protección contra ir	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31660	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36790	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39790	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56390	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56400	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62610	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66110	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71150	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77410	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79930	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.09.03.4 Sistemas electricos		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5070	60% (Esp. técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Tomas de corrie	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31670	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,Distribución)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31680	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36800	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39800	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56410	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56420	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62620	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66120	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71160	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77420	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79940	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.09.03.5 Sistemas HYS		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5080	60% Elaboracion y entrega del diseño (Cantidades,Instalación)	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31690	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31700	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36810	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39810	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56430	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56440	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62630	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66130	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71170	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77430	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79950	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.09.03.6 Sistemas SYC		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5090	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31710	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Deteccion y Ala	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31720	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36820	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39820	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56450	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56460	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62640	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66140	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71180	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77440	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22

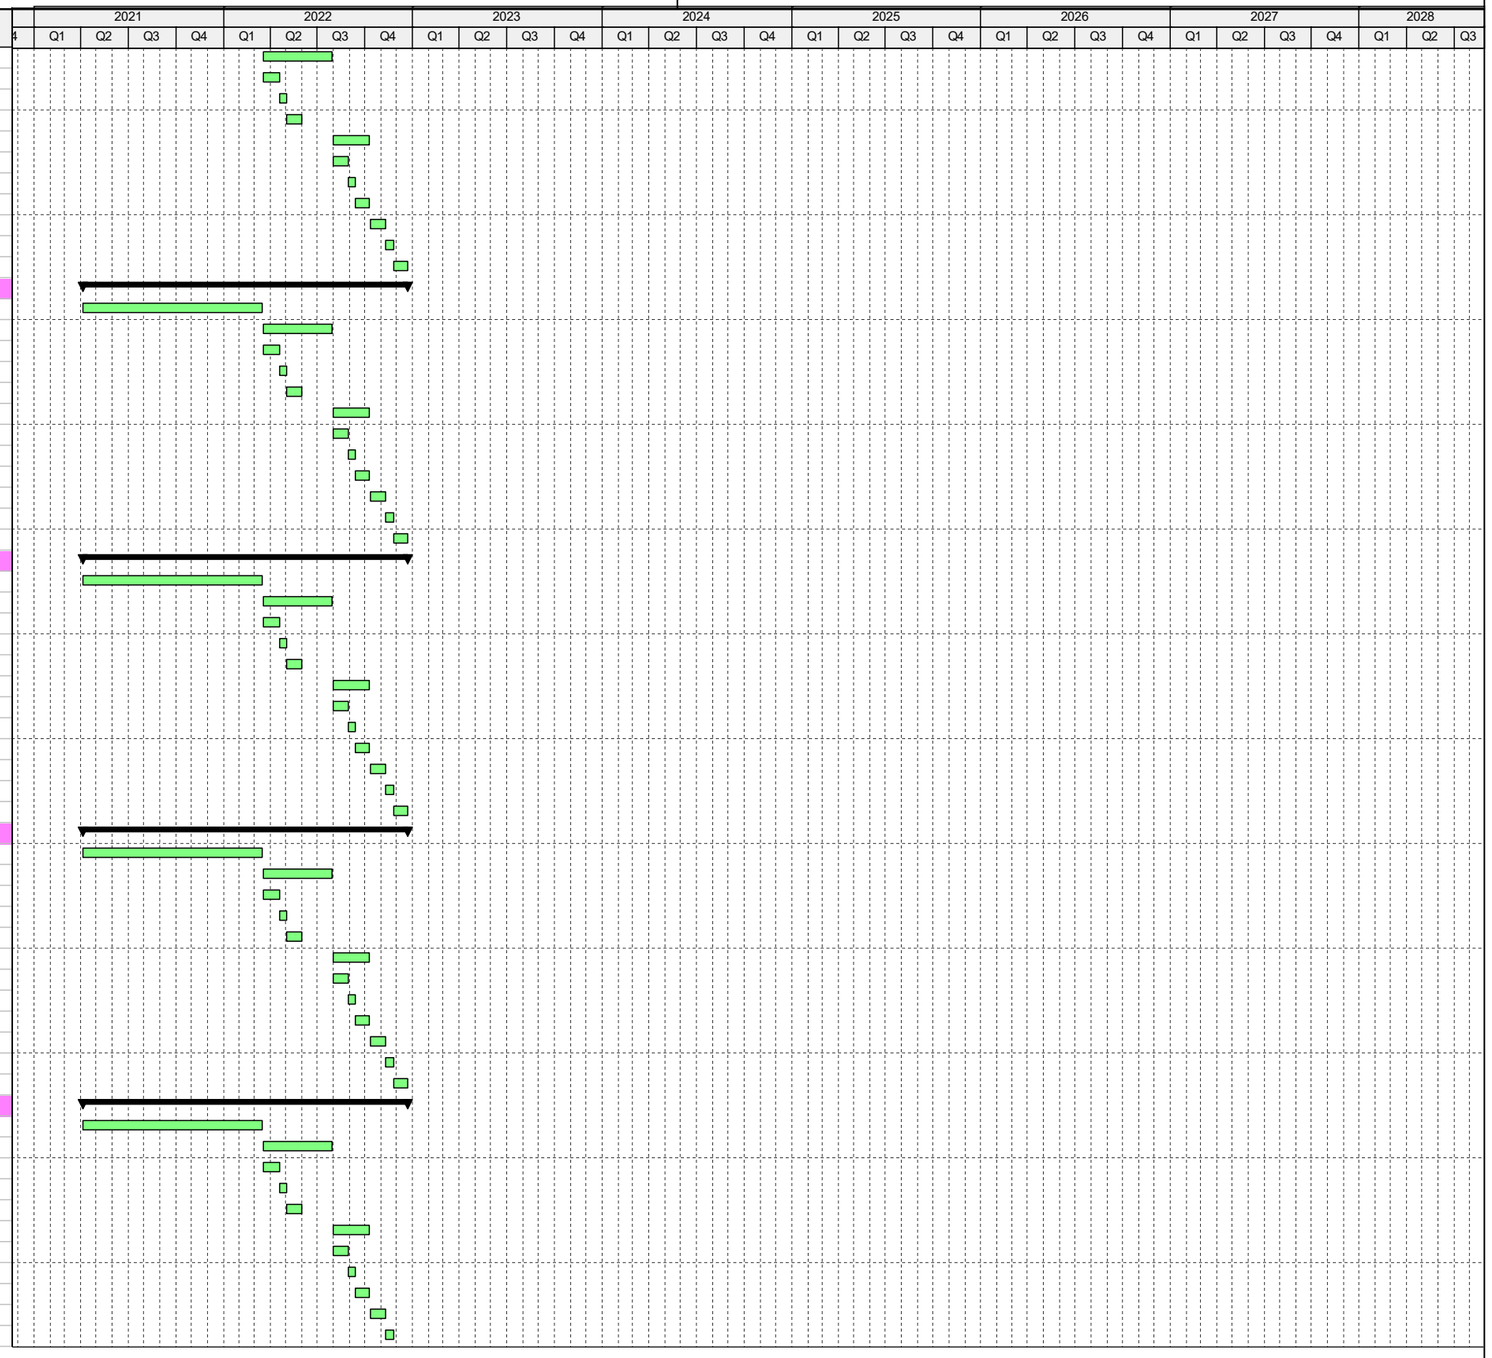


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-79960	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.10 Edificios-Tanque SCI, almacenamiento de aguas y residuos		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.10.01 Diseño Estructura		412	05-Apr-21	30-Nov-22
P-5100	60% Elaboracion y entrega del diseño (Información general,Ubicación de los apoyos,C	174	05-Apr-21	16-Dec-21
P-19330	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Plantas de cimentación,Detalles de l	123	17-Dec-21	13-Jun-22
P-19340	Revisión de la interventoria R1 60%	20	17-Dec-21	14-Jan-22
P-23100	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Jan-22	28-Jan-22
P-25190	Revisión de la interventoria R2 60%	20	31-Jan-22	25-Feb-22
P-45830	Final 100%	65	14-Jun-22	16-Sep-22
P-45840	Revisión de la interventoria R1 90%	20	14-Jun-22	13-Jul-22
P-51010	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	14-Jul-22	28-Jul-22
P-55690	Revisión de la interventoria R2 90%	20	29-Jul-22	26-Aug-22
P-67180	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Sep-22	14-Oct-22
P-72110	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Oct-22	31-Oct-22
P-75380	Revisión de la interventoria R2 100%	20	01-Nov-22	30-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.10.02 Diseño Arquitectonico		311	05-Apr-21	05-Jul-22
P-5110	60% Elaboracion y entrega del diseño (Plano del edificio de nivel,Cantidades)	101	05-Apr-21	31-Aug-21
P-10850	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Informe Análisis bioclimático,Seccion	80	01-Sep-21	27-Dec-21
P-10860	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Sep-21	28-Sep-21
P-11600	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Sep-21	12-Oct-21
P-13150	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Oct-21	11-Nov-21
P-20620	Final 100%	80	28-Dec-21	21-Apr-22
P-20630	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Dec-21	25-Jan-22
P-24900	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jan-22	08-Feb-22
P-26450	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Feb-22	08-Mar-22
P-37400	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Apr-22	19-May-22
P-42460	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-May-22	03-Jun-22
P-43900	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Jun-22	05-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.10.03 MEP		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.10.03.1 Ascensores		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5120	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Cantidades de traba	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31730	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles Ascensor)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31740	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36830	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39830	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56470	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56480	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62650	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66150	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71190	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77450	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79970	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.10.03.2 Sistema de Ventilación		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5130	60% (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Inst	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31750	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilación y aire ac	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31760	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36840	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39840	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56490	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56500	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62660	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66160	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71200	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77460	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79980	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.10.03.3 Sistema Contraincendios		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5140	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31770	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de protección contra ir	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31780	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36850	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39850	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56510	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22

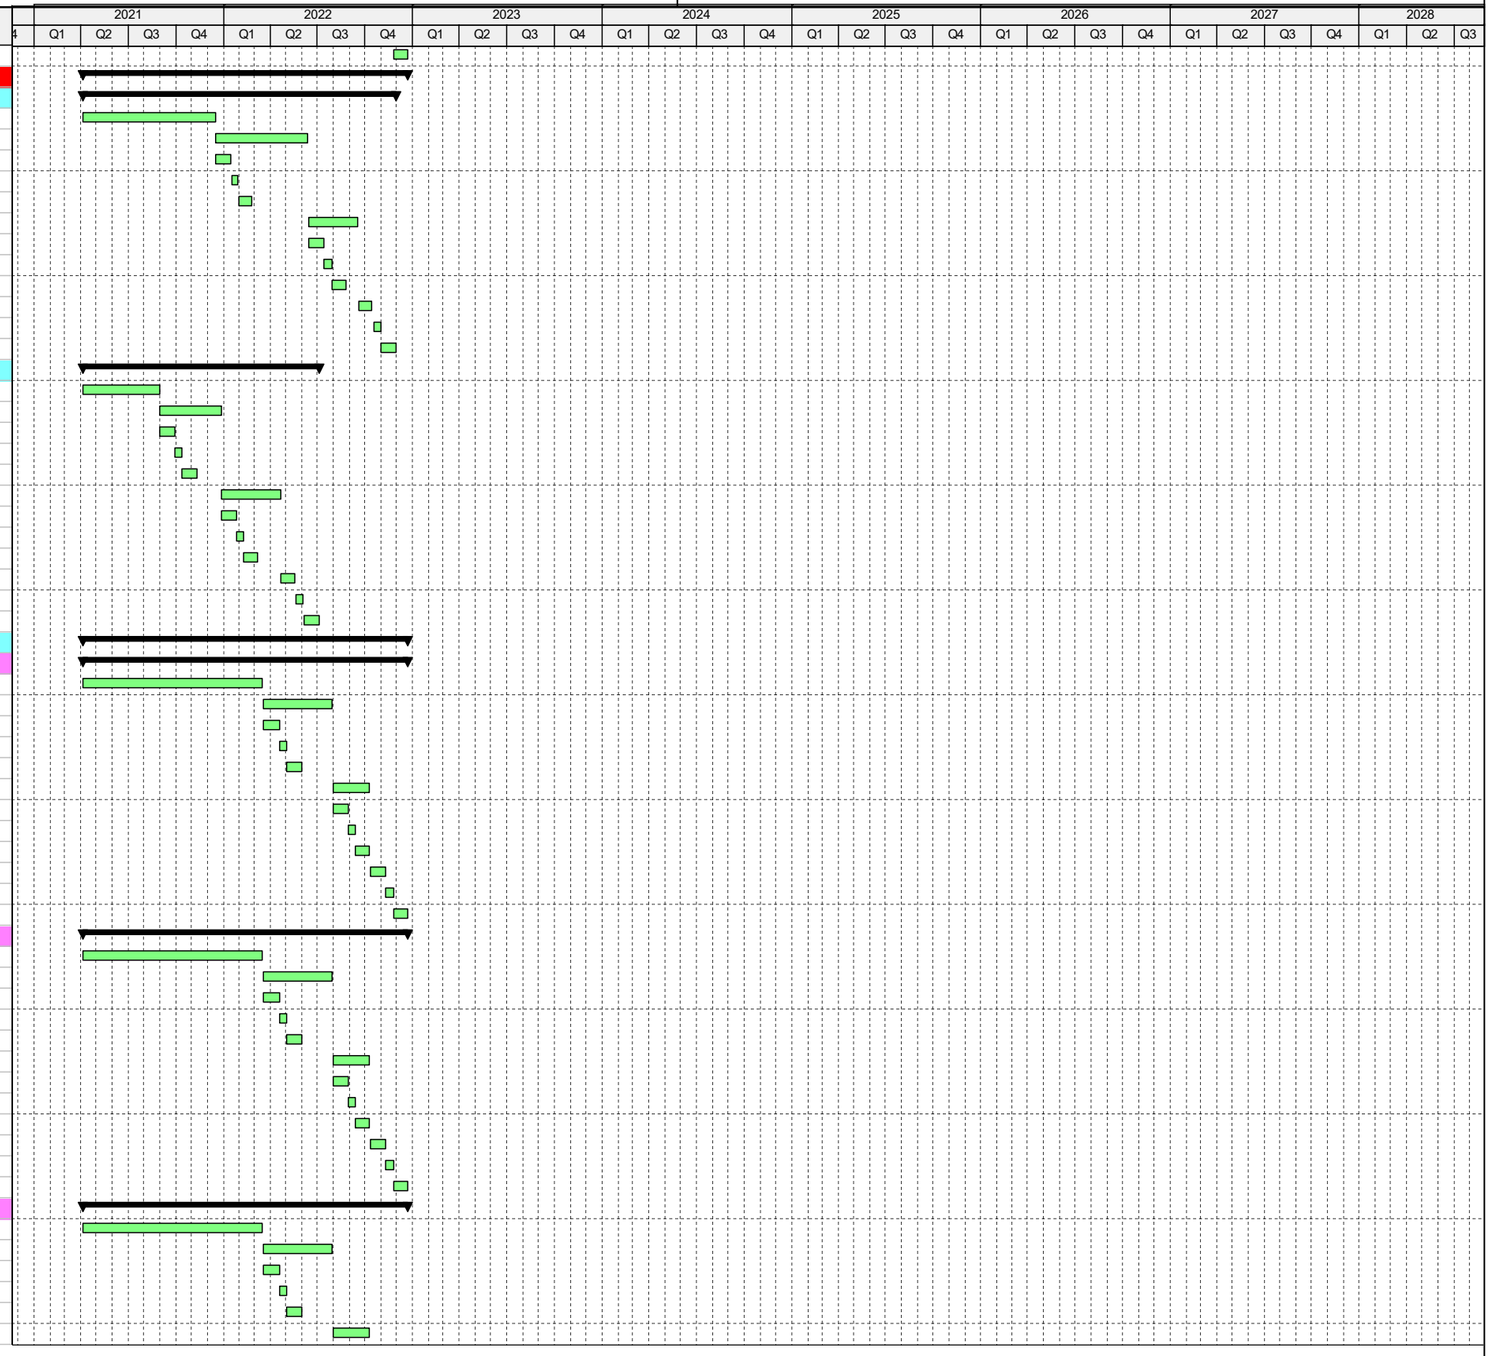

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-56520	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62670	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66170	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71210	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77470	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-79990	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.10.03.4 Sistemas electricos		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5150	60% (Esp. técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Tomas de corrie	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31790	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,Distribución)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31800	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36860	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39860	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56530	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56540	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62680	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66180	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71220	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77480	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80000	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.10.03.5 Sistemas HYS		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5160	60% Elaboracion y entrega del diseño (Cantidades,Instalación)	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31810	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31820	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36870	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39870	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56550	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56560	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62690	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66190	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71230	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77490	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80010	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.10.03.6 Sistemas SYC		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5170	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31830	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Deteccion y Ala	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31840	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36880	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39880	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56570	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56580	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62700	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66200	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71240	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77500	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80020	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.11 Edificios - Planta de tratamiento de aguas		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.11.01 Diseño Estructura		412	05-Apr-21	30-Nov-22
P-5180	60% Elaboracion y entrega del diseño (Información general,Ubicación de los apoyos,C	174	05-Apr-21	16-Dec-21
P-19350	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Plantas de cimentación,Detalles de l	123	17-Dec-21	13-Jun-22
P-19360	Revisión de la interventoria R1 60%	20	17-Dec-21	14-Jan-22
P-23110	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Jan-22	28-Jan-22
P-25200	Revisión de la interventoria R2 60%	20	31-Jan-22	25-Feb-22
P-45850	Final 100%	65	14-Jun-22	16-Sep-22
P-45860	Revisión de la interventoria R1 90%	20	14-Jun-22	13-Jul-22
P-51020	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	14-Jul-22	28-Jul-22
P-55700	Revisión de la interventoria R2 90%	20	29-Jul-22	26-Aug-22
P-67190	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Sep-22	14-Oct-22
P-72120	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Oct-22	31-Oct-22
P-75390	Revisión de la interventoria R2 100%	20	01-Nov-22	30-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.11.02 Diseño Arquitectonico		311	05-Apr-21	05-Jul-22
P-5190	60% Elaboracion y entrega del diseño (Plano del edificio de nivel,Cantidades)	101	05-Apr-21	31-Aug-21
P-10870	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Informe Análisis bioclimático,Seccion	80	01-Sep-21	27-Dec-21

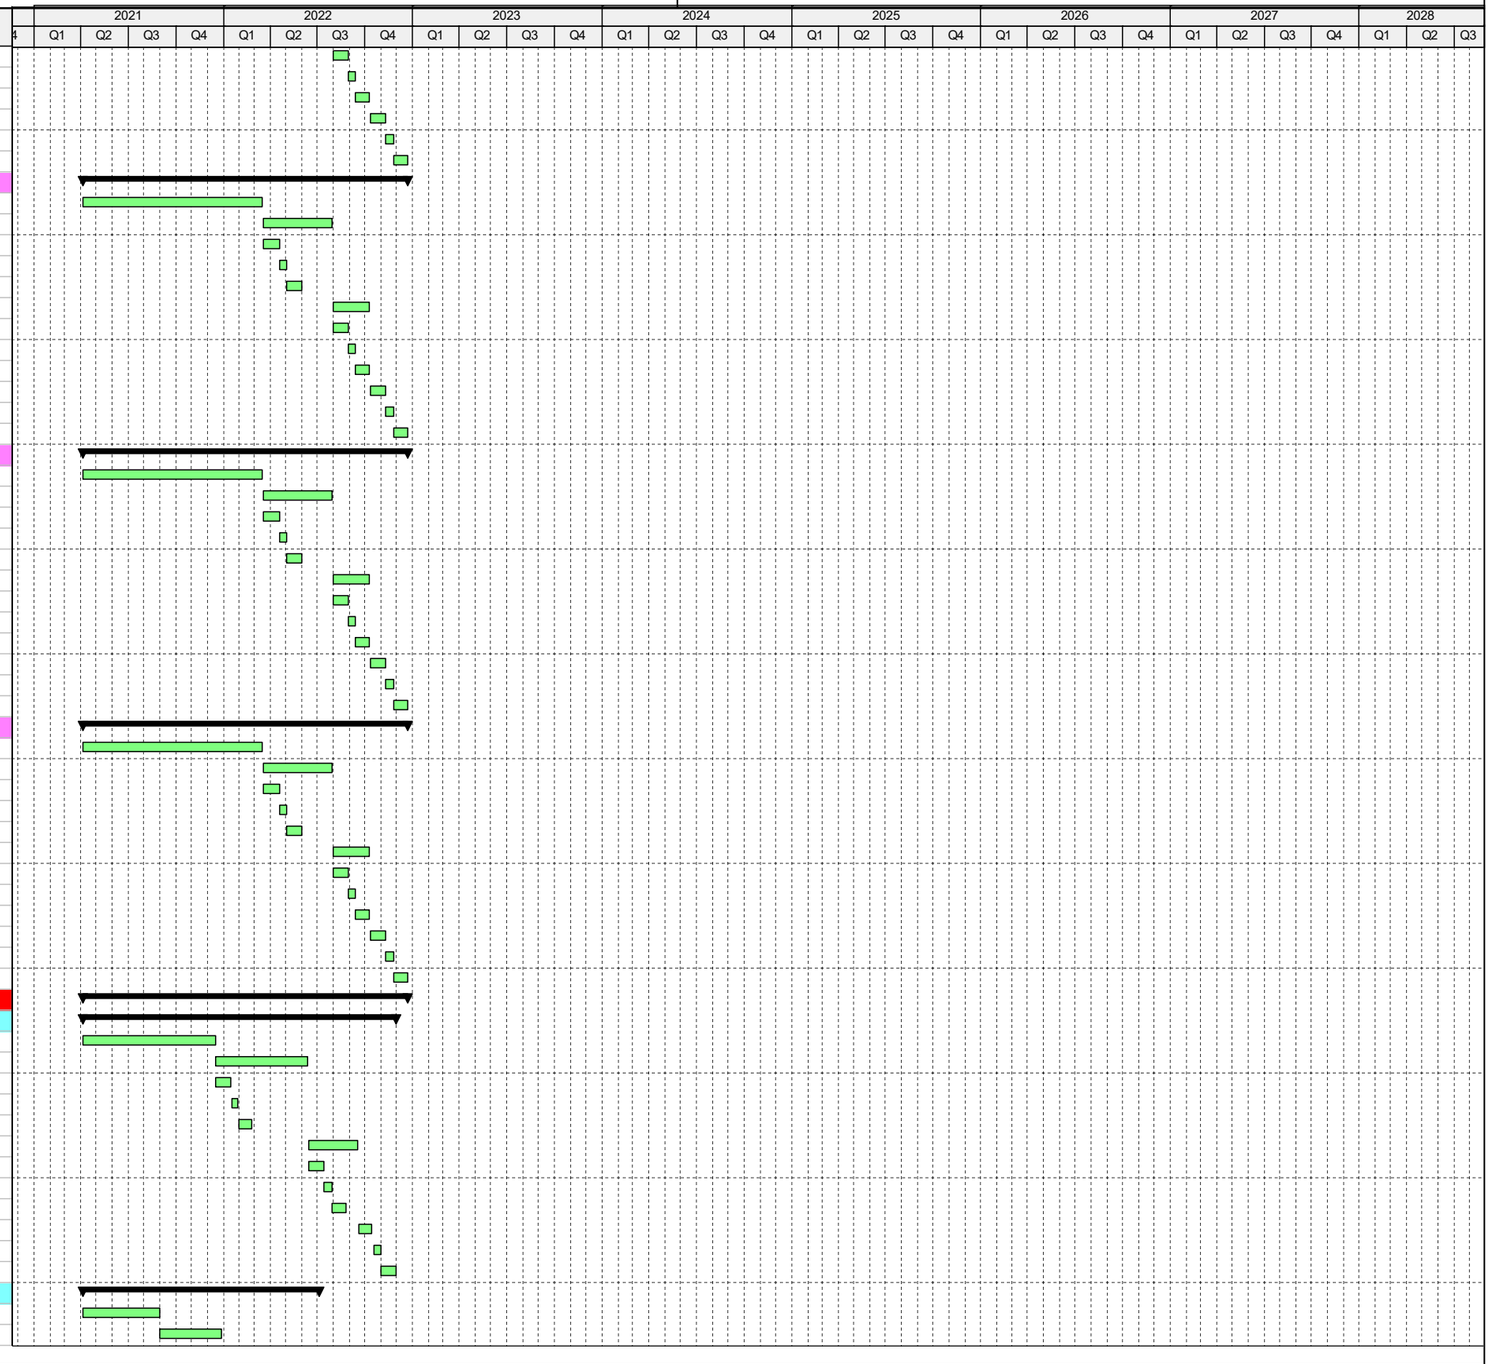


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-10880	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Sep-21	28-Sep-21
P-11610	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Sep-21	12-Oct-21
P-13160	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Oct-21	11-Nov-21
P-20640	Final 100%	80	28-Dec-21	21-Apr-22
P-20650	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Dec-21	25-Jan-22
P-24910	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jan-22	08-Feb-22
P-26460	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Feb-22	08-Mar-22
P-37410	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Apr-22	19-May-22
P-42470	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-May-22	03-Jun-22
P-43910	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Jun-22	05-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.11.03 MEP		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.11.03.1 Ascensores		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5200	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Cantidades de traba	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31850	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles Ascensor)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31860	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36890	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39890	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56590	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56600	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62710	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66210	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71250	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77510	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80030	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.11.03.2 Sistema de Ventilación		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5210	60% (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Inst	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31870	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilación y aire ac	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31880	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36900	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39900	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56610	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56620	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62720	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66220	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71260	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77520	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80040	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.11.03.3 Sistema Contraincendios		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5220	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31890	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de protección contra in	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31900	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36910	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39910	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56630	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56640	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62730	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66230	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71270	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77530	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80050	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.11.03.4 Sistemas electricos		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5230	60% (Esp. técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Tomas de corrie	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31910	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,Distribución)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31920	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36920	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39920	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56650	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56660	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62740	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66240	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71280	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77540	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22

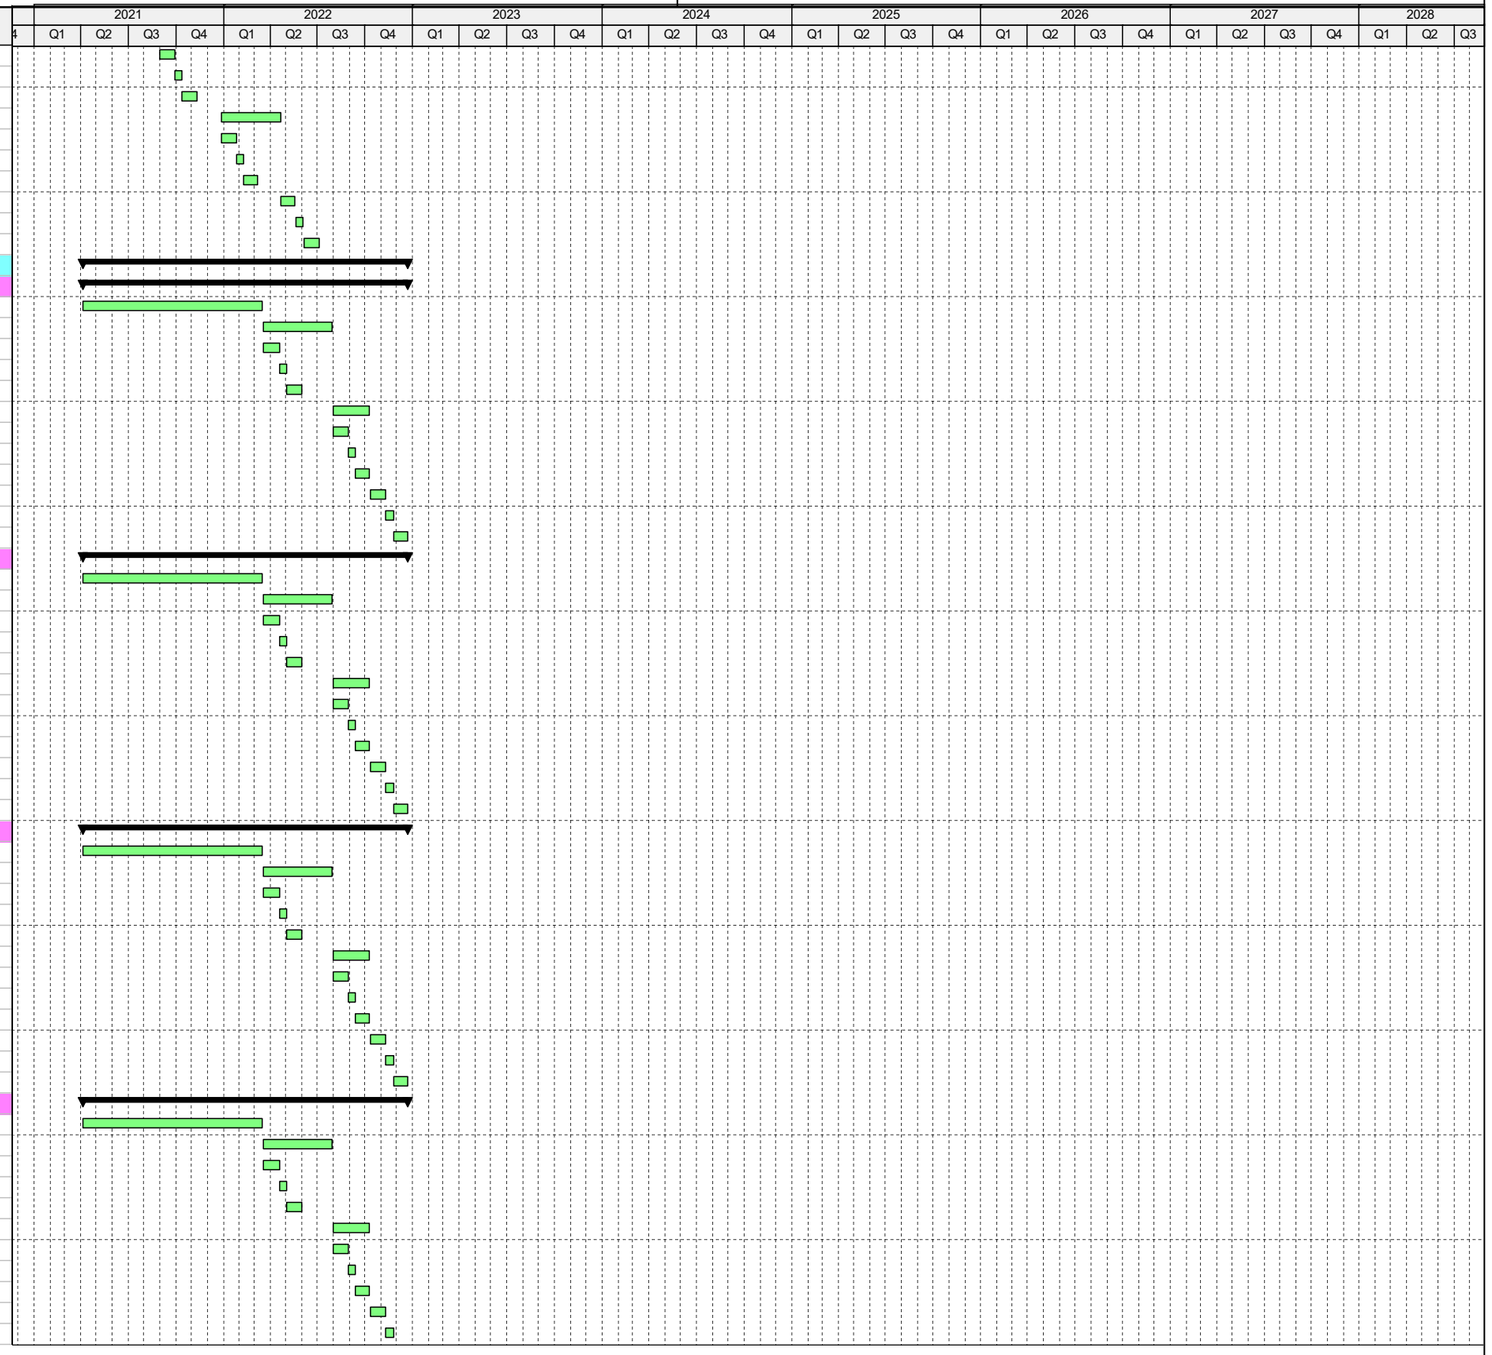


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-80060	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.11.03.5	**Sistemas HYS**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5240	60% Elaboracion y entrega del diseño (Cantidades,Instalación)	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31930	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31940	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36930	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39930	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56670	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56680	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62750	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66250	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71290	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77550	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80070	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.11.03.6	**Sistemas SYC**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5250	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31950	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31960	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36940	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39940	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56690	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56700	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62760	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66260	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71300	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77560	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80080	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.12	**Edificios - Puesto de Mando Taller y Puesto Central Control**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.12.01	**Diseño Estructura**	412	05-Apr-21	30-Nov-22
P-5260	60% Elaboracion y entrega del diseño (Información general,Ubicación de los apoyos,C	174	05-Apr-21	16-Dec-21
P-19370	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Plantas de cimentación,Detalles de l	123	17-Dec-21	13-Jun-22
P-19380	Revisión de la interventoria R1 60%	20	17-Dec-21	14-Jan-22
P-23120	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Jan-22	28-Jan-22
P-25210	Revisión de la interventoria R2 60%	20	31-Jan-22	25-Feb-22
P-45870	Final 100%	65	14-Jun-22	16-Sep-22
P-45880	Revisión de la interventoria R1 90%	20	14-Jun-22	13-Jul-22
P-51030	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	14-Jul-22	28-Jul-22
P-55710	Revisión de la interventoria R2 90%	20	29-Jul-22	26-Aug-22
P-67200	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Sep-22	14-Oct-22
P-72130	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Oct-22	31-Oct-22
P-75400	Revisión de la interventoria R2 100%	20	01-Nov-22	30-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.12.02	**Diseño Arquitectonico**	311	05-Apr-21	05-Jul-22
P-5270	60% Elaboracion y entrega del diseño (Plano del edificio de nivel,Cantidades)	101	05-Apr-21	31-Aug-21
P-10890	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Informe Análisis bioclimático,Seccion	80	01-Sep-21	27-Dec-21
P-10900	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Sep-21	28-Sep-21
P-11620	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Sep-21	12-Oct-21
P-13170	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Oct-21	11-Nov-21
P-20660	Final 100%	80	28-Dec-21	21-Apr-22
P-20670	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Dec-21	25-Jan-22
P-24920	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jan-22	08-Feb-22
P-26470	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Feb-22	08-Mar-22
P-37420	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Apr-22	19-May-22
P-42480	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-May-22	03-Jun-22
P-43920	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Jun-22	05-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.12.03	**MEP**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.12.03.1	**Ascensores**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5280	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Cantidades de traba	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31970	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles Ascensor)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-31980	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36950	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39950	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56710	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22

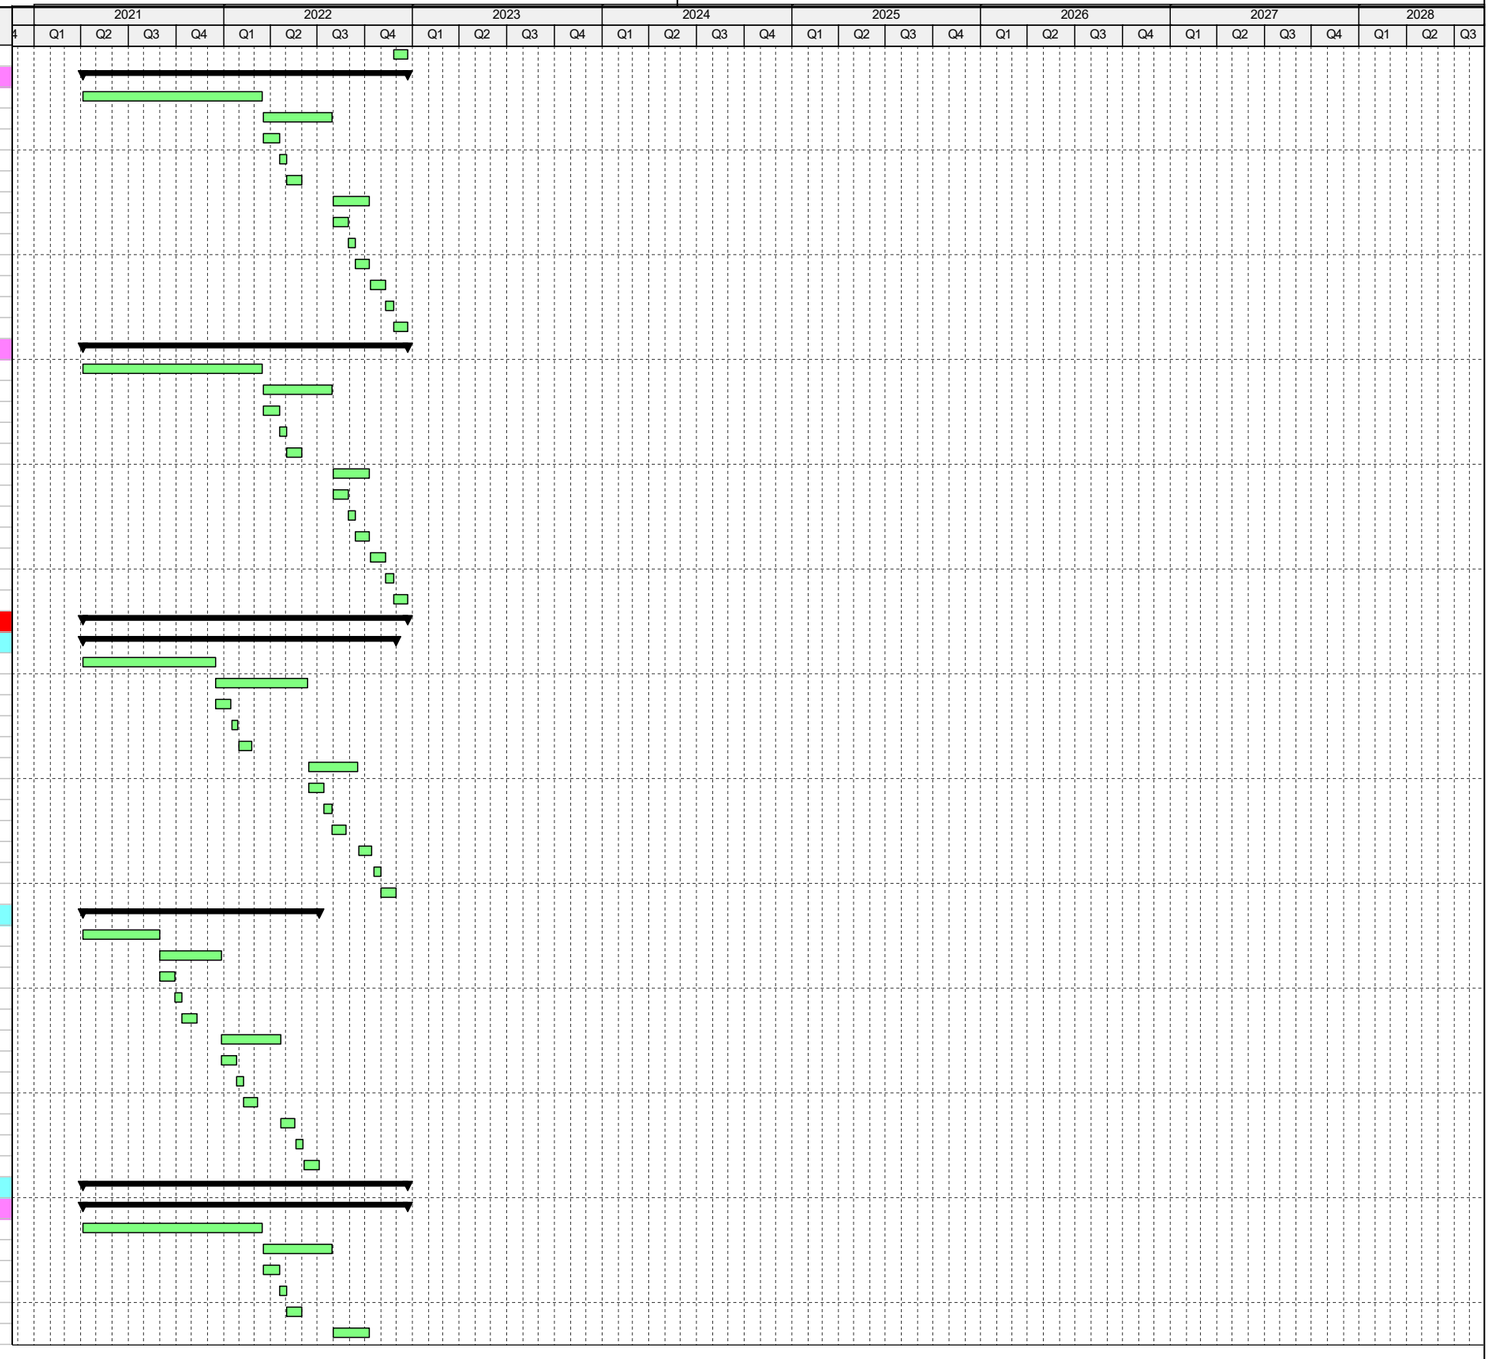


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-56720	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62770	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66270	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71310	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77570	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80090	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.12.03.2 Sistema de Ventilación		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5290	60% (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Inst	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-31990	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilación y aire ac	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32000	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36960	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39960	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56730	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56740	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62780	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66280	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71320	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77580	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80100	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.12.03.3 Sistema Contraincendios		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5300	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32010	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de protección contra ir	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32020	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36970	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39970	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56750	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56760	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62790	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66290	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71330	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77590	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80110	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.12.03.4 Sistemas electricos		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5310	60% (Esp. técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Tomas de corrie	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32030	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,Distribución)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32040	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36980	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39980	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56770	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56780	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62800	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66300	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71340	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77600	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80120	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.12.03.5 Sistemas HYS		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5320	60% Elaboracion y entrega del diseño (Cantidades,Instalación)	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32050	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32060	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-36990	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-39990	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56790	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56800	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62810	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66310	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71350	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77610	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80130	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.12.03.6 Sistemas SYC		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5330	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32070	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32080	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22

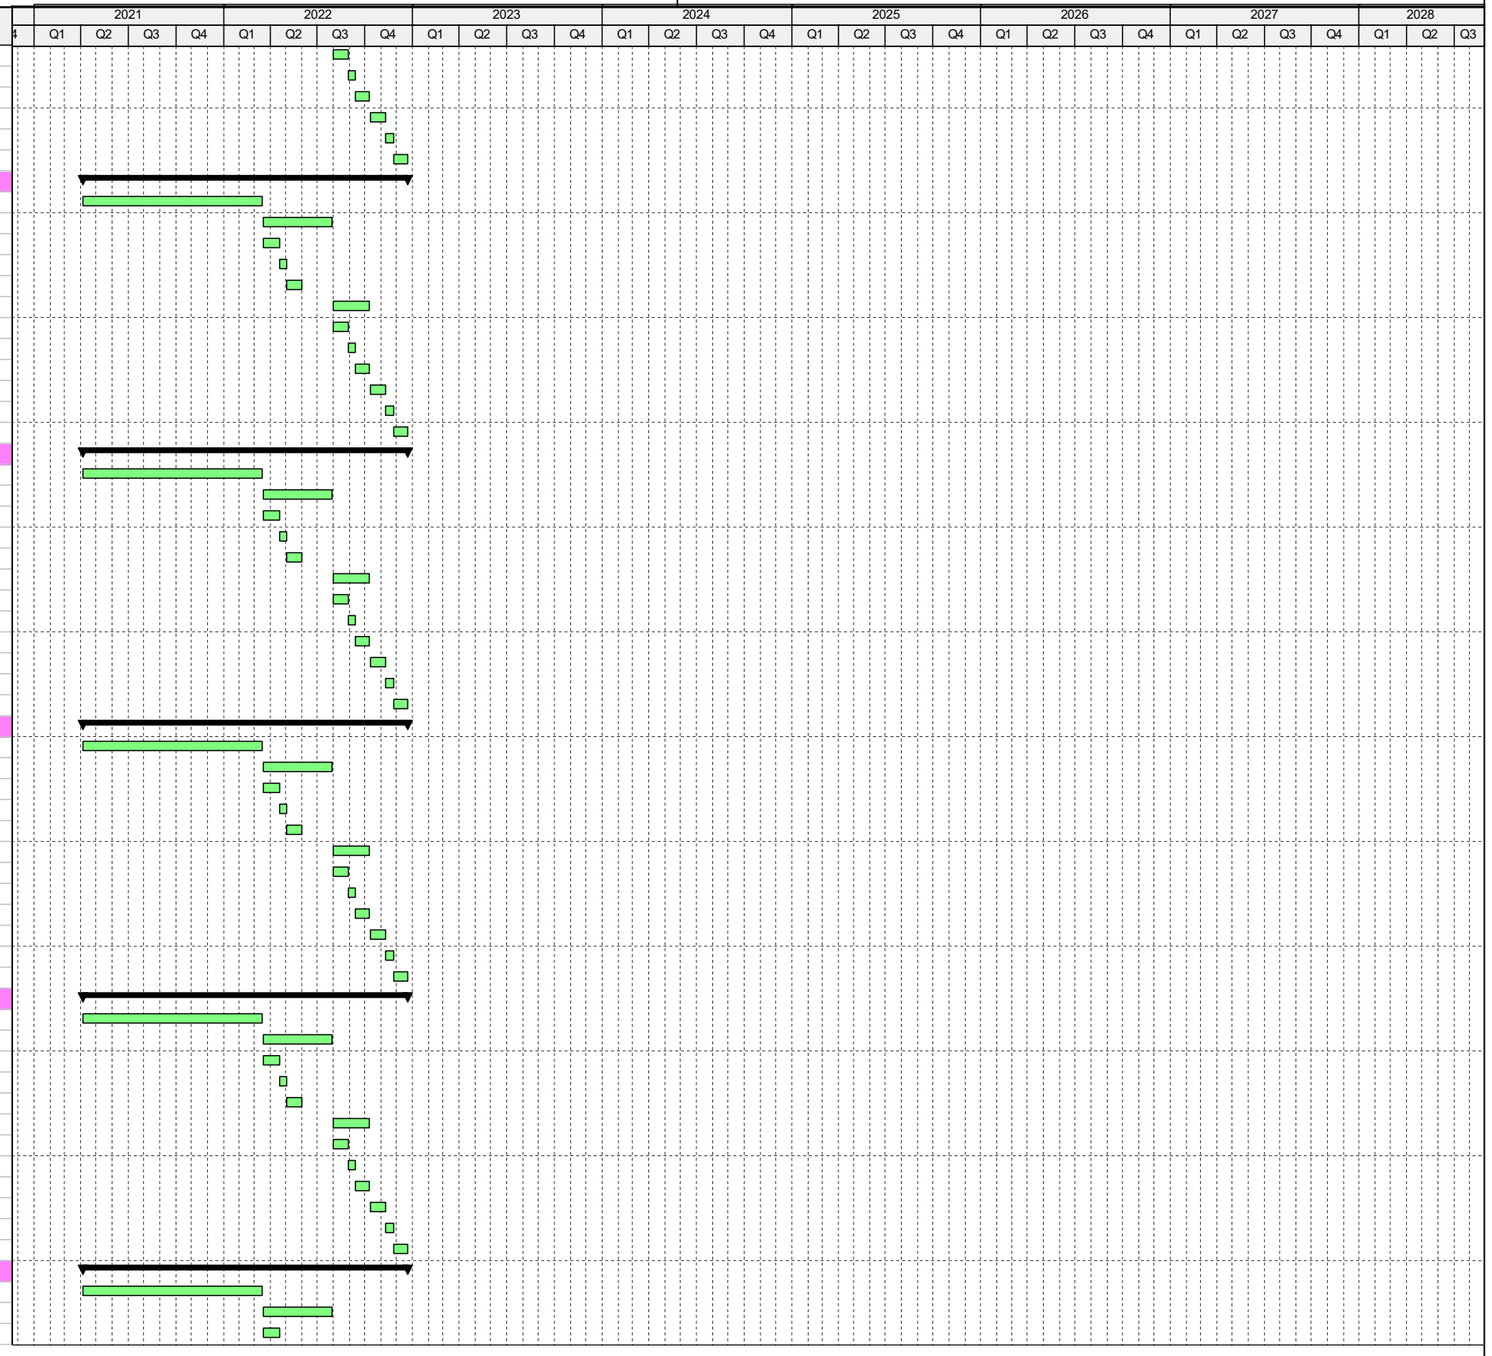


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-37000	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40000	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56810	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56820	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62820	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66320	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71360	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77620	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80140	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.13 Edificios -Torno en Foso		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.13.01 Diseño Estructura		412	05-Apr-21	30-Nov-22
P-5340	60% Elaboracion y entrega del diseño (Información general,Ubicación de los apoyos,C	174	05-Apr-21	16-Dec-21
P-19390	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Plantas de cimentación,Detalles de l	123	17-Dec-21	13-Jun-22
P-19400	Revisión de la interventoria R1 60%	20	17-Dec-21	14-Jan-22
P-23130	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Jan-22	28-Jan-22
P-25220	Revisión de la interventoria R2 60%	20	31-Jan-22	25-Feb-22
P-45890	Final 100%	65	14-Jun-22	16-Sep-22
P-45900	Revisión de la interventoria R1 90%	20	14-Jun-22	13-Jul-22
P-51040	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	14-Jul-22	28-Jul-22
P-55720	Revisión de la interventoria R2 90%	20	29-Jul-22	26-Aug-22
P-67210	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Sep-22	14-Oct-22
P-72140	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Oct-22	31-Oct-22
P-75410	Revisión de la interventoria R2 100%	20	01-Nov-22	30-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.13.02 Diseño Arquitectonico		311	05-Apr-21	05-Jul-22
P-5350	60% Elaboracion y entrega del diseño (Plano del edificio de nivel,Cantidades)	101	05-Apr-21	31-Aug-21
P-10910	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Informe Análisis bioclimático,Seccion	80	01-Sep-21	27-Dec-21
P-10920	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Sep-21	28-Sep-21
P-11630	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Sep-21	12-Oct-21
P-13180	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Oct-21	11-Nov-21
P-20680	Final 100%	80	28-Dec-21	21-Apr-22
P-20690	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Dec-21	25-Jan-22
P-24930	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jan-22	08-Feb-22
P-26480	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Feb-22	08-Mar-22
P-37430	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Apr-22	19-May-22
P-42490	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-May-22	03-Jun-22
P-43930	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Jun-22	05-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.13.03 MEP		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.13.03.1 Ascensores		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5360	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Cantidades de traba	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32090	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles Ascensor)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32100	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37010	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40010	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56830	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56840	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62830	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66330	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71370	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77630	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80150	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.13.03.2 Sistema de Ventilación		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5370	60% (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Inst	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32110	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilación y aire ac	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32120	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37020	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40020	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56850	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56860	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62840	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66340	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71380	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77640	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22

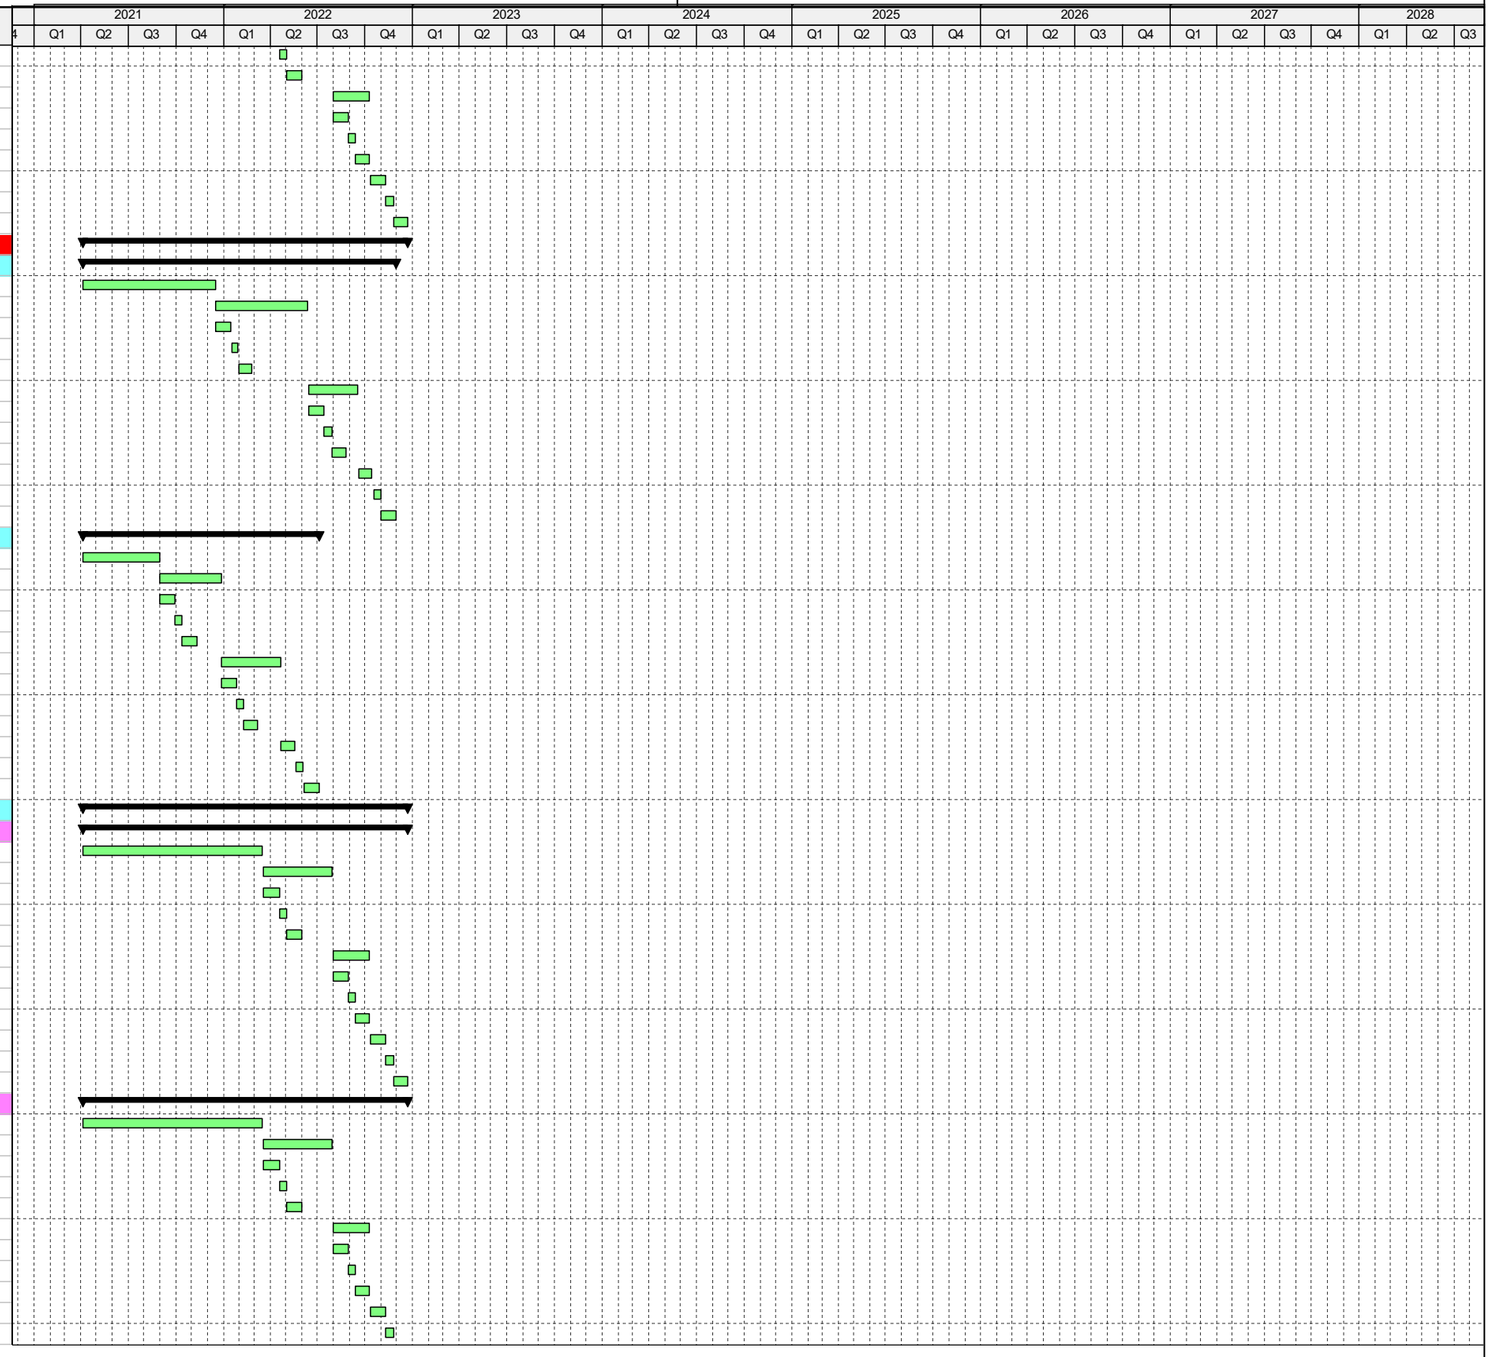

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-80160	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.13.03.3	**Sistema Contraincendios**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5380	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32130	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de protección contra ir	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32140	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37030	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40030	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56870	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56880	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62850	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66350	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71390	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77650	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80170	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.13.03.4	**Sistemas electricos**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5390	60% (Esp. técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Tomas de corrie	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32150	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,Distribución)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32160	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37040	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40040	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56890	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56900	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62860	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66360	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71400	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77660	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80180	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.13.03.5	**Sistemas HYS**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5400	60% Elaboracion y entrega del diseño (Cantidades,Instalación)	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32170	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32180	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37050	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40050	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56910	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56920	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62870	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66370	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71410	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77670	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80190	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.13.03.6	**Sistemas SYC**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5410	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32190	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Deteccion y Ala	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32200	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37060	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40060	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56930	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56940	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62880	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66380	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71420	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77680	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80200	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.14	**Edificios - Estaciión de Servicio**	428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.14.01	**Diseño Estructura**	412	05-Apr-21	30-Nov-22
P-5420	60% Elaboracion y entrega del diseño (Información general,Ubicación de los apoyos,C	174	05-Apr-21	16-Dec-21
P-19410	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Plantas de cimentación,Detalles de l	123	17-Dec-21	13-Jun-22
P-19420	Revisión de la interventoria R1 60%	20	17-Dec-21	14-Jan-22
P-23140	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Jan-22	28-Jan-22
P-25230	Revisión de la interventoria R2 60%	20	31-Jan-22	25-Feb-22
P-45910	Final 100%	65	14-Jun-22	16-Sep-22
P-45920	Revisión de la interventoria R1 90%	20	14-Jun-22	13-Jul-22

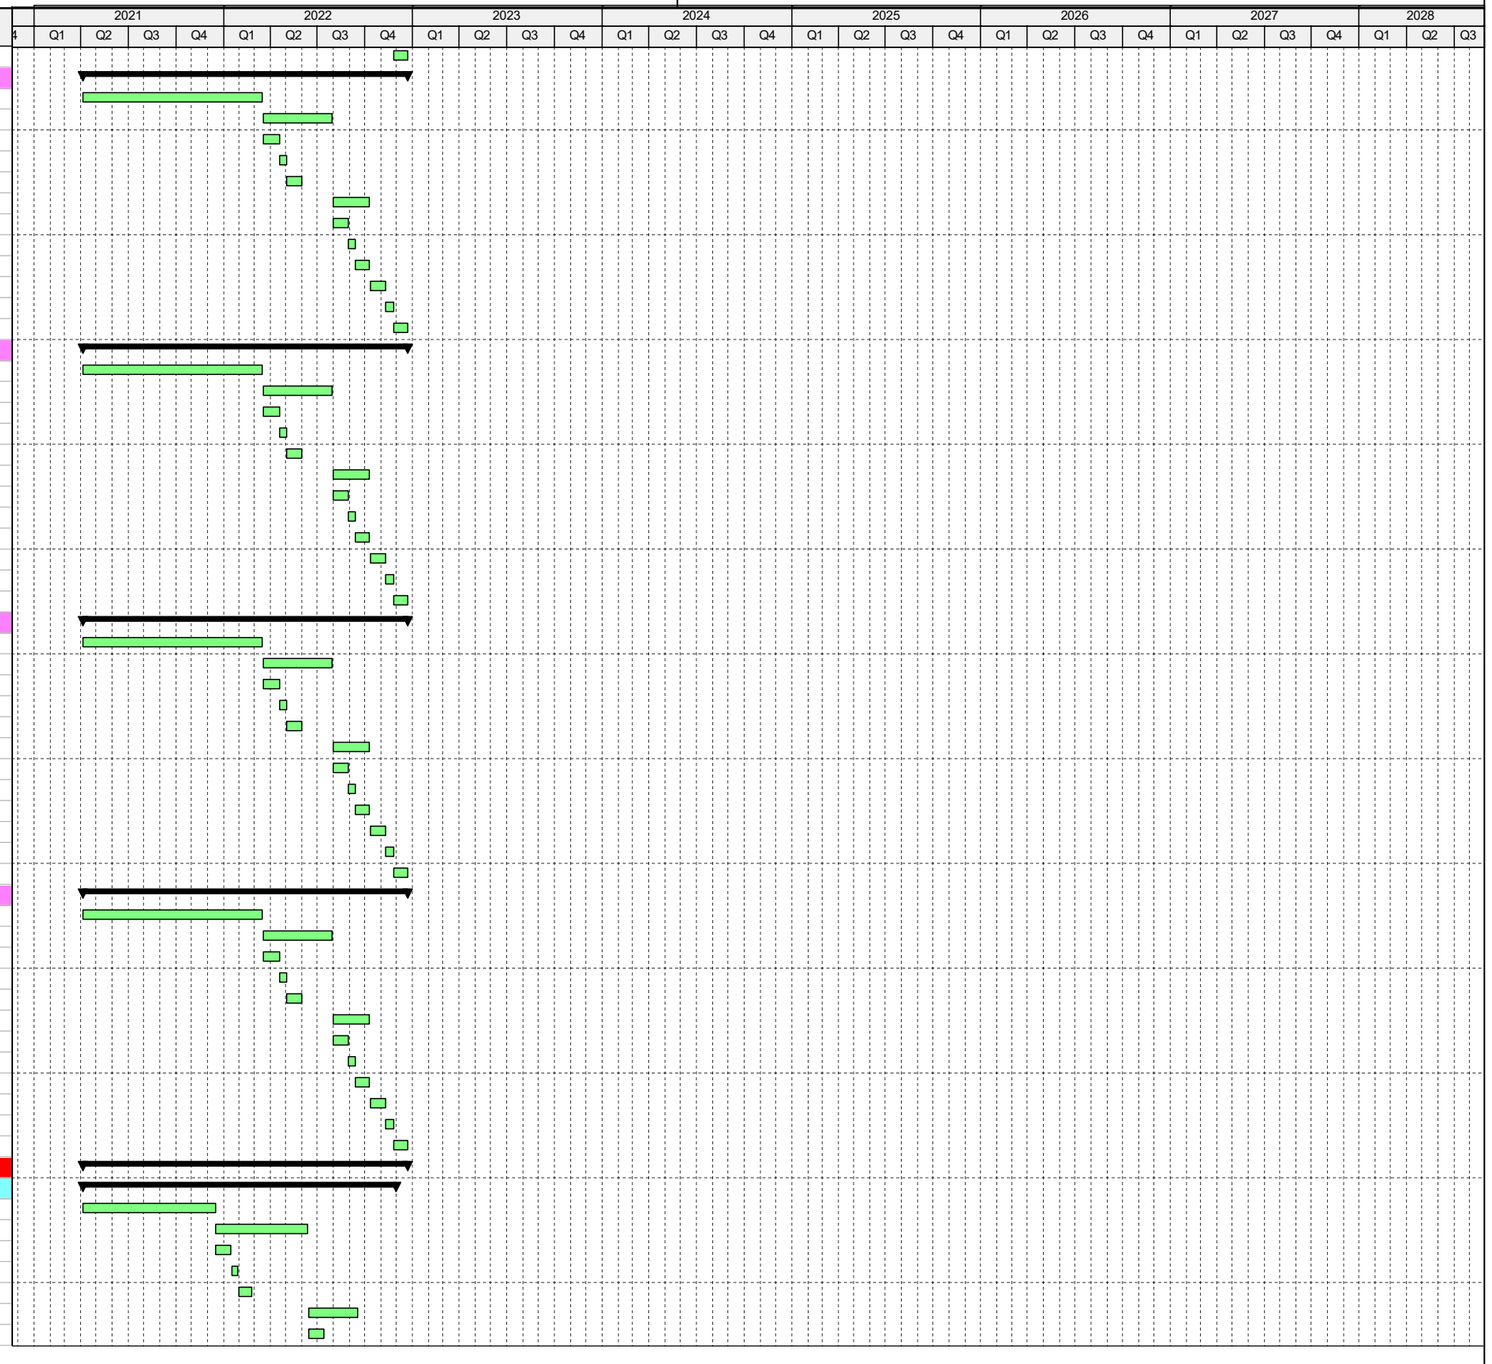


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-51050	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	14-Jul-22	28-Jul-22
P-55730	Revisión de la interventoria R2 90%	20	29-Jul-22	26-Aug-22
P-67220	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Sep-22	14-Oct-22
P-72150	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Oct-22	31-Oct-22
P-75420	Revisión de la interventoria R2 100%	20	01-Nov-22	30-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.14.02 Diseño Arquitectonico		311	05-Apr-21	05-Jul-22
P-5430	60% Elaboracion y entrega del diseño (Plano del edificio de nivel,Cantidades)	101	05-Apr-21	31-Aug-21
P-10930	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Informe Análisis bioclimático,Seccion	80	01-Sep-21	27-Dec-21
P-10940	Revisión de la interventoria R1 60%	20	01-Sep-21	28-Sep-21
P-11640	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	29-Sep-21	12-Oct-21
P-13190	Revisión de la interventoria R2 60%	20	13-Oct-21	11-Nov-21
P-20700	Final 100%	80	28-Dec-21	21-Apr-22
P-20710	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Dec-21	25-Jan-22
P-24940	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Jan-22	08-Feb-22
P-26490	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Feb-22	08-Mar-22
P-37440	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Apr-22	19-May-22
P-42500	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	20-May-22	03-Jun-22
P-43940	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Jun-22	05-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.14.03 MEP		428	05-Apr-21	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.14.03.1 Ascensores		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5440	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Cantidades de traba	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32210	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Detalles Ascensor)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32220	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37070	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40070	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56950	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56960	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62890	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66390	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71430	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77690	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80210	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.14.03.2 Sistema de Ventilación		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5450	60% (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Inst	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32230	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de ventilación y aire ac	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32240	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37080	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40080	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56970	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-56980	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62900	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66400	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71440	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77700	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80220	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.14.03.3 Sistema Contraincendios		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5460	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32250	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones de protección contra in	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32260	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37090	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40090	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-56990	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-57000	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62910	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66410	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71450	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77710	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80230	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.14.03.4 Sistemas electricos		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5470	60% (Esp. técnicas,Bases de Diseño,Memorias de cálculo,Cantidades,Tomas de corrie	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32270	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones eléctricas,Distribución)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32280	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22

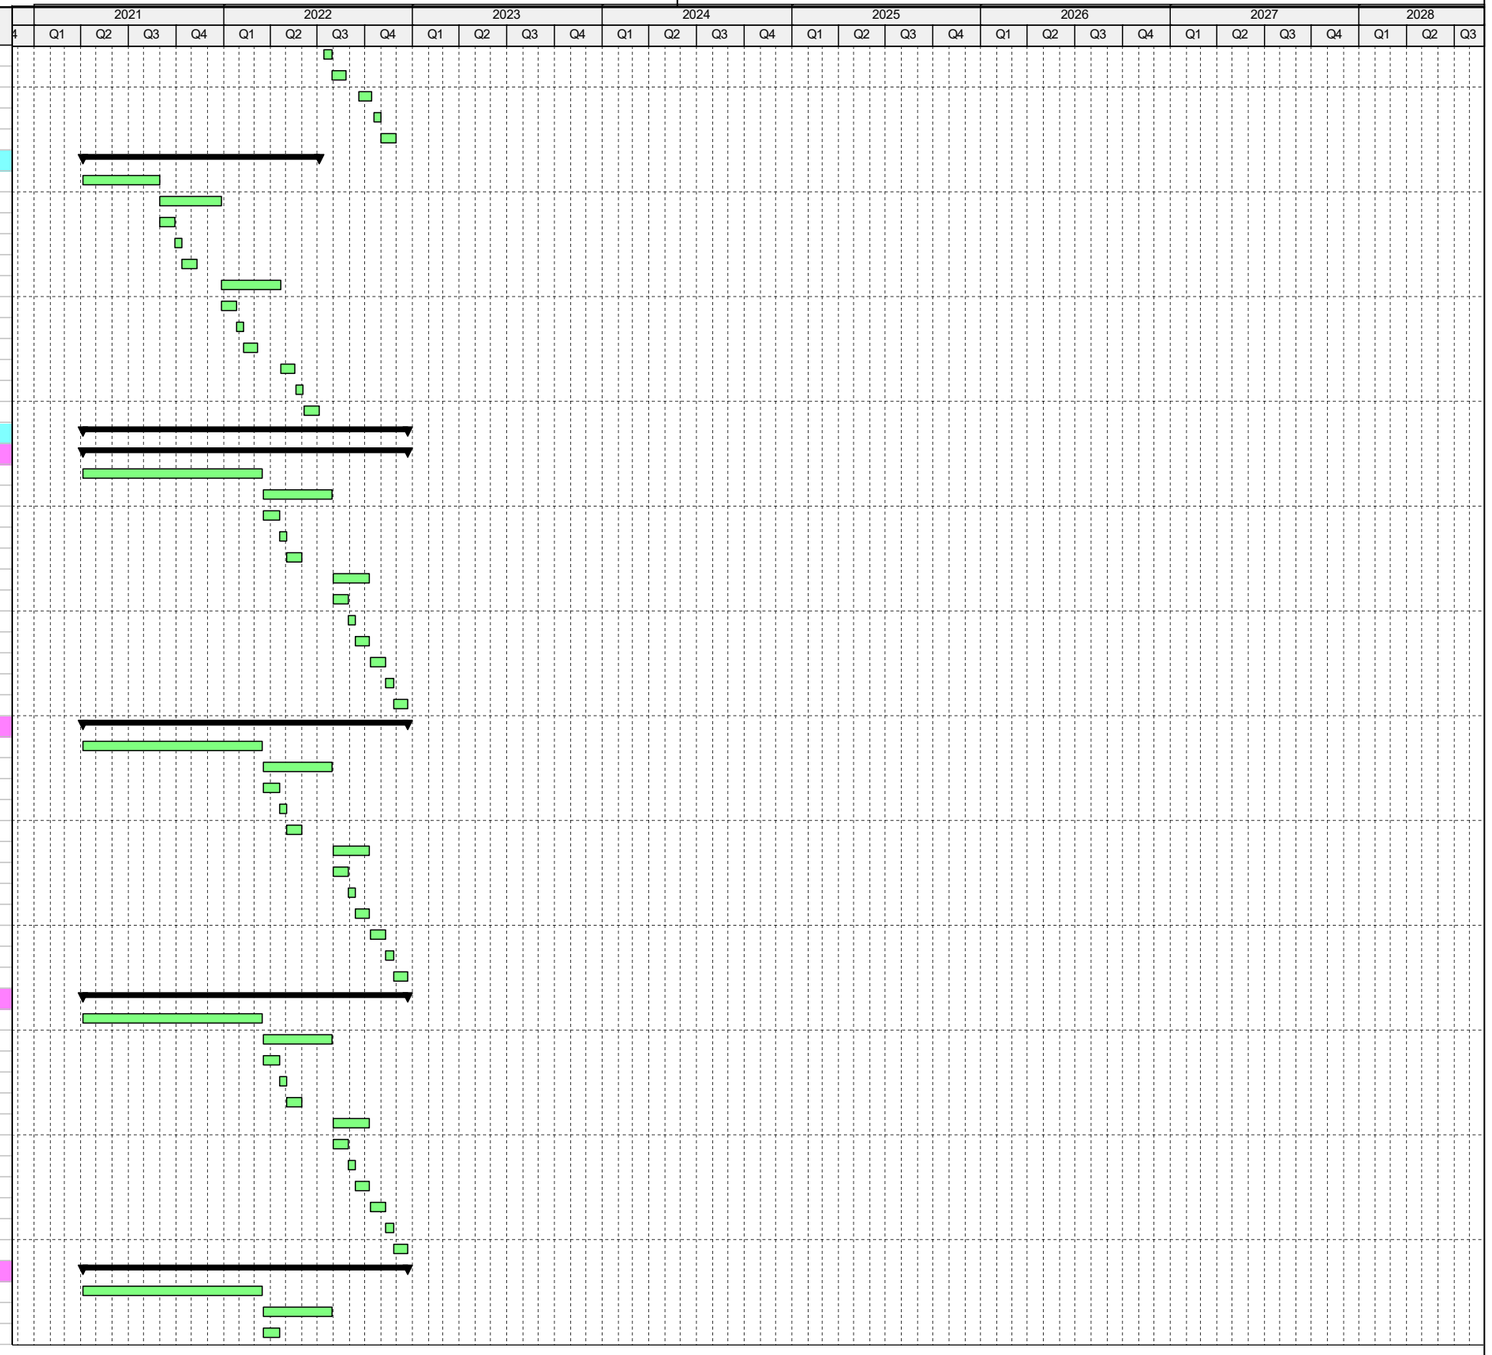

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-37100	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40100	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-57010	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-57020	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62920	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66420	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71460	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77720	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80240	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.14.03.5 Sistemas HYS		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5480	60% Elaboracion y entrega del diseño (Cantidades,Instalación)	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32290	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Instalaciones Hidrosanitarias)	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32300	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37110	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40110	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-57030	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-57040	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62930	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66430	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71470	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77730	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80250	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.14.03.6 Sistemas SYC		428	05-Apr-21	23-Dec-22
P-5490	60% Elaboracion y entrega del diseño (Especificaciones técnicas,Bases de Diseño,Me	238	05-Apr-21	17-Mar-22
P-32310	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Sistema y Equipos de Detecion y Ala	90	18-Mar-22	29-Jul-22
P-32320	Revisión de la interventoria R1 60%	20	18-Mar-22	18-Apr-22
P-37120	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Apr-22	02-May-22
P-40120	Revisión de la interventoria R2 60%	20	03-May-22	31-May-22
P-57050	Final 100%	50	01-Aug-22	10-Oct-22
P-57060	Revisión de la interventoria R1 90%	20	01-Aug-22	29-Aug-22
P-62940	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	30-Aug-22	12-Sep-22
P-66440	Revisión de la interventoria R2 90%	20	13-Sep-22	10-Oct-22
P-71480	Revisión de la interventoria R1 100%	20	11-Oct-22	09-Nov-22
P-77740	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	10-Nov-22	24-Nov-22
P-80260	Revisión de la interventoria R2 100%	20	25-Nov-22	23-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.15 Pavimentos		430	05-Apr-21	27-Dec-22
P-5580	60%(Criterios de diseño,Planta general,Planos de la planta de perfil,Lista,Ubicación de	230	05-Apr-21	07-Mar-22
P-30290	90%(Secciones,Niv. de pavimento,Dim. del pavimento,Diseño de pavimentos,Plan de	100	08-Mar-22	02-Aug-22
P-30300	Revisión de la interventoria R1 60%	20	08-Mar-22	05-Apr-22
P-35440	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	06-Apr-22	20-Apr-22
P-37310	Revisión de la interventoria R2 60%	20	21-Apr-22	18-May-22
P-57600	Final 100%	50	03-Aug-22	12-Oct-22
P-57610	Revisión de la interventoria R1 90%	20	03-Aug-22	31-Aug-22
P-63470	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	01-Sep-22	14-Sep-22
P-67110	Revisión de la interventoria R2 90%	20	15-Sep-22	12-Oct-22
P-72010	Revisión de la interventoria R1 100%	20	13-Oct-22	11-Nov-22
P-78090	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	15-Nov-22	28-Nov-22
P-81280	Revisión de la interventoria R2 100%	20	29-Nov-22	27-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.08.16 Diseño Plataforma de Trabajo		46	18-May-21	26-Jul-21
A1210	Revision 1 por parte de Interventoria	15	18-May-21	08-Jun-21
A1220	Atencion a comentarios	10	09-Jun-21	23-Jun-21
A1240	Revision 2 por parte de interventoria	20	24-Jun-21	23-Jul-21
A1250	No objecion por parte de interventoria	1	26-Jul-21	26-Jul-21
PLMB-T1-V04.1.03.08.17 Diseño Mejoramiento de Suelos		45	09-Jun-21	13-Aug-21
A1230	Revision 1 por parte de Interventoria	15	09-Jun-21	30-Jun-21
A1260	Atencion a comentarios	10	01-Jul-21	15-Jul-21
A1270	Revision 2 por parte de interventoria	20	16-Jul-21	13-Aug-21
A1280	No objecion por parte de interventoria	0		13-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.03.09 SISTEMAS Y EQUIPOS		548	20-Oct-20	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.09.01 Subestaciones receptoras (SER)		534	09-Nov-20	05-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.09.01.1 Patio taller		534	09-Nov-20	05-Jan-23
P-2030	60%(Listado,Criterios de Diseño,Memoria de cálculo,Disposición general,Servicios aux	295	09-Nov-20	20-Jan-22




Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-24640	90%(Diagramas de Conexionado Externos,Lista)	124	21-Jan-22	21-Jul-22
P-24650	Revisión de la interventoria R1 60%	20	21-Jan-22	17-Feb-22
P-28450	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	18-Feb-22	03-Mar-22
P-29750	Revisión de la interventoria R2 60%	20	04-Mar-22	01-Apr-22
P-52250	Final 100%	66	21-Jul-22	24-Oct-22
P-52310	Revisión de la interventoria R1 90%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
P-60550	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	22-Aug-22	02-Sep-22
P-63550	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Sep-22	30-Sep-22
P-74460	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Oct-22	23-Nov-22
P-79570	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Nov-22	07-Dec-22
P-82560	Revisión de la interventoria R2 100%	20	09-Dec-22	05-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.09.01.2 Subestacion electrica calle 1		534	09-Nov-20	05-Jan-23
P-2040	60%(Listado,Criterios de Diseño,Memoria de cálculo,Disposición general,Servicios aux	295	09-Nov-20	20-Jan-22
P-24660	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle(Diagramas de Conexionado Externos	124	21-Jan-22	21-Jul-22
P-24670	Revisión de la interventoria R1 60%	20	21-Jan-22	17-Feb-22
P-28460	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	18-Feb-22	03-Mar-22
P-29760	Revisión de la interventoria R2 60%	20	04-Mar-22	01-Apr-22
P-52260	Final 100%	66	21-Jul-22	24-Oct-22
P-52320	Revisión de la interventoria R1 90%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
P-60560	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	22-Aug-22	02-Sep-22
P-63560	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Sep-22	30-Sep-22
P-74470	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Oct-22	23-Nov-22
P-79580	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Nov-22	07-Dec-22
P-82570	Revisión de la interventoria R2 100%	20	09-Dec-22	05-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.09.01.3 Estacion 15 - (E15) - Calle 63		534	09-Nov-20	05-Jan-23
P-2050	60%(Listado,Criterios de Diseño,Memoria de cálculo,Disposición general,Servicios aux	295	09-Nov-20	20-Jan-22
P-24680	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Diagramas de Conexionado Externo	124	21-Jan-22	21-Jul-22
P-24690	Revisión de la interventoria R1 60%	20	21-Jan-22	17-Feb-22
P-28470	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	18-Feb-22	03-Mar-22
P-29770	Revisión de la interventoria R2 60%	20	04-Mar-22	01-Apr-22
P-52270	Final 100%	66	21-Jul-22	24-Oct-22
P-52330	Revisión de la interventoria R1 90%	20	22-Jul-22	19-Aug-22
P-60570	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	22-Aug-22	02-Sep-22
P-63570	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Sep-22	30-Sep-22
P-74480	Revisión de la interventoria R1 100%	20	25-Oct-22	23-Nov-22
P-79590	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	24-Nov-22	07-Dec-22
P-82580	Revisión de la interventoria R2 100%	20	09-Dec-22	05-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.09.02 Subestacion electrica de traccion (SET)		512	09-Nov-20	05-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.02.1 Estación 1		512	09-Nov-20	05-Dec-22
P-2060	60%(Listado,Criterios de Diseño,Memoria de cálculo,Disposición general, Disposición g	273	09-Nov-20	20-Dec-21
P-20140	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria de cálculo,Trayectoria de ca	124	21-Dec-21	16-Jun-22
P-20150	Revisión de la interventoria R1 60%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-23820	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Jan-22	01-Feb-22
P-25530	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-45990	Final 100%	66	16-Jun-22	21-Sep-22
P-46100	Revisión de la interventoria R1 90%	20	17-Jun-22	18-Jul-22
P-52100	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	19-Jul-22	02-Aug-22
P-57620	Revisión de la interventoria R2 90%	20	03-Aug-22	31-Aug-22
P-67680	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Sep-22	20-Oct-22
P-73050	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Oct-22	03-Nov-22
P-76040	Revisión de la interventoria R2 100%	20	04-Nov-22	05-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.02.2 Estación 3		512	09-Nov-20	05-Dec-22
P-2070	60%(Listado,Criterios de Diseño,Memoria de cálculo,Disposición general, Disposición g	273	09-Nov-20	20-Dec-21
P-20160	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria de cálculo,Trayectoria de ca	124	21-Dec-21	16-Jun-22
P-20170	Revisión de la interventoria R1 60%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-23830	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Jan-22	01-Feb-22
P-25540	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-46000	Final 100%	66	16-Jun-22	21-Sep-22
P-46110	Revisión de la interventoria R1 90%	20	17-Jun-22	18-Jul-22
P-52110	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	19-Jul-22	02-Aug-22
P-57630	Revisión de la interventoria R2 90%	20	03-Aug-22	31-Aug-22
P-67690	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Sep-22	20-Oct-22

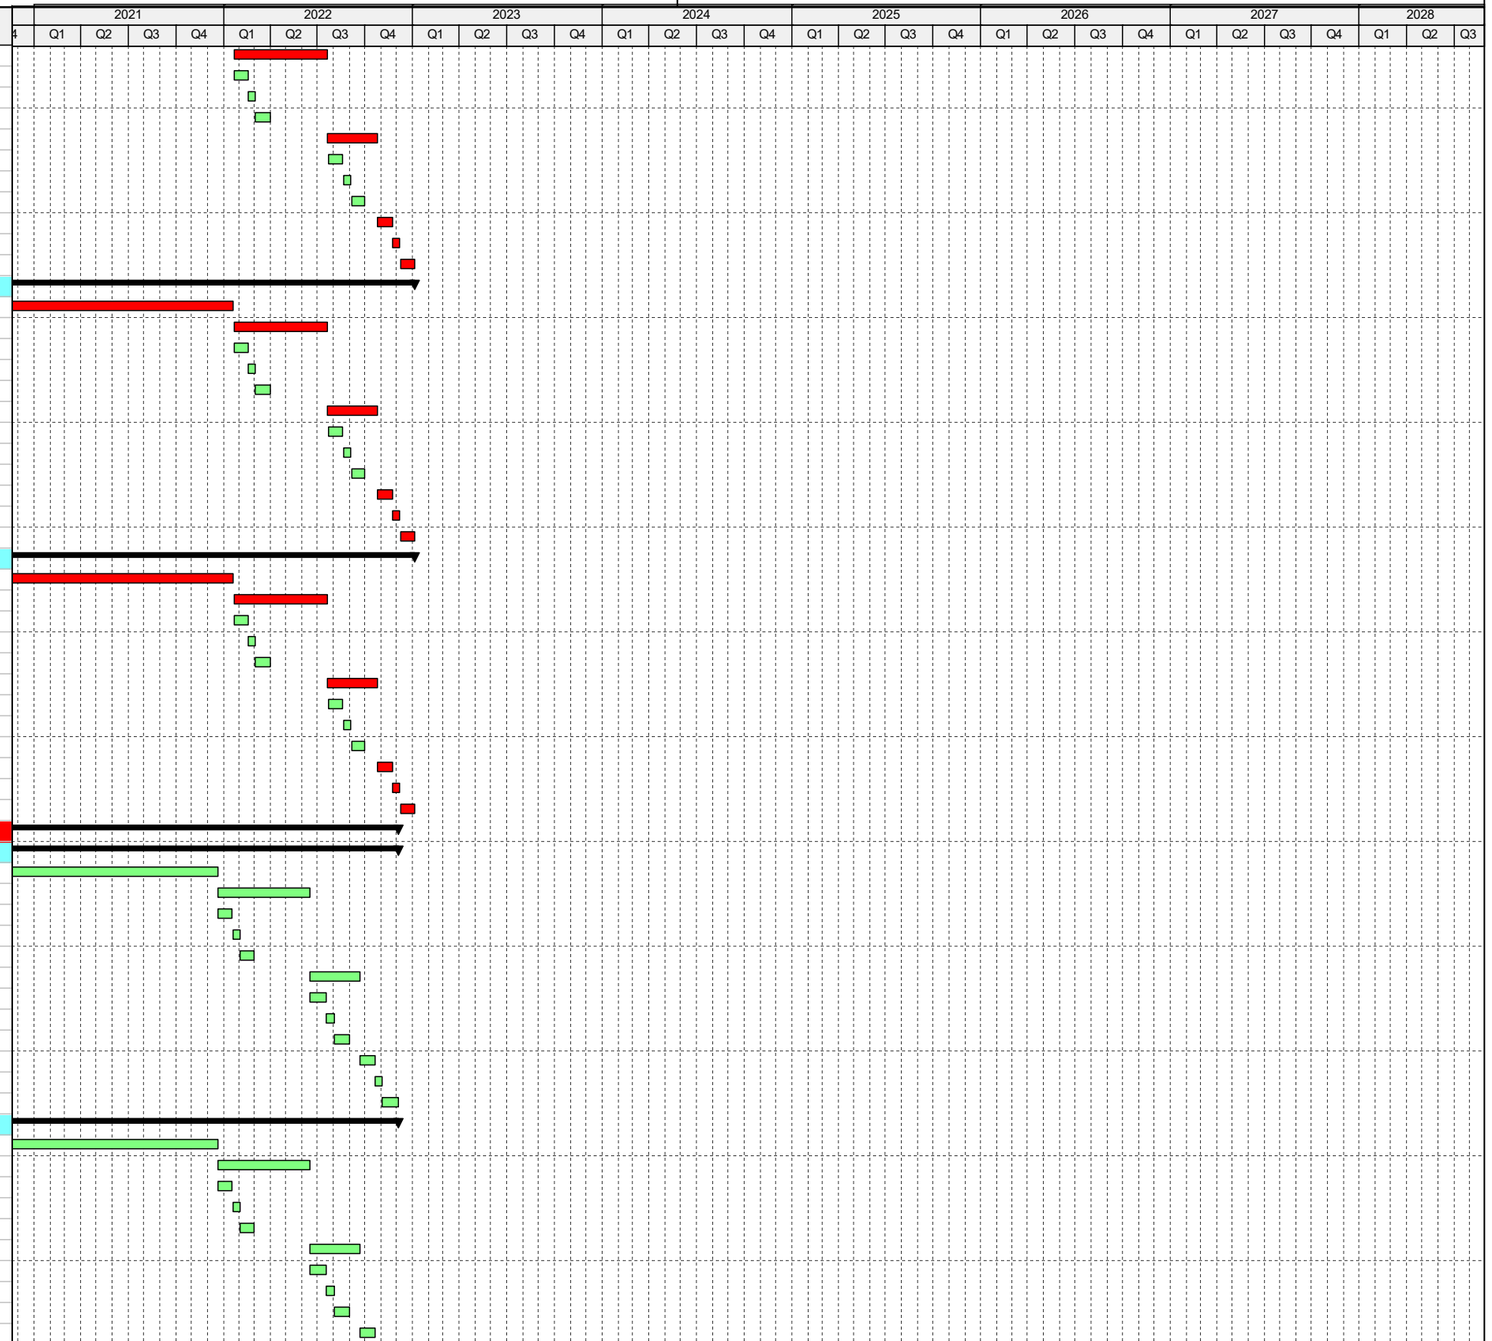


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-73060	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Oct-22	03-Nov-22
P-76050	Revisión de la interventoria R2 100%	20	04-Nov-22	05-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.02.3 Estación 5		512	09-Nov-20	05-Dec-22
P-2080	60%(Listado,Criterios de Diseño,Memoria de cálculo,Disposición general, Disposición g	273	09-Nov-20	20-Dec-21
P-20180	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria de cálculo,Trayectoria de ca	124	21-Dec-21	16-Jun-22
P-20190	Revisión de la interventoria R1 60%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-23840	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Jan-22	01-Feb-22
P-25550	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-46010	Final 100%	66	16-Jun-22	21-Sep-22
P-46120	Revisión de la interventoria R1 90%	20	17-Jun-22	18-Jul-22
P-52120	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	19-Jul-22	02-Aug-22
P-57640	Revisión de la interventoria R2 90%	20	03-Aug-22	31-Aug-22
P-67700	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Sep-22	20-Oct-22
P-73070	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Oct-22	03-Nov-22
P-76060	Revisión de la interventoria R2 100%	20	04-Nov-22	05-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.02.4 Estación 7		512	09-Nov-20	05-Dec-22
P-2090	60%(Listado,Criterios de Diseño,Memoria de cálculo,Disposición general, Disposición g	273	09-Nov-20	20-Dec-21
P-20200	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria de cálculo,Trayectoria de ca	124	21-Dec-21	16-Jun-22
P-20210	Revisión de la interventoria R1 60%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-23850	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Jan-22	01-Feb-22
P-25560	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-46020	Final 100%	66	16-Jun-22	21-Sep-22
P-46130	Revisión de la interventoria R1 90%	20	17-Jun-22	18-Jul-22
P-52130	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	19-Jul-22	02-Aug-22
P-57650	Revisión de la interventoria R2 90%	20	03-Aug-22	31-Aug-22
P-67710	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Sep-22	20-Oct-22
P-73080	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Oct-22	03-Nov-22
P-76070	Revisión de la interventoria R2 100%	20	04-Nov-22	05-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.02.5 Estación 9		512	09-Nov-20	05-Dec-22
P-2100	60%(Listado,Criterios de Diseño,Memoria de cálculo,Disposición general, Disposición g	273	09-Nov-20	20-Dec-21
P-20220	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria de cálculo,Trayectoria de ca	124	21-Dec-21	16-Jun-22
P-20230	Revisión de la interventoria R1 60%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-23860	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Jan-22	01-Feb-22
P-25570	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-46030	Final 100%	66	16-Jun-22	21-Sep-22
P-46140	Revisión de la interventoria R1 90%	20	17-Jun-22	18-Jul-22
P-52140	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	19-Jul-22	02-Aug-22
P-57660	Revisión de la interventoria R2 90%	20	03-Aug-22	31-Aug-22
P-67720	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Sep-22	20-Oct-22
P-73090	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Oct-22	03-Nov-22
P-76080	Revisión de la interventoria R2 100%	20	04-Nov-22	05-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.02.6 Estación 11		512	09-Nov-20	05-Dec-22
P-2110	60%(Listado,Criterios de Diseño,Memoria de cálculo,Disposición general, Disposición g	273	09-Nov-20	20-Dec-21
P-20240	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria de cálculo,Trayectoria de ca	124	21-Dec-21	16-Jun-22
P-20250	Revisión de la interventoria R1 60%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-23870	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Jan-22	01-Feb-22
P-25580	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-46040	Final 100%	66	16-Jun-22	21-Sep-22
P-46150	Revisión de la interventoria R1 90%	20	17-Jun-22	18-Jul-22
P-52150	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	19-Jul-22	02-Aug-22
P-57670	Revisión de la interventoria R2 90%	20	03-Aug-22	31-Aug-22
P-67730	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Sep-22	20-Oct-22
P-73100	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Oct-22	03-Nov-22
P-76090	Revisión de la interventoria R2 100%	20	04-Nov-22	05-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.02.7 Estación 13		512	09-Nov-20	05-Dec-22
P-2120	60%(Listado,Criterios de Diseño,Memoria de cálculo,Disposición general, Disposición g	273	09-Nov-20	20-Dec-21
P-20260	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria de cálculo,Trayectoria de ca	124	21-Dec-21	16-Jun-22
P-20270	Revisión de la interventoria R1 60%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-23880	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Jan-22	01-Feb-22
P-25590	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-46050	Final 100%	66	16-Jun-22	21-Sep-22
P-46160	Revisión de la interventoria R1 90%	20	17-Jun-22	18-Jul-22

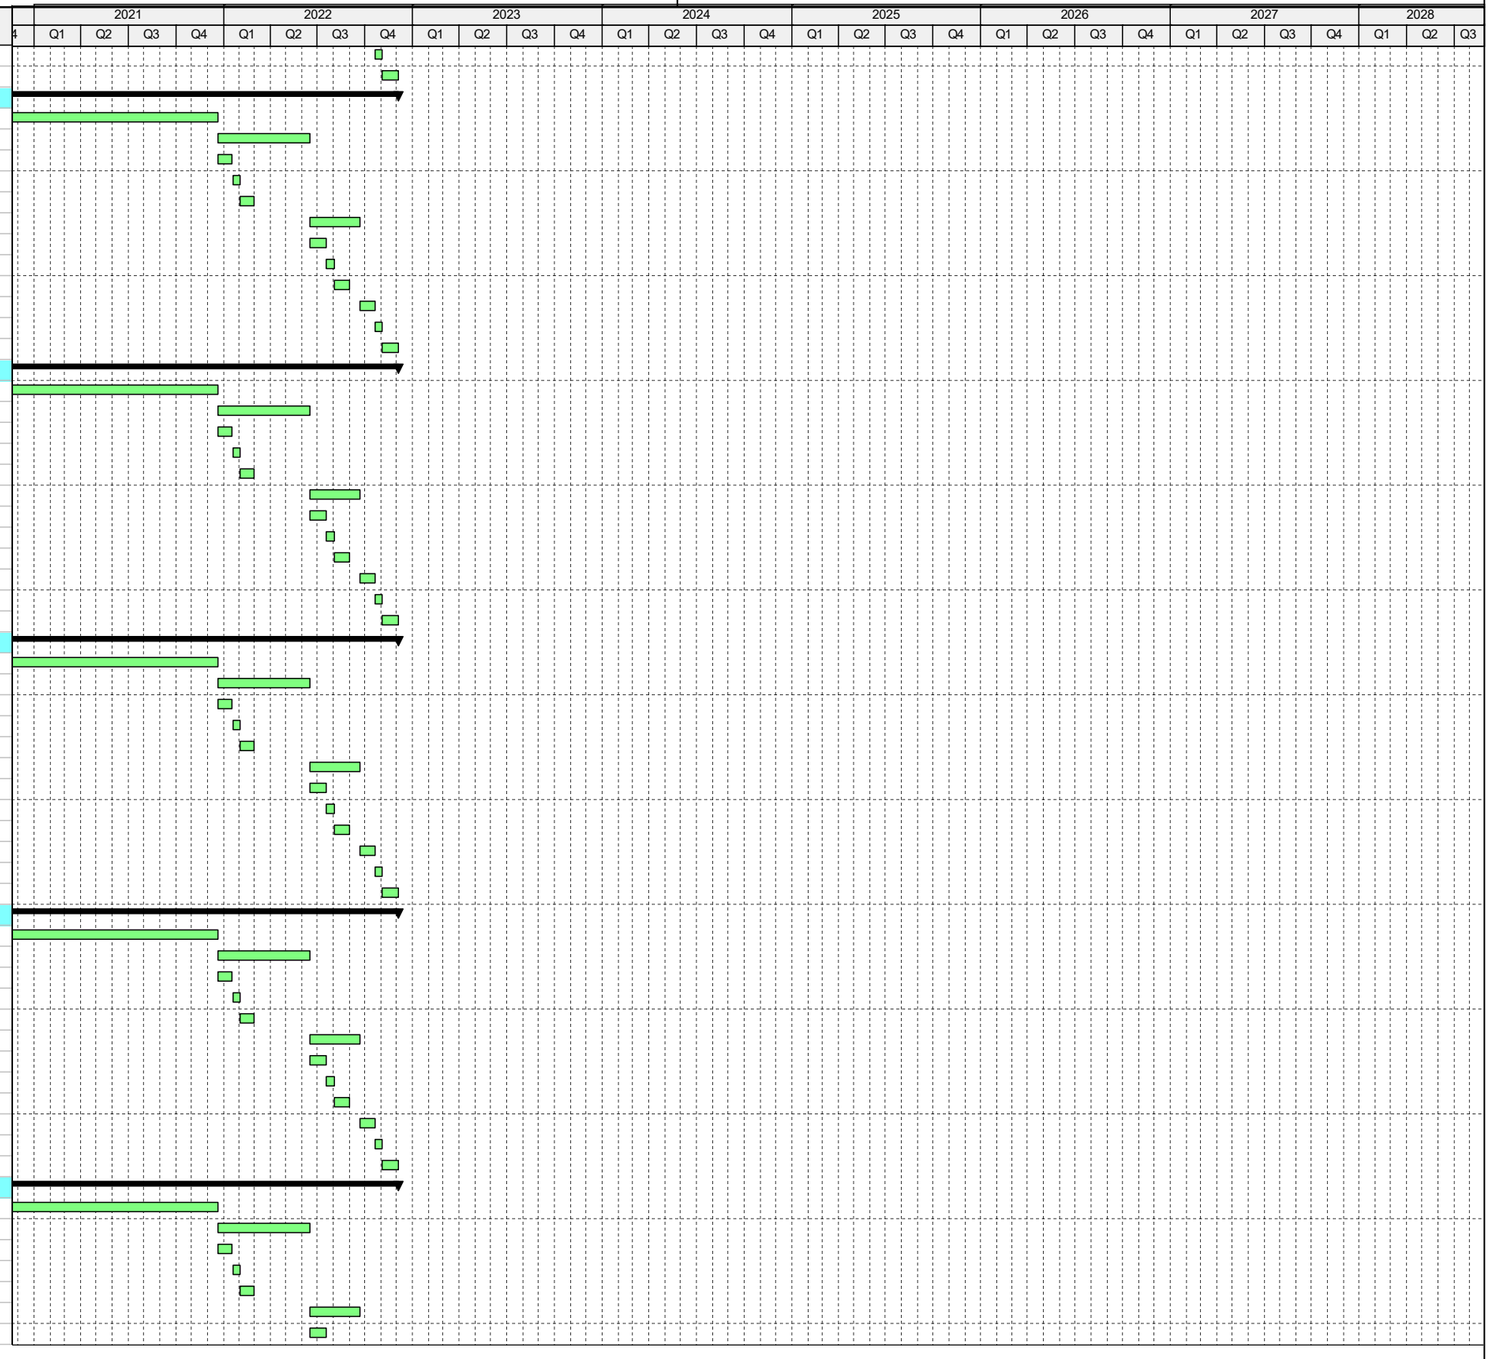


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-52160	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	19-Jul-22	02-Aug-22
P-57680	Revisión de la interventoria R2 90%	20	03-Aug-22	31-Aug-22
P-67740	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Sep-22	20-Oct-22
P-73110	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Oct-22	03-Nov-22
P-76100	Revisión de la interventoria R2 100%	20	04-Nov-22	05-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.02.8 Estación 15		512	09-Nov-20	05-Dec-22
P-2130	60%(Listado,Criterios de Diseño,Memoria de cálculo,Disposición general, Disposición (	273	09-Nov-20	20-Dec-21
P-20280	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria de cálculo,Trayectoria de ca	124	21-Dec-21	16-Jun-22
P-20290	Revisión de la interventoria R1 60%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-23890	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Jan-22	01-Feb-22
P-25600	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-46060	Final 100%	66	16-Jun-22	21-Sep-22
P-46170	Revisión de la interventoria R1 90%	20	17-Jun-22	18-Jul-22
P-52170	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	19-Jul-22	02-Aug-22
P-57690	Revisión de la interventoria R2 90%	20	03-Aug-22	31-Aug-22
P-67750	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Sep-22	20-Oct-22
P-73120	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Oct-22	03-Nov-22
P-76110	Revisión de la interventoria R2 100%	20	04-Nov-22	05-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.02.9 Estación 16		512	09-Nov-20	05-Dec-22
P-2140	60%(Listado,Criterios de Diseño,Memoria de cálculo,Disposición general, Disposición (	273	09-Nov-20	20-Dec-21
P-20300	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria de cálculo,Trayectoria de ca	124	21-Dec-21	16-Jun-22
P-20310	Revisión de la interventoria R1 60%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-23900	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Jan-22	01-Feb-22
P-25610	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-46070	Final 100%	66	16-Jun-22	21-Sep-22
P-46180	Revisión de la interventoria R1 90%	20	17-Jun-22	18-Jul-22
P-52180	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	19-Jul-22	02-Aug-22
P-57700	Revisión de la interventoria R2 90%	20	03-Aug-22	31-Aug-22
P-67760	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Sep-22	20-Oct-22
P-73130	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Oct-22	03-Nov-22
P-76120	Revisión de la interventoria R2 100%	20	04-Nov-22	05-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.02.10 Patio taller		512	09-Nov-20	05-Dec-22
P-2150	60%(Listado,Criterios de Diseño,Memoria de cálculo,Disposición general, Disposición (	273	09-Nov-20	20-Dec-21
P-20320	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle (Memoria de cálculo,Trayectoria de ca	124	21-Dec-21	16-Jun-22
P-20330	Revisión de la interventoria R1 60%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-23910	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Jan-22	01-Feb-22
P-25620	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-46080	Final 100%	66	16-Jun-22	21-Sep-22
P-46190	Revisión de la interventoria R1 90%	20	17-Jun-22	18-Jul-22
P-52190	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	19-Jul-22	02-Aug-22
P-57710	Revisión de la interventoria R2 90%	20	03-Aug-22	31-Aug-22
P-67770	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Sep-22	20-Oct-22
P-73140	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Oct-22	03-Nov-22
P-76130	Revisión de la interventoria R2 100%	20	04-Nov-22	05-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.03 Sistema de alimentacion alta tension		530	09-Nov-20	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.03.1 Patio taller		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2160	60%(Listado,Calculo de campos,Calculos de regulacion, Analisis)	290	09-Nov-20	13-Jan-22
P-22980	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	124	14-Jan-22	13-Jul-22
P-22990	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Jan-22	10-Feb-22
P-27180	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Feb-22	24-Feb-22
P-28780	Revisión de la interventoria R2 60%	20	25-Feb-22	25-Mar-22
P-51070	Final 100%	66	14-Jul-22	18-Oct-22
P-51080	Revisión de la interventoria R1 90%	20	14-Jul-22	11-Aug-22
P-59440	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	12-Aug-22	26-Aug-22
P-62240	Revisión de la interventoria R2 90%	20	29-Aug-22	23-Sep-22
P-72210	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78140	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81330	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.03.2 Subestación Electrica calle 1		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2170	60%(Listado,Calculo de campos,Calculos de regulacion, Analisis)	290	09-Nov-20	13-Jan-22
P-23000	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	124	14-Jan-22	13-Jul-22
P-23010	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Jan-22	10-Feb-22

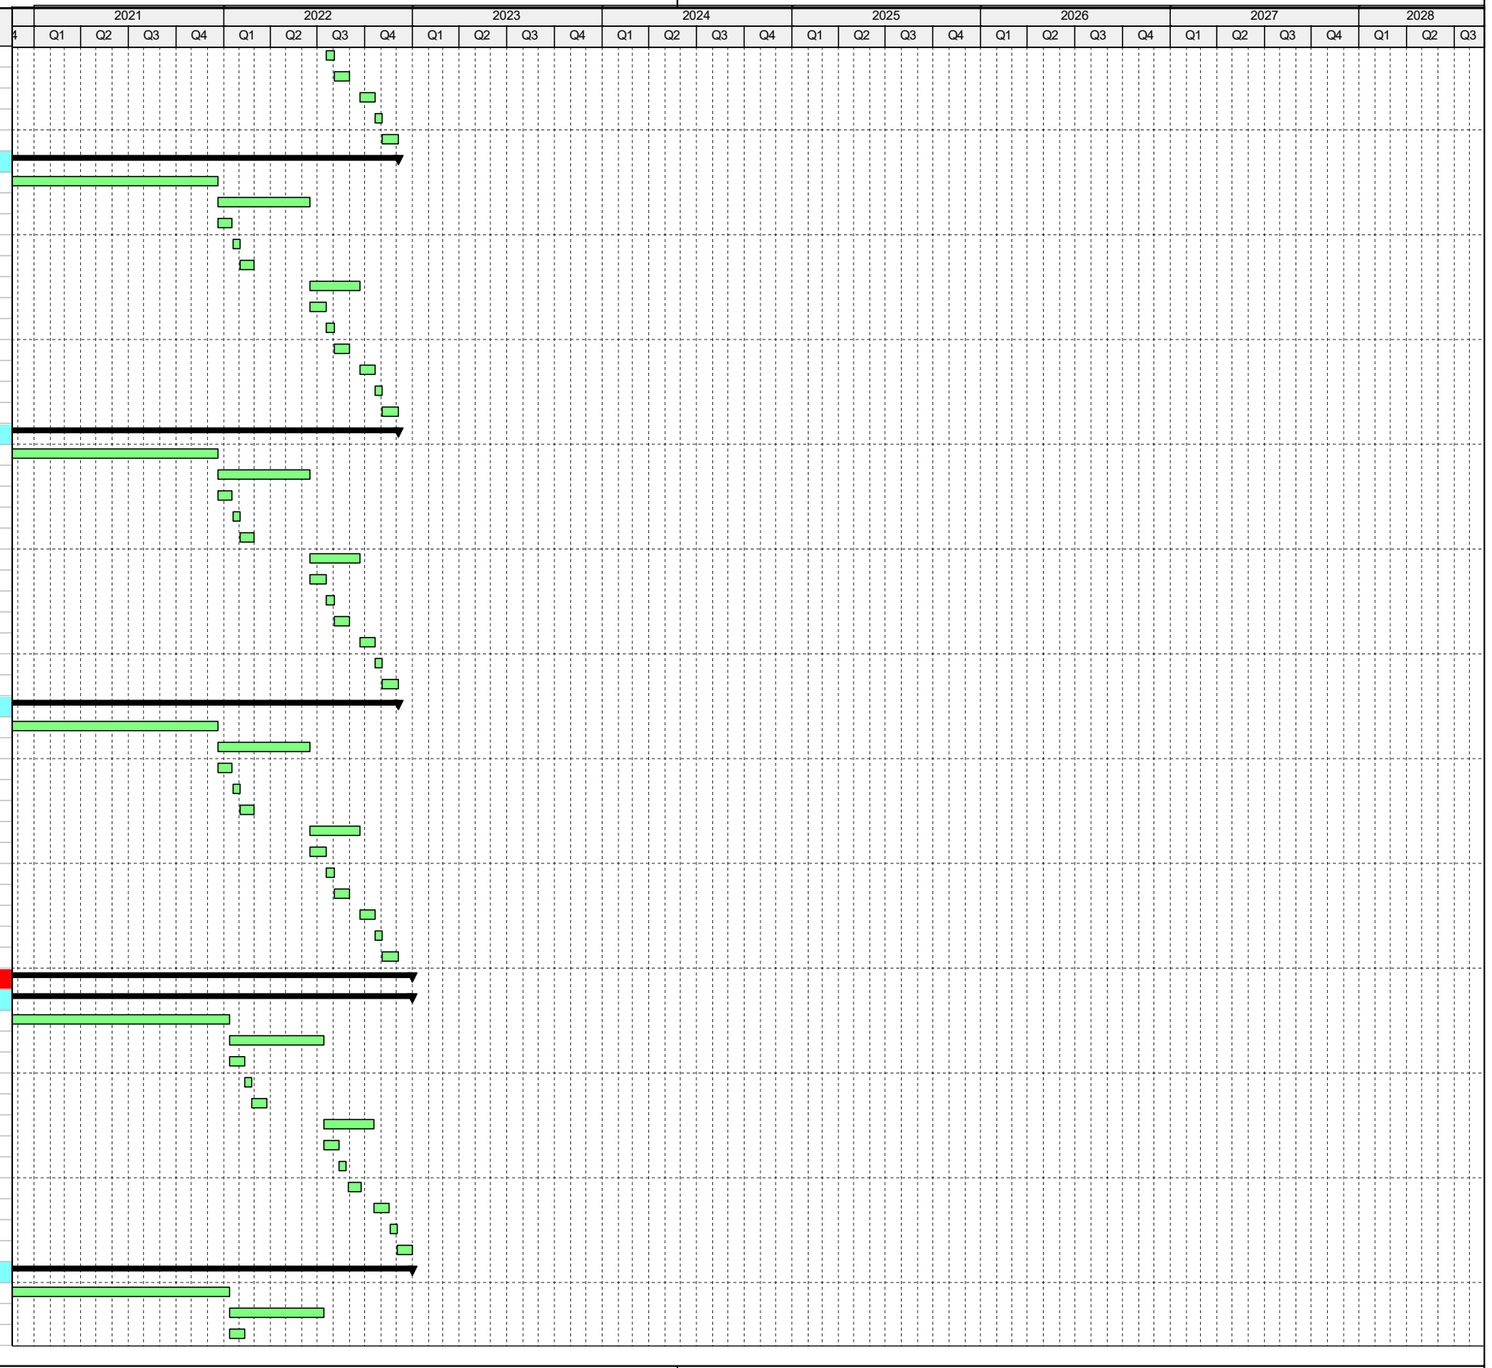


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-27190	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Feb-22	24-Feb-22
P-28790	Revisión de la interventoria R2 60%	20	25-Feb-22	25-Mar-22
P-51090	Final 100%	66	14-Jul-22	18-Oct-22
P-51100	Revisión de la interventoria R1 90%	20	14-Jul-22	11-Aug-22
P-59450	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	12-Aug-22	26-Aug-22
P-62250	Revisión de la interventoria R2 90%	20	29-Aug-22	23-Sep-22
P-72220	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78150	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81340	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.03.3 Estación 16		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2180	60%(Listado,Calculo de campos,Calculos de regulacion, Analisis)	290	09-Nov-20	13-Jan-22
P-23020	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	124	14-Jan-22	13-Jul-22
P-23030	Revisión de la interventoria R1 60%	20	14-Jan-22	10-Feb-22
P-27200	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	11-Feb-22	24-Feb-22
P-28800	Revisión de la interventoria R2 60%	20	25-Feb-22	25-Mar-22
P-51110	Final 100%	66	14-Jul-22	18-Oct-22
P-51120	Revisión de la interventoria R1 90%	20	14-Jul-22	11-Aug-22
P-59460	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	12-Aug-22	26-Aug-22
P-62260	Revisión de la interventoria R2 90%	20	29-Aug-22	23-Sep-22
P-72230	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78160	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81350	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04 Centro de transformacion de energia (CTE)		530	09-Nov-20	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.1 CTE Diseño_Estación 1 (Cra 96)		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2190	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-23920	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-23930	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-27980	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29290	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51170	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51610	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60100	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63120	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72240	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78170	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81360	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.2 CTE Diseño_Estación 2 (Portal Americas)		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2200	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-23940	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-23950	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-27990	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29300	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51180	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51620	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60110	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63130	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72250	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78180	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81370	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.3 CTE Diseño_Estación 3 (Cra 80)		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2210	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-23960	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-23970	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28000	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29310	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51190	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51630	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60120	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63140	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72260	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78190	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81380	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22

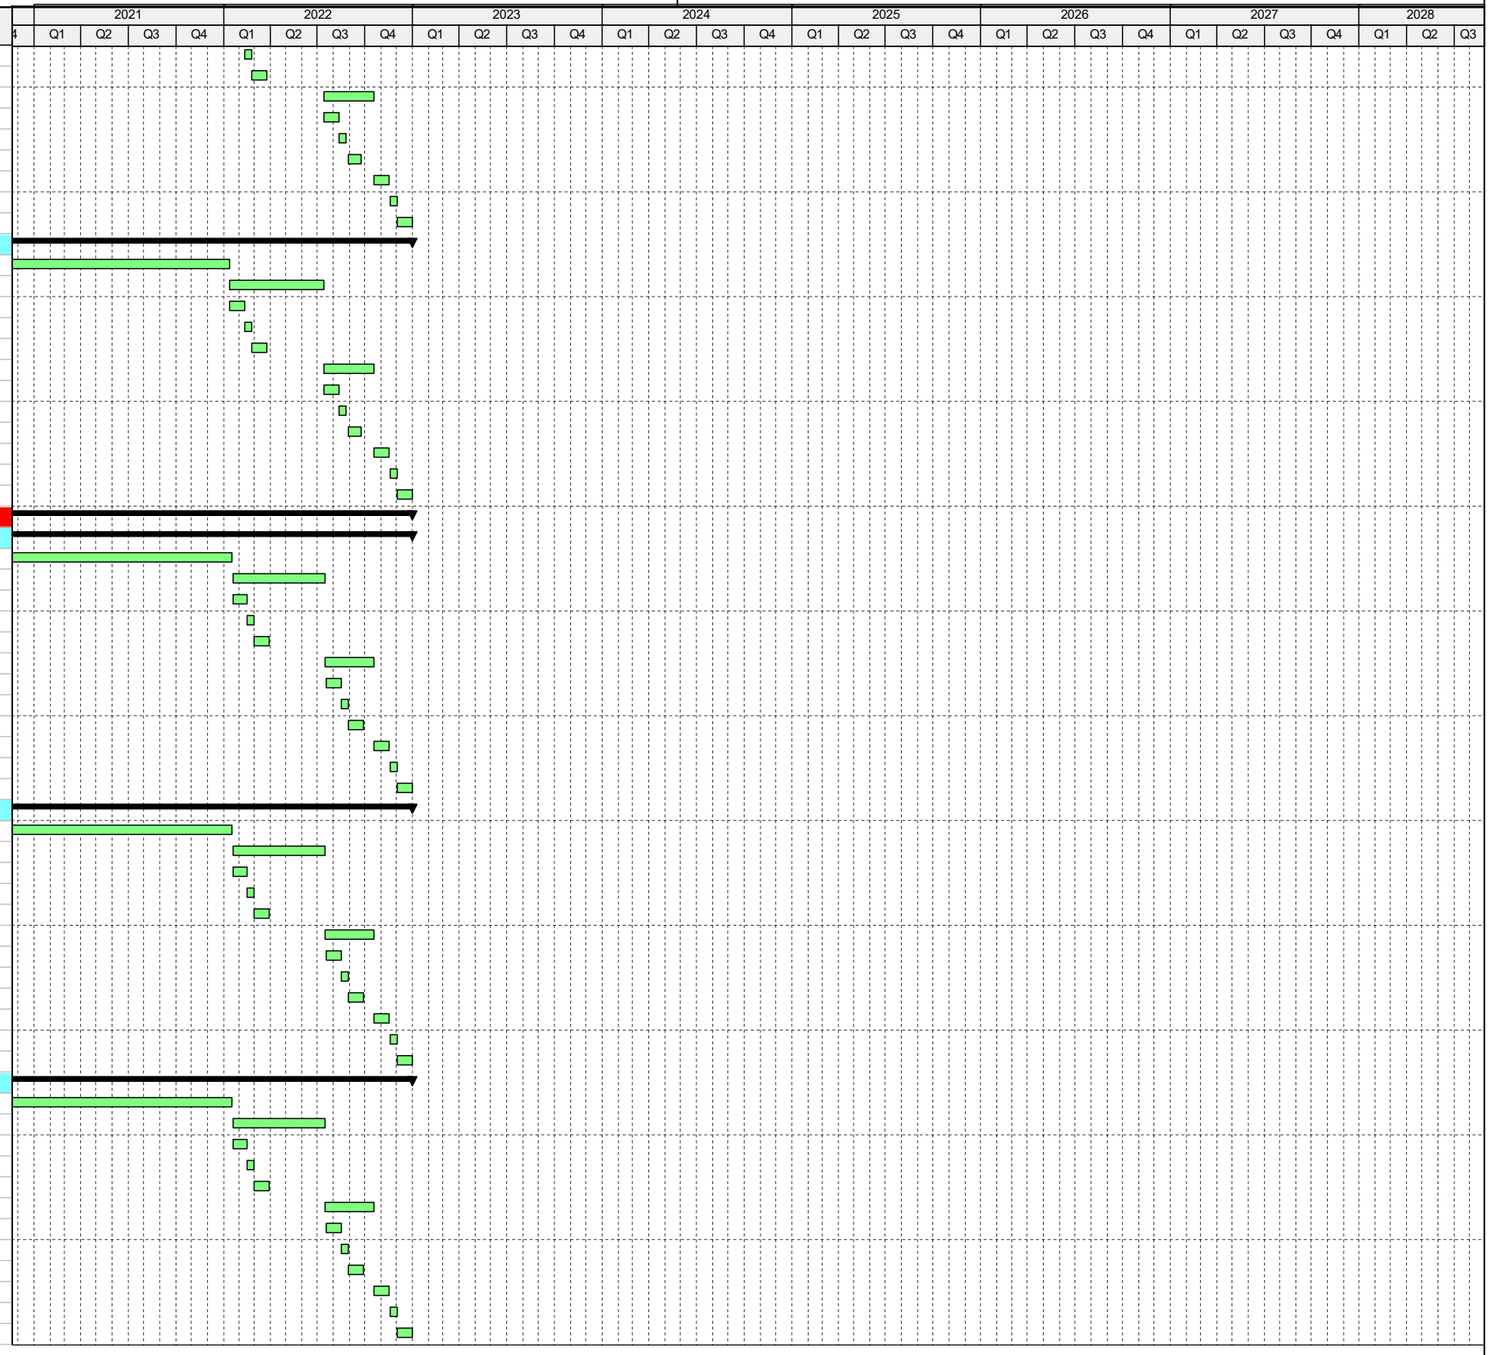

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.4	**CTE Diseño_Estación 4 (Calle 42S)**	530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2220	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-23980	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-23990	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28010	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29320	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51200	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51640	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60130	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63150	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72270	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78200	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81390	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.5	**CTE Diseño_Estación 5 (Kennedy)**	530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2230	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24000	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24010	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28020	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29330	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51210	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51650	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60140	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63160	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72280	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78210	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81400	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.6	**CTE Diseño_Estación 6 (Av. Boyaca)**	530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2240	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24020	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24030	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28030	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29340	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51220	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51660	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60150	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63170	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72290	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78220	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81410	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.7	**CTE Diseño_Estación 7 (Av. 68)**	530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2250	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24040	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24050	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28040	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29350	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51230	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51670	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60160	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63180	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72300	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78230	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81420	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.8	**CTE Diseño_Estación 8 (Cra 50)**	530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2260	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24060	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24070	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28050	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29360	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51240	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51680	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60170	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63190	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22

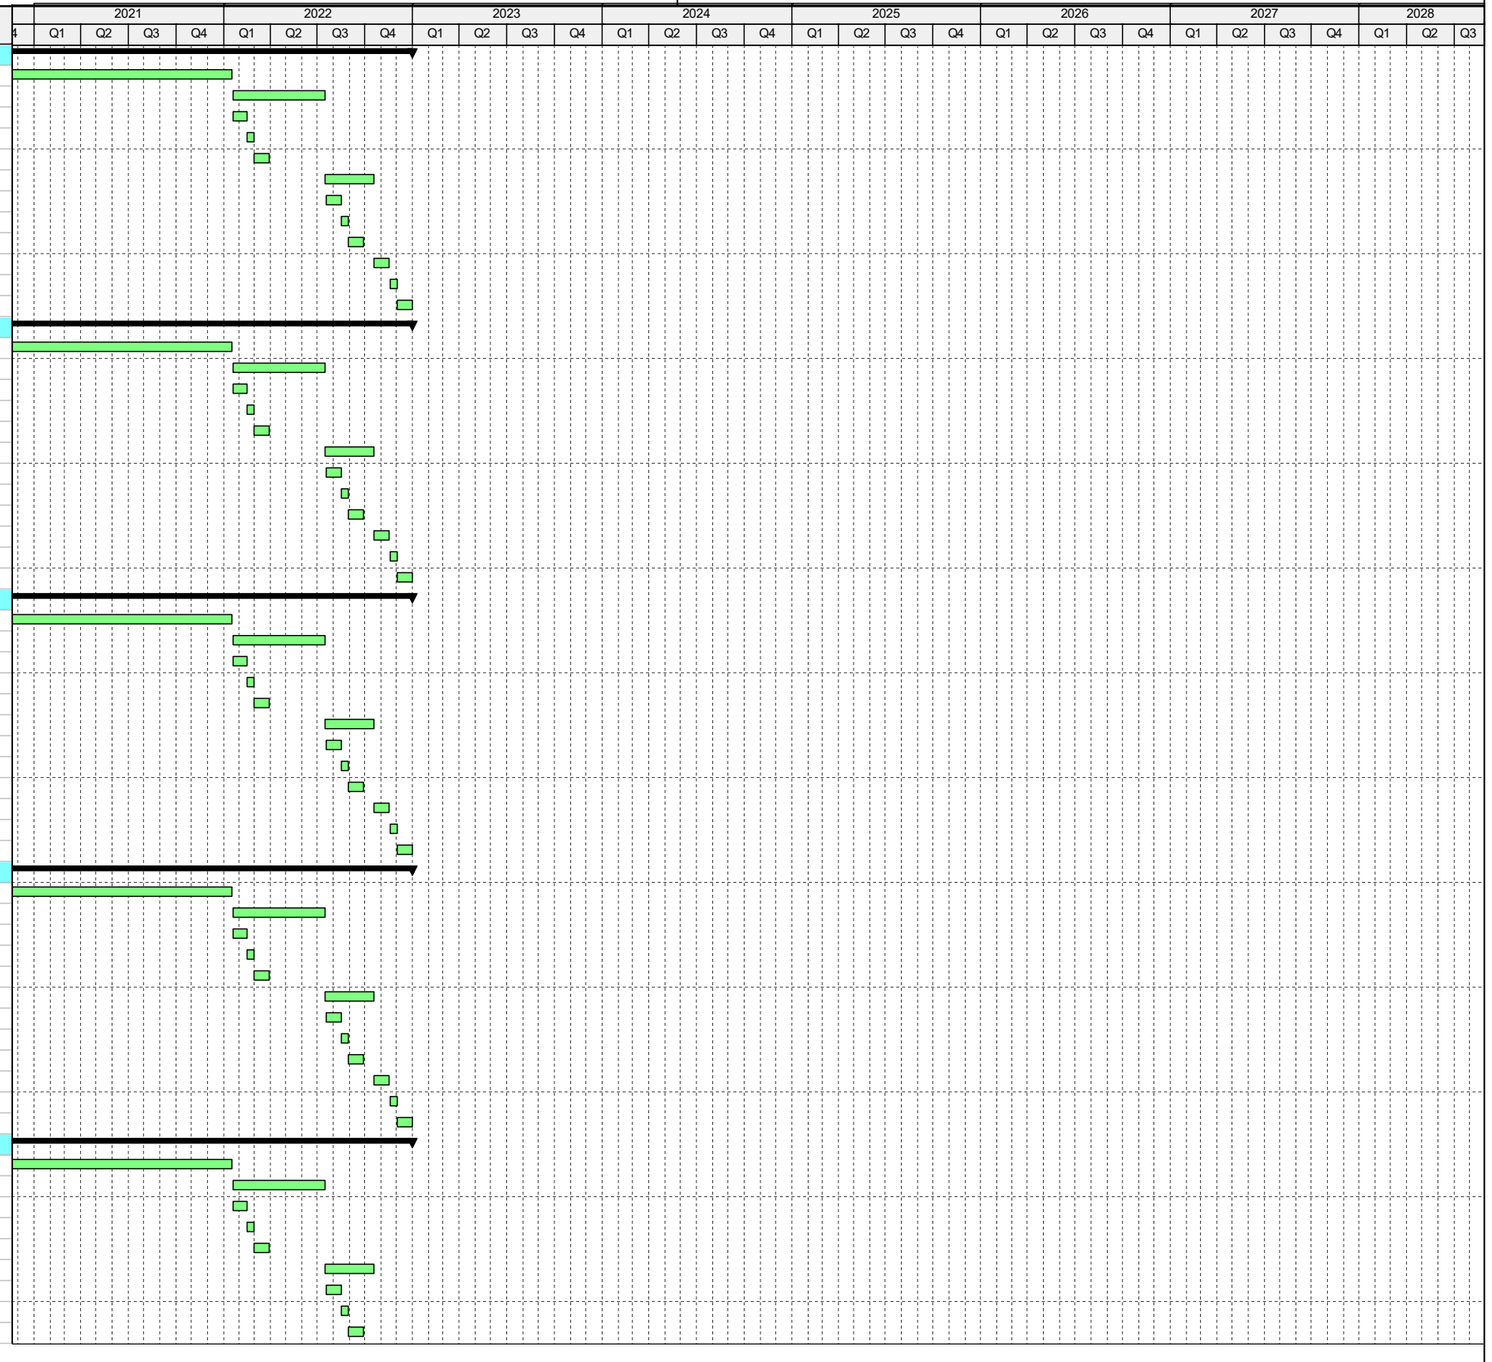


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-72310	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78240	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81430	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.9 CTE Diseño_Estación 9 (NQS)		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2270	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24080	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24090	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28060	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29370	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51250	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51690	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60180	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63200	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72320	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78250	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81440	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.10 CTE Diseño_Estación 10 (Nariño)		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2280	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24100	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24110	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28070	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29380	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51260	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51700	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60190	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63210	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72330	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78260	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81450	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.11 CTE Diseño_Estación 11 (CII 1a)		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2290	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24120	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24130	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28080	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29390	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51270	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51710	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60200	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63220	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72340	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78270	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81460	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.12 CTE Diseño_Estación 12 (CII 10)		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2300	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24140	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24150	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28090	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29400	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51280	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51720	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60210	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63230	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72350	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78280	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81470	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.13 CTE Diseño_Estación 13 (CII 26)		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2310	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24160	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24170	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28100	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29410	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51290	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22

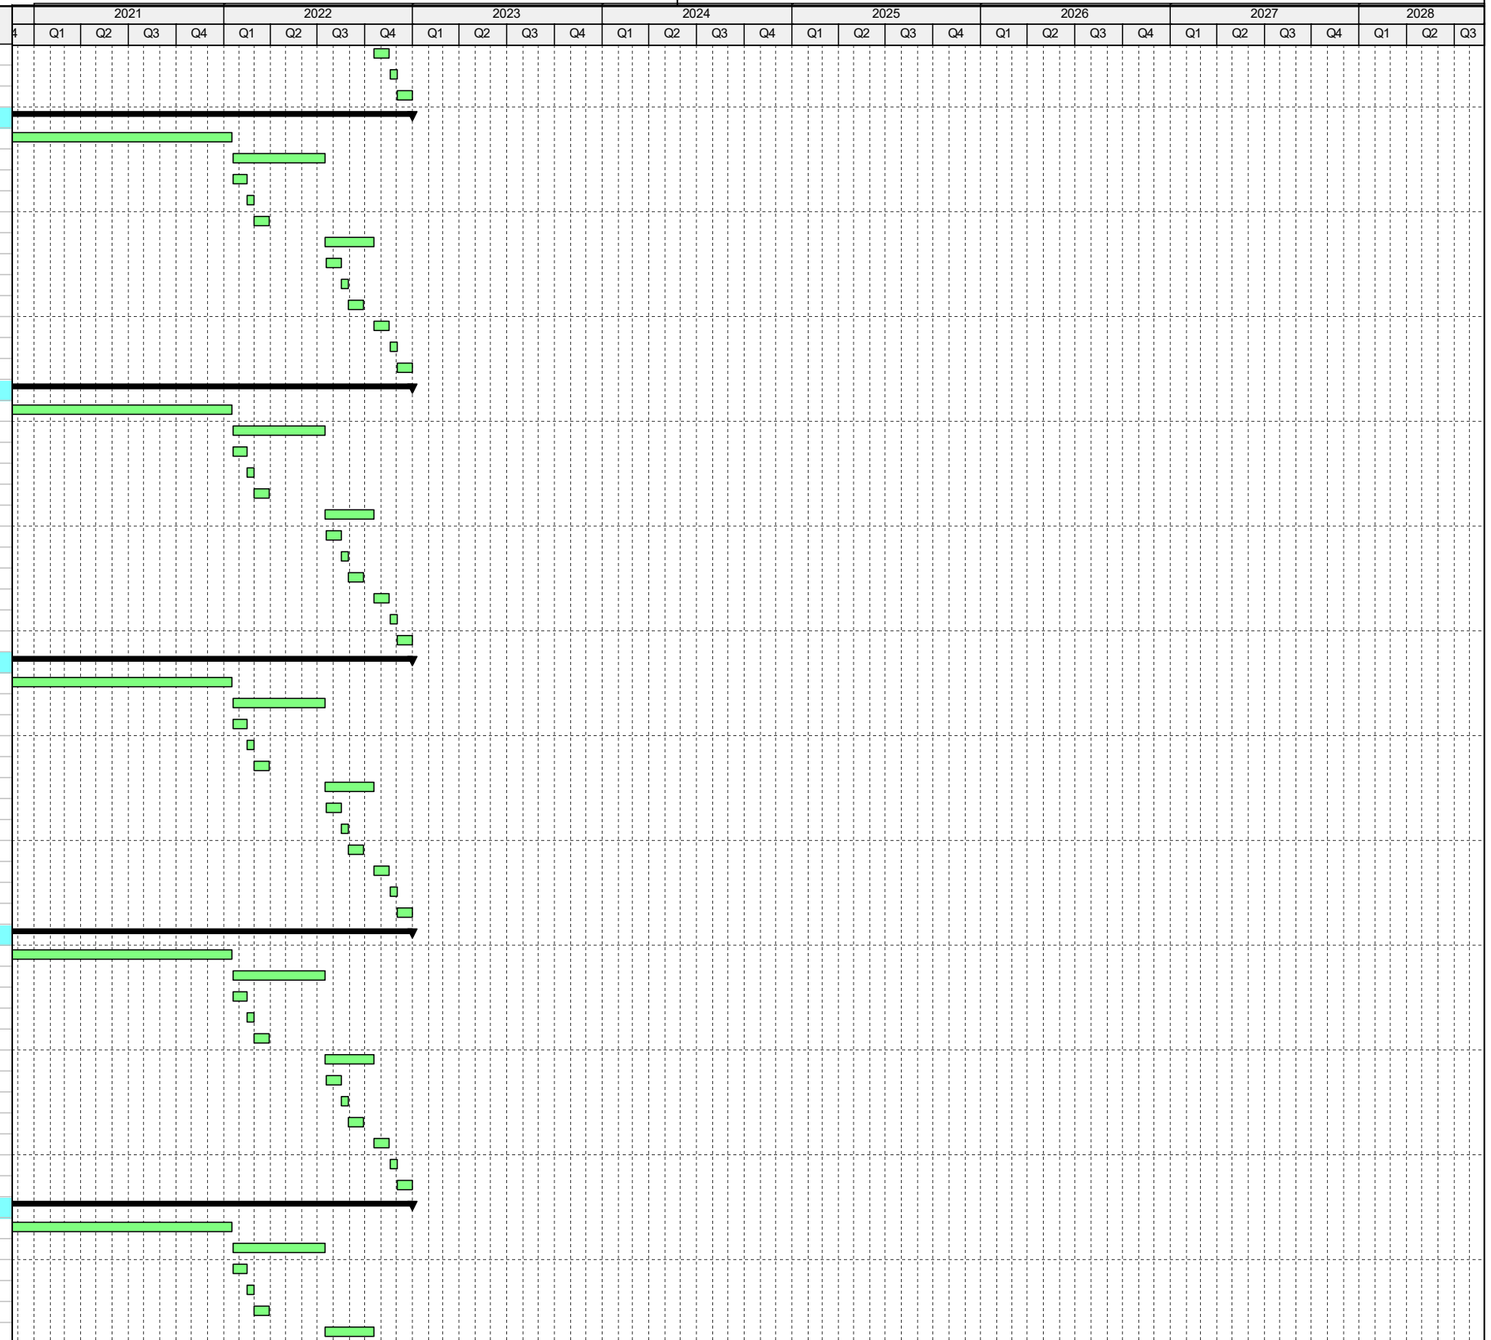


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-51730	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60220	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63240	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72360	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78290	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81480	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.14 CTE Diseño_Estación 14 (CII 45)		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2320	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24180	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24190	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28110	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29420	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51300	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51740	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60230	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63250	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72370	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78300	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81490	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.15 CTE Diseño_Estación 15 (CII 63)		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2330	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24200	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24210	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28120	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29430	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51310	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51750	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60240	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63260	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72380	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78310	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81500	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.16 CTE_Estación 16 (CII 72)		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2340	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24220	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24230	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28130	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29440	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51320	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51760	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60250	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63270	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72390	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78320	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81510	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.17 Edificios- Edificio Administrativo		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2350	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24240	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24250	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28140	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29450	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51330	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51770	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60260	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63280	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72400	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78330	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81520	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.18 Edificio- Hall de cocheras		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2360	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24260	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24270	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22

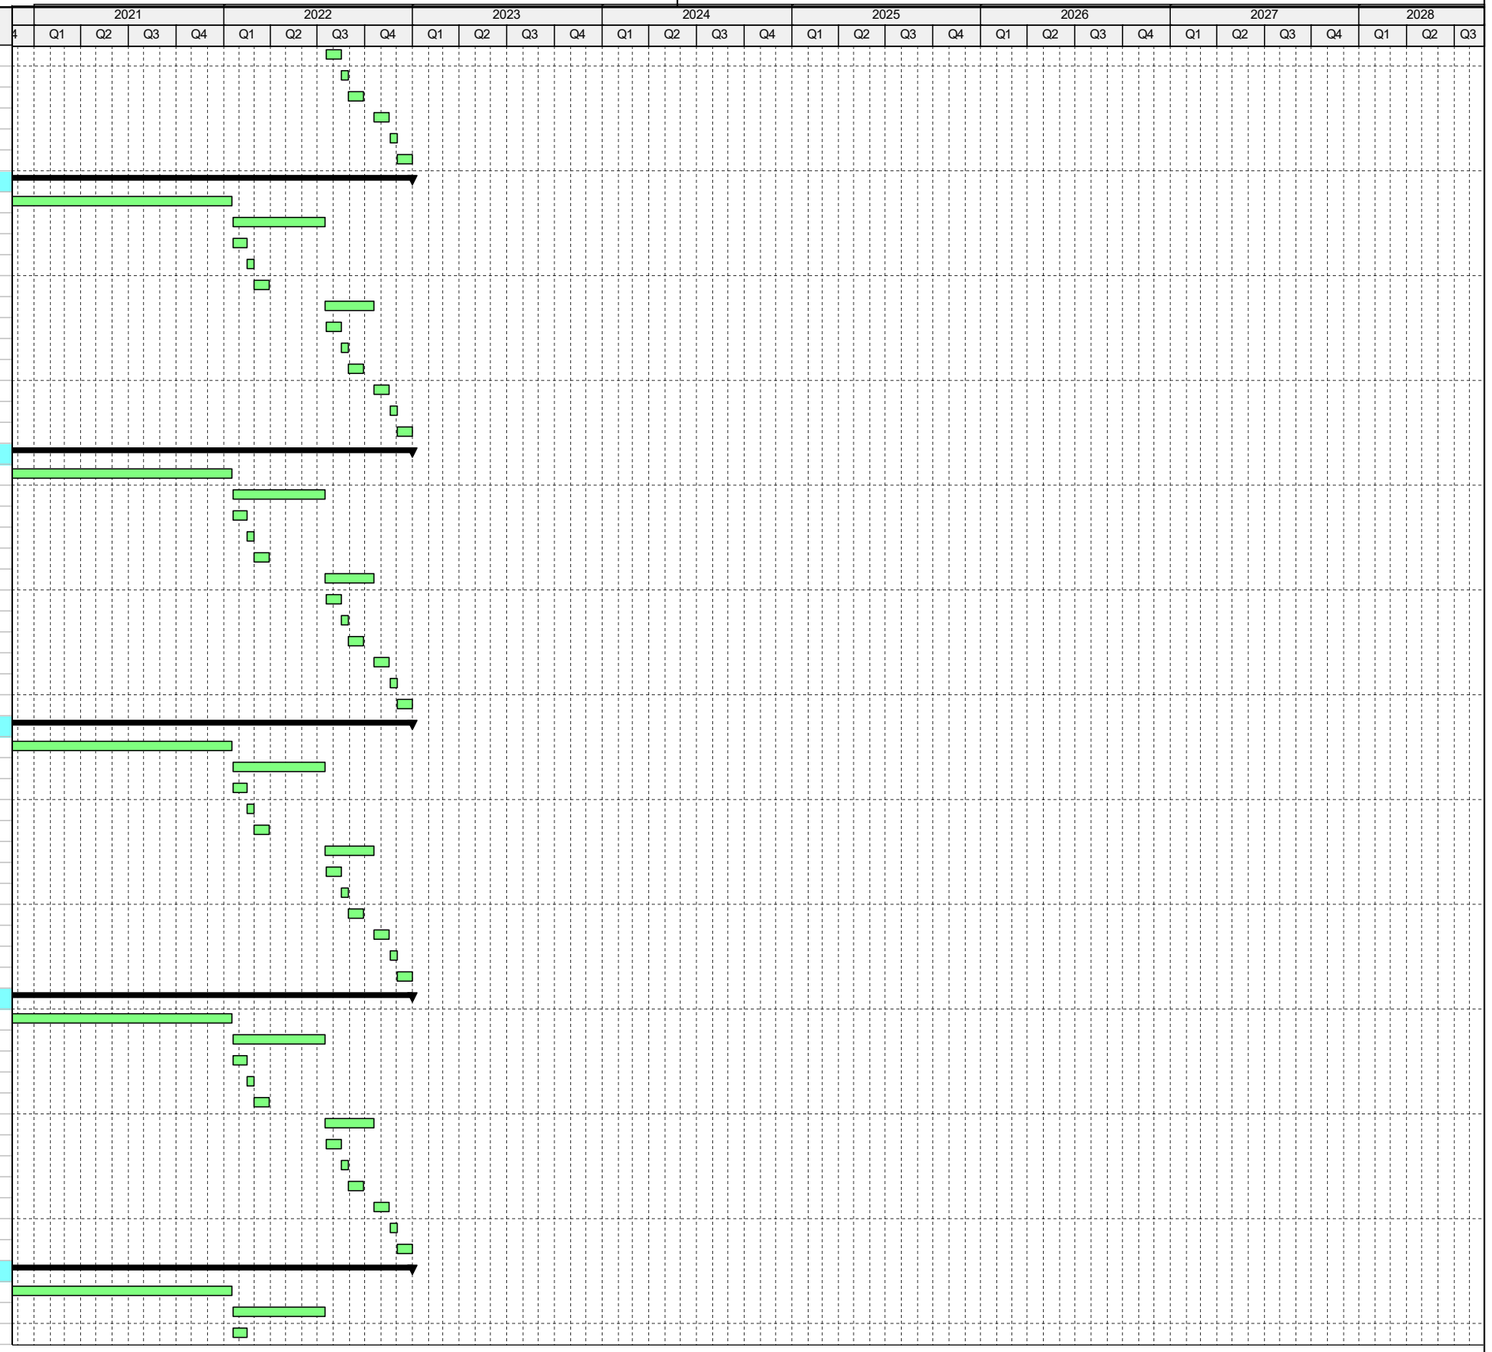


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-28150	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29460	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51340	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51780	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60270	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63290	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72410	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78340	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81530	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.19 Edificios-Maquina de lavado		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2370	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24280	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24290	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28160	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29470	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51350	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51790	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60280	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63300	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72420	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78350	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81540	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.20 Edificios-Taller de mantenimiento infraestructura		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2380	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24300	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24310	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28170	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29480	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51360	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51800	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60290	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63310	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72430	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78360	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81550	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.21 Edificios-Taller de mantenimiento mayor y menor		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2390	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24320	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24330	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28180	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29490	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51370	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51810	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60300	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63320	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72440	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78370	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81560	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.04.22 Edificios - Puesto de Mando Taller y Puesto Central Control		530	09-Nov-20	30-Dec-22
P-2400	60%(Listado,Criterios de Diseño ,Memoria de cálculo,Estudio,Disposición general)	293	09-Nov-20	18-Jan-22
P-24340	90%(Detalles de conexion,Especificaciones tecnicas)	123	19-Jan-22	15-Jul-22
P-24350	Revisión de la interventoria R1 60%	20	19-Jan-22	15-Feb-22
P-28190	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	16-Feb-22	01-Mar-22
P-29500	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Mar-22	30-Mar-22
P-51380	Final 100%	65	15-Jul-22	18-Oct-22
P-51820	Revisión de la interventoria R1 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-60310	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	17-Aug-22	30-Aug-22
P-63330	Revisión de la interventoria R2 90%	20	31-Aug-22	27-Sep-22
P-72450	Revisión de la interventoria R1 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
P-78380	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	18-Nov-22	01-Dec-22
P-81570	Revisión de la interventoria R2 100%	20	02-Dec-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.05 Sistema de alimentacion baja tension		512	09-Nov-20	05-Dec-22

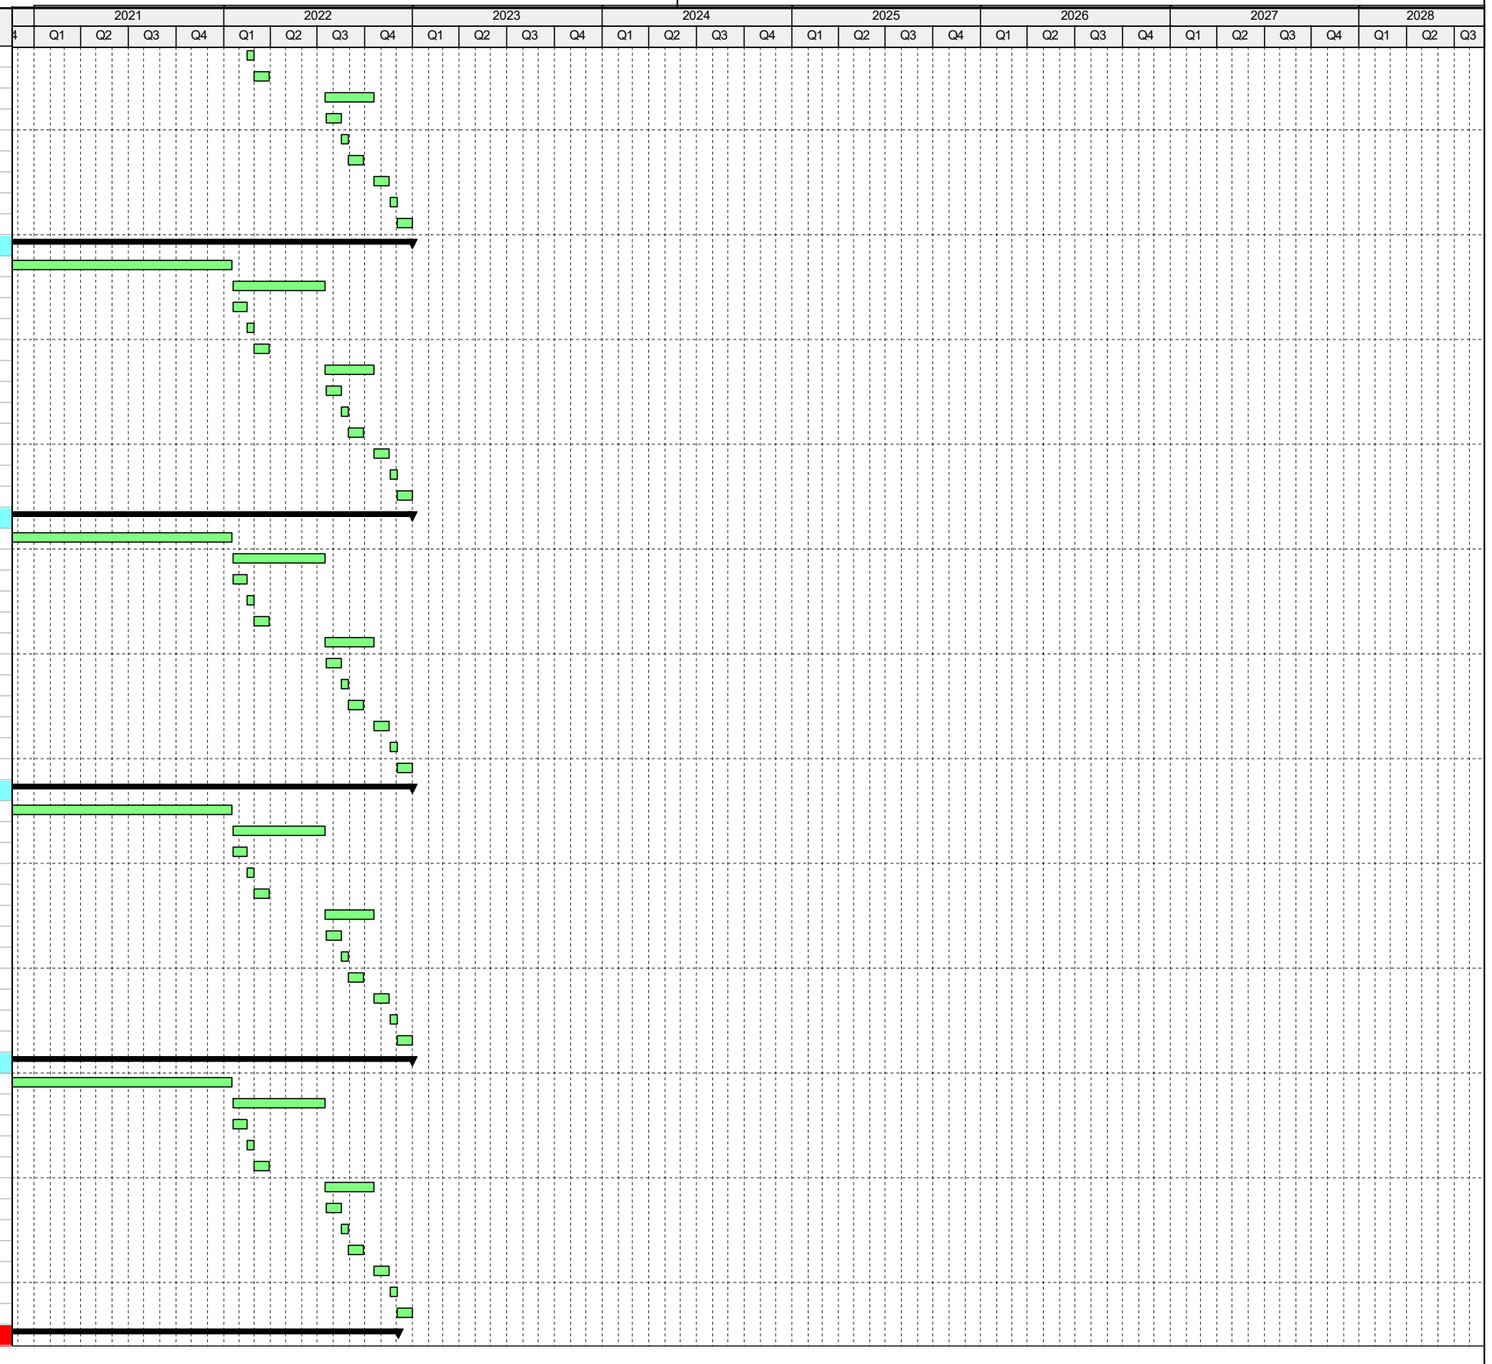

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-2410	60%(Listado,Dimensionamiento,Calculos,Analisis,Disposicion fisica)	273	09-Nov-20	20-Dec-21
P-20340	90%(Especificaciones teccnicas,Detalles de conexion de equipos,Detalles de conexior	124	21-Dec-21	16-Jun-22
P-20350	Revisión de la interventoria R1 60%	20	21-Dec-21	18-Jan-22
P-24360	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	19-Jan-22	01-Feb-22
P-25630	Revisión de la interventoria R2 60%	20	02-Feb-22	01-Mar-22
P-46090	Final 100%	66	16-Jun-22	21-Sep-22
P-46200	Revisión de la interventoria R1 90%	20	17-Jun-22	18-Jul-22
P-52200	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	19-Jul-22	02-Aug-22
P-57720	Revisión de la interventoria R2 90%	20	03-Aug-22	31-Aug-22
P-67780	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Sep-22	20-Oct-22
P-73150	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Oct-22	03-Nov-22
P-76140	Revisión de la interventoria R2 100%	20	04-Nov-22	05-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.06	**Conexiion a tierra, equipotencial, proteccion contra rayo y corrosión**	500	09-Nov-20	17-Nov-22
P-2420	60%(Listado,Equipotencialización General,Corrosión,BoM,Diseño y detalles, Informe d	271	09-Nov-20	16-Dec-21
P-19450	90%(Medicion de resistividad)	115	17-Dec-21	01-Jun-22
P-19460	Revisión de la interventoria R1 60%	20	17-Dec-21	14-Jan-22
P-23160	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Jan-22	28-Jan-22
P-25250	Revisión de la interventoria R2 60%	20	31-Jan-22	25-Feb-22
P-43750	Final 100%	65	01-Jun-22	05-Sep-22
P-43760	Revisión de la interventoria R1 90%	20	02-Jun-22	30-Jun-22
P-50010	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	01-Jul-22	15-Jul-22
P-51830	Revisión de la interventoria R2 90%	20	18-Jul-22	16-Aug-22
P-63640	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Sep-22	03-Oct-22
P-68730	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Oct-22	18-Oct-22
P-72460	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.07	**Estructuras de vias ferreas**	512	09-Nov-20	05-Dec-22
P-2430	60%(vías y planos de perfil,distribución geométrica,Medidas de interacción,ubicación d	275	09-Nov-20	22-Dec-21
P-20380	90%(sección transversal,Detalles del dispositivo,transición de la forma de pista)	123	23-Dec-21	17-Jun-22
P-20390	Revisión de la interventoria R1 60%	20	23-Dec-21	20-Jan-22
P-24700	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	21-Jan-22	03-Feb-22
P-26250	Revisión de la interventoria R2 60%	20	04-Feb-22	03-Mar-22
P-46210	Final 100%	65	17-Jun-22	21-Sep-22
P-46290	Revisión de la interventoria R1 90%	20	20-Jun-22	19-Jul-22
P-52280	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	21-Jul-22	03-Aug-22
P-57750	Revisión de la interventoria R2 90%	20	04-Aug-22	01-Sep-22
P-67790	Revisión de la interventoria R1 100%	20	22-Sep-22	20-Oct-22
P-73160	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	21-Oct-22	03-Nov-22
P-76150	Revisión de la interventoria R2 100%	20	04-Nov-22	05-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.08	**Potencia de Traccion y ETE**	514	09-Nov-20	07-Dec-22
P-2440	60%(Diagrama de alimentación,Planos de disposición,Informe,Criterios de diseño,Infor	276	09-Nov-20	23-Dec-21
P-20400	90%(Especificaciones,)	123	24-Dec-21	20-Jun-22
P-20410	Revisión de la interventoria R1 60%	20	24-Dec-21	21-Jan-22
P-24730	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	24-Jan-22	04-Feb-22
P-26350	Revisión de la interventoria R2 60%	20	07-Feb-22	04-Mar-22
P-46300	Final 100%	66	20-Jun-22	23-Sep-22
P-46330	Revisión de la interventoria R1 90%	20	21-Jun-22	21-Jul-22
P-52340	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	22-Jul-22	04-Aug-22
P-57780	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Aug-22	02-Sep-22
P-68320	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Sep-22	24-Oct-22
P-74490	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Oct-22	08-Nov-22
P-77040	Revisión de la interventoria R2 100%	20	09-Nov-22	07-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.09	**Telecomunicaciones**	517	09-Nov-20	13-Dec-22
P-2450	60%(Diagrama de arquitectura,Diseño de CCTV,PAS,PIS,telefonia publicitario,Calculo	276	09-Nov-20	23-Dec-21
P-20420	90%(Esquema de la declaración de diseño,AFC - interfaz con RMS)	123	24-Dec-21	20-Jun-22
P-20430	Revisión de la interventoria R1 60%	20	24-Dec-21	21-Jan-22
P-24740	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	24-Jan-22	04-Feb-22
P-26360	Revisión de la interventoria R2 60%	20	07-Feb-22	04-Mar-22
P-46310	Final 100%	69	20-Jun-22	28-Sep-22
P-46340	Revisión de la interventoria R1 90%	20	21-Jun-22	21-Jul-22
P-52350	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	22-Jul-22	04-Aug-22
P-57790	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Aug-22	02-Sep-22
P-68500	Revisión de la interventoria R1 100%	20	29-Sep-22	27-Oct-22

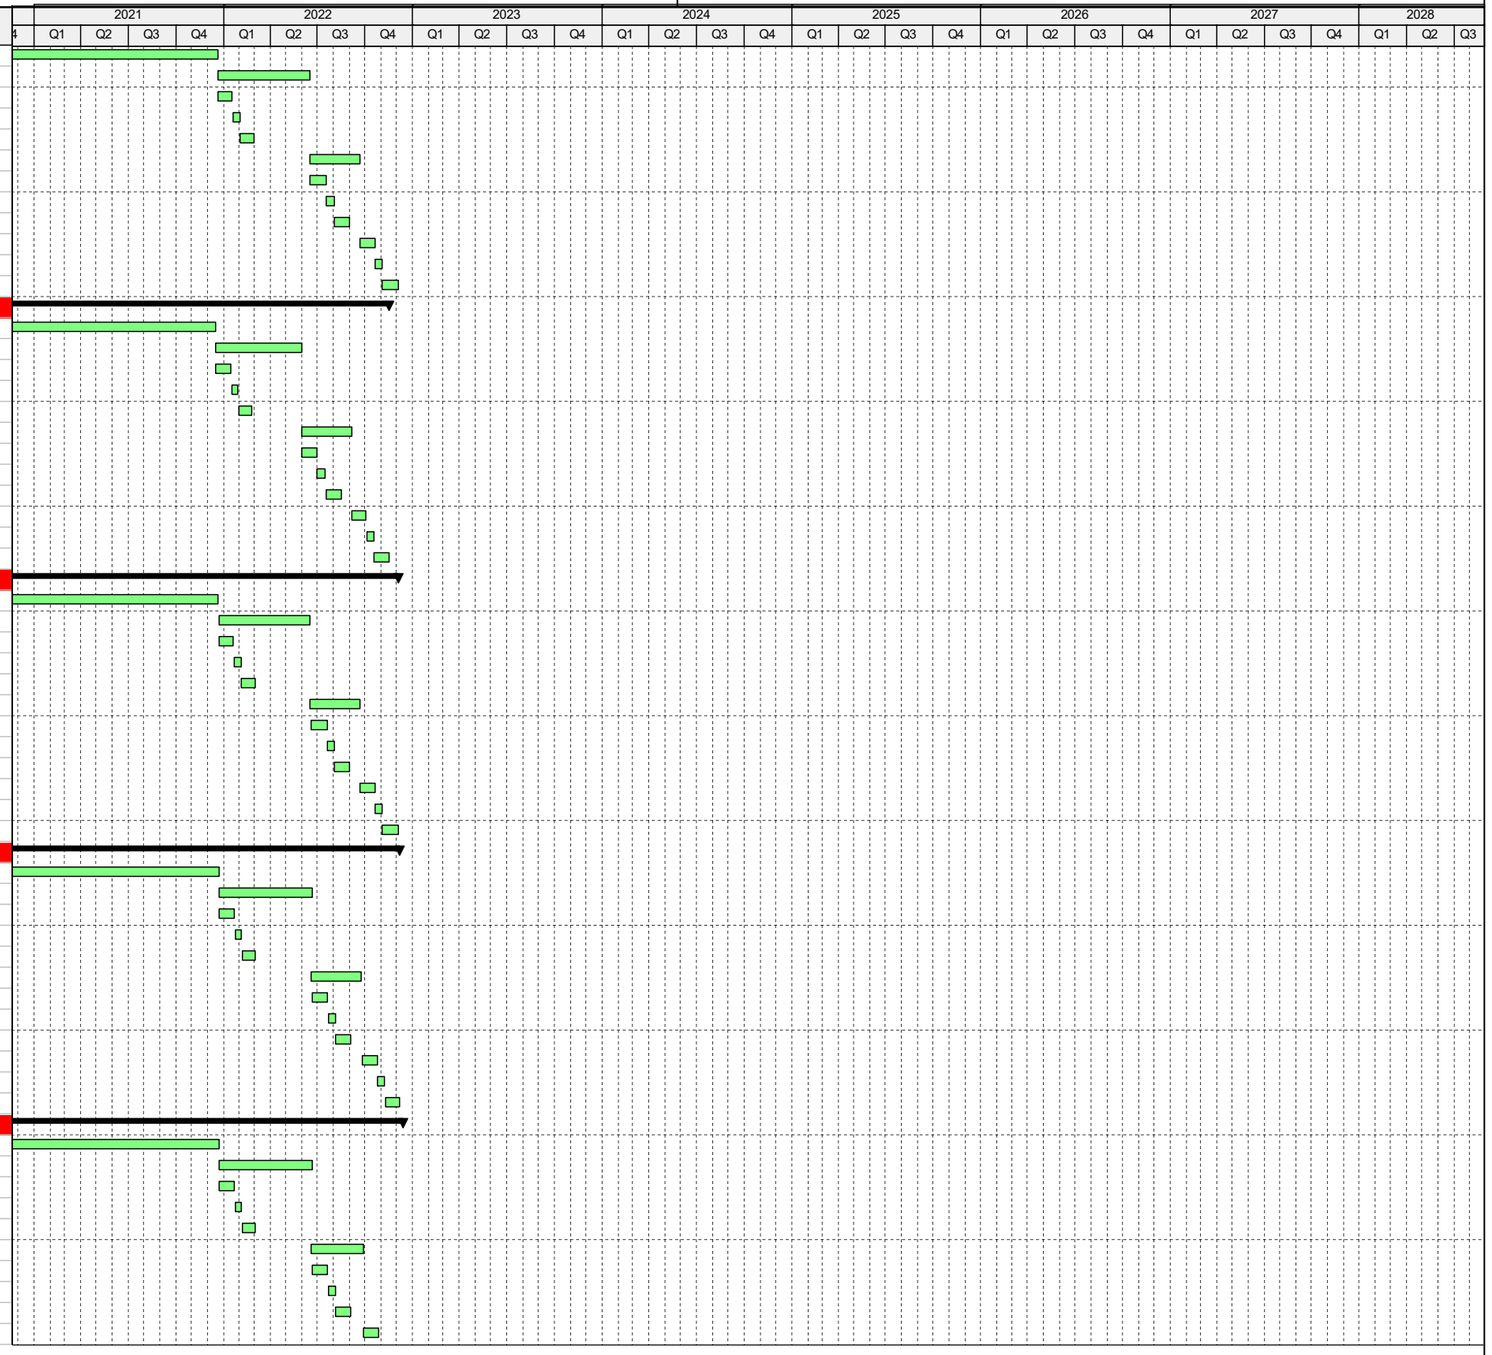


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-75160	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	28-Oct-22	11-Nov-22
P-78100	Revisión de la interventoria R2 100%	20	15-Nov-22	13-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.10 Puertas de anden o plataforma (PDAP)		535	09-Nov-20	06-Jan-23
P-2460	60%(Dibujo de disposición general típica,Declaración,especificaciones,Arquitectura)	295	09-Nov-20	20-Jan-22
P-24710	90%(Descripcion general de la interfaz Final)	132	21-Jan-22	02-Aug-22
P-24720	Revisión de la interventoria R1 60%	20	21-Jan-22	17-Feb-22
P-28480	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	18-Feb-22	03-Mar-22
P-29780	Revisión de la interventoria R2 60%	20	04-Mar-22	01-Apr-22
P-57590	Final 100%	59	02-Aug-22	25-Oct-22
P-57730	Revisión de la interventoria R1 90%	20	03-Aug-22	31-Aug-22
P-63480	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	01-Sep-22	14-Sep-22
P-67120	Revisión de la interventoria R2 90%	20	15-Sep-22	12-Oct-22
P-74540	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Oct-22	24-Nov-22
P-80330	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Nov-22	09-Dec-22
P-82630	Revisión de la interventoria R2 100%	20	12-Dec-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.09.11 Equipos de Patio Taller		514	09-Nov-20	07-Dec-22
P-2470	60%(Diseños típicos de equipos,Dibujos de planos, especificaciones)	276	09-Nov-20	23-Dec-21
P-20440	90%(especificacion de interfaz,)	123	24-Dec-21	20-Jun-22
P-20450	Revisión de la interventoria R1 60%	20	24-Dec-21	21-Jan-22
P-24750	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	24-Jan-22	04-Feb-22
P-26370	Revisión de la interventoria R2 60%	20	07-Feb-22	04-Mar-22
P-46320	Final 100%	66	20-Jun-22	23-Sep-22
P-46350	Revisión de la interventoria R1 90%	20	21-Jun-22	21-Jul-22
P-52360	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	22-Jul-22	04-Aug-22
P-57800	Revisión de la interventoria R2 90%	20	05-Aug-22	02-Sep-22
P-68330	Revisión de la interventoria R1 100%	20	26-Sep-22	24-Oct-22
P-74500	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	25-Oct-22	08-Nov-22
P-77050	Revisión de la interventoria R2 100%	20	09-Nov-22	07-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.09.12 Material Rodante- Pasajeros		545	20-Oct-20	03-Jan-23
P-1680	Entrega por parte de EMB manual de Imgen institucional	158	20-Oct-20	11-Jun-21
P-8430	Propuestas(9) de diseño estico del tren por parte de ML1	40	15-Jun-21	11-Aug-21
P-10350	Aprobacion por parte de EMB de la Modelacion 3D escogida	63	12-Aug-21	11-Nov-21
P-16410	60%(Lista,Descripción funcional,Propuesta y disposición,Especificación,Cálculo,Estudi	52	12-Nov-21	27-Jan-22
P-25040	90%(Informe de consumo,)	123	28-Jan-22	27-Jul-22
P-25050	Revisión de la interventoria R1 60%	20	28-Jan-22	24-Feb-22
P-28810	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	25-Feb-22	10-Mar-22
P-30690	Revisión de la interventoria R2 60%	20	11-Mar-22	08-Apr-22
P-53470	Final 100%	60	27-Jul-22	20-Oct-22
P-53810	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jul-22	25-Aug-22
P-61600	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	26-Aug-22	08-Sep-22
P-64330	Revisión de la interventoria R2 90%	20	09-Sep-22	06-Oct-22
P-73170	Revisión de la interventoria R1 100%	20	21-Oct-22	21-Nov-22
P-78990	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	22-Nov-22	05-Dec-22
P-82360	Revisión de la interventoria R2 100%	20	06-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.03.09.13 Señalizacion y control de trenes (CBTC)		518	09-Nov-20	14-Dec-22
P-2480	60%(Lista,Descripcion,Identificadores,Plan para la Verificacion,Analisis,ATS,DTS,TWC,	280	09-Nov-20	29-Dec-21
P-20850	90% Elaboracion y entrega del diseño de detalle	123	30-Dec-21	24-Jun-22
P-20860	Revisión de la interventoria R1 60%	20	30-Dec-21	27-Jan-22
P-25060	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	28-Jan-22	10-Feb-22
P-27210	Revisión de la interventoria R2 60%	20	11-Feb-22	10-Mar-22
P-47150	Final 100%	66	24-Jun-22	29-Sep-22
P-47300	Revisión de la interventoria R1 90%	20	28-Jun-22	27-Jul-22
P-53820	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	28-Jul-22	10-Aug-22
P-58440	Revisión de la interventoria R2 90%	20	11-Aug-22	08-Sep-22
P-68560	Revisión de la interventoria R1 100%	20	30-Sep-22	28-Oct-22
P-75230	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	31-Oct-22	15-Nov-22
P-78120	Revisión de la interventoria R2 100%	20	16-Nov-22	14-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.10 REDES Reubicación		383	20-Apr-21	02-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.01 Datos de entrada para diseños		140	29-Jun-21	20-Jan-22
P-8890	Preliminar (Diseños Geotecnicos)	90	29-Jun-21	08-Nov-21
P-16220	Revisión de la interventoria R1	20	09-Nov-21	07-Dec-21
P-19100	Atencion de comentarios de Interventoria	10	09-Dec-21	22-Dec-21

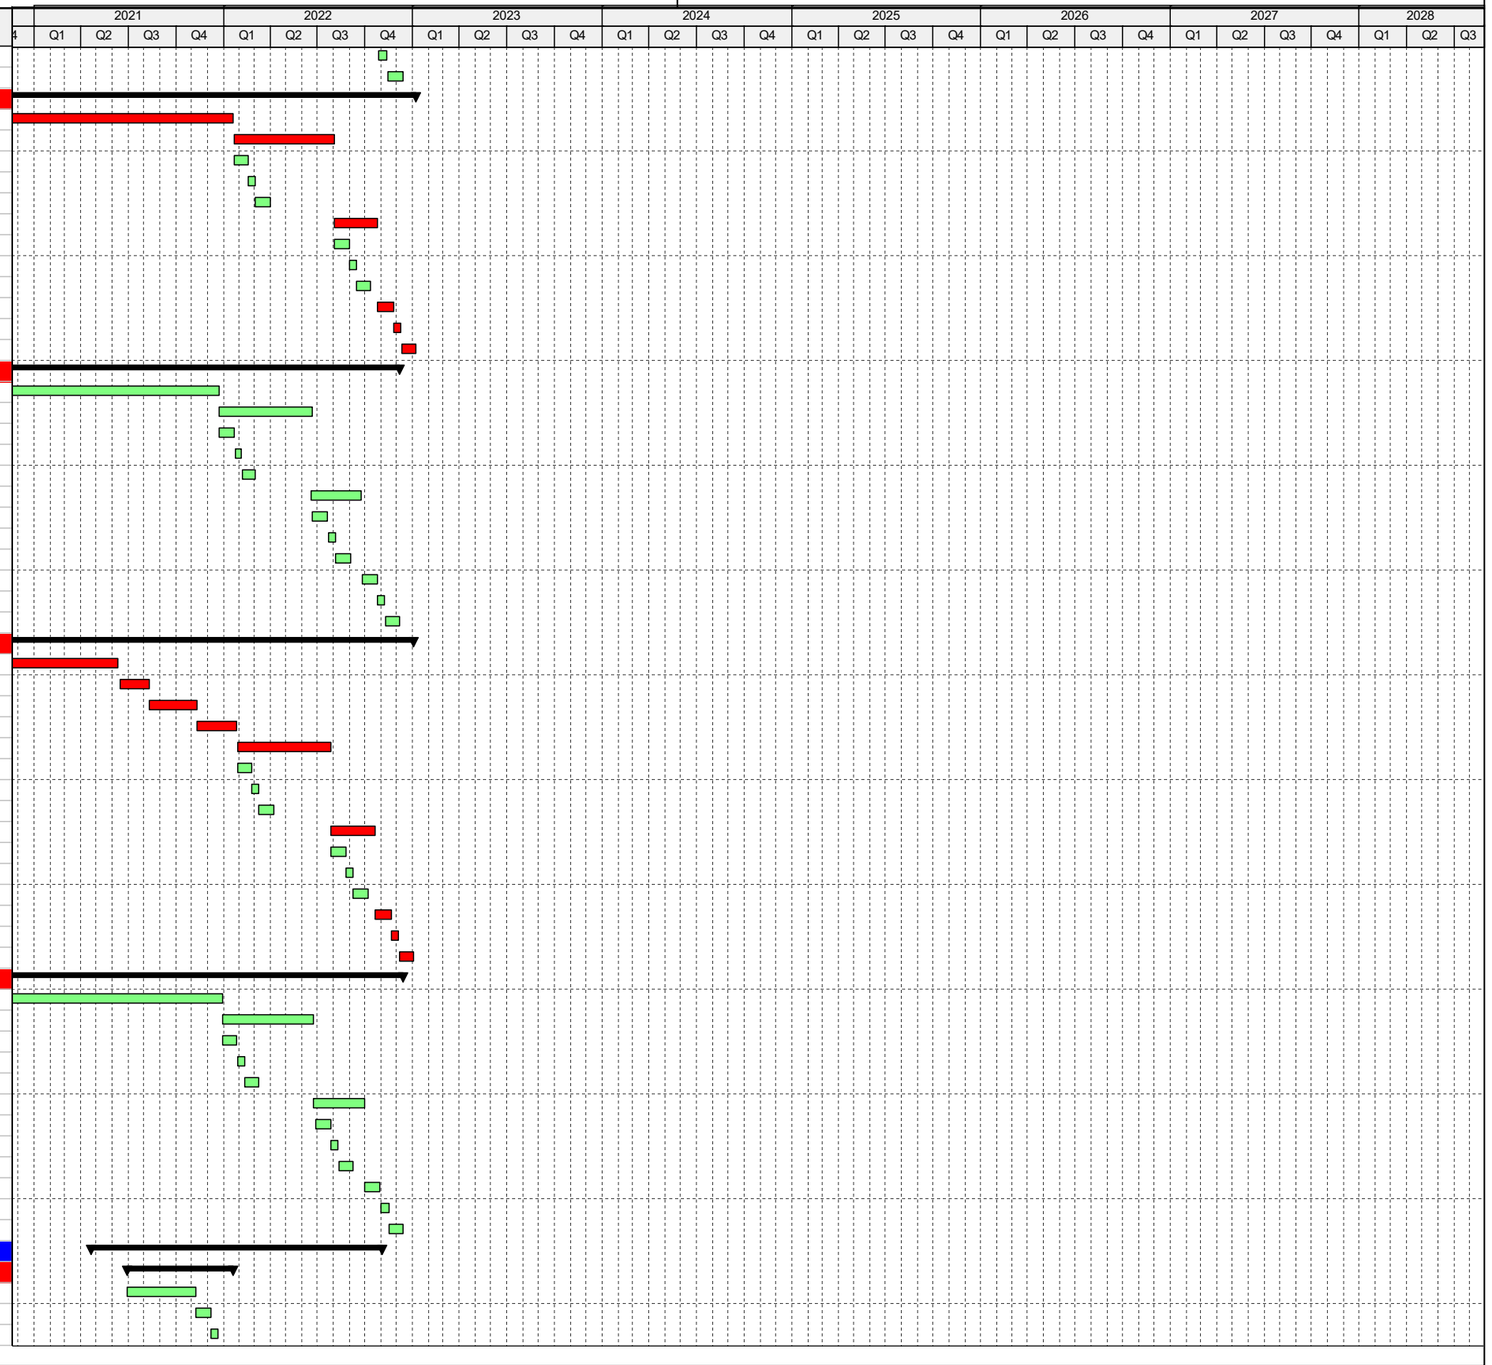


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-20370	Revisión de la interventoria R2	20	23-Dec-21	20-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.02 WF1(K0+000 - K3+642)		280	18-Aug-21	29-Sep-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.02.1 Redes Secas		180	18-Aug-21	05-May-22
P-10470	Elaboracion y entrega diseños Final	130	18-Aug-21	22-Feb-22
P-28580	Revisión de la interventoria R1	20	23-Feb-22	23-Mar-22
P-32500	Atencion de comentarios de Interventoria	10	24-Mar-22	06-Apr-22
P-35620	Revisión de la interventoria R2	20	07-Apr-22	05-May-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.02.2 Redes Humedas		280	18-Aug-21	29-Sep-22
P-10480	Elaboracion y entrega diseños	130	18-Aug-21	22-Feb-22
P-28590	Revisión de la interventoria R1	20	23-Feb-22	23-Mar-22
P-32510	Atencion de comentarios de Interventoria	10	24-Mar-22	06-Apr-22
P-35630	Revisión de la interventoria R2	20	07-Apr-22	05-May-22
P-40300	Revision por parte de EAAB de Diseños aprobados por Interventoria	60	06-May-22	03-Aug-22
P-50070	Revision por parte de DITG	60	06-Jul-22	29-Sep-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.03 WF2(K3+642 - K7+830)		160	18-Aug-21	06-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.03.1 Redes Secas		160	18-Aug-21	06-Apr-22
P-10490	Elaboracion y entrega diseños Final	110	18-Aug-21	25-Jan-22
P-24970	Revisión de la interventoria R1	20	26-Jan-22	22-Feb-22
P-28600	Atencion de comentarios de Interventoria	10	23-Feb-22	08-Mar-22
P-30340	Revisión de la interventoria R2	20	09-Mar-22	06-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.03.2 Redes Humedas		160	18-Aug-21	06-Apr-22
P-10500	Elaboracion y entrega diseños Final	110	18-Aug-21	25-Jan-22
P-24980	Revisión de la interventoria R1	20	26-Jan-22	22-Feb-22
P-28610	Atencion de comentarios de Interventoria	10	23-Feb-22	08-Mar-22
P-30350	Revisión de la interventoria R2	20	09-Mar-22	06-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.04 WF3(K7+830 - K12+033)		200	18-Aug-21	03-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.04.1 Redes Secas		200	18-Aug-21	03-Jun-22
P-10510	Elaboracion y entrega diseños Final	150	18-Aug-21	23-Mar-22
P-32520	Revisión de la interventoria R1	20	24-Mar-22	21-Apr-22
P-37460	Atencion de comentarios de Interventoria	10	22-Apr-22	05-May-22
P-40280	Revisión de la interventoria R2	20	06-May-22	03-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.04.2 Redes Humedas		200	18-Aug-21	03-Jun-22
P-10520	Elaboracion y entrega diseños Final	150	18-Aug-21	23-Mar-22
P-32530	Revisión de la interventoria R1	20	24-Mar-22	21-Apr-22
P-37470	Atencion de comentarios de Interventoria	10	22-Apr-22	05-May-22
P-40290	Revisión de la interventoria R2	20	06-May-22	03-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.05 WF4(K12+033 - K16+374)		160	18-Aug-21	06-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.05.1 Redes Secas		160	18-Aug-21	06-Apr-22
P-10530	Elaboracion y entrega diseños Final	110	18-Aug-21	25-Jan-22
P-24990	Revisión de la interventoria R1	20	26-Jan-22	22-Feb-22
P-28620	Atencion de comentarios de Interventoria	10	23-Feb-22	08-Mar-22
P-30360	Revisión de la interventoria R2	20	09-Mar-22	06-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.05.2 Redes Humedas		160	18-Aug-21	06-Apr-22
P-10540	Elaboracion y entrega diseños Final	110	18-Aug-21	25-Jan-22
P-25000	Revisión de la interventoria R1	20	26-Jan-22	22-Feb-22
P-28630	Atencion de comentarios de Interventoria	10	23-Feb-22	08-Mar-22
P-30370	Revisión de la interventoria R2	20	09-Mar-22	06-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.06 WF5(K16+374 - K19+830)		180	18-Aug-21	05-May-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.06.1 Redes Secas		180	18-Aug-21	05-May-22
P-10550	Elaboracion y entrega diseños Final	130	18-Aug-21	22-Feb-22
P-28640	Revisión de la interventoria R1	20	23-Feb-22	23-Mar-22
P-32540	Atencion de comentarios de Interventoria	10	24-Mar-22	06-Apr-22
P-35640	Revisión de la interventoria R2	20	07-Apr-22	05-May-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.06.2 Redes Humedas		180	18-Aug-21	05-May-22
P-10560	Elaboracion y entrega diseños Final	130	18-Aug-21	22-Feb-22
P-28650	Revisión de la interventoria R1	20	23-Feb-22	23-Mar-22
P-32550	Atencion de comentarios de Interventoria	10	24-Mar-22	06-Apr-22
P-35650	Revisión de la interventoria R2	20	07-Apr-22	05-May-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.07 WF6(K19+830 - K23+864)		160	18-Aug-21	06-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.07.1 Redes Secas		160	18-Aug-21	06-Apr-22
P-10570	Elaboracion y entrega diseños Final	110	18-Aug-21	25-Jan-22
P-25010	Revisión de la interventoria R1	20	26-Jan-22	22-Feb-22

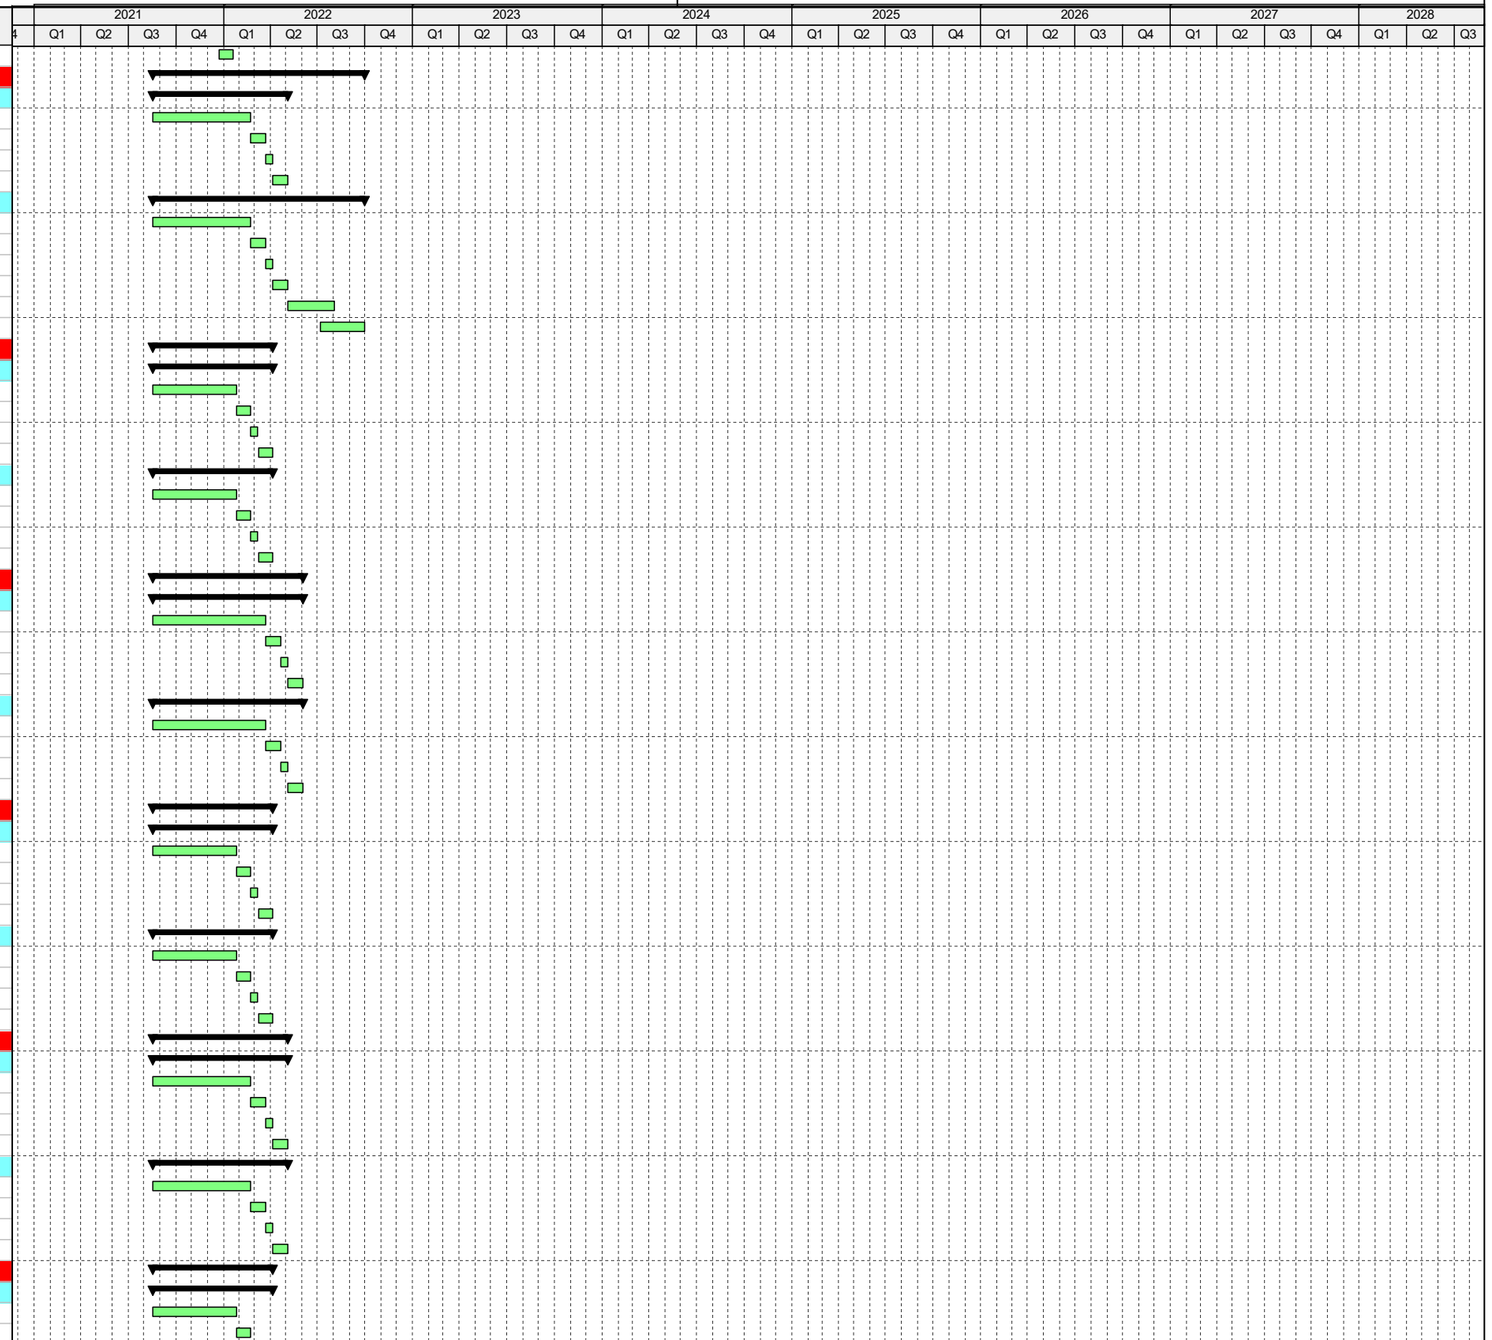


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-28660	Atencion de comentarios de Interventoria	10	23-Feb-22	08-Mar-22
P-30380	Revisión de la interventoria R2	20	09-Mar-22	06-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.07.2 Redes Humedas		160	18-Aug-21	06-Apr-22
P-10580	Elaboracion y entrega diseños Final	110	18-Aug-21	25-Jan-22
P-25020	Revisión de la interventoria R1	20	26-Jan-22	22-Feb-22
P-28670	Atencion de comentarios de Interventoria	10	23-Feb-22	08-Mar-22
P-30390	Revisión de la interventoria R2	20	09-Mar-22	06-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.08 REDES-Patio Taller		70	02-Jun-21	14-Sep-21
P-8110	Elaboracion y entrega diseños Final	21	02-Jun-21	02-Jul-21
P-8980	Revisión de la interventoria R1	20	02-Jul-21	02-Aug-21
P-10230	Atencion de comentarios de Interventoria	10	03-Aug-21	17-Aug-21
P-10450	Revisión de la interventoria R2	20	18-Aug-21	14-Sep-21
PLMB-T1-V04.1.03.10.09 REDES-Interseccion Especial Calle 72		79	20-Apr-21	13-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.03.10.09.1 Redes Secas		79	20-Apr-21	13-Aug-21
P-6820	Elaboracion y entrega diseños Final	30	20-Apr-21	01-Jun-21
P-8020	Revisión de la interventoria R1	20	01-Jun-21	30-Jun-21
P-8940	Atencion de comentarios de Interventoria	10	01-Jul-21	15-Jul-21
P-9230	Revisión de la interventoria R2	20	16-Jul-21	13-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.03.10.09.2 Redes Humedas		79	20-Apr-21	13-Aug-21
P-6830	Elaboracion y entrega diseños Final	30	20-Apr-21	01-Jun-21
P-8030	Revisión de la interventoria R1	20	01-Jun-21	30-Jun-21
P-8950	Atencion de comentarios de Interventoria	10	01-Jul-21	15-Jul-21
P-9240	Revisión de la interventoria R2	20	16-Jul-21	13-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.03.10.10 REDES-Interseccion Av68 x Av. 1 mayo		223	14-Dec-21	02-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.10.1 Redes Secas		223	14-Dec-21	02-Nov-22
P-19130	Elaboracion y entrega diseños Final	174	14-Dec-21	24-Aug-22
P-61250	Revisión de la interventoria R1	20	24-Aug-22	20-Sep-22
P-67620	Atencion de comentarios de Interventoria	10	21-Sep-22	04-Oct-22
P-69250	Revisión de la interventoria R2	20	05-Oct-22	02-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.10.10.2 Redes Humedas		79	14-Dec-21	05-Apr-22
P-19140	Elaboracion y entrega diseños Final	30	14-Dec-21	25-Jan-22
P-24760	Revisión de la interventoria R1	20	25-Jan-22	21-Feb-22
P-28540	Atencion de comentarios de Interventoria	10	22-Feb-22	07-Mar-22
P-30310	Revisión de la interventoria R2	20	08-Mar-22	05-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.03.11 SER		330	22-Jul-21	17-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.11.01 Patio Taller Subestaciones receptoras (SER)		330	22-Jul-21	17-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.11.01.1 Diseños Geotecnicos		110	22-Jul-21	29-Dec-21
P-9420	60%(Criterios de Diseño y Disposiciones Generales, Localización General,Estudio de S	60	22-Jul-21	14-Oct-21
P-13550	Revisión de la interventoria R1 60%	20	15-Oct-21	16-Nov-21
P-16640	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Nov-21	30-Nov-21
P-17690	Revisión de la interventoria R2 60%	20	01-Dec-21	29-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.03.11.01.2 Estructura estaciones		270	15-Oct-21	17-Nov-22
P-13560	60%(Drenajes,Cárcamos y ductos,Cimentaciones SER,Equipos inductivos)	120	15-Oct-21	08-Apr-22
P-35770	Revisión de la interventoria R1 60%	20	11-Apr-22	09-May-22
P-35790	90%(Disposición detalles de Drenajes,Cárcamos y ductos y Cimentaciones SER,Equip	50	11-Apr-22	21-Jun-22
P-40440	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	10-May-22	23-May-22
P-42550	Revisión de la interventoria R2 60%	20	24-May-22	21-Jun-22
P-46370	Revisión de la interventoria R1 90%	20	22-Jun-22	22-Jul-22
P-46380	Final 100%	50	22-Jun-22	05-Sep-22
P-52600	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	25-Jul-22	05-Aug-22
P-57810	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Aug-22	05-Sep-22
P-63650	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Sep-22	03-Oct-22
P-68740	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Oct-22	18-Oct-22
P-72470	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.11.01.3 Arquitectura intersecciones		270	15-Oct-21	17-Nov-22
P-13570	60%(Drenajes,Cárcamos y ductos,Cimentaciones SER,Equipos inductivos)	120	15-Oct-21	08-Apr-22
P-35800	Revisión de la interventoria R1 60%	20	11-Apr-22	09-May-22
P-35810	90%(Disposición detalles de Drenajes,Cárcamos y ductos y Cimentaciones SER,Equip	50	11-Apr-22	21-Jun-22
P-40450	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	10-May-22	23-May-22
P-42560	Revisión de la interventoria R2 60%	20	24-May-22	21-Jun-22
P-46390	Revisión de la interventoria R1 90%	20	22-Jun-22	22-Jul-22
P-46400	Final 100%	50	22-Jun-22	05-Sep-22

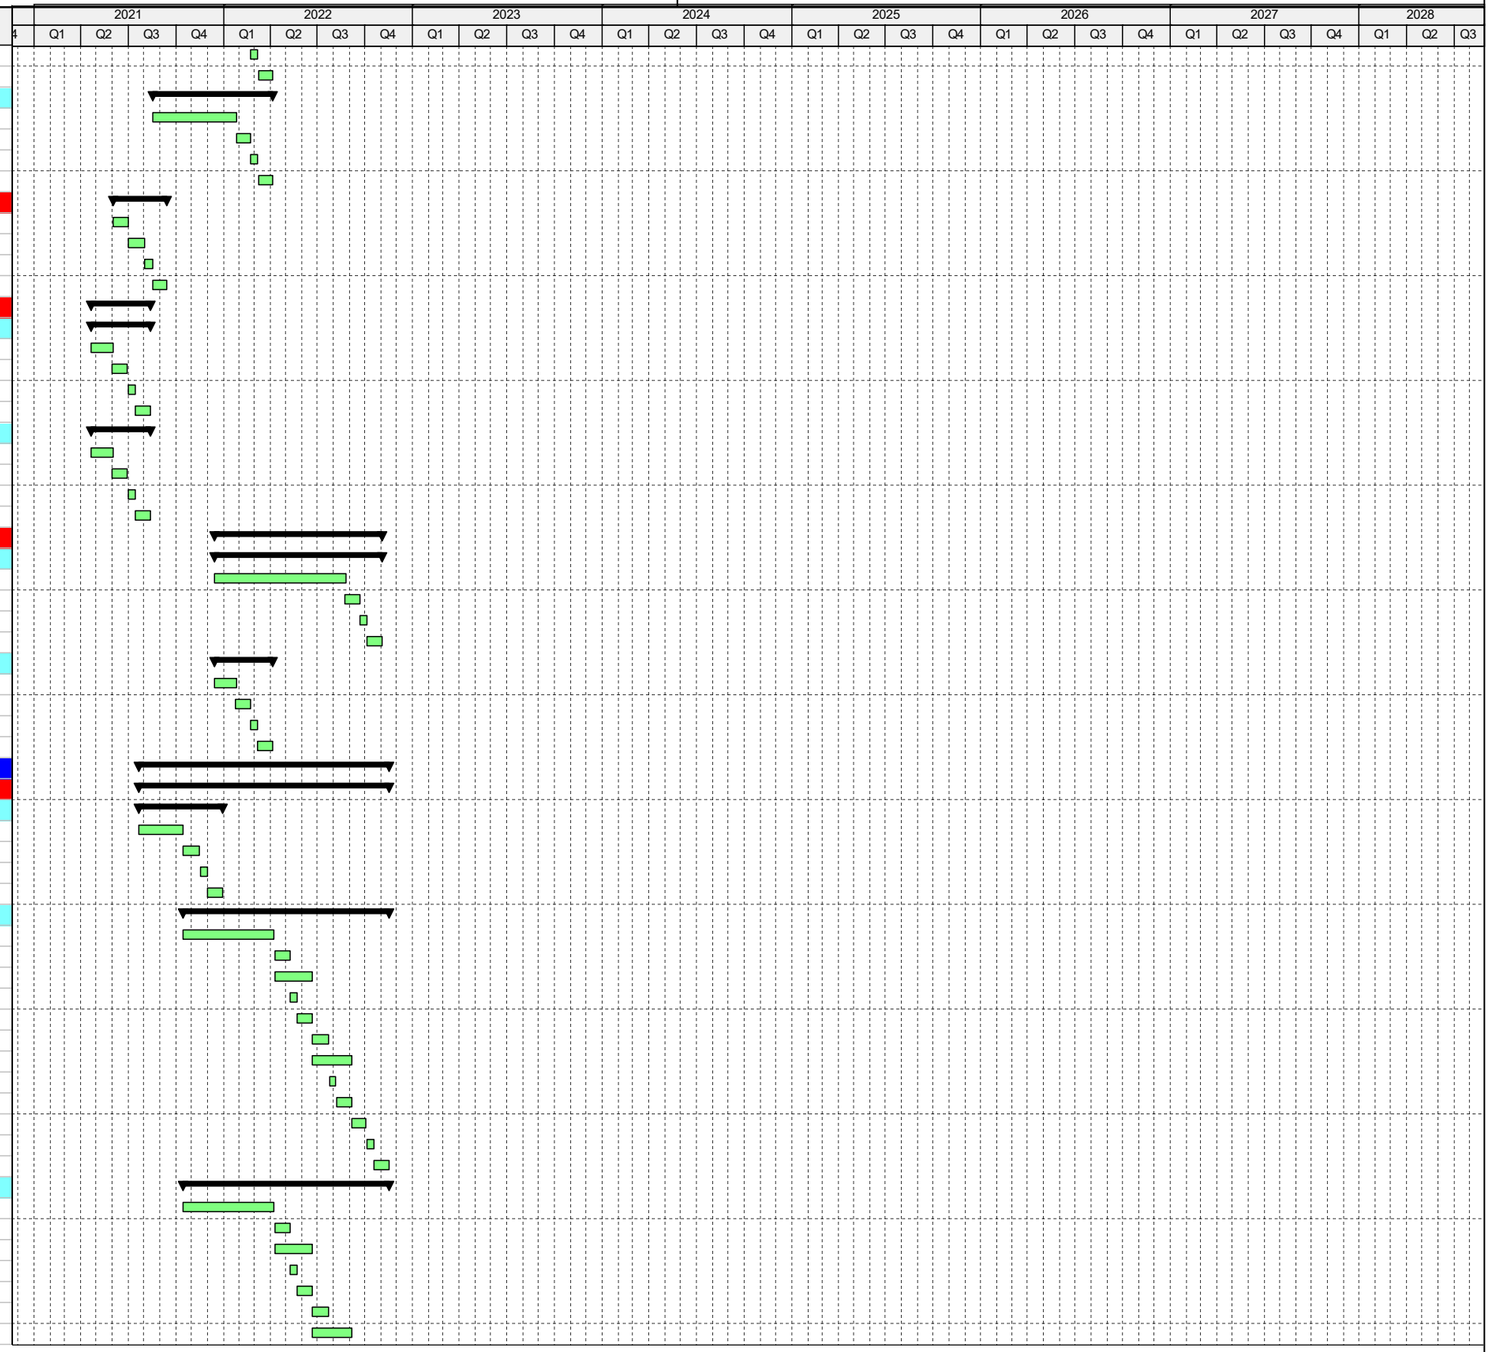

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-52610	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	25-Jul-22	05-Aug-22
P-57820	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Aug-22	05-Sep-22
P-63660	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Sep-22	03-Oct-22
P-68750	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Oct-22	18-Oct-22
P-72480	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.11.01.4 MEP		270	15-Oct-21	17-Nov-22
P-13580	60%(Drenajes,Cárcamos y ductos,Cimentaciones SER,Equipos inductivos)	120	15-Oct-21	08-Apr-22
P-35820	Revisión de la interventoria R1 60%	20	11-Apr-22	09-May-22
P-35830	90%(Disposición detalles de Drenajes,Cárcamos y ductos y Cimentaciones SER,Equip	50	11-Apr-22	21-Jun-22
P-40460	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	10-May-22	23-May-22
P-42570	Revisión de la interventoria R2 60%	20	24-May-22	21-Jun-22
P-46410	Revisión de la interventoria R1 90%	20	22-Jun-22	22-Jul-22
P-46420	Final 100%	50	22-Jun-22	05-Sep-22
P-52620	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	25-Jul-22	05-Aug-22
P-57830	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Aug-22	05-Sep-22
P-63670	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Sep-22	03-Oct-22
P-68760	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Oct-22	18-Oct-22
P-72490	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.11.02 Calle 1 (SER)		330	22-Jul-21	17-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.11.02.1 Diseños Geotecnicos		110	22-Jul-21	29-Dec-21
P-9440	60%(Criterios de Diseño y Disposiciones Generales, Localización General,Estudio de S	60	22-Jul-21	14-Oct-21
P-13650	Revisión de la interventoria R1 60%	20	15-Oct-21	16-Nov-21
P-16650	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Nov-21	30-Nov-21
P-17700	Revisión de la interventoria R2 60%	20	01-Dec-21	29-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.03.11.02.2 Estructura estaciones		270	15-Oct-21	17-Nov-22
P-13590	60%(Drenajes,Cárcamos y ductos,Cimentaciones SER,Equipos inductivos)	120	15-Oct-21	08-Apr-22
P-35840	Revisión de la interventoria R1 60%	20	11-Apr-22	09-May-22
P-35850	90%(Disposición detalles de Drenajes,Cárcamos y ductos y Cimentaciones SER,Equip	50	11-Apr-22	21-Jun-22
P-40470	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	10-May-22	23-May-22
P-42580	Revisión de la interventoria R2 60%	20	24-May-22	21-Jun-22
P-46430	Revisión de la interventoria R1 90%	20	22-Jun-22	22-Jul-22
P-46440	Final 100%	50	22-Jun-22	05-Sep-22
P-52630	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	25-Jul-22	05-Aug-22
P-57840	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Aug-22	05-Sep-22
P-63680	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Sep-22	03-Oct-22
P-68770	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Oct-22	18-Oct-22
P-72500	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.11.02.3 Arquitectura intersecciones		270	15-Oct-21	17-Nov-22
P-13600	60%(Drenajes,Cárcamos y ductos,Cimentaciones SER,Equipos inductivos)	120	15-Oct-21	08-Apr-22
P-35860	Revisión de la interventoria R1 60%	20	11-Apr-22	09-May-22
P-35870	90%(Disposición detalles de Drenajes,Cárcamos y ductos y Cimentaciones SER,Equip	50	11-Apr-22	21-Jun-22
P-40480	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	10-May-22	23-May-22
P-42590	Revisión de la interventoria R2 60%	20	24-May-22	21-Jun-22
P-46450	Revisión de la interventoria R1 90%	20	22-Jun-22	22-Jul-22
P-46460	Final 100%	50	22-Jun-22	05-Sep-22
P-52640	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	25-Jul-22	05-Aug-22
P-57850	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Aug-22	05-Sep-22
P-63690	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Sep-22	03-Oct-22
P-68780	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Oct-22	18-Oct-22
P-72510	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.11.02.4 MEP		270	15-Oct-21	17-Nov-22
P-13610	60%(Drenajes,Cárcamos y ductos,Cimentaciones SER,Equipos inductivos)	120	15-Oct-21	08-Apr-22
P-35880	Revisión de la interventoria R1 60%	20	11-Apr-22	09-May-22
P-35890	90%(Disposición detalles de Drenajes,Cárcamos y ductos y Cimentaciones SER,Equip	50	11-Apr-22	21-Jun-22
P-40490	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	10-May-22	23-May-22
P-42600	Revisión de la interventoria R2 60%	20	24-May-22	21-Jun-22
P-46470	Revisión de la interventoria R1 90%	20	22-Jun-22	22-Jul-22
P-46480	Final 100%	50	22-Jun-22	05-Sep-22
P-52650	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	25-Jul-22	05-Aug-22
P-57860	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Aug-22	05-Sep-22
P-63700	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Sep-22	03-Oct-22
P-68790	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Oct-22	18-Oct-22

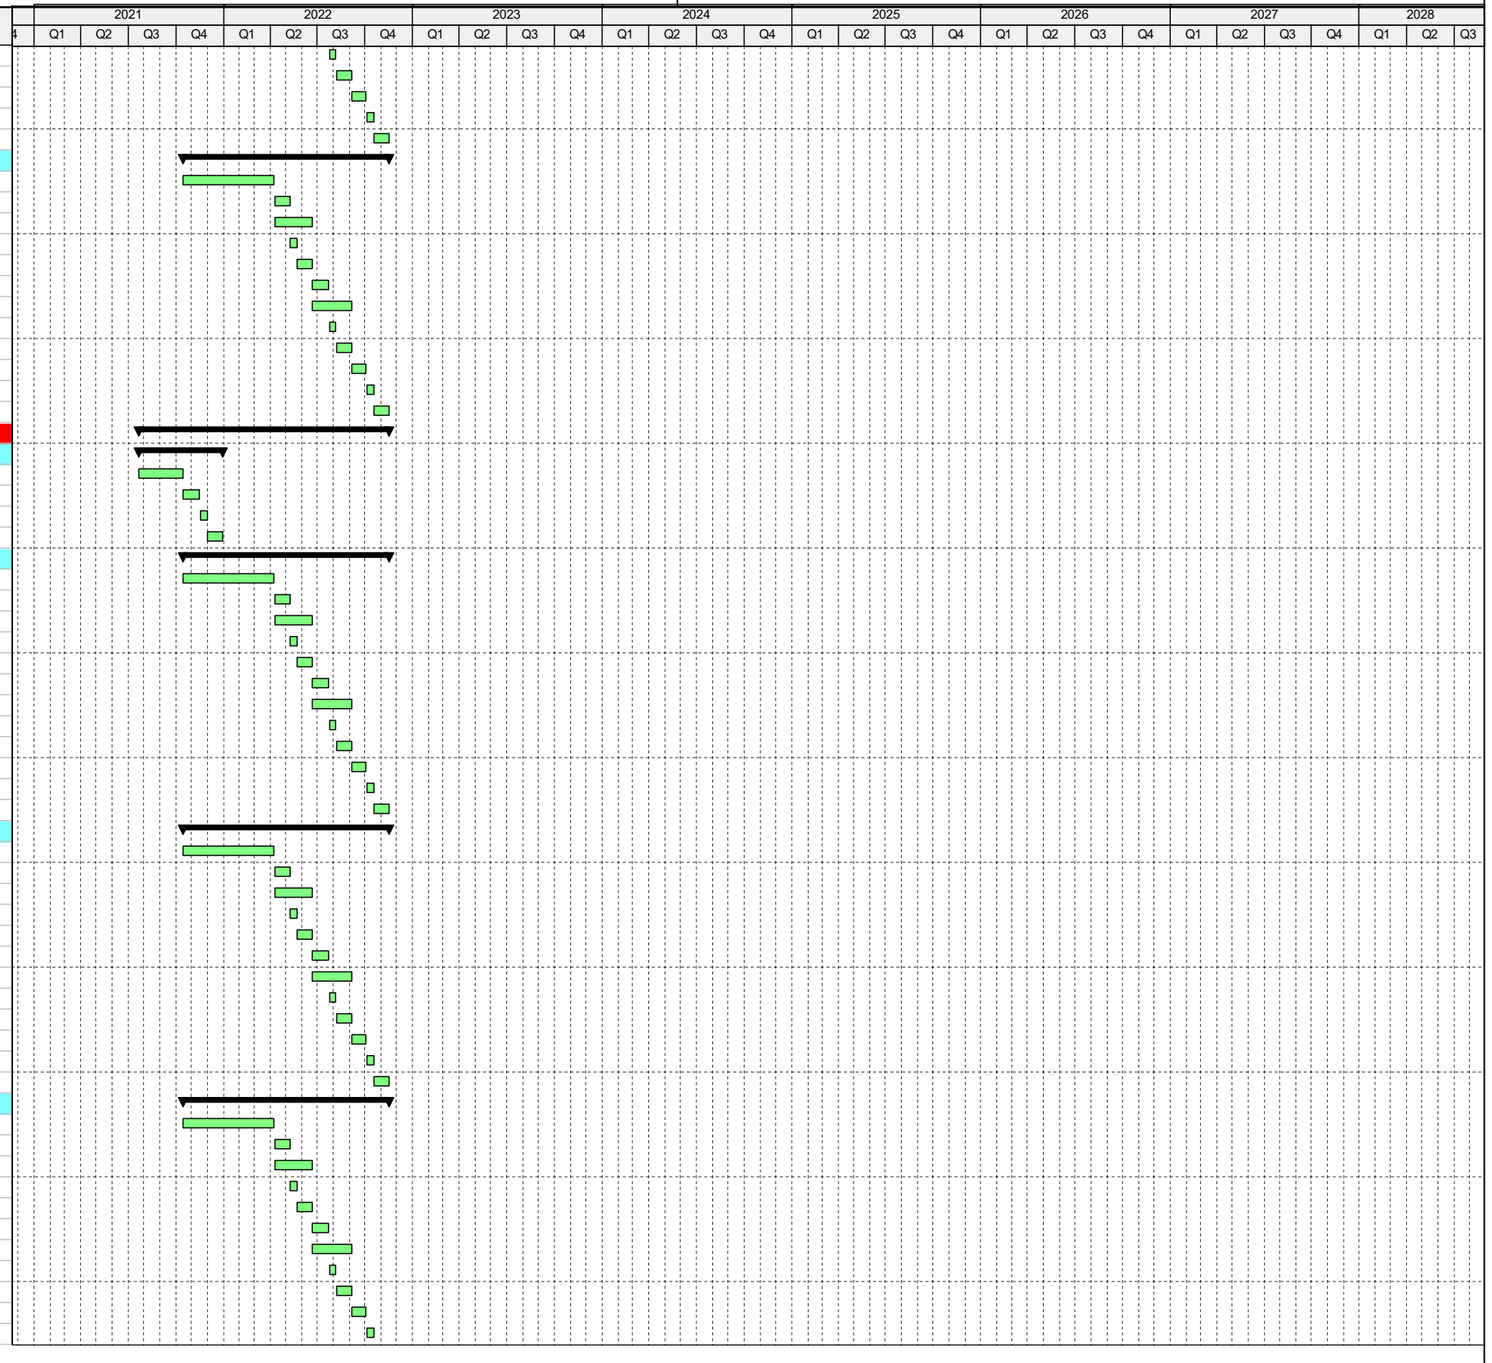


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-72520	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.11.03 Estación 15 - (E15) - Calle 63 Subestaciones receptoras (SER)		330	22-Jul-21	17-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.11.03.1 Diseños Geotecnicos		110	22-Jul-21	29-Dec-21
P-9450	60%(Criterios de Diseño y Disposiciones Generales, Localización General,Estudio de S	60	22-Jul-21	14-Oct-21
P-13660	Revisión de la interventoria R1 60%	20	15-Oct-21	16-Nov-21
P-16660	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	17-Nov-21	30-Nov-21
P-17710	Revisión de la interventoria R2 60%	20	01-Dec-21	29-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.03.11.03.2 Estructura estaciones		270	15-Oct-21	17-Nov-22
P-13620	60%(Drenajes,Cárcamos y ductos,Cimentaciones SER,Equipos inductivos)	120	15-Oct-21	08-Apr-22
P-35900	Revisión de la interventoria R1 60%	20	11-Apr-22	09-May-22
P-35910	90%(Disposición detalles de Drenajes,Cárcamos y ductos y Cimentaciones SER,Equip	50	11-Apr-22	21-Jun-22
P-40500	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	10-May-22	23-May-22
P-42610	Revisión de la interventoria R2 60%	20	24-May-22	21-Jun-22
P-46490	Revisión de la interventoria R1 90%	20	22-Jun-22	22-Jul-22
P-46500	Final 100%	50	22-Jun-22	05-Sep-22
P-52660	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	25-Jul-22	05-Aug-22
P-57870	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Aug-22	05-Sep-22
P-63710	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Sep-22	03-Oct-22
P-68800	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Oct-22	18-Oct-22
P-72530	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.11.03.3 Arquitectura intersecciones		270	15-Oct-21	17-Nov-22
P-13630	60%(Drenajes,Cárcamos y ductos,Cimentaciones SER,Equipos inductivos)	120	15-Oct-21	08-Apr-22
P-35920	Revisión de la interventoria R1 60%	20	11-Apr-22	09-May-22
P-35930	90%(Disposición detalles de Drenajes,Cárcamos y ductos y Cimentaciones SER,Equip	50	11-Apr-22	21-Jun-22
P-40510	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	10-May-22	23-May-22
P-42620	Revisión de la interventoria R2 60%	20	24-May-22	21-Jun-22
P-46510	Revisión de la interventoria R1 90%	20	22-Jun-22	22-Jul-22
P-46520	Final 100%	50	22-Jun-22	05-Sep-22
P-52670	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	25-Jul-22	05-Aug-22
P-57880	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Aug-22	05-Sep-22
P-63720	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Sep-22	03-Oct-22
P-68810	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Oct-22	18-Oct-22
P-72540	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.11.03.4 MEP		270	15-Oct-21	17-Nov-22
P-13640	60%(Drenajes,Cárcamos y ductos,Cimentaciones SER,Equipos inductivos)	120	15-Oct-21	08-Apr-22
P-35940	Revisión de la interventoria R1 60%	20	11-Apr-22	09-May-22
P-35950	90%(Disposición detalles de Drenajes,Cárcamos y ductos y Cimentaciones SER,Equip	50	11-Apr-22	21-Jun-22
P-40520	Atencion de comentarios de Interventoria 60%	10	10-May-22	23-May-22
P-42630	Revisión de la interventoria R2 60%	20	24-May-22	21-Jun-22
P-46530	Revisión de la interventoria R1 90%	20	22-Jun-22	22-Jul-22
P-46540	Final 100%	50	22-Jun-22	05-Sep-22
P-52680	Atencion de comentarios de Interventoria 90%	10	25-Jul-22	05-Aug-22
P-57890	Revisión de la interventoria R2 90%	20	08-Aug-22	05-Sep-22
P-63730	Revisión de la interventoria R1 100%	20	06-Sep-22	03-Oct-22
P-68820	Atencion de comentarios de Interventoria 100%	10	04-Oct-22	18-Oct-22
P-72550	Revisión de la interventoria R2 100%	20	19-Oct-22	17-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.12 BIM		543	20-Oct-20	30-Dec-22
P-1640	Estandarizacion y Pre-configuracion componentes BIM	10	20-Oct-20	03-Nov-20
P-1980	Desarrollo del Plan de Ejecución BIM (PEB)	23	04-Nov-20	07-Dec-20
P-2730	Revisión de la Interventoría R1 del PEB	42	09-Dec-20	09-Feb-21
P-2910	Configuración y pruebas comunes del entorno de datos	60	31-Dec-20	29-Mar-21
P-3460	Atención de comentarios R1 del PEB	18	09-Feb-21	04-Mar-21
P-3790	Revisión de la Interventoría R2 del PEB	15	05-Mar-21	26-Mar-21
P-4460	Atención de comentarios R2 del PEB	15	29-Mar-21	20-Apr-21
PLMB-T1-V04.1.03.12.1 VIADUCTO		358	26-May-21	02-Nov-22
P-7640	QAQC Modelos 60%	214	26-May-21	05-Apr-22
P-27330	QAQC Modelos 90%	150	14-Feb-22	20-Sep-22
P-46600	QAQC Modelos 100%	90	23-Jun-22	02-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.12.2 CORREDOR PRINCIPAL		376	13-Apr-21	14-Oct-22
P-5700	QAQC Modelos 60%	220	13-Apr-21	01-Mar-22
P-13900	QAQC Modelos 90%	180	29-Oct-21	21-Jul-22
P-22840	QAQC Modelos 100%	190	13-Jan-22	14-Oct-22

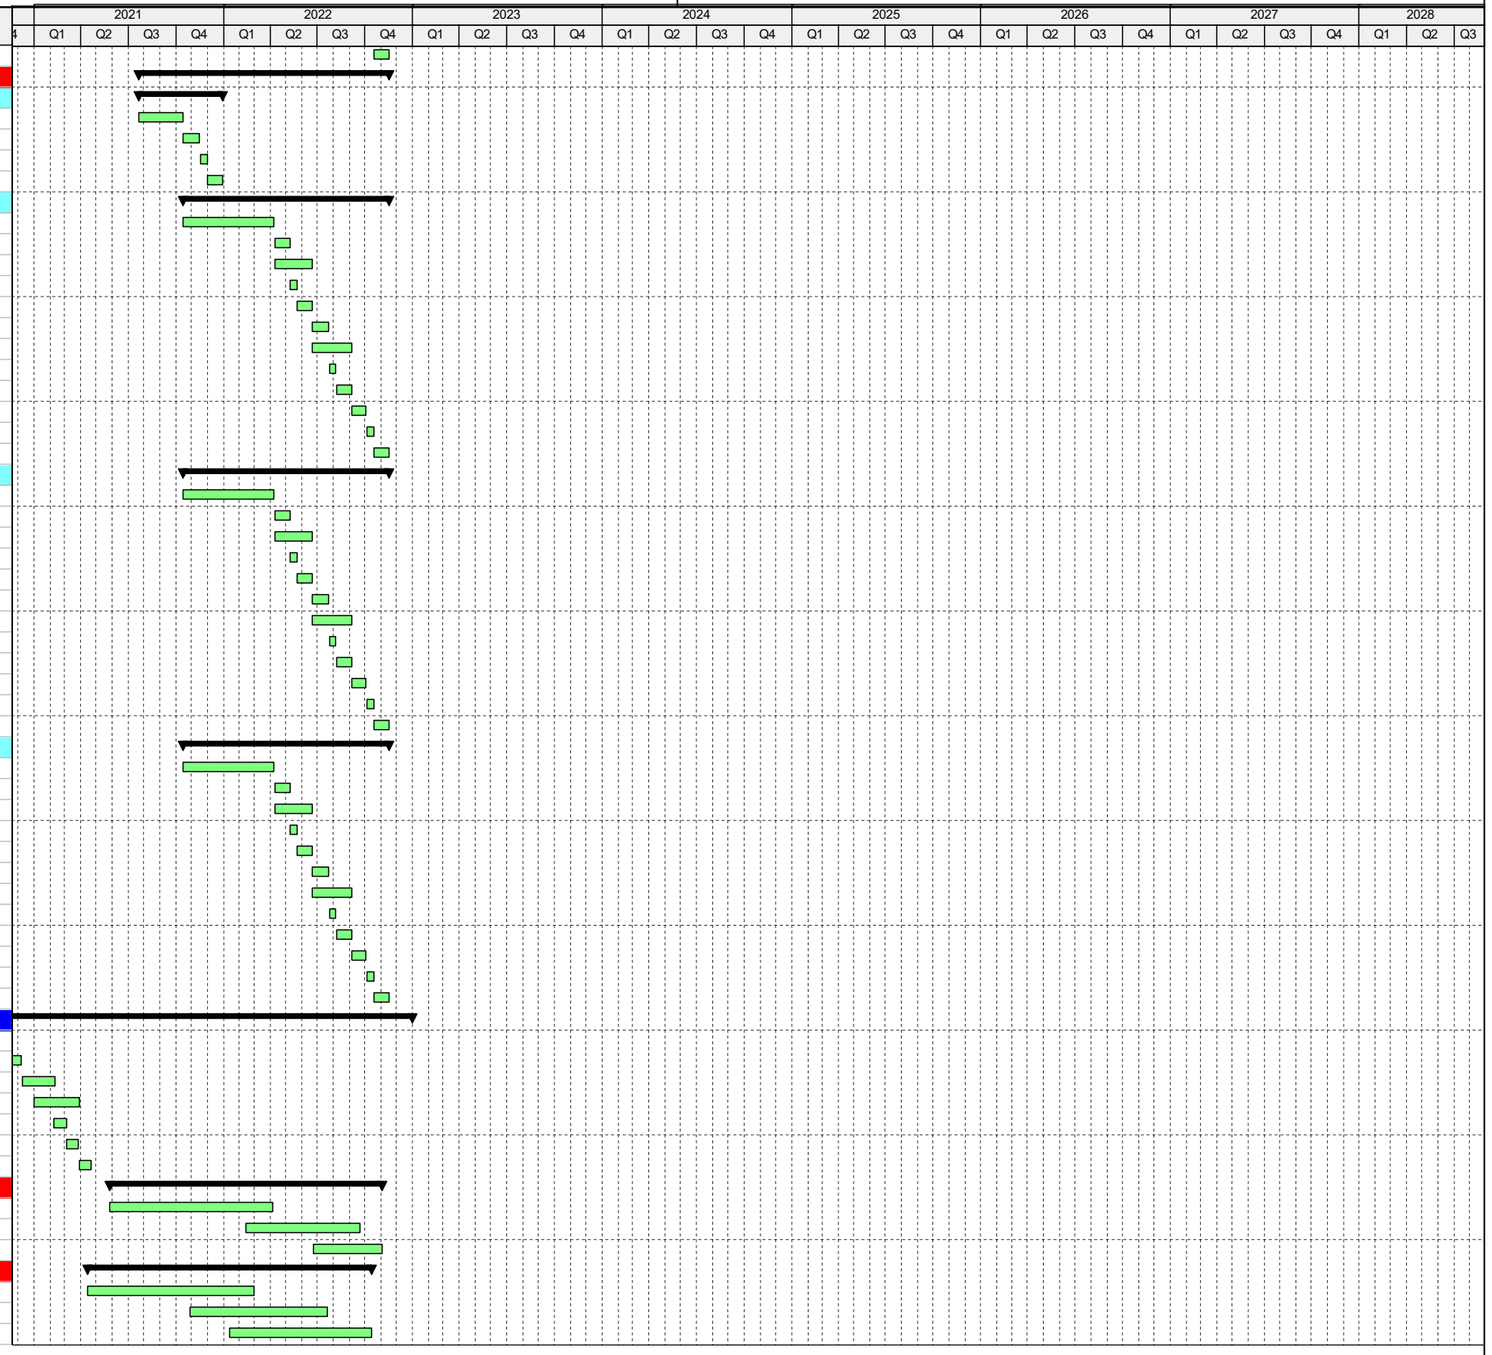


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.1.03.12.3	Especial INTERSECCIONES	401	03-Feb-21	15-Sep-22
P-3350	QAQC Modelos 60%	270	03-Feb-21	07-Mar-22
P-24770	QAQC Modelos 90%	115	26-Jan-22	12-Jul-22
P-46220	QAQC Modelos 100%	60	20-Jun-22	15-Sep-22
PLMB-T1-V04.1.03.12.4	ESTACIÓN DE METRO (16)	391	13-Apr-21	08-Nov-22
P-5710	QAQC Modelos 60%	330	13-Apr-21	10-Aug-22
P-11170	QAQC Modelos 90%	250	27-Sep-21	27-Sep-22
P-26530	QAQC Modelos 100%	185	10-Feb-22	08-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.12.5	BRT Estación S (13)	398	29-Mar-21	03-Nov-22
P-4180	QAQC Modelos 60%	210	29-Mar-21	02-Feb-22
P-11740	QAQC Modelos 90%	210	06-Oct-21	10-Aug-22
P-14190	QAQC Modelos 100%	249	05-Nov-21	03-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.12.6	PATIO TALLER	391	03-Mar-21	29-Sep-22
P-3730	QAQC Modelos 60%	200	03-Mar-21	24-Dec-21
P-10720	QAQC Modelos 90%	200	01-Sep-21	17-Jun-22
P-20490	QAQC Modelos 100%	190	28-Dec-21	29-Sep-22
PLMB-T1-V04.1.03.12.7	SISTEMAS Y EQUIPOS	488	09-Nov-20	28-Oct-22
P-2000	QAQC Modelos 60%	300	09-Nov-20	27-Jan-22
P-24630	QAQC Modelos 90%	130	21-Jan-22	29-Jul-22
P-52210	QAQC Modelos 100%	70	21-Jul-22	28-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.03.12.8	REDES	180	18-Aug-21	05-May-22
P-10440	QAQC Modelos 60%	180	18-Aug-21	05-May-22
PLMB-T1-V04.1.03.12.9	SER	300	15-Oct-21	30-Dec-22
P-13540	QAQC Modelos 60%	210	15-Oct-21	22-Aug-22
P-35780	QAQC Modelos 90%	150	11-Apr-22	17-Nov-22
P-46550	QAQC Modelos 100%	130	22-Jun-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.03.13	TRÁNSITO	756	20-Oct-20	14-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.13.01	Plan de cierres y alternativas de desvios	405	20-Oct-20	29-Nov-21
P-1260	Metodología para toma de informacion y definición de línea de base envio a Interventc	20	20-Oct-20	09-Nov-20
P-1990	Metodología para toma de informacion y definición de línea de base Revision y comer	20	09-Nov-20	29-Nov-20
P-2660	Metodología para toma de informacion y definición de línea de base, ajustes y envio a	6	29-Nov-20	05-Dec-20
P-2680	Metodología para toma de informacion y definición de linea base, revision y comentari	30	05-Dec-20	04-Jan-21
P-2920	Metodología para toma de informacion y definición de línea de base, ajustes y envio a	15	04-Jan-21	19-Jan-21
P-3130	Definicion linea base, preparar y enviar a interventoria	60	19-Jan-21	20-Mar-21
P-3970	Definición de línea de base Revision y comentarios de la Interventoria	20	20-Mar-21	09-Apr-21
P-5640	Definición de línea de base, ajustes y envio a interventoria(No objecion) y a SDM	10	09-Apr-21	19-Apr-21
P-6730	Definición de línea de base, revision y comentarios SDM	30	19-Apr-21	19-May-21
P-7610	Definición de línea de base, revision y ajustes y envio aprobacion SDM	19	19-May-21	07-Jun-21
P-8170	Plan de cierre y alternativas de desvios: preparar y enviar a Interventoria	10	07-Jun-21	17-Jun-21
P-8470	Plan de cierres y alternativas de desvios: revisión y comentario de interventoria	20	17-Jun-21	07-Jul-21
P-9070	Plan de cierres y alternativas de desvios: ajustes y envios a interventoria(No objecion) y	15	07-Jul-21	22-Jul-21
P-9360	Plan de cierres y alternativas de desvios: revision y comentarios de Transmilenio	30	22-Jul-21	21-Aug-21
P-10610	Plan de cierres y alternativas de desvios: ajustes y envios a Transmilenio y a SDM	55	21-Aug-21	15-Oct-21
P-13500	Plan de cierres y alternativas de desvios: revision y comentarios SDM	30	15-Oct-21	14-Nov-21
P-16480	Plan de cierres y alternativas de desvios: ajustes y envio aprobacion SDM	15	14-Nov-21	29-Nov-21
PLMB-T1-V04.1.03.13.02	Estudio de Transito PLMB-T1	420	20-Oct-20	14-Dec-21
P-1270	Metodología del Estudio de Transito, preparar y presentar a interventoria	91	20-Oct-20	19-Jan-21
P-3140	Metodología del Estudio de Transito, revision y comentarios interventoria	20	19-Jan-21	08-Feb-21
P-3430	Metodología del Estudio de Transito, ajustes y envios a interventoria(No objecion) y a S	15	08-Feb-21	23-Feb-21
P-3600	Metodología del Estudio de Transito, revision y comentarios SDM	30	23-Feb-21	25-Mar-21
P-4040	Metodología del Estudio de Transito, ajustes y envio a aprobacion SDM	15	25-Mar-21	09-Apr-21
P-5630	Definición de área de influencia directa, preparar y enviar a interventoria	10	09-Apr-21	19-Apr-21
P-6740	Definición de área de influencia directa, revision y comentarios interventoria	20	19-Apr-21	09-May-21
P-7200	Definición de área de influencia directa, ajustes y envio a interventoria(No objecion) y a	39	09-May-21	17-Jun-21
P-8480	Definición de área de influencia directa, revision y comentarios SDM	30	17-Jun-21	17-Jul-21
P-9270	Definición de área de influencia directa, ajsutes y envio aprobacion SDM	15	17-Jul-21	01-Aug-21
P-10190	Estudio de transito elaboracion y envio a interventoria	15	01-Aug-21	16-Aug-21
P-10410	Estudio de transito, revision y comentarios interventoria	20	16-Aug-21	05-Sep-21
P-11000	Estudio de transito, ajustes y envio a interventoria	40	05-Sep-21	15-Oct-21
P-13510	Estudio de transito, revision y comentarios SDM	30	15-Oct-21	14-Nov-21
P-16490	Estudio de transito, ajustes y envio aprobacion SDM	30	14-Nov-21	14-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.03.13.03	Diseño de señalizacion y semaforizacion PLMB	195	17-Jul-21	28-Jan-22

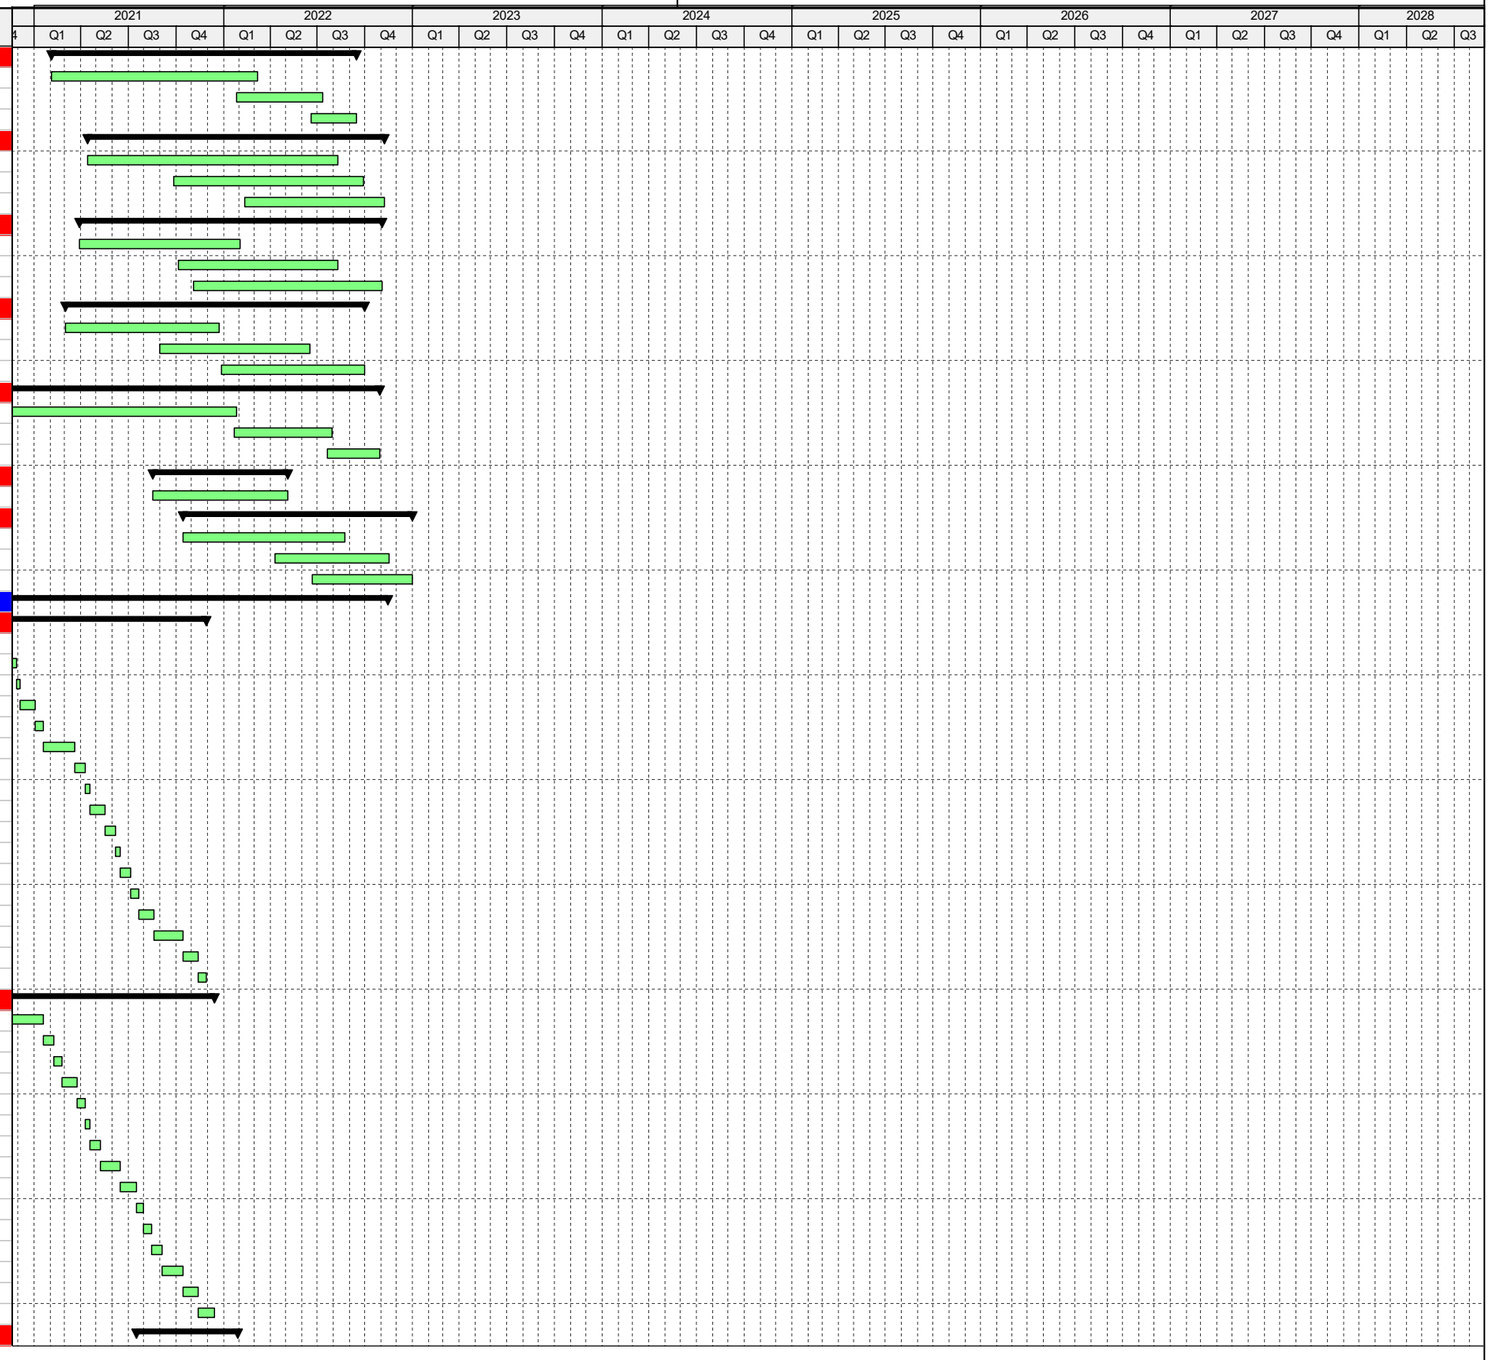


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-9290	Elaboracion y entrega del diseño de señalizacion y semaforizacion a interventoria 60%	60	17-Jul-21	15-Sep-21
P-11070	Revisión de la interventoria y auditoria R1 60%	30	15-Sep-21	15-Oct-21
P-13520	Ajustes de comentarios y envio Interventoria y auditoria 60%	15	15-Oct-21	30-Oct-21
P-14050	Revisión de la interventoria y auditoria R2 60%	30	30-Oct-21	29-Nov-21
P-17380	Ajustes y envios a interventoria (No objecion) y a SDM 90%	15	29-Nov-21	14-Dec-21
P-19110	Revision y comentarios SDM 90%	30	14-Dec-21	13-Jan-22
P-22830	Ajustes y envio a aprobacion SDM	15	13-Jan-22	28-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.03.13.04 Estudio de Transito Interseccion Deprimido Calle 72		233	20-Oct-20	09-Jun-21
P-1290	Metodología del Estudio de Transito, preparar y presentar a interventoria	2	20-Oct-20	21-Oct-20
P-1920	Metodología del Estudio de Transito, revision y comentarios interventoria	12	21-Oct-20	02-Nov-20
P-1950	Metodología del Estudio de Transito, ajustes y envios a interventoria(No objecion)	18	02-Nov-20	20-Nov-20
P-2620	Metodologia Estudio Transito, revisión y No objeción Interventoria	6	20-Nov-20	26-Nov-20
P-2630	Metodologia Estudio Transito envio SDM	1	26-Nov-20	27-Nov-20
P-2640	Metodologia Estudio Transito revisión y aprobación SDM	48	27-Nov-20	14-Jan-21
P-2650	Estudio de Transito, preparar y presentar a interventoria	27	27-Nov-20	24-Dec-20
P-2870	Estudio de Transito, revision y comentarios interventoria	22	24-Dec-20	15-Jan-21
P-3070	Estudio de Transito, ajustes y envios a interventoria	14	15-Jan-21	29-Jan-21
P-3280	Estudio de Transito, revision de la interventoria	33	29-Jan-21	03-Mar-21
P-3750	Estudio de Transito, ajustes de comentarios y envio a interventoria	20	03-Mar-21	23-Mar-21
P-4000	Estudio de Transito, revision de la interventoria	20	23-Mar-21	12-Apr-21
P-5690	Estudio de Transito, ajustes de comentarios y envio a interventoria	7	12-Apr-21	19-Apr-21
P-6770	Estudio de Transito, revision y no objecion de la Interventoria	10	19-Apr-21	29-Apr-21
P-6960	Estudio de Transito, envio SDM	1	29-Apr-21	30-Apr-21
P-6970	EstudioTransito revisión y comentarios SDM	30	30-Apr-21	30-May-21
P-7850	Estudio Transito ajustes y envio a SDM	5	30-May-21	04-Jun-21
P-8160	Estudio Transito revisión y aprobación SDM	5	04-Jun-21	09-Jun-21
PLMB-T1-V04.1.03.13.05 Diseño de señalizacion y semaforizacion Interseccion Deprimiso Calle 72		145	15-Jan-21	09-Jun-21
P-3080	Elaboracion y entrega del diseño de señalizacion y semaforizacion a interventoria 60%	41	15-Jan-21	25-Feb-21
P-3650	Revisión de la interventoria y auditoria R1 60%	30	25-Feb-21	27-Mar-21
P-4150	Ajustes de comentarios y envio Interventoria y auditoria 60%	7	27-Mar-21	03-Apr-21
P-4540	Revisión de la interventoria y auditoria R2 60%	20	03-Apr-21	23-Apr-21
P-6900	Ajustes y envios a interventoria (No objecion) y a SDM 90%	7	23-Apr-21	30-Apr-21
P-6980	Revision y comentarios SDM 90%	30	30-Apr-21	30-May-21
P-7860	Ajustes y envio a aprobacion SDM	10	30-May-21	09-Jun-21
PLMB-T1-V04.1.03.13.06 Plan manejo de transito Interseccion Deprimido Calle 72		248	01-Feb-21	07-Oct-21
P-8040	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)para subterraneo de la calle 72 - informe y envio a In	204	01-Feb-21	24-Aug-21
P-3420	Metodología (PMT)para subterraneo de la calle 72 - informe y envio a Interventoria	31	07-Feb-21	10-Mar-21
P-3800	Metodología (PMT) para subterraneo de la calle 72 - revision y No Objeción de Interver	65	10-Mar-21	14-May-21
P-3810	Linea Base (PMT)para subterraneo de la calle 72 - informe y envio a Interventoria	28	10-Mar-21	07-Apr-21
P-5600	Linea Base (PMT) para subterraneo de la calle 72 - revision y No Objeción de Intervent	55	07-Apr-21	01-Jun-21
P-6875	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)para subterraneo de la calle 72 - informe y envio a In	15	07-Apr-21	22-Apr-21
P-6880	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para subterraneo de la calle 72 - revision y No Objet	10	22-Apr-21	02-May-21
P-6950	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para subterraneo de la calle 72 - revisión y aprobac	44	02-May-21	15-Jun-21
P-3900	Metodología (PMT) para subterraneo de la calle 72 - revisión y aprobación de SDM	70	14-May-21	23-Jul-21
P-6570	Linea Base (PMT) para subterraneo de la calle 72 - revision y comentarios de SDM	45	01-Jun-21	16-Jul-21
P-83730	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para subterraneo de la calle 72 - revision y No Objet	14	24-Aug-21	07-Sep-21
P-83770	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para subterraneo de la calle 72 - revisión y aprobac	30	07-Sep-21	07-Oct-21
PLMB-T1-V04.1.03.13.07 Plan manejo de tránsito Patio Taller		214	20-Oct-20	22-May-21
P-1280	Plan de gestión del tráfico (PMT) para patio y talleres: licitación / asignación	90	20-Oct-20	18-Jan-21
P-3120	Plan de manejo de transito (PMT) para patio y talleres - informe y envio a Interventoria	20	18-Jan-21	07-Feb-21
P-3410	Plan de manejo de transito (PMT) para patio y talleres - revision y comentarios de Inter	20	07-Feb-21	27-Feb-21
P-3660	Plan de manejo de transito (PMT) para patio y talleres - ajustes y envio a Interventoria	24	27-Feb-21	23-Mar-21
P-3980	Plan de manejo de transito (PMT) para patio y talleres - revision y No Objeción Interver	30	23-Mar-21	22-Apr-21
P-6890	Plan de manejo de transito (PMT) para patio y talleres - revision y aprobación de entida	30	22-Apr-21	22-May-21
PLMB-T1-V04.1.03.13.08 Estudio de Transito Patio Taller		201	15-Feb-21	04-Sep-21
P-3510	Metodología del Estudio de Transito, preparar y presentar a interventoria	28	15-Feb-21	15-Mar-21
P-3910	Metodología del Estudio de Transito, revision y comentarios interventoria	20	15-Mar-21	04-Apr-21
P-4550	Metodología del Estudio de Transito, ajustes y envios a interventoria(No objecion) y a S	13	04-Apr-21	17-Apr-21
P-6670	Metodología del Estudio de Transito, revision y comentarios SDM	30	17-Apr-21	17-May-21
P-7560	Metodología del Estudio de Transito, ajustes y envio a aprobacion SDM	15	17-May-21	01-Jun-21
P-7960	Estudio de transito elaboracion y envio a interventoria	15	01-Jun-21	16-Jun-21
P-8440	Estudio de transito, revision y comentarios interventoria	20	16-Jun-21	06-Jul-21

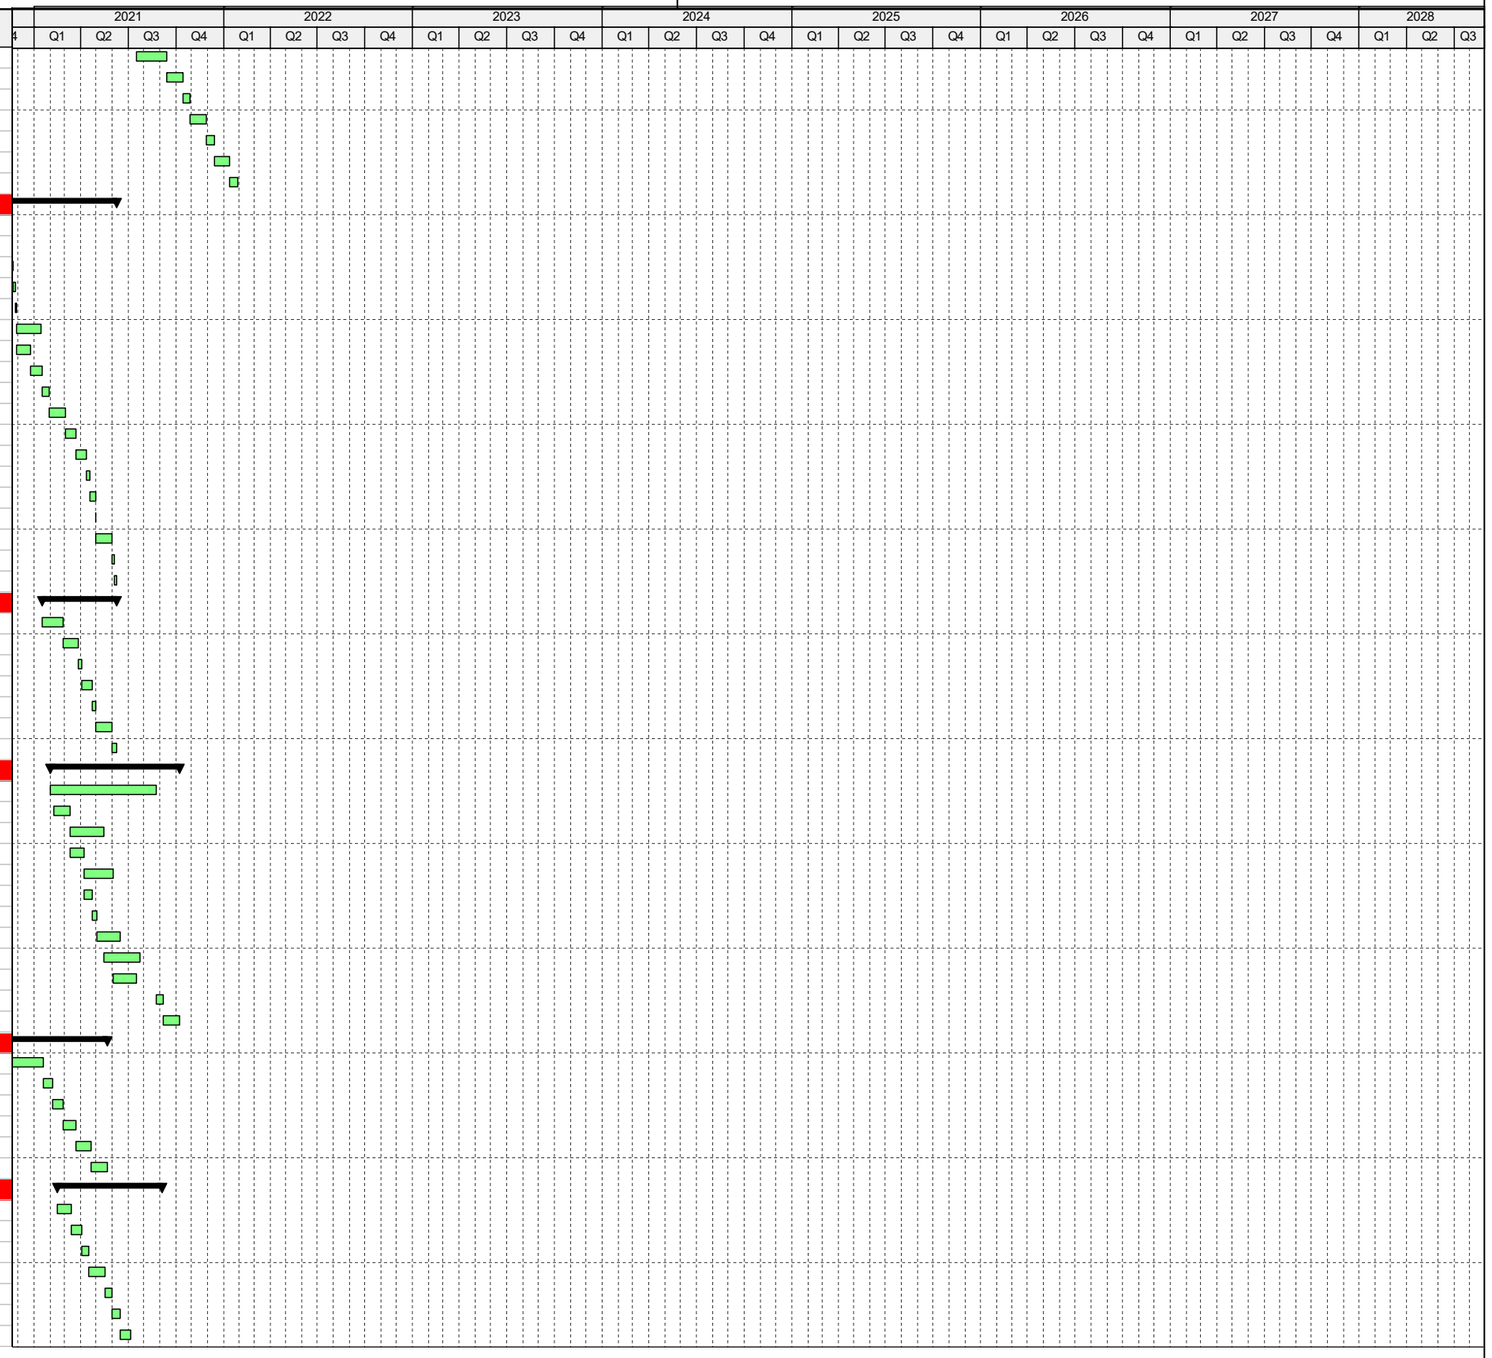

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-9040	Estudio de transito, ajustes y envio a interventoria	15	06-Jul-21	21-Jul-21
P-9350	Estudio de transito, revision y comentarios SDM	30	21-Jul-21	20-Aug-21
P-10600	Estudio de transito, ajustes y envio aprobacion SDM	15	20-Aug-21	04-Sep-21
PLMB-T1-V04.1.03.13.09 Diseño de señalizacion y semaforizacion Patio Taller		165	16-Jun-21	28-Nov-21
P-8450	Elaboracion y entrega del diseño de señalizacion y semaforizacion a interventoria 60%	30	16-Jun-21	16-Jul-21
P-9210	Revisión de la interventoria y auditoria R1 60%	30	16-Jul-21	15-Aug-21
P-10380	Ajustes de comentarios y envio Interventoria y auditoria 60%	15	15-Aug-21	30-Aug-21
P-10640	Revisión de la interventoria y auditoria R2 60%	30	30-Aug-21	29-Sep-21
P-11500	Ajustes y envios a interventoria (No objecion) y a SDM 90%	15	29-Sep-21	14-Oct-21
P-13210	Revision y comentarios SDM 90%	30	14-Oct-21	13-Nov-21
P-16440	Ajustes y envio a aprobacion SDM	15	13-Nov-21	28-Nov-21
PLMB-T1-V04.1.03.13.10 Planes Manejo de transito Fase de construccion		352	28-Nov-21	14-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.13.10.1 Traslado de Redes		60	28-Nov-21	27-Jan-22
P-17340	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)para traslado de redes - informe y envio a Intervento	30	28-Nov-21	28-Dec-21
P-20480	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para traslado de redes - revision y No Objeción de I	15	28-Dec-21	12-Jan-22
P-22610	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para traslado de redes - revisión y aprobación de S	15	12-Jan-22	27-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.03.13.10.2 Viaducto		145	22-Jun-22	14-Nov-22
P-46560	Metodología (PMT)para viaducto - informe y envio a Interventoria	30	22-Jun-22	22-Jul-22
P-52520	Metodología (PMT) para viaducto - revision y No Objeción de Interventoria	20	22-Jul-22	11-Aug-22
P-52530	Linea Base (PMT)para viaducto - informe y envio a Interventoria	30	22-Jul-22	21-Aug-22
P-59350	Metodología (PMT) para viaducto - revisión y aprobación de SDM	30	11-Aug-22	10-Sep-22
P-60460	Linea Base (PMT) para viaducto - revision y No Objeción de Interventoria	10	21-Aug-22	31-Aug-22
P-60470	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)para viaducto - informe y envio a Interventoria	15	21-Aug-22	05-Sep-22
P-62190	Linea Base (PMT) para viaducto - revision y comentarios de SDM	30	31-Aug-22	30-Sep-22
P-63580	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para viaducto - revision y No Objeción de Intervento	10	05-Sep-22	15-Sep-22
P-65720	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para viaducto - revisión y aprobación de SDM	30	15-Sep-22	15-Oct-22
P-65730	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para viaducto - revisión y aprobación de Transmileni	30	15-Sep-22	15-Oct-22
P-71970	Adecuación de Desvíos del (PMT) específico para viaducto	30	15-Oct-22	14-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.13.10.3 Estaciones		145	22-Jun-22	14-Nov-22
P-46570	Metodología (PMT)para estaciones - informe y envio a Interventoria	30	22-Jun-22	22-Jul-22
P-52540	Metodología (PMT) para estaciones - revision y No Objeción de Interventoria	20	22-Jul-22	11-Aug-22
P-52550	Linea Base (PMT)para estaciones - informe y envio a Interventoria	30	22-Jul-22	21-Aug-22
P-59360	Metodología (PMT) para estaciones - revisión y aprobación de SDM	30	11-Aug-22	10-Sep-22
P-60480	Linea Base (PMT) para estaciones - revision y No Objeción de Interventoria	10	21-Aug-22	31-Aug-22
P-60490	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)para estaciones - informe y envio a Interventoria	15	21-Aug-22	05-Sep-22
P-62200	Linea Base (PMT) para estaciones - revision y comentarios de SDM	30	31-Aug-22	30-Sep-22
P-63590	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para estaciones - revision y No Objeción de Interver	10	05-Sep-22	15-Sep-22
P-65740	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para estaciones - revisión y aprobación de SDM	30	15-Sep-22	15-Oct-22
P-71980	Adecuación de Desvíos del (PMT) específico para estaciones	30	15-Oct-22	14-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.13.10.4 Malla vial existente		145	22-Jun-22	14-Nov-22
P-46580	Metodología (PMT)para malla vial- informe y envio a Interventoria	30	22-Jun-22	22-Jul-22
P-52560	Metodología (PMT) para malla vial- revision y No Objeción de Interventoria	20	22-Jul-22	11-Aug-22
P-52570	Linea Base (PMT)para malla vial - informe y envio a Interventoria	30	22-Jul-22	21-Aug-22
P-59370	Metodología (PMT) para malla vial - revisión y aprobación de SDM	30	11-Aug-22	10-Sep-22
P-60500	Linea Base (PMT) para malla vial - revision y No Objeción de Interventoria	10	21-Aug-22	31-Aug-22
P-60510	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)para malla vial - informe y envio a Interventoria	15	21-Aug-22	05-Sep-22
P-62210	Linea Base (PMT) para malla vial - revision y comentarios de SDM	30	31-Aug-22	30-Sep-22
P-63600	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para malla vial - revision y No Objeción de Intervent	10	05-Sep-22	15-Sep-22
P-65750	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para malla vial - revisión y aprobación de SDM	30	15-Sep-22	15-Oct-22
P-65760	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para malla vial - revisión y aprobación de Transmiler	30	15-Sep-22	15-Oct-22
P-71990	Adecuación de Desvíos del (PMT) específico para Malla vial	30	15-Oct-22	14-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.03.13.10.5 Espacio publico		145	22-Jun-22	14-Nov-22
P-46590	Metodología (PMT)para espacio publico - informe y envio a Interventoria	30	22-Jun-22	22-Jul-22
P-52580	Metodología (PMT) para espacio publico - revision y No Objeción de Interventoria	20	22-Jul-22	11-Aug-22
P-52590	Linea Base (PMT)para espacio publico - informe y envio a Interventoria	30	22-Jul-22	21-Aug-22
P-59380	Metodología (PMT) para espacio publico - revisión y aprobación de SDM	30	11-Aug-22	10-Sep-22
P-60520	Linea Base (PMT) para espacio publico - revision y No Objeción de Interventoria	10	21-Aug-22	31-Aug-22
P-60530	Plan de Manejo de Tránsito (PMT)para espacio publico - informe y envio a Interventoria	15	21-Aug-22	05-Sep-22
P-62220	Linea Base (PMT) para espacio publico - revision y comentarios de SDM	30	31-Aug-22	30-Sep-22
P-63610	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para espacio publico - revision y No Objeción de Int	10	05-Sep-22	15-Sep-22
P-65770	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para espacio publico - revisión y aprobación de SDI	30	15-Sep-22	15-Oct-22
P-65780	Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para espacio publico - revisión y aprobación de Trar	30	15-Sep-22	15-Oct-22

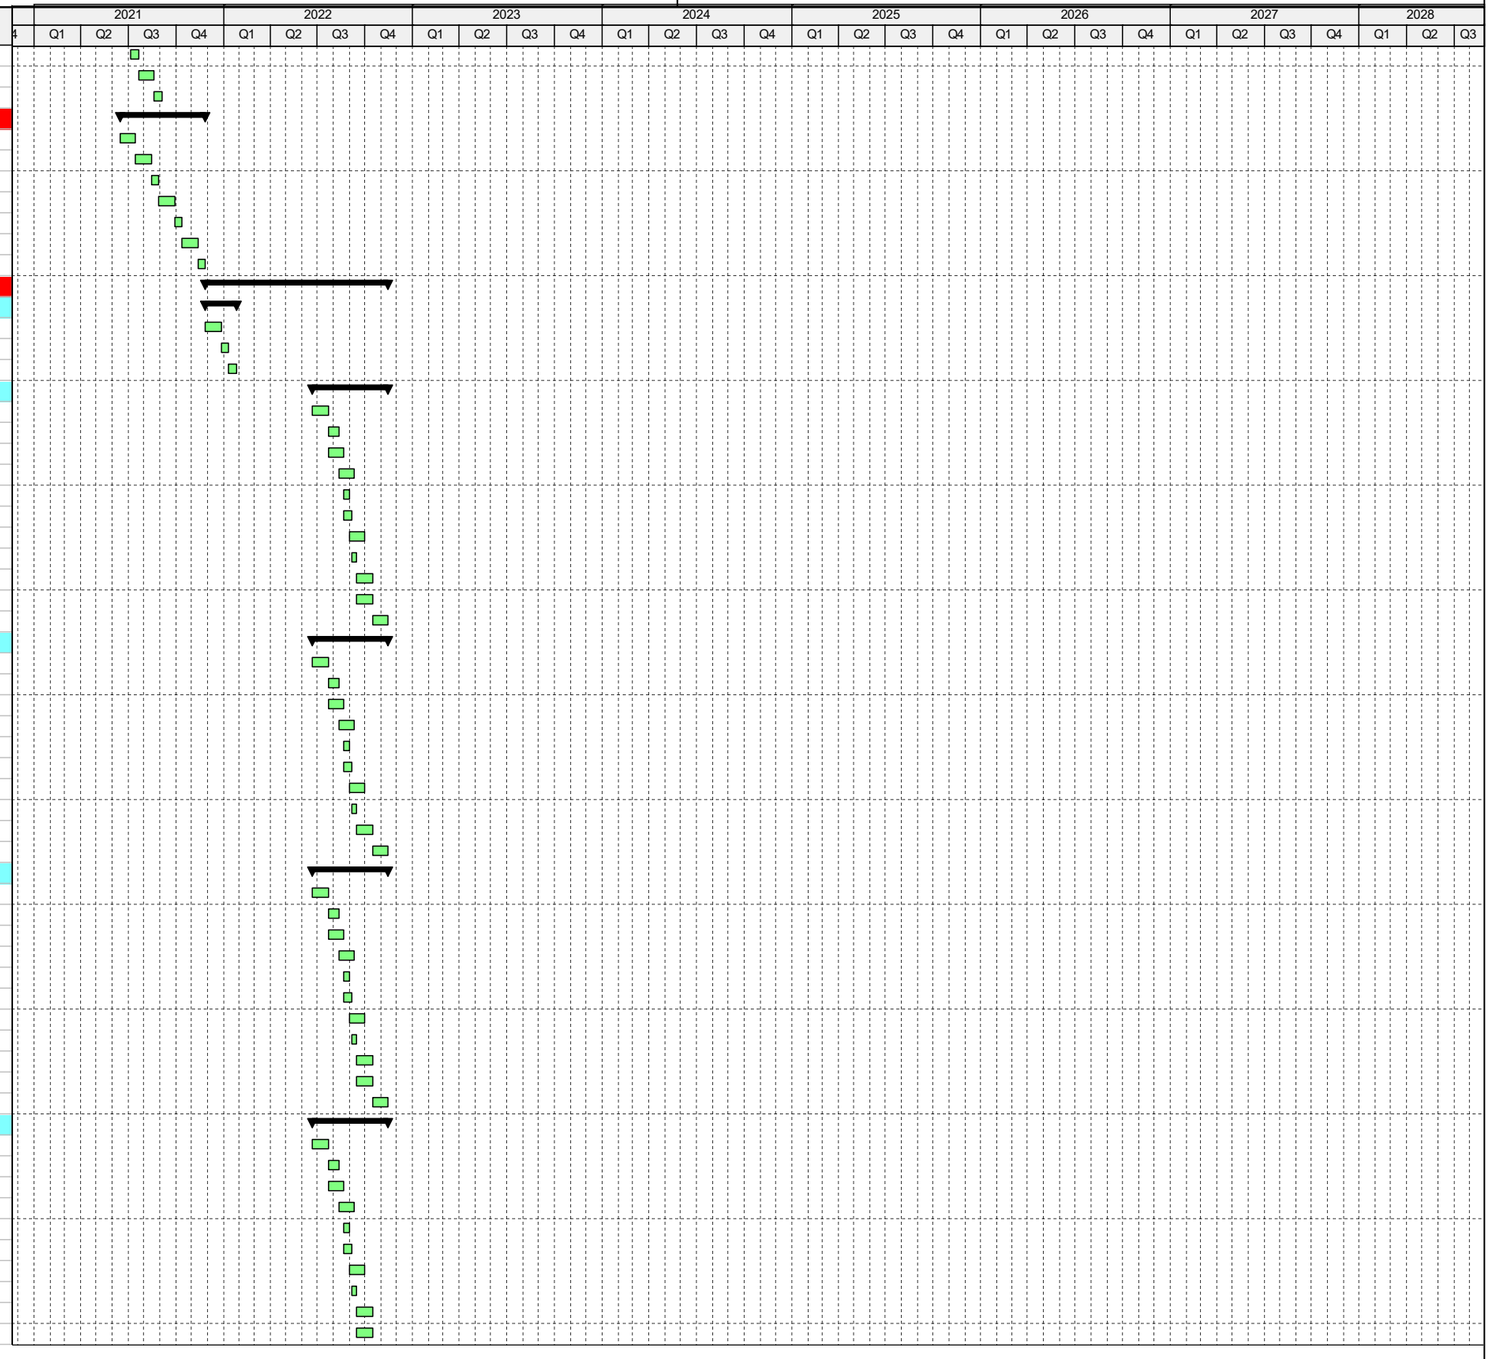

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-72000	Adecuación de Desvíos del (PMT) específico para espacio publico	30	15-Oct-22	14-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.04	Permisos para Inicio de Obras	502	20-Oct-20	31-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.04.1	Permisos y Licencias - Topográfico	30	20-Oct-20	02-Dec-20
P-1690	Permiso Ocupacion Espacio Publico Topografía	30	20-Oct-20	02-Dec-20
P-1700	Permiso Ocupacion Espacio Publico Geotecnia	30	20-Oct-20	02-Dec-20
PLMB-T1-V04.1.04.02	Permisos - Patio Taller	160	20-Oct-20	16-Jun-21
PLMB-T1-V04.1.04.02.2	Permisos y Licencias - Construccion	160	20-Oct-20	16-Jun-21
P-1710	EAAB (conexionn temporal de agua y alcantarillados para el campamento / autorizacic	160	20-Oct-20	16-Jun-21
P-1720	ENEL (conexión temporal de energía Eléctrica para el campamento)	160	20-Oct-20	16-Jun-21
PLMB-T1-V04.1.04.03	Permisos - Deprimido Calle 72	160	20-Oct-20	16-Jun-21
PLMB-T1-V04.1.04.03.2	Permisos y Licencias - Construccion	160	20-Oct-20	16-Jun-21
P-1730	SDP (Licencia para Intervencion y Ocupacion del Espacio Publico)	160	20-Oct-20	16-Jun-21
P-1740	EAAB (conexion temporal de agua y alcantarillado para el campamento	160	20-Oct-20	16-Jun-21
P-1750	ENEL (conexion temporal de energia Electrica para el campamento)	160	20-Oct-20	16-Jun-21
PLMB-T1-V04.1.04.04	Permisos - Interseccion especial Av68	502	20-Oct-20	31-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.04.04.2	Permisos y Licencias - Construccion	502	20-Oct-20	31-Oct-22
P-1760	SDP (Licencia para Intervencion y Ocupacion del Espacio Publico)	502	20-Oct-20	31-Oct-22
P-1770	EAAB (conexion temporal de agua y alcantarillado para el campamento	502	20-Oct-20	31-Oct-22
P-1780	ENEL (conexion temporal de energia Electrica para el campamento)	502	20-Oct-20	31-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.04.05	Permisos - Traslado de Redes	450	20-Oct-20	17-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.04.05.2	Permisos y Licencias - Construccion	450	20-Oct-20	17-Aug-22
P-1790	SDP (Licencia para Intervencion y Ocupacion del Espacio Publico)	450	20-Oct-20	17-Aug-22
P-1800	EAAB (conexion temporal de agua y alcantarillado para el campamento	450	20-Oct-20	17-Aug-22
P-1810	ENEL (conexion temporal de energia Electrica para el campamento)	450	20-Oct-20	17-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.04.06	Permisos - Instalaciones Temporales	500	20-Oct-20	27-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.04.06.2	Permisos y Licencias - Construccion	500	20-Oct-20	27-Oct-22
P-1820	Curaduria Urbana (Licencia de Urbanismo / Licencia de Construccion)	500	20-Oct-20	27-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.04.07	Permisos - Infraestructura del Viaducto	500	20-Oct-20	27-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.04.07.2	Permisos y Licencias - Construccion	500	20-Oct-20	27-Oct-22
P-1830	SDP (Licencia para Intervención y Ocupación del Espacio Público)	500	20-Oct-20	27-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.04.08	Permisos - Contruccion Edificios	490	20-Oct-20	12-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.04.08.2	Permisos y Licencias - Construccion	490	20-Oct-20	12-Oct-22
P-1840	EAAB (conexión definitiva de agua y alcantarillados)	490	20-Oct-20	12-Oct-22
P-1850	ENEL (conexión definitiva de energía eléctrica)	490	20-Oct-20	12-Oct-22
P-1860	VANTI (conexión definitiva de gas natural)	490	20-Oct-20	12-Oct-22
P-1870	ETB (conexión de comunicaciones e internet)	490	20-Oct-20	12-Oct-22
P-1880	Curaduría Urbana (Licencia de Construcción / Licencia de Demolición)	490	20-Oct-20	12-Oct-22
P-1890	SDP (Licencia para Intervención y Ocupación del Espacio Público)	490	20-Oct-20	12-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.04.09	Permisos - Subestación (SER)	500	20-Oct-20	27-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.04.09.2	Permisos y Licencias - Construccion	500	20-Oct-20	27-Oct-22
P-1900	ENEL (conexión de energía eléctrica)	500	20-Oct-20	27-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.05	Gestion Social	809	20-Oct-20	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.1	INICIO TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS	306	15-Nov-20	17-Sep-21
P-2560	Gestión para la instalación de la valla fija en Patio Taller	273	15-Nov-20	15-Aug-21
P-3340	Gestión para la instalación de la valla fija en Deprimido Calle 72	225	02-Feb-21	15-Sep-21
P-3700	Registro Programa Arqueologia Preventiva - Patio Taller	167	01-Mar-21	15-Aug-21
P-1370	Plan de Manejo Arqueológico PLMB (Incluye Calle 72)	168	02-Apr-21	17-Sep-21
PLMB-T1-V04.1.05.2	ACTUALIZACION, AJUSTES Y COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO S	808	20-Oct-20	06-Jan-23
P-1300	Socializar el avance en la estructuración del proyecto y del alcance de los términos de	496	20-Oct-20	28-Feb-22
P-3670	Identificación de impactos y recepción de propuestas para su manejo y mitigación	275	28-Feb-22	30-Nov-22
P-20870	Entrega de actualizaciones, ajustes y complementaciones del estudio de Impacto Soci	37	30-Nov-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3	ACTUALIZACION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIONES DEL PLAN DE MANEJO	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-83480	Entrega de actualizaciones, ajustes y complementaciones del Plan de Manejo Social y	37	30-Nov-22	06-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1	PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO SOCIAL	809	20-Oct-20	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.1	PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN PUBLICA	809	20-Oct-20	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.1.1	Plan Estratégico de Comunicaciones	717	20-Jan-21	07-Jan-23
P-3180	Presentar propuesta de implementación del PEC (Dentro de los 15 días hábiles de ca	717	20-Jan-21	07-Jan-23
P-3190	Mantener informada a la comunidad sobre el desarrollo de las actividades	717	20-Jan-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.1.2	Sistema de información "Metro comunica" (Páqina web, mini site, R	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1420	Mantener informada a la ciudadanía sobre alcance, tiempo, actividades y característica	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1430	Encuesta de percepción y satisfacción (semestral)	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-2590	Entrega de parrilla de información (mensual)	779	19-Nov-20	07-Jan-23



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.1.3	**Metro en cifras de cumplimiento: Aplicación de encuestas de percep**	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1440	Medición y evaluación de cumplimiento de indicadores (Mensual)	809	20-Oct-20	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.1.4	**Metro de Bogota es cultura**	448	16-Oct-21	07-Jan-23
P-11080	Campañas, estrategias espacios lúdicos y pedagógicos	448	16-Oct-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.1.5	**Mecanismos de Divulgación del Proyecto**	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1450	Entrega de volantes, afiches, folletos, infografía (Divulgación debe hacerse mín. 5 días	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1460	Tecnologías de información y comunicación	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1580	Disponibilidad puntos moviles de atencion (por cada frente de obra)	477	17-Sep-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.1.5.1	**Patio Taller**	523	02-Aug-21	07-Jan-23
P-836	Funcionamiento oficina fija - Disponibilidad de buzón	523	02-Aug-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.1.5.2	**Calle 72**	492	02-Sep-21	07-Jan-23
P-837	Funcionamiento oficina fija - Disponibilidad de buzón	492	02-Sep-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.2	**PROGRAMA METRO ESCUCHA, METRO RESUELVE**	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1310	Atención al ciudadano	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1470	Generación de reportes (mensuales, trimestrales y anuales)	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1480	Comunicación y atención de PQRS- "Metro escucha - Metro resuelve"	809	20-Oct-20	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.3	**PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA**	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1490	Inspección de predios con manejo inadecuado de aguas lluvias	139	20-Oct-20	08-Mar-21
P-8530	Medidas de mitigación ante corte de SP (Plantas de energia, carro tanques)	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-8540	Gestión con Empresas de Servicios Públicos (Coordinar con entidades minimo una ser	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-8560	Reuniones informativas, extraordinarias y/o atencion a veedurias	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-10590	Distribución del comunicado para solicitar adecuación de bajantes de aguas lluvias	447	17-Oct-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.3.1	**Patio Taller**	520	05-Aug-21	07-Jan-23
P-8180	Hablemos de Metro de Bogota Reunión, inicio de obras Patio Tallery Calle 72	2	05-Aug-21	07-Aug-21
P-8550	Reuniones con directivas Centros Educativos (Semestral)	478	16-Sep-21	07-Jan-23
P-10360	Comités de Participación Zonal (Frecuencia Bimestral)	449	15-Oct-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.3.2	**Calle 72**	487	07-Sep-21	07-Jan-23
P-83720	Hablemos de Metro de Bogota Reunión, inicio de obras Patio Tallery Calle 72	2	07-Sep-21	09-Sep-21
P-83750	Reuniones con directivas Centros Educativos (Semestral)	447	17-Oct-21	07-Jan-23
P-83740	Comités de Participación Zonal (Frecuencia Bimestral)	417	16-Nov-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.4	**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CIUDADANA PARA LA CONSTRUC**	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1500	Diagnóstico de organizaciones comunitarias	305	20-Oct-20	21-Aug-21
P-83710	Reporte semestral (Mecanismo de control y seguimiento)	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-10240	Proyecto de Fortalecimiento ciudadano	448	16-Oct-21	07-Jan-23
P-10250	Fortalecimiento al control social	448	16-Oct-21	07-Jan-23
P-22540	Implementación de estrategias para la construcción y fortalecimiento del tejido urbano	334	07-Feb-22	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.5	**PROGRAMA DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL**	705	01-Feb-21	07-Jan-23
P-3310	La EMB determinara de forma puntual la vinculación del Concesionario a la Mesa Inter	705	01-Feb-21	07-Jan-23
P-3320	Según las necesidades de articulación interinstitucional, se remitir a la EMB un informe	705	01-Feb-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.6	**PROGRAMA DE CULTURA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE**	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1510	Inventario de los accesos a garajes de los frentes de obra a intervenir	139	20-Oct-20	08-Mar-21
P-1520	Capacitación para conductores vinculados al proyecto	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1530	Prevención de accidentes	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-8240	Reuniones informativas PMT (según necesidad)	518	07-Aug-21	07-Jan-23
P-8570	Construcción de la Cultura de Movilidad Sostenible para el Sector Educativo (mínimo 1	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-8590	Coordinación con el sector Salud para la Movilidad Sostenible	508	17-Aug-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.6.1	**Patio Taller**	388	15-Dec-21	07-Jan-23
P-8580	Taller de Movilidad Sostenible (Frecuencia Cuatrimestral)	388	15-Dec-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.6.2	**Calle 72**	357	15-Jan-22	07-Jan-23
P-83760	Taller de Movilidad Sostenible (Frecuencia Cuatrimestral)	357	15-Jan-22	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.7	**PROGRAMA DE PROTECCION A LA INSFRAESTRUCTURA Y BIENES DE**	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1540	Atención para daños de bienes a terceros	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-7050	Levantamiento actas de vecindad	593	24-May-21	07-Jan-23
P-8050	Registro Fílmico Vias de desvío	576	10-Jun-21	07-Jan-23
P-8610	Programa de acompañamiento en el control de las vibraciones	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-8600	Actas de construcción de acceso a garajes y rampas	447	17-Oct-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.8	**PROGRAMA DE INCLUSION SOCIO LABORAL**	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1550	Jornadas de capacitación	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-3330	Articulación con la estrategia de empleo definido por la EMB	704	02-Feb-21	07-Jan-23
P-7950	Implementación de estrategia para la generación de empleo	508	17-Aug-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.9	**PROGRAMA DE MANEJO PARA LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DEL**	523	02-Aug-21	07-Jan-23
P-8060	Gestión cargue y descargue de mercancia	523	02-Aug-21	07-Jan-23

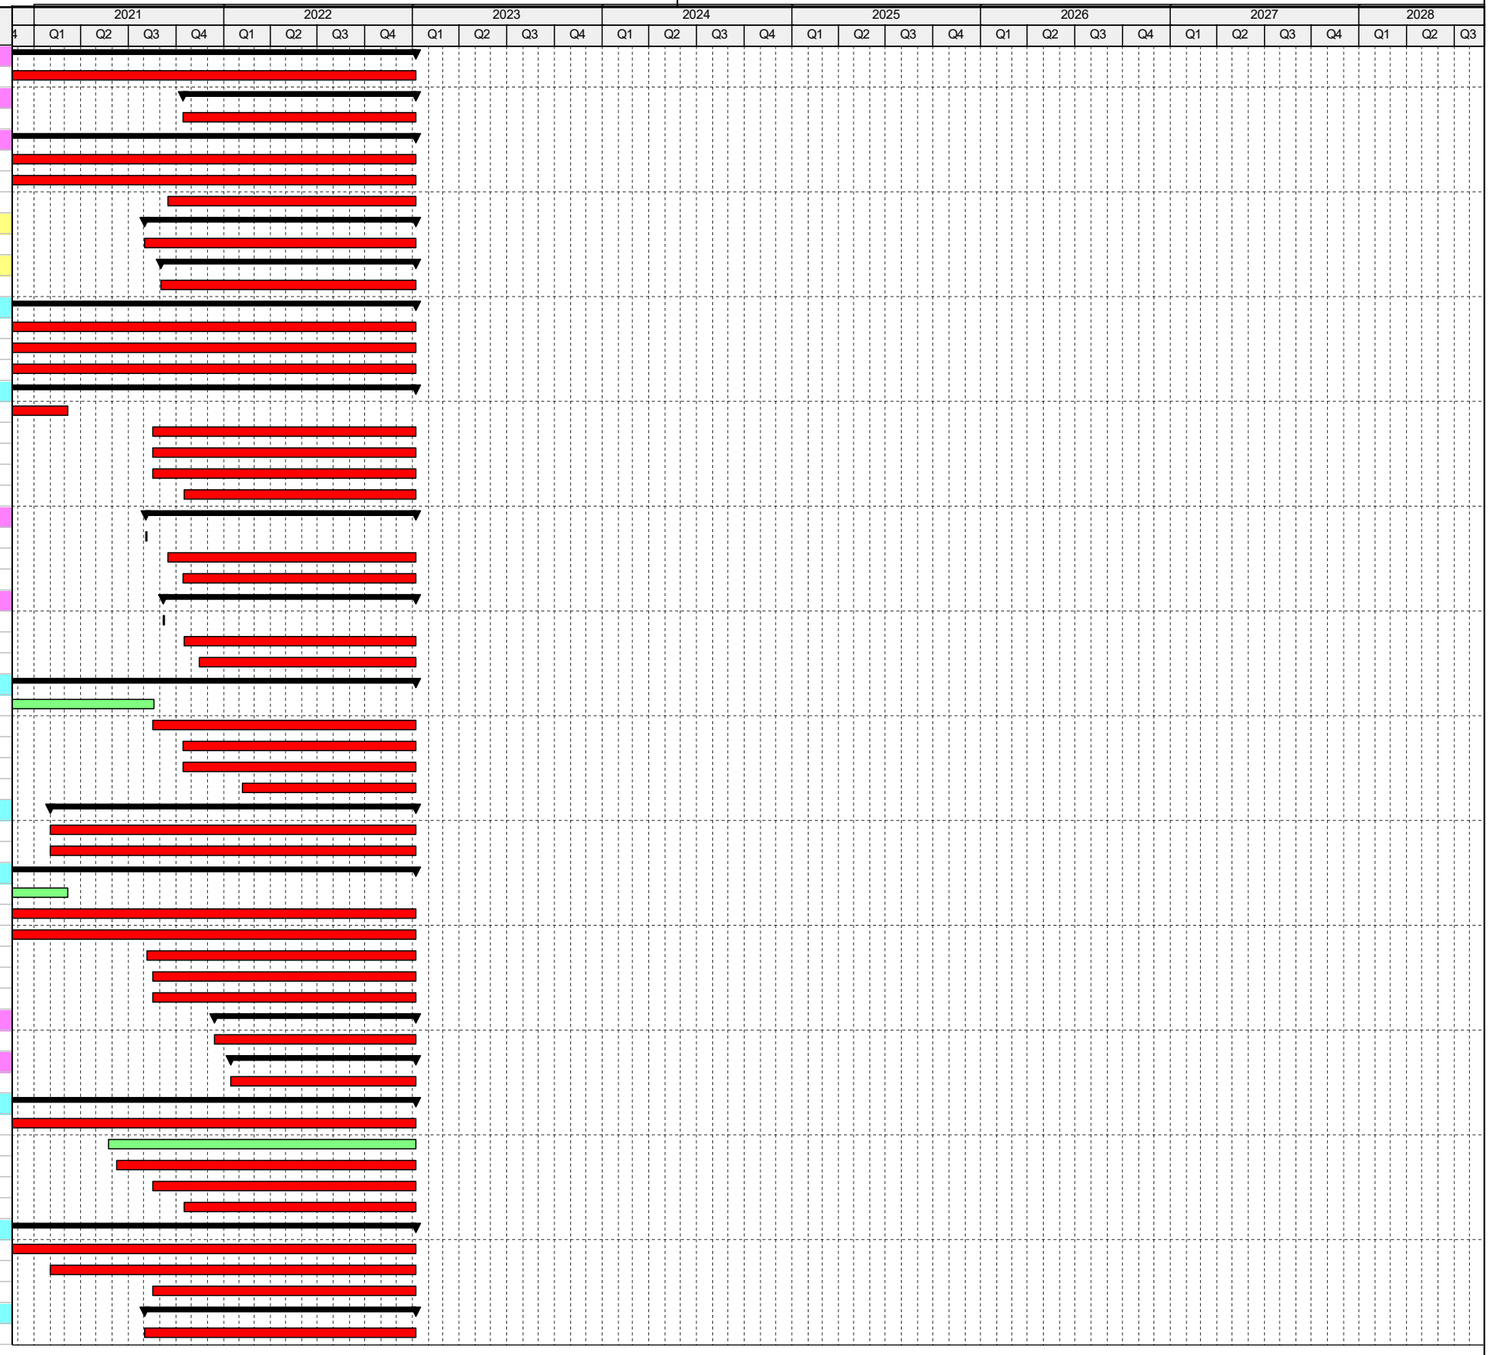

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-8620	Capacitación a comerciantes para la gestión comercial y de mercadeo (plan anual - fa	447	17-Oct-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.10	PROGRAMA DE MANEJO PARA OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1320	Monitoreo de las dinamicas del comercio informal en el AID del proyecto.(Frecuencia Q	809	20-Oct-20	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.11	PROGRAMA DE OBSERVATORIO DE OCUPACIÓN Y VALOR DEL SUEL	478	16-Sep-21	07-Jan-23
P-9280	Recolectar la información solicitada por la EMB para aportar al seguimiento de las diná	478	16-Sep-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.12	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO URBANO DE LA PI	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-22560	Proyecto de sensibilizar y capacitar al personal vinculado al Proyecto Metro	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1560	Identificación de escenarios y actores para la implementación de la Cultura Metro de B	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-22570	Construir las estrategias para la implementacion de la Cultura Metro	362	10-Jan-22	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.13	PROGRAMA DE MANEJO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CI	508	17-Aug-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.13.1	Protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC) de los ámbitos n	508	17-Aug-21	07-Jan-23
A1290	Plan de manejo arqueológico	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-7590	Actas de vecindad correspondientes a BIC y registro filmico previo a la llegada de maq	507	18-Aug-21	07-Jan-23
P-8220	Reuniones de información para propietarios de Bienes de Interés Cultural BIC- y terce	487	07-Sep-21	07-Jan-23
P-8630	Capacitaciones de sensibilización y Patrimonio Cultural para personal vinculado al proy	477	17-Sep-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.14	PROGRAMA DE REASENTAMIENTO	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1570	Atención de las unidades sociales afectadas por la construcción de la PLMB. Program	809	20-Oct-20	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.15	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	523	02-Aug-21	07-Jan-23
P-8070	Presentar Plan estratégico de Seguridad Vial aprobado por la autoridad gubernamenta	15	02-Aug-21	17-Aug-21
P-8080	Divulgación de Planes de Manejo de Tránsito	520	05-Aug-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.3.1.16	PROGRAMA DE MANEJO PARA EL INFLUJO LABORAL	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-8640	Jornadas de sensibilización para abordar el riesgo de violencia de genero	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-8650	Protocolo y plan de trabajo especifico a su área de intervención en razón a las mujeres	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-8660	Programa de sensibilización para abordar riesgo de violencia de genero (En alianza co	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-8670	Elaborar una política de cooperación con autoridades policiales para investigación de q	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-10420	Comite zonal de participación de mujeres y personas LGBTI	448	16-Oct-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.4	INFORMES DE GESTIÓN	809	20-Oct-20	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.4.1	INFORMES DE GESTIÓN SOCIAL	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1590	Informes de Gestion Social (mensual)	809	20-Oct-20	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.05.5	COMITÉS	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1600	Comite Social	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1610	Comités de seguimiento integrados SST, Ambiental y Social	809	20-Oct-20	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06	Gestion Ambiental	810	20-Oct-20	08-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.1	HITOS PREDECESORES A LAS OBRAS TEMPRANAS	247	16-Nov-20	21-Jul-21
PLMB-T1-V04.1.06.1.1	Actualización del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) y Plan de Monitc	247	16-Nov-20	21-Jul-21
P-2570	Elaboración del documento	150	16-Nov-20	15-Apr-21
P-6620	Entrega a la Interventoría	1	15-Apr-21	16-Apr-21
P-6630	Revisión de la Interventoría	10	15-Apr-21	25-Apr-21
P-6910	Entrega al Concesionario	1	25-Apr-21	26-Apr-21
P-6920	Ajustes del Concesionario	10	25-Apr-21	05-May-21
P-7070	Entrega a la Interventoría	1	05-May-21	06-May-21
P-7080	Revisión de la interventoría y notificación de plazo de cura	7	06-May-21	13-May-21
A1310	Plazo de cura	10	14-May-21	24-May-21
A1320	Revisión y validación por la interventoría	15	24-May-21	08-Jun-21
P-7180	Remisión a la EMB	1	08-Jun-21	09-Jun-21
P-7190	Revisión por la EMB	25	08-Jun-21	03-Jul-21
P-7810	Entrega de EMB al Concesionario para ajustes	1	05-Jul-21	06-Jul-21
P-7820	Atención de observaciones por el Concesionario	10	06-Jul-21	16-Jul-21
P-8190	Revisión y Concepto de No Objeción de EMB y Entidades Multilaterlaes	4	16-Jul-21	20-Jul-21
P-8230	No Objeción Ambiental y Social por la EMB	1	20-Jul-21	21-Jul-21
PLMB-T1-V04.1.06.2	PROVEEDORES CON LICENCIAS AMBIENTALES	120	10-Apr-21	08-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.06.2.1	Fuentes de materiales	120	10-Apr-21	08-Aug-21
P-5670	Revisión de documentos ambientales de los proveedores	119	10-Apr-21	07-Aug-21
P-8200	Envío de documentación a la Interventoría de las licencias ambientales de los proveed	1	07-Aug-21	08-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.06.2.2	Disposición de Residuos de Construcción y Demolición	120	10-Apr-21	08-Aug-21
P-5680	Revisión de documentos ambientales de los proveedores de sitio de disposición final	119	10-Apr-21	07-Aug-21
P-8210	Envío de documentación a la Interventoría de las licencias ambientales de los sitios de	1	07-Aug-21	08-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.06.3	PERMISOS AMBIENTALES	763	06-Dec-20	08-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.3.1	Permiso de Trabajo Nocturno	280	10-Dec-20	16-Sep-21
P-2770	Solicitud de permiso a las Alcaldías Menores	280	10-Dec-20	16-Sep-21
P-2780	Envío de la solicitud del permiso a la Interventoría	280	10-Dec-20	16-Sep-21
P-2790	Expedición del permiso de trabajo nocturno	280	10-Dec-20	16-Sep-21




© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-2800	Envío de permiso a la Interventoría	280	10-Dec-20	16-Sep-21
PLMB-T1-V04.1.06.3.2	**Pin de Generador de RCD - SDA**	763	06-Dec-20	08-Jan-23
P-2690	Elaborar Plan de gestión de RCD	30	06-Dec-20	05-Jan-21
P-2930	Radicación a la Secretaría Distrital de Ambiente	1	05-Jan-21	06-Jan-21
P-2980	Obtención del PIN	1	06-Jan-21	07-Jan-21
P-2990	Envío del PIN a la intervnetoría	1	06-Jan-21	07-Jan-21
P-8800	Envío del reporte mensual de RCD a SDA	478	17-Sep-21	08-Jan-23
P-8810	Envío de radicación del reporte mensual a Interventoría	478	17-Sep-21	08-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.3.3	**Permiso Generación de RCD - CAR**	761	06-Dec-20	07-Jan-23
P-2710	Elaborar Programa de Manejo Ambiental de RCD	30	06-Dec-20*	05-Jan-21
P-2970	Radicación a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	1	05-Jan-21	06-Jan-21
P-3020	Entrega de radicación a Interventoría	1	07-Jan-21	08-Jan-21
P-8790	Entrega de reporte de implementación mensual a Interventoría	477	17-Sep-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.3.4	**Permisos Calle 72**	706	31-Jan-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.3.4.1	**Permiso de tratamiento silvicutural y especies en veda (árboles y epifita**	318	13-Mar-21	25-Jan-22
P-3880	Levantamiento del Inventario Forestal	10	13-Mar-21	23-Mar-21
P-4010	Solicitud usuario y asignación de clave -Software - Cartera- Obtención Acta Código SIC	60	24-Mar-21	23-May-21
P-4520	Diseño paisajístico, Memoria Técnica, Balance de zonas verdes, Propuesta de compe	120	02-Apr-21	31-Jul-21
P-4530	Preparación de la documentación, Pago por Evaluación Silvicultural y Radicación ante	120	02-Apr-21	31-Jul-21
P-7970	Revisión Autoridad Ambiental	30	31-Jul-21	30-Aug-21
P-7980	Envío de radicación a interventoría	1	31-Jul-21	01-Aug-21
P-10650	Solicitud de Información Adicional o Complementos por AAC	10	30-Aug-21	09-Sep-21
P-11090	Revisión por la autoridad ambiental de información adicional o complementos	30	09-Sep-21	09-Oct-21
P-14180	Auto de Inicio del permiso	30	09-Oct-21	08-Nov-21
P-17720	Visita de evaluación Inventario Forestal AAC y expedición del concepto técnico	30	08-Nov-21	08-Dec-21
P-20900	Expedición del permiso de tratamiento silvicultural	30	08-Dec-21	07-Jan-22
P-26230	Recurso de reposición	10	07-Jan-22	17-Jan-22
P-26240	Envío del permiso a la interventoría	3	08-Jan-22	11-Jan-22
P-27300	Respuesta al recurso de reposición de AAC	5	17-Jan-22	22-Jan-22
P-27320	Envío de recurso de reposición a Interventoría	3	18-Jan-22	21-Jan-22
P-28430	Envío del concepto de recurso de reposición a la Interventoría	3	22-Jan-22	25-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.06.3.4.6	**Permiso del Jardín Botánico de Bogota para ubicación de árboles a trasl**	109	25-Jan-22	14-May-22
P-28510	Preparación de documentacion	45	25-Jan-22	11-Mar-22
P-35590	Radicación de Documentación	1	11-Mar-22	12-Mar-22
P-35660	Respuesta de la entidad	60	12-Mar-22	11-May-22
P-35690	Envío de radicado a Interventoría	1	13-Mar-22	14-Mar-22
P-43960	Envío de respuesta de entidad a interventoría	3	11-May-22	14-May-22
PLMB-T1-V04.1.06.3.4.2	**Salvoconducto de movilización de madera**	138	25-Jan-22	12-Jun-22
P-28490	Solicitud de registro en la plataforma VITAL de la Resolución del permiso silvicultural a	1	25-Jan-22	26-Jan-22
P-28500	Cargue del trámite en la Plataforma por la Plataforma Ventanilla Virutal	30	25-Jan-22	24-Feb-22
P-32450	Notificación del cargue de la información por la Plataforma Ventanilla Virutal	1	24-Feb-22	25-Feb-22
P-32480	Pago del Salvoconducto	29	25-Feb-22	26-Mar-22
P-32490	Envío de respuesta de cargue de información a Interventoría	1	25-Feb-22	26-Feb-22
P-37320	Diligenciar los formatos de la plataforma	1	26-Mar-22	27-Mar-22
P-37330	Evaluación de la información por la Autridad Ambiental	30	26-Mar-22	25-Apr-22
P-42520	Visita de campo de la autoridad ambiental	15	25-Apr-22	10-May-22
P-43810	Otorgamiento del permiso	30	10-May-22	09-Jun-22
P-50050	Envío del permiso de movilización de madera a interventoría	3	09-Jun-22	12-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.06.3.4.4	**Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies sil**	4	25-Mar-21	29-Mar-21
P-4050	Se obtendra por un proveedor con permiso vigente	1	25-Mar-21	26-Mar-21
P-4060	Se enviara el permiso a la Interventoría	1	25-Mar-21	26-Mar-21
P-4110	Radicación a la autoridad ambiental del uso del permiso de colecta antes del incio de a	1	26-Mar-21	27-Mar-21
P-4160	Envío de radicación a la interventoría	1	28-Mar-21	29-Mar-21
PLMB-T1-V04.1.06.3.4.5	**Actualización de la Caracterización del Componente Biótico Calle 72**	651	27-Mar-21	07-Jan-23
P-4130	Inventario de nidos	25	27-Mar-21	21-Apr-21
P-6840	Caracterización en campo (Colecta y observaciones)	15	21-Apr-21	06-May-21
P-7120	Elaboración de la caracterización	8	06-May-21	14-May-21
P-7130	Evaluación de los impactos ambientales	8	06-May-21	14-May-21
P-7490	Elaboración del Plan de Manejo de fauna	2	14-May-21	15-May-21
P-7520	Radicación del Plan de Manejo de fauna ante la SDA	1	15-May-21	16-May-21
P-7540	Pronunciamiento de AAC	15	16-May-21	31-May-21
P-7550	Envío de radicación del Plan de Manejo Ambiental a Interventoría	1	16-May-21	17-May-21



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-7940	Envío a la interventoría del pronunciamiento de AAC	1	31-May-21	01-Jun-21
P-7930	Implementación del plan	492	02-Sep-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.3.4.3	**Permiso de Publicidad Exterior**	229	31-Jan-21	17-Sep-21
P-3290	Elaboración de la valla (Dirección Social)	178	31-Jan-21	28-Jul-21
P-6990	Radicación de solicitud de permiso de publicidad exterior	1	28-Jul-21	29-Jul-21
P-7000	Revisión por la Autoridad Ambiental	38	28-Jul-21	04-Sep-21
P-7010	Envío de radicación de solicitud del permiso a Interventoría	1	28-Jul-21	29-Jul-21
P-7870	Obtención del permiso	1	04-Sep-21	05-Sep-21
P-7880	Envío del permiso a la Interventoría	3	04-Sep-21	07-Sep-21
P-7890	Solicitud de póliza	10	04-Sep-21	14-Sep-21
P-8370	Radicación de póliza a AAC	1	14-Sep-21	15-Sep-21
P-8380	Envío de radicación de póliza a Interventoría	3	14-Sep-21	17-Sep-21
PLMB-T1-V04.1.06.3.4.8	**Permiso de Trabajo Nocturno**	477	17-Sep-21	07-Jan-23
P-8690	Solicitud de permiso a las Alcaldías Menores	477	17-Sep-21	07-Jan-23
P-8700	Envío de la solicitud del permiso a la Interventoría	477	17-Sep-21	07-Jan-23
P-8710	Expedición del permiso de trabajo nocturno	477	17-Sep-21	07-Jan-23
P-8720	Envío de permiso a la Interventoría	477	17-Sep-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.3.5	**Permisos Patio Taller**	712	25-Jan-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.3.5.1	**Permiso Silvicultural y especies en veda (árboles y epifitas) SDA Patio T**	275	25-Jan-21	27-Oct-21
P-3260	Levantamiento del Inventario Forestal	10	25-Jan-21	04-Feb-21
P-3390	Preparación de la documentación, Pago por Evaluación Silvicultural y Radicación ante	60	04-Feb-21	05-Apr-21
P-4560	Revisión Autoridad Ambiental	30	05-Apr-21	05-May-21
P-5590	Envío de radicación a interventoría	1	06-Apr-21	07-Apr-21
P-9020	Solicitud de Información Adicional o Complementos por AAC	22	05-May-21	27-May-21
P-9460	Revisión por la autoridad ambiental de información adicional o complementos	45	27-May-21	11-Jul-21
P-11010	Auto de Inicio del permiso	30	11-Jul-21	10-Aug-21
P-13050	Visita de evaluación Inventario Forestal AAC y expedición del concepto técnico	30	10-Aug-21	09-Sep-21
P-16180	Expedición del permiso de tratamiento silvicultural	30	09-Sep-21	09-Oct-21
P-19040	Recurso de reposición	10	09-Oct-21	19-Oct-21
P-19080	Envío del permiso a la interventoría	3	10-Oct-21	13-Oct-21
P-19470	Respuesta al recurso de reposición de AAC	5	19-Oct-21	24-Oct-21
P-19480	Envío de recurso de reposición a Interventoría	3	20-Oct-21	23-Oct-21
P-20360	Envío del concepto de recurso de reposición a la Interventoría	3	24-Oct-21	27-Oct-21
PLMB-T1-V04.1.06.3.5.2	**Permiso Silvicultural y especies en veda (árboles y epifitas) CAR - Patio**	311	01-Mar-21	06-Jan-22
P-3710	Levantamiento del Inventario Forestal	11	01-Mar-21	12-Mar-21
P-3920	Plan de Aprovechamiento (Memoria Técnica)	30	18-Mar-21	17-Apr-21
P-6710	Radicación Autoridad Ambiental	1	18-Apr-21	19-Apr-21
P-6720	Revisión Documental Autoridad Ambiental	75	18-Apr-21	02-Jul-21
P-6750	Envío de radicación a interventoría	1	19-Apr-21	20-Apr-21
P-8090	Pago por Evaluación Silvicultural	40	02-Jul-21	11-Aug-21
P-9120	Visita Técnica Autoridad Ambiental y generación de concepto	10	11-Aug-21	21-Aug-21
P-10340	Solicitud de Información Adicional o Complementos	30	21-Aug-21	20-Sep-21
P-11020	Tiempo para atención de observaciones de visita técnica	30	20-Sep-21	20-Oct-21
P-13080	Verificación de la información adicional o complementos AAC	15	20-Oct-21	04-Nov-21
P-16150	Auto de Inicio	30	04-Nov-21	04-Dec-21
P-22500	Otorgamiento del Permiso	15	04-Dec-21	19-Dec-21
P-26290	Recurso de reposición	10	19-Dec-21	29-Dec-21
P-26330	Envío del permiso a la Interventoría	3	20-Dec-21	23-Dec-21
P-27950	Envío de recurso de reposición a Interventoría	3	29-Dec-21	01-Jan-22
P-27960	Respuesta al recurso de reposición de AAC	5	29-Dec-21	03-Jan-22
P-28520	Envío del concepto de recurso de reposición a la Interventoría	3	03-Jan-22	06-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.06.3.5.11	**Permiso del Jardín Botánico de Bogota para ubicación de árboles a tras**	109	23-Dec-21	11-Apr-22
P-26520	Preparación de documentacion	45	23-Dec-21	06-Feb-22
P-32920	Radicación de Documentación	1	06-Feb-22	07-Feb-22
P-32950	Respuesta de la entidad	60	07-Feb-22	08-Apr-22
P-32970	Envío de radicado a Interventoría	1	08-Feb-22	09-Feb-22
P-42690	Envío de respuesta de entidad a interventoría	3	08-Apr-22	11-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.06.3.5.7	**Salvoconducto de movilización de madera**	138	06-Jan-22	24-May-22
P-28680	Solicitud de registro en la plataforma VITAL de la Resolución del permiso silvicultural a	1	06-Jan-22	07-Jan-22
P-28690	Cargue del trámite en la Plataforma por la Plataforma Ventanilla Virutal	30	06-Jan-22	05-Feb-22
P-32910	Notificación del cargue de la información por la Plataforma Ventanilla Virutal	1	05-Feb-22	06-Feb-22
P-32930	Pago del Salvoconducto	29	06-Feb-22	07-Mar-22

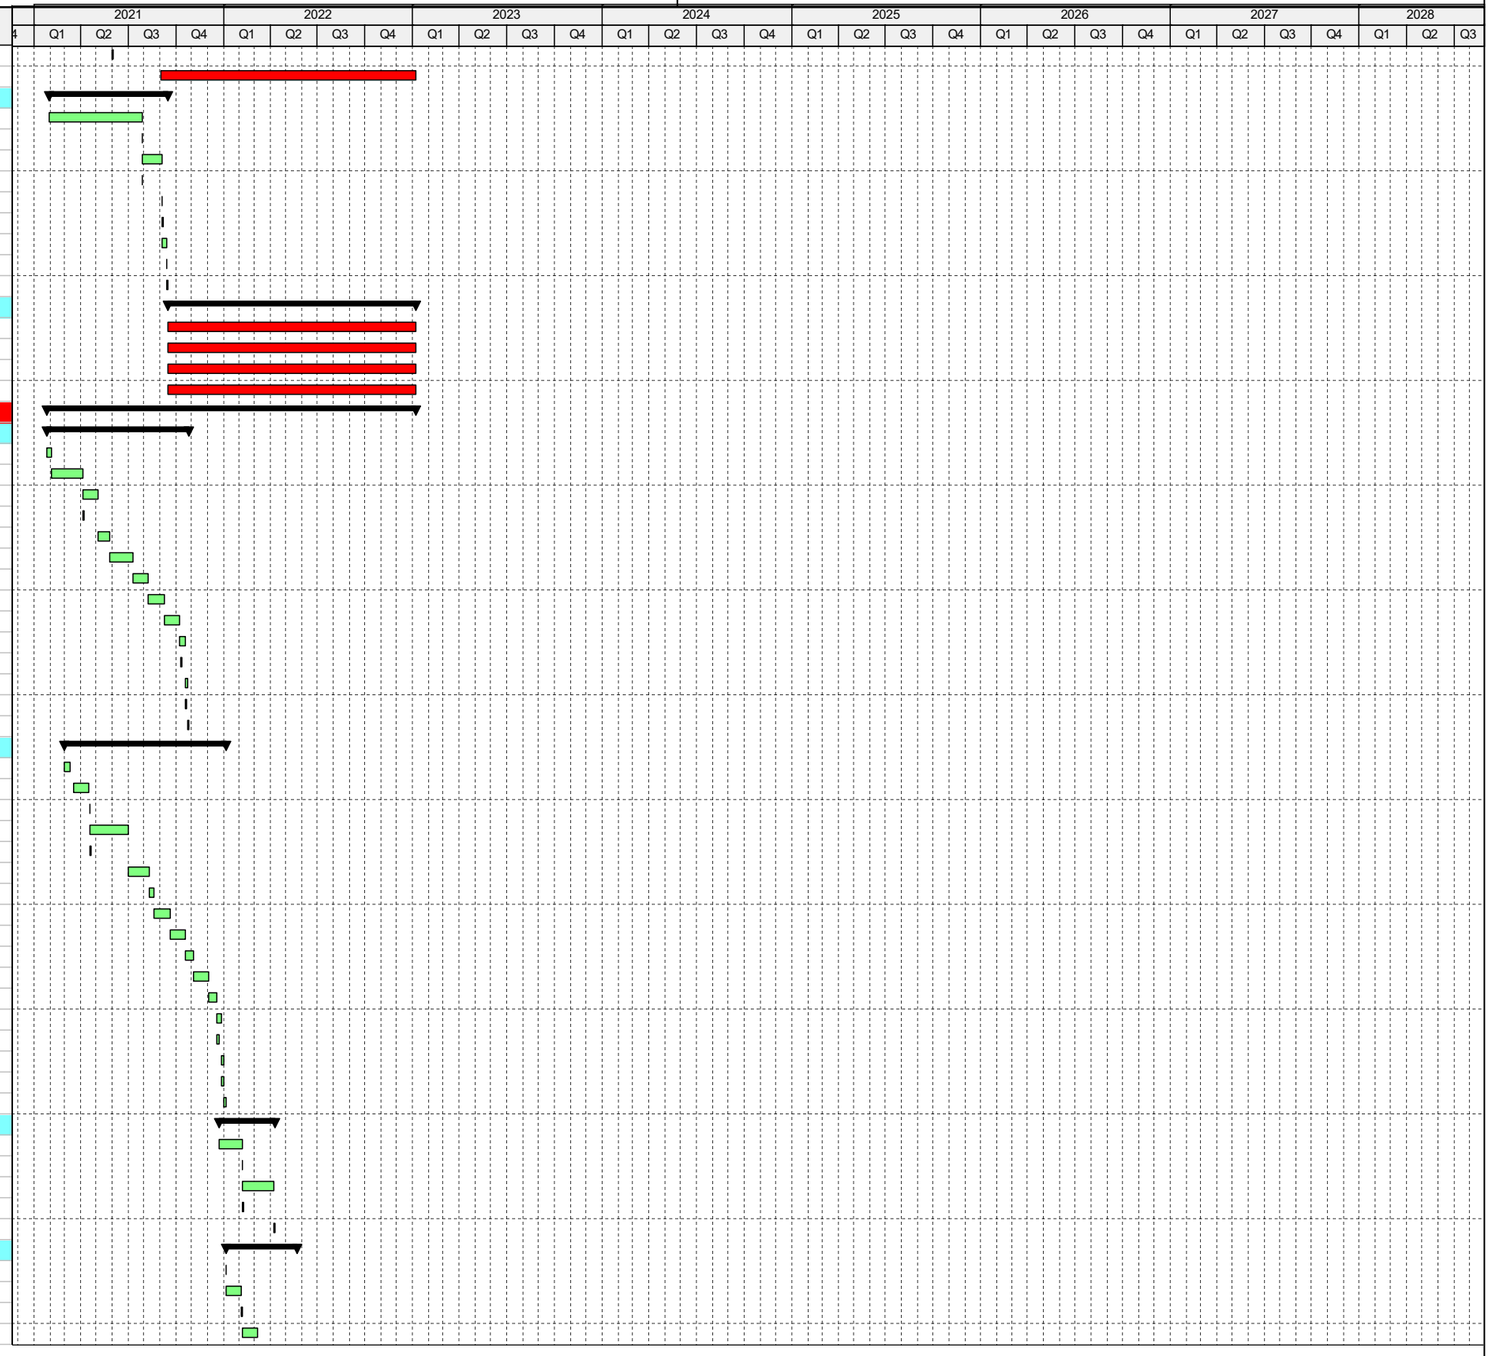

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-32940	Envío de respuesta de cargue de información a Interventoría	1	06-Feb-22	07-Feb-22
P-37490	Diligenciar los formatos de la plataforma	1	07-Mar-22	08-Mar-22
P-37500	Evaluación de la información por la Autridad Ambiental	30	07-Mar-22	06-Apr-22
P-42640	Visita de campo de la autoridad ambiental	15	06-Apr-22	21-Apr-22
P-44160	Otorgamiento del permiso	30	21-Apr-22	21-May-22
P-50240	Envío del permiso de movilización de madera a interventoría	3	21-May-22	24-May-22
PLMB-T1-V04.1.06.3.5.3	**Permiso de Publicidad Exterior Patio Taller**	194	31-Jan-21	13-Aug-21
P-3300	Elaboración de la valla (Dirección Social)	148	31-Jan-21	28-Jun-21
P-3850	Permiso de Acueducto para poner Valla	111	11-Mar-21	30-Jun-21
P-7020	Radicación de solicitud de permiso de publicidad exterior	1	28-Jun-21	29-Jun-21
P-7030	Revisión por la Autoridad Ambiental	30	28-Jun-21	28-Jul-21
P-7040	Envío de radicación de solicitud del permiso a Interventoría	1	28-Jun-21	29-Jun-21
P-7900	Obtención del permiso	1	28-Jul-21	29-Jul-21
P-7910	Envío del permiso a la Interventoría	1	28-Jul-21	29-Jul-21
P-7920	Solicitud de póliza	13	28-Jul-21	10-Aug-21
P-8390	Radicación de póliza a AAC	1	10-Aug-21	11-Aug-21
P-8410	Envío de radicación de póliza a Interventoría	3	10-Aug-21	13-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.06.3.5.4	**Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies sil**	4	25-Mar-21	29-Mar-21
P-4070	Se obtendra por un proveedor con permiso vigente	1	25-Mar-21	26-Mar-21
P-4080	Se enviara el permiso a la Interventoría	1	25-Mar-21	26-Mar-21
P-4120	Radicación a la autoridad ambiental del uso del permiso de colecta antes del incio de	1	26-Mar-21	27-Mar-21
P-4170	Envío de radicación a la interventoría	1	28-Mar-21	29-Mar-21
PLMB-T1-V04.1.06.3.5.5	**Actualización de la Caracterización del Componente Biótico**	651	27-Mar-21	07-Jan-23
P-4140	Inventario de nidos	25	27-Mar-21	21-Apr-21
P-6850	Caracterización en campo (Colecta y observaciones)	14	21-Apr-21	05-May-21
P-7100	Elaboración de la caracterización	8	05-May-21	13-May-21
P-7110	Evaluación de los impactos ambientales	8	05-May-21	13-May-21
P-7460	Actualización del programa de fauna del Plan de Manejo Ambiental - CAR	1	13-May-21	14-May-21
P-7500	Elaboración del Plan de Manejo de fauna	2	14-May-21	16-May-21
P-7530	Radicación del Plan de Manejo Ambiental ante la SDA	1	16-May-21	17-May-21
P-7570	Pronunciamiento de AAC	15	17-May-21	01-Jun-21
P-7580	Envío de radicación del Plan de Manejo Ambiental a Interventoría	1	17-May-21	18-May-21
P-8000	Envío a la interventoría del pronunciamiento de AAC	1	01-Jun-21	02-Jun-21
P-7990	Implementación del plan	523	02-Aug-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.3.5.6	**Lineamiento para posible intervención en EEP-ZMPA-CER**	62	15-Jun-21	16-Aug-21
P-6650	Preparación de documentacion	29	15-Jun-21	14-Jul-21
P-7480	Radicación de Documentación	15	14-Jul-21	29-Jul-21
P-7830	Respuesta de la entidad	15	29-Jul-21	13-Aug-21
P-7840	Entrega de radicación de documentación a interventoría	1	29-Jul-21	30-Jul-21
P-8400	Envío de respuesta de entidad a interventoría	3	13-Aug-21	16-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.06.3.5.8	**Permiso de Trabajo Nocturno**	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-8730	Solicitud de permiso a las Alcaldías Menores	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-8740	Envío de la solicitud del permiso a la Interventoría	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-8750	Expedición del permiso de trabajo nocturno	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-8760	Envío de permiso a la Interventoría	508	17-Aug-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.3.5.9	**Permiso de Vertimientos**	152	17-Aug-21	16-Jan-22
P-8780	Preparación de documentación y radicación ante AAC	29	17-Aug-21	15-Sep-21
P-9220	Envío de solicitud a la interventoría	5	15-Sep-21	20-Sep-21
P-10390	Pago de evaluación a la autoridad ambiental	1	15-Oct-21	16-Oct-21
P-10400	Revisión por la autoridad ambiental	29	15-Oct-21	13-Nov-21
P-11050	Solicitud de Información Adicional o Complementos	22	13-Nov-21	05-Dec-21
P-11730	Revisión por la autoridad ambiental de información adicional o complementos	29	05-Dec-21	03-Jan-22
P-14150	Expedición del permiso de vertimientos	1	03-Jan-22	04-Jan-22
P-14160	Recurso de reposición	5	03-Jan-22	08-Jan-22
P-14170	Envío del permiso a la interventoría	3	03-Jan-22	06-Jan-22
P-16160	Respuesta al recurso de reposición de AAC	5	08-Jan-22	13-Jan-22
P-16170	Envío de recurso de reposición a Interventoría	3	08-Jan-22	11-Jan-22
P-16450	Envío del permiso a la Interventoría	3	13-Jan-22	16-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.06.3.5.10	**Registro de Vertimientos**	149	17-Aug-21	13-Jan-22
P-8770	Preparación del formulario y radicación ante AAC	131	17-Aug-21	26-Dec-21
P-13680	Expedición del registro de vertimientos	15	26-Dec-21	10-Jan-22
P-13690	Envío de radicación a la interventoría	1	26-Dec-21	27-Dec-21




© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-16240	Envío del registro a la interventoría	3	10-Jan-22	13-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.06.4	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	809	20-Oct-20	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.4.1	Cronograma Ambiental	87	19-Jan-21	16-Apr-21
P-3150	Elaboración del Cronograma	30	19-Jan-21	18-Feb-21
P-3540	Entrega del Cronograma	1	18-Feb-21	19-Feb-21
P-3550	Revisión del Cronograma por la Interventoría	10	18-Feb-21	28-Feb-21
P-3680	Entrega de observaciones por la Interventoría	0	28-Feb-21	28-Feb-21
P-3690	Atención de Observaciones del Concesionario	11	28-Feb-21	11-Mar-21
P-3830	Entrega de las observaciones a la Interventoría por el Concesionario	1	11-Mar-21	12-Mar-21
P-3840	Revisión de las Observaciones por la Interventoría	3	11-Mar-21	14-Mar-21
P-3890	Atención de observaciones por Concesionario	16	14-Mar-21	30-Mar-21
P-4470	Validación de la Interventoría	5	30-Mar-21	04-Apr-21
P-6640	Envío del Cronograma a la EMB	1	15-Apr-21	16-Apr-21
PLMB-T1-V04.1.06.4.2	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1620	Entrega del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	20-Oct-20	21-Oct-20
P-1630	Revisión del SG-SST por la Interventoría	10	20-Oct-20	30-Oct-20
P-1930	Entrega de observaciones por parte de la Interventoría	1	30-Oct-20	31-Oct-20
P-1940	Atención de observaciones por el Concesionario	5	30-Oct-20	04-Nov-20
P-1960	Entrega de observaciones por el Concesionario	1	04-Nov-20	05-Nov-20
P-1970	Revisión de observaciones por la Interventoría	3	04-Nov-20	07-Nov-20
P-2880	Entrega a la Interventoría de la certificación de implementación del SG-SST expedido p	1	30-Dec-20	31-Dec-20
P-2890	Actualización permanente del Sistema de Gestión SST	738	30-Dec-20	07-Jan-23
P-2900	Entrega anual de la certificación de implementación del SG-SST expedido por la ARL	738	30-Dec-20	07-Jan-23
P-3240	Validación del SG-SST por la Interventoría	1	21-Jan-21	22-Jan-21
P-3250	Remisión del SG-SST a la EMB	1	21-Jan-21	22-Jan-21
PLMB-T1-V04.1.06.4.3	Plan de Gestión del Riesgo de Desastres	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1380	Elaboración del Plan de Gestión de Riesgo de Desastre - PGRD	91	20-Oct-20	19-Jan-21
P-3160	Entrega del Plan de Gestión de Riesgo de Desastre	1	19-Jan-21	20-Jan-21
P-3170	Revisión por la Interventoría del Plan de Gestión de Riesgo de Desastre	10	19-Jan-21	29-Jan-21
P-3270	Atención de observaciones del PGRD por el Concesionario	10	29-Jan-21	08-Feb-21
P-3440	Revisión de ajustes por la Interventoría	3	08-Feb-21	11-Feb-21
P-3490	Validación del PGRD por la Interventoría	1	11-Feb-21	12-Feb-21
P-3500	Remisión del PGRD a las Autoridades Gubernamentales	1	12-Feb-21	13-Feb-21
P-3520	Envío a la Interveventoría de carta de remisión del PGRD a las Autoridades Gubernam	1	15-Feb-21	16-Feb-21
P-3530	Actualización semestral	691	15-Feb-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.4.4	SGA - ISO 14001	361	20-Oct-20	16-Oct-21
P-1390	Implementación del Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14001:	360	20-Oct-20	15-Oct-21
P-13530	Presentación del Sistema e Gestión Ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14001:201	1	15-Oct-21	16-Oct-21
PLMB-T1-V04.1.06.4.5	Matriz de Huella de Carbono	762	06-Dec-20	07-Jan-23
P-2700	Elaboración Plan Huella de Carbono	30	06-Dec-20	05-Jan-21
P-2940	Envío Plan Huella de Carbono a Interventoría	1	05-Jan-21	06-Jan-21
P-2950	Revisión Plan Huella de Carbono por Interventoría	5	05-Jan-21	10-Jan-21
P-3040	Presentación de observaciones por la Interventoría al Concesionario	1	10-Jan-21	11-Jan-21
P-3050	Atención de Observaciones por el Concesionario	5	11-Jan-21	16-Jan-21
P-3090	Revisión por interventoría y validación	1	16-Jan-21	17-Jan-21
P-3100	Envío de Plan Huella de Carbono aprobado a la EMB	1	17-Jan-21	18-Jan-21
P-3110	Levantameinto Matriz Huella de Carbono (Mensual)	720	17-Jan-21	07-Jan-23
P-22480	Radicación del levantamiento de matriz huella de carbono (anual) a interventoría	367	05-Jan-22	07-Jan-23
P-22490	Revisión y validación por interventoría	367	05-Jan-22	07-Jan-23
P-22580	Respuesta a observaciones por parte del concesionario	362	10-Jan-22	07-Jan-23
P-22590	Revisión por interventoría	362	10-Jan-22	07-Jan-23
P-23040	Radicación a EMB	357	15-Jan-22	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.4.6	Departamento de Gestión Ambiental - DGA	37	01-Apr-21	08-May-21
P-4500	Estructuración de Departamento de Gestión Ambiental	29	01-Apr-21	30-Apr-21
P-7090	Radicación ante la Autoridad Ambiental del Departamento de Gestión Ambiental	1	05-May-21	06-May-21
P-7160	Envío de Carta de radicación a la Interventoría del Departamento de Gestión Ambient	1	07-May-21	08-May-21
PLMB-T1-V04.1.06.4.7	Informe de Avance mensual de la Gestión Ambiental y SST por cada frente de	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-8510	Elaboración del Informe	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-9080	Entrega del Informe a la Interventoría	487	07-Sep-21	07-Jan-23
P-9090	Revisión del Informe por la interventoría	487	07-Sep-21	07-Jan-23
P-9300	Entrega de observaciones de la Interventoría al Concesionario	477	17-Sep-21	07-Jan-23
P-9310	Atención de observaciones de la Interventoría por el Concesionario	477	17-Sep-21	07-Jan-23



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-10140	Revisión y validacion de las observaciones por la Interventoría	467	27-Sep-21	07-Jan-23
P-10150	Remisión del Informe a la EMB	467	27-Sep-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.4.8	**Protocolo de Monitoreo de Ruido y Vibraciones (Fase de Construcción, Puest**	99	10-Sep-22	18-Dec-22
P-65660	Elaboración del Protocolo	59	10-Sep-22	08-Nov-22
P-76200	Entrega a la Interventoría	1	08-Nov-22	09-Nov-22
P-76210	Revisión de la Interventoría	18	08-Nov-22	26-Nov-22
P-81210	Entrega al Concesionario	1	26-Nov-22	27-Nov-22
P-81220	Ajustes del Concesionario	18	26-Nov-22	14-Dec-22
P-82830	Entrega a la Interventoría	1	14-Dec-22	15-Dec-22
P-82840	Revisión y Validación de la Interventoría	3	14-Dec-22	17-Dec-22
P-82910	Remisión a la EMB	1	17-Dec-22	18-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.06.4.9	**Comite Ambiental y SST Semanal**	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1400	Comite Ambiental y SST que se realiza semanal	809	20-Oct-20	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.4.10	**Comite Integral Mensual**	809	20-Oct-20	07-Jan-23
P-1410	Comite Intergral que se realiza una vez al mes	809	20-Oct-20	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.5	**IMPLEMENTACIÓN**	508	17-Aug-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.5.1	**Implementación del PMAS y PMS de PLMB para Entidades Multilaterales**	508	17-Aug-21	07-Jan-23
P-8500	Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social y Plan de Monitoreo y Seguimi	508	17-Aug-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6	**HITOS PREVIOS A FASE DE CONSTRUCCION**	646	01-Apr-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.1	**ACTUALIZACIÓN DEL EIAS-PMAS-PMS DE PLMB PARA ENTIDADES MULTILA**	646	01-Apr-21	07-Jan-23
P-4510	Elaboración del Documento	566	01-Apr-21	19-Oct-22
P-72170	Entrega a la Interventoría	1	19-Oct-22	20-Oct-22
P-72180	Revisión de la Interventoría	18	19-Oct-22	06-Nov-22
P-76180	Entrega al Concesionario	1	06-Nov-22	07-Nov-22
P-76190	Ajustes del Concesionario	15	06-Nov-22	21-Nov-22
P-78400	Entrega a la Interventoría	1	21-Nov-22	22-Nov-22
P-78410	Revisión y Validación de la Interventoría	3	21-Nov-22	24-Nov-22
P-79550	Remisión a la EMB	1	24-Nov-22	25-Nov-22
P-79560	Revisión por la EMB	35	24-Nov-22	29-Dec-22
P-83400	Entrega de EMB al Concesionario para ajustes	1	29-Dec-22	30-Dec-22
P-83410	Atención de observaciones por el Concesionario	5	29-Dec-22	03-Jan-23
P-83520	Revisión y Concepto de No Objeción de EMB y Entidades Multilaterlaes	3	03-Jan-23	06-Jan-23
P-83600	No Objeción Ambiental y Social por la EMB	1	06-Jan-23	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.2	**PERMISO DE TRABAJO NOCTURNO**	29	09-Dec-22	07-Jan-23
P-82540	Solicitud de permiso a las Alcaldías Menores	1	09-Dec-22	10-Dec-22
P-82550	Envío de solicitud del permiso a Interventoría	1	09-Dec-22	10-Dec-22
P-82590	Expedición del permiso de trabajo nocturno	25	10-Dec-22	04-Jan-23
P-83540	Envío de permiso a la Interventoría	3	04-Jan-23	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.3	**PERMISO DE PUBLICIDAD EXTERIOR**	169	22-Jul-22	07-Jan-23
P-52290	Elaboración de las vallas por frente de obra (Dirección Social)	76	22-Jul-22	06-Oct-22
P-69270	Radicación de solicitud de permiso de publicidad exterior	1	06-Oct-22	07-Oct-22
P-69280	Revisión por la Autoridad Ambiental	60	06-Oct-22	05-Dec-22
P-69290	Envío de radicación de solicitud a Interventoría	1	06-Oct-22	07-Oct-22
P-81610	Obtención del permiso	1	05-Dec-22	06-Dec-22
P-81620	Envío del permiso a la Interventoría	1	05-Dec-22	06-Dec-22
P-81630	Solicitud de póliza	30	05-Dec-22	04-Jan-23
P-83550	Radicación de póliza a AAC	1	04-Jan-23	05-Jan-23
P-83560	Envío de radicación de póliza a Interventoría	3	04-Jan-23	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.4	**LICENCIAS AMBIENTALES**	626	14-Apr-21	31-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.4.1	**Subestaciones Eléctricas Receptoras y redes de conexión**	626	14-Apr-21	31-Dec-22
P-6580	Elaboración de documentos	360	14-Apr-21	09-Apr-22
P-35700	Radicación de solicitud de licencia ambiental	1	09-Apr-22	10-Apr-22
P-35710	Evaluación de la autoridad ambiental	30	09-Apr-22	09-May-22
P-35720	Envío de radicación de solicitud a Interventoría	1	09-Apr-22	10-Apr-22
P-40340	Visita de campo de la autoridad ambiental	30	09-May-22	08-Jun-22
P-44150	Evaluación de la autoridad ambiental	90	08-Jun-22	06-Sep-22
P-63620	Entrega de observaciones de la autoridad ambiental	1	06-Sep-22	07-Sep-22
P-63630	Atención de observaciones de la autoridad ambiental por parte del concesionario	30	06-Sep-22	06-Oct-22
P-69260	Evaluación de la autoridad ambiental a observaciones	60	06-Oct-22	05-Dec-22
P-81600	Otorgamiento de la licencia ambiental	23	05-Dec-22	28-Dec-22
P-83370	Envío a la Interventoría	3	28-Dec-22	31-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.4.2	**Planta fija de Concreto**	626	14-Apr-21	31-Dec-22

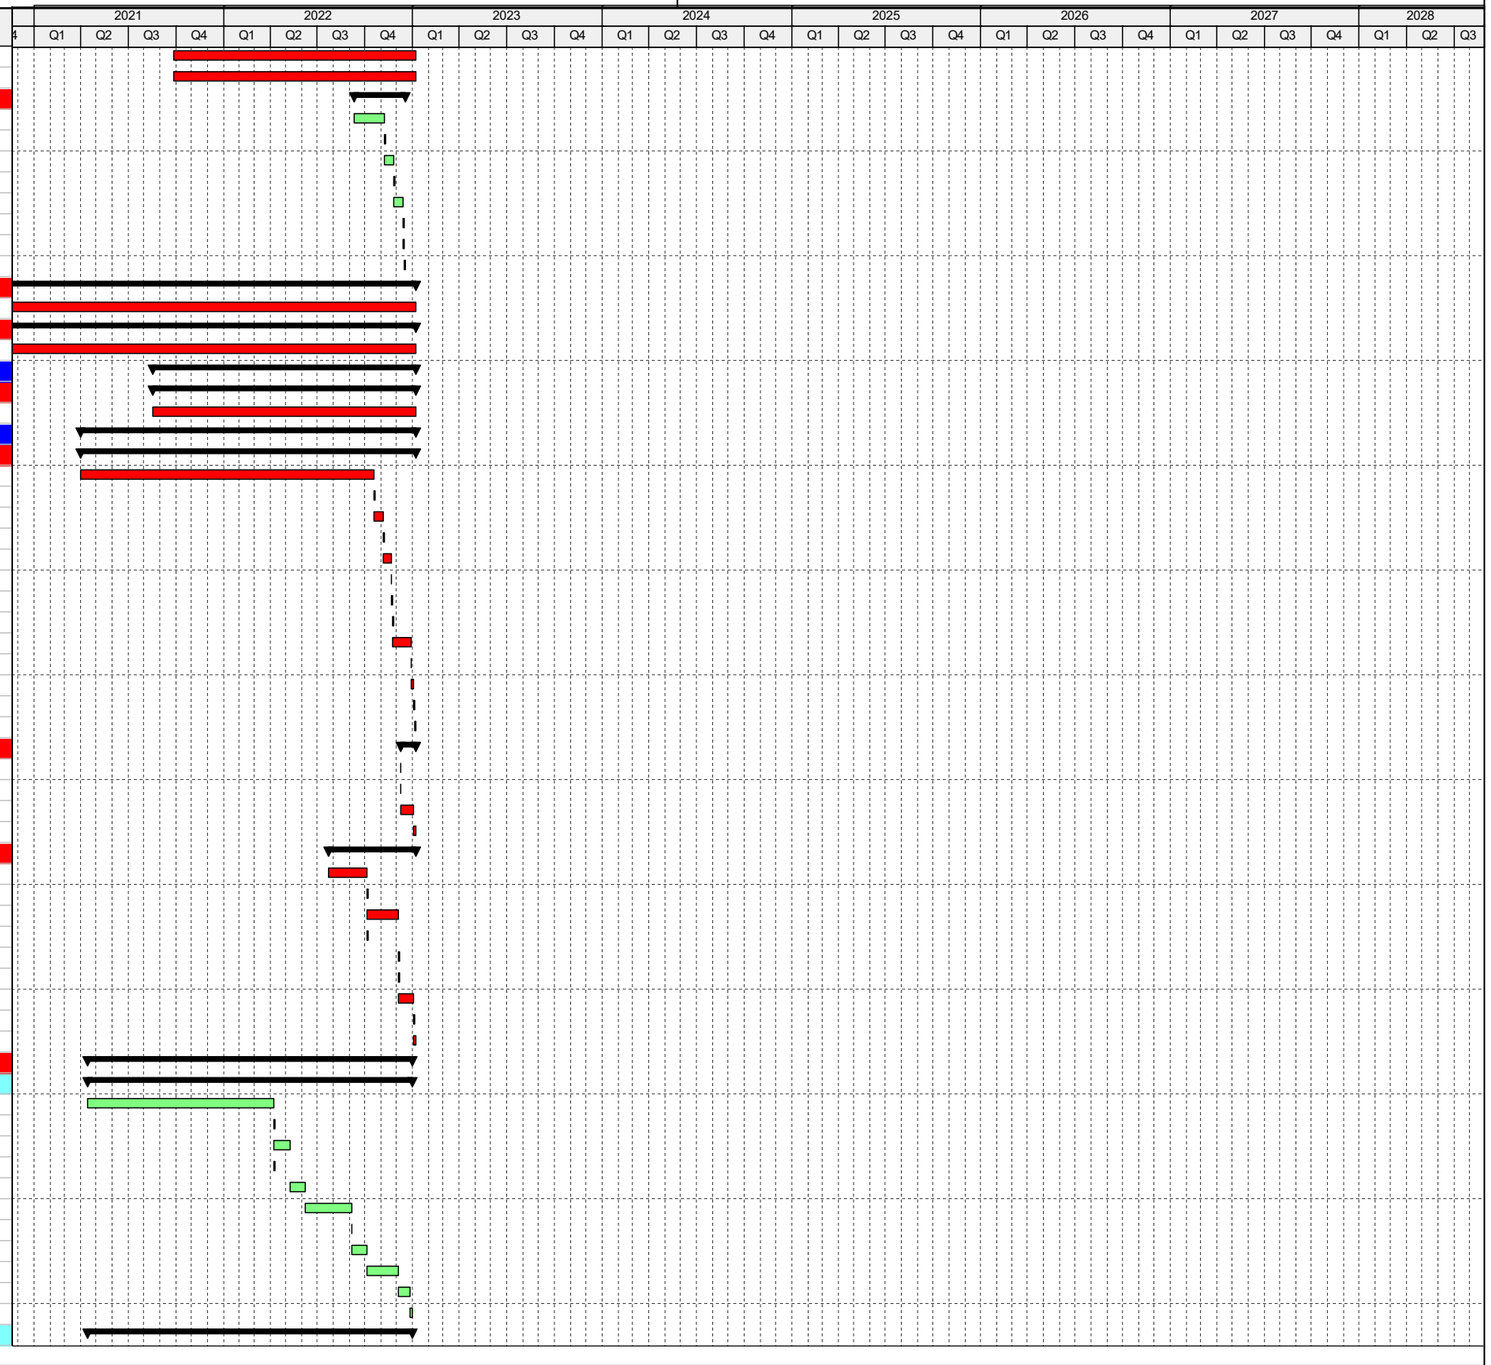


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-6590	Elaboración de documentos	360	14-Apr-21	09-Apr-22
P-35730	Radicación de solicitud de licencia ambiental	1	09-Apr-22	10-Apr-22
P-35740	Evaluación de la autoridad ambiental	30	10-Apr-22	10-May-22
P-35750	Envío de radicación la solicitud a la interventoría	1	10-Apr-22	11-Apr-22
P-40430	Visita de campo de la autoridad ambiental	30	10-May-22	09-Jun-22
P-44170	Evaluación de la autoridad ambiental	90	09-Jun-22	07-Sep-22
P-63740	Entrega de Observaciones de la autoridad ambiental	1	07-Sep-22	08-Sep-22
P-63750	Atención de observaciones de la autoridad ambiental por parte del concesionario	30	07-Sep-22	07-Oct-22
P-69340	Evaluación de la autoridad ambiental	60	07-Oct-22	06-Dec-22
P-82220	Otorgamiento de la licencia ambiental	22	06-Dec-22	28-Dec-22
P-83380	Envío a la Interventoría	3	28-Dec-22	31-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.5	**PROVEEDORES CON LICENCIAS AMBIENTALES**	87	05-Oct-22	31-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.5.1	**Fuentes de Materiales**	87	05-Oct-22	31-Dec-22
P-68850	Revisión de documentos ambientales de los proveedores	86	05-Oct-22	30-Dec-22
P-83420	Envío de documentación a la Interventoría de las licencias ambientales de los proveed	1	30-Dec-22	31-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.5.2	**Disposición de Residuos de Construcción y Demolición**	87	05-Oct-22	31-Dec-22
P-68860	Revisión de documentos ambientales de los proveedores	86	05-Oct-22	30-Dec-22
P-83430	Envío de documentación a la Interventoría de las licencias ambientales de los sitios de	1	30-Dec-22	31-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6	**PERMISOS AMBIENTALES**	555	01-Jul-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1	**Permiso de tratamiento silvicutural y especies en veda (árboles y epifita**	555	01-Jul-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.1	**Tramo 1**	534	01-Jul-21	17-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.1.8	**Permiso de tratamiento silvicutural y especies en veda (árboles**	425	01-Jul-21	30-Aug-22
P-89(	Levantamiento del Inventario Forestal	90	01-Jul-21	29-Sep-21
P-11(	Solicitud usuario y asignación de clave -Software - Cartera- Obtención Acta Código SIC	60	30-Sep-21	29-Nov-21
P-13(	Diseño paisajístico, Memoria Técnica, Balance de zonas verdes, Propuesta de compe	60	09-Oct-21	08-Dec-21
P-13(	Preparación de la documentación, Pago por Evaluación Silvicultural y Radicación ante	60	09-Oct-21	08-Dec-21
P-19(	Revisión Autoridad Ambiental	90	08-Dec-21	08-Mar-22
P-19(	Envío de radicación a interventoría	1	09-Dec-21	10-Dec-21
P-30	Solicitud de Información Adicional o Complementos por AAC	22	08-Mar-22	30-Mar-22
P-33	Revisión por la autoridad ambiental de información adicional o complementos	45	30-Mar-22	14-May-22
P-42	Auto de Inicio del permiso	30	14-May-22	13-Jun-22
P-44	Visita de evaluación Inventario Forestal AAC y expedición del concepto técnico	30	13-Jun-22	13-Jul-22
P-50	Expedición del permiso de tratamiento silvicultural	30	13-Jul-22	12-Aug-22
P-59	Recurso de reposición	10	12-Aug-22	22-Aug-22
P-59	Envío del permiso a la interventoría	3	13-Aug-22	16-Aug-22
P-60	Respuesta al recurso de reposición de AAC	5	22-Aug-22	27-Aug-22
P-60	Envío de recurso de reposición a Interventoría	3	23-Aug-22	26-Aug-22
P-62	Envío del concepto de recurso de reposición a la Interventoría	3	27-Aug-22	30-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.1.9	**Permiso del Jardín Botánico de Bogota para ubicación de árbol**	109	30-Aug-22	17-Dec-22
P-62	Preparación de documentacion	45	30-Aug-22	14-Oct-22
P-72(	Radicación de Documentación	1	14-Oct-22	15-Oct-22
P-72(	Respuesta de la entidad	60	15-Oct-22	14-Dec-22
P-72(	Envío de radicado a Interventoría	1	15-Oct-22	16-Oct-22
P-82	Envío de respuesta de entidad a interventoría	3	14-Dec-22	17-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.2	**Tramo 2**	525	31-Jul-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.2.8	**Permiso de tratamiento silvicutural y especies en veda (árboles**	425	31-Jul-21	29-Sep-22
P-10	Levantamiento del Inventario Forestal	90	31-Jul-21	29-Oct-21
P-14(	Solicitud usuario y asignación de clave -Software - Cartera- Obtención Acta Código SIC	60	30-Oct-21	29-Dec-21
P-16	Diseño paisajístico, Memoria Técnica, Balance de zonas verdes, Propuesta de compe	60	08-Nov-21	07-Jan-22
P-16	Preparación de la documentación, Pago por Evaluación Silvicultural y Radicación ante	60	08-Nov-21	07-Jan-22
P-22	Revisión Autoridad Ambiental	90	07-Jan-22	07-Apr-22
P-22	Envío de radicación a interventoría	1	08-Jan-22	09-Jan-22
P-35	Solicitud de Información Adicional o Complementos por AAC	22	07-Apr-22	29-Apr-22
P-37	Revisión por la autoridad ambiental de información adicional o complementos	45	29-Apr-22	13-Jun-22
P-44	Auto de Inicio del permiso	30	13-Jun-22	13-Jul-22
P-50	Visita de evaluación Inventario Forestal AAC y expedición del concepto técnico	30	13-Jul-22	12-Aug-22
P-59	Expedición del permiso de tratamiento silvicultural	30	12-Aug-22	11-Sep-22
P-65	Recurso de reposición	10	11-Sep-22	21-Sep-22
P-65	Envío del permiso a la interventoría	3	12-Sep-22	15-Sep-22
P-67	Respuesta al recurso de reposición de AAC	5	21-Sep-22	26-Sep-22
P-67	Envío de recurso de reposición a Interventoría	3	22-Sep-22	25-Sep-22
P-68	Envío del concepto de recurso de reposición a la Interventoría	3	26-Sep-22	29-Sep-22

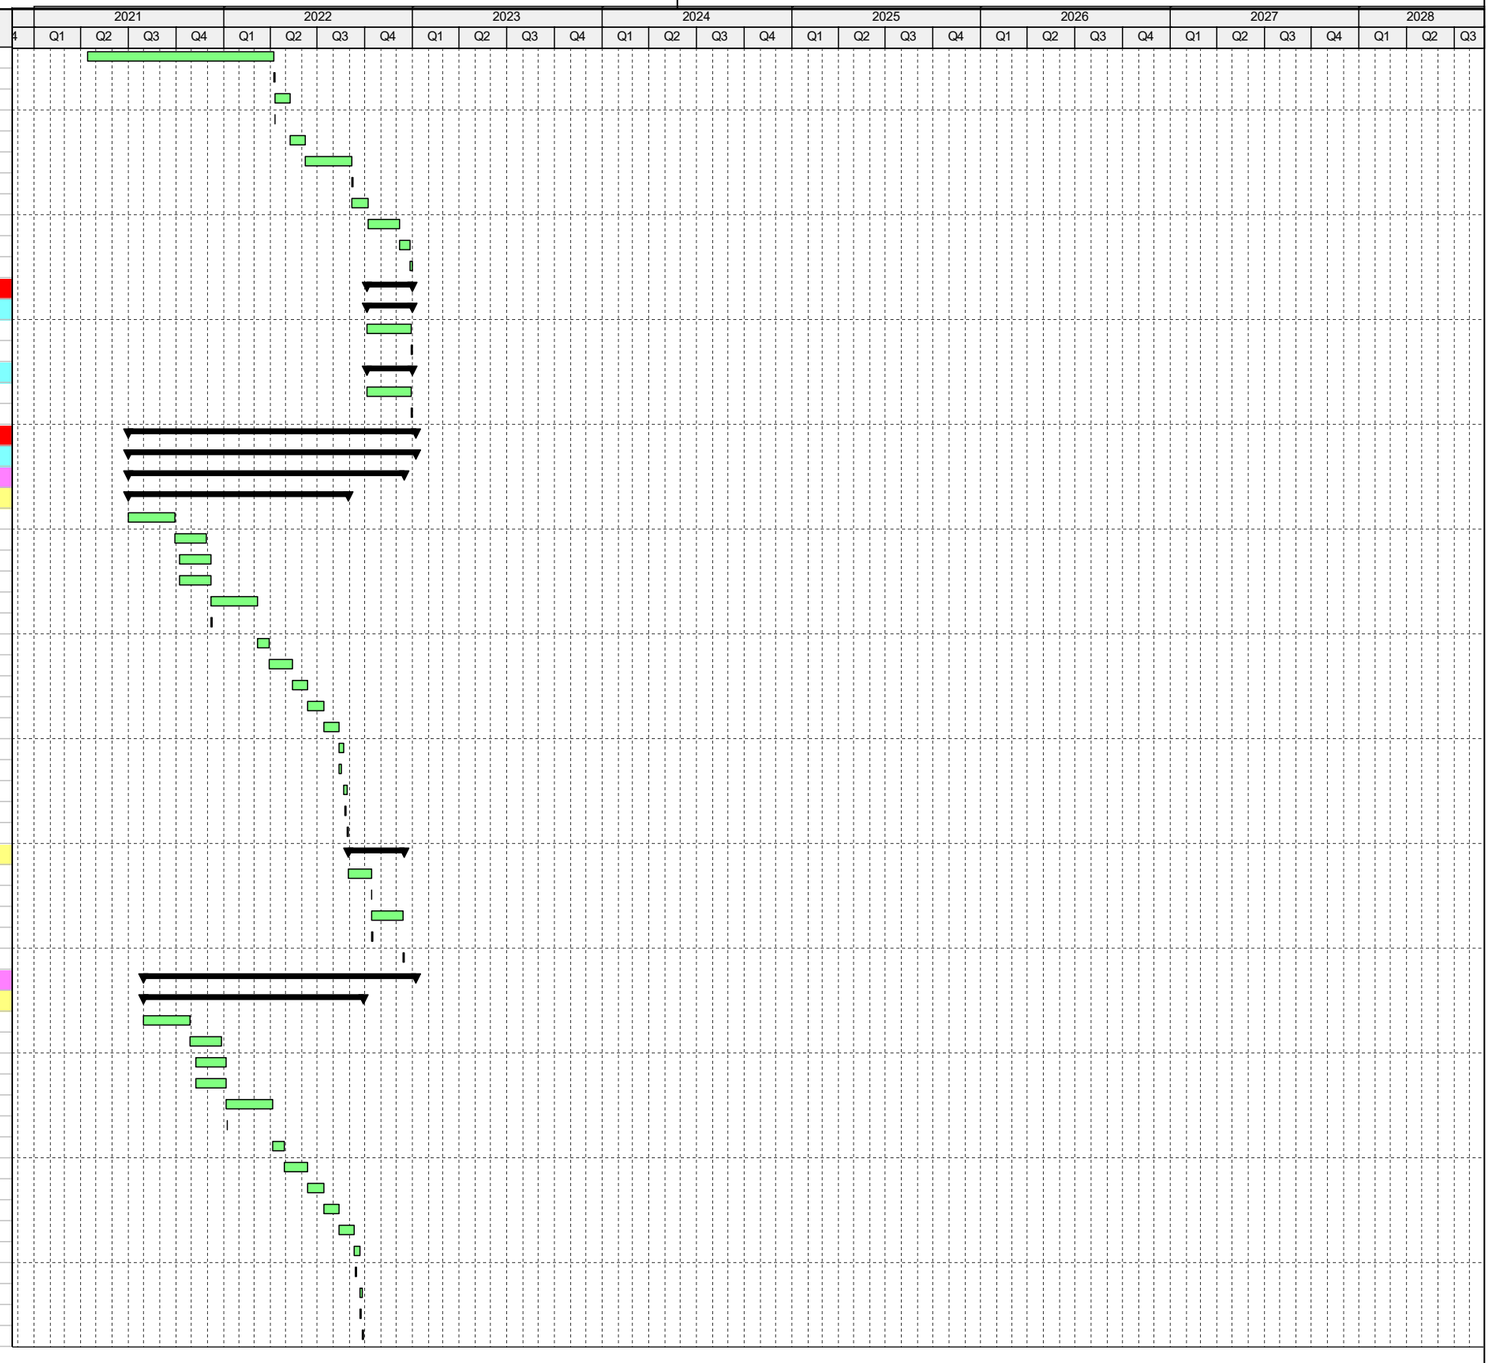


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.2.9	**Permiso del Jardín Botánico de Bogota para ubicación de árbol**	100	29-Sep-22	07-Jan-23
P-68	Preparación de documentacion	45	29-Sep-22	13-Nov-22
P-78	Radicación de Documentación	1	13-Nov-22	14-Nov-22
P-78	Respuesta de la entidad	54	14-Nov-22	07-Jan-23
P-78	Envío de radicado a Interventoría	1	14-Nov-22	15-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.3	**Tramo 3**	495	30-Aug-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.3.8	**Permiso de tratamiento silvicutural y especies en veda (árboles**	425	30-Aug-21	29-Oct-22
P-10	Levantamiento del Inventario Forestal	90	30-Aug-21	28-Nov-21
P-17	Solicitud usuario y asignación de clave -Software - Cartera- Obtención Acta Código SIC	60	29-Nov-21	28-Jan-22
P-19	Diseño paisajístico, Memoria Técnica, Balance de zonas verdes, Propuesta de compe	60	08-Dec-21	06-Feb-22
P-19	Preparación de la documentación, Pago por Evaluación Silvicultural y Radicación ante	60	08-Dec-21	06-Feb-22
P-26	Revisión Autoridad Ambiental	90	06-Feb-22	07-May-22
P-26	Envío de radicación a interventoría	1	07-Feb-22	08-Feb-22
P-40	Solicitud de Información Adicional o Complementos por AAC	22	07-May-22	29-May-22
P-43	Revisión por la autoridad ambiental de información adicional o complementos	45	29-May-22	13-Jul-22
P-50	Auto de Inicio del permiso	30	13-Jul-22	12-Aug-22
P-59	Visita de evaluación Inventario Forestal AAC y expedición del concepto técnico	30	12-Aug-22	11-Sep-22
P-65	Expedición del permiso de tratamiento silvicultural	30	11-Sep-22	11-Oct-22
P-70	Recurso de reposición	10	11-Oct-22	21-Oct-22
P-71	Envío del permiso a la interventoría	3	12-Oct-22	15-Oct-22
P-72	Respuesta al recurso de reposición de AAC	5	21-Oct-22	26-Oct-22
P-73	Envío de recurso de reposición a Interventoría	3	22-Oct-22	25-Oct-22
P-74	Envío del concepto de recurso de reposición a la Interventoría	3	26-Oct-22	29-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.3.9	**Permiso del Jardín Botánico de Bogota para ubicación de árbol**	70	29-Oct-22	07-Jan-23
P-75	Preparación de documentacion	45	29-Oct-22	13-Dec-22
P-82	Radicación de Documentación	1	13-Dec-22	14-Dec-22
P-82	Respuesta de la entidad	24	14-Dec-22	07-Jan-23
P-82	Envío de radicado a Interventoría	1	14-Dec-22	15-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.4	**Tramo 4**	465	29-Sep-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.4.8	**Permiso de tratamiento silvicutural y especies en veda (árboles**	425	29-Sep-21	28-Nov-22
P-11	Levantamiento del Inventario Forestal	90	29-Sep-21	28-Dec-21
P-20	Solicitud usuario y asignación de clave -Software - Cartera- Obtención Acta Código SIC	60	29-Dec-21	27-Feb-22
P-22	Diseño paisajístico, Memoria Técnica, Balance de zonas verdes, Propuesta de compe	60	07-Jan-22	08-Mar-22
P-22	Preparación de la documentación, Pago por Evaluación Silvicultural y Radicación ante	60	07-Jan-22	08-Mar-22
P-30	Revisión Autoridad Ambiental	90	08-Mar-22	06-Jun-22
P-30	Envío de radicación a interventoría	1	09-Mar-22	10-Mar-22
P-43	Solicitud de Información Adicional o Complementos por AAC	22	06-Jun-22	28-Jun-22
P-47	Revisión por la autoridad ambiental de información adicional o complementos	45	28-Jun-22	12-Aug-22
P-59	Auto de Inicio del permiso	30	12-Aug-22	11-Sep-22
P-65	Visita de evaluación Inventario Forestal AAC y expedición del concepto técnico	30	11-Sep-22	11-Oct-22
P-70	Expedición del permiso de tratamiento silvicultural	30	11-Oct-22	10-Nov-22
P-77	Recurso de reposición	10	10-Nov-22	20-Nov-22
P-78	Envío del permiso a la interventoría	3	11-Nov-22	14-Nov-22
P-78	Respuesta al recurso de reposición de AAC	5	20-Nov-22	25-Nov-22
P-78	Envío de recurso de reposición a Interventoría	3	21-Nov-22	24-Nov-22
P-79	Envío del concepto de recurso de reposición a la Interventoría	3	25-Nov-22	28-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.4.9	**Permiso del Jardín Botánico de Bogota para ubicación de árbol**	40	28-Nov-22	07-Jan-23
P-81	Preparación de documentacion	40	28-Nov-22	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.5	**Tramo 5**	435	29-Oct-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.5.8	**Permiso de tratamiento silvicutural y especies en veda (árboles**	425	29-Oct-21	28-Dec-22
P-13	Levantamiento del Inventario Forestal	90	29-Oct-21	27-Jan-22
P-25	Solicitud usuario y asignación de clave -Software - Cartera- Obtención Acta Código SIC	60	28-Jan-22	29-Mar-22
P-26	Diseño paisajístico, Memoria Técnica, Balance de zonas verdes, Propuesta de compe	60	06-Feb-22	07-Apr-22
P-26	Preparación de la documentación, Pago por Evaluación Silvicultural y Radicación ante	60	06-Feb-22	07-Apr-22
P-35	Revisión Autoridad Ambiental	90	07-Apr-22	06-Jul-22
P-35	Envío de radicación a interventoría	1	08-Apr-22	09-Apr-22
P-50	Solicitud de Información Adicional o Complementos por AAC	22	06-Jul-22	28-Jul-22
P-53	Revisión por la autoridad ambiental de información adicional o complementos	45	28-Jul-22	11-Sep-22
P-65	Auto de Inicio del permiso	30	11-Sep-22	11-Oct-22
P-70	Visita de evaluación Inventario Forestal AAC y expedición del concepto técnico	30	11-Oct-22	10-Nov-22
P-77	Expedición del permiso de tratamiento silvicultural	30	10-Nov-22	10-Dec-22
P-82	Recurso de reposición	10	10-Dec-22	20-Dec-22

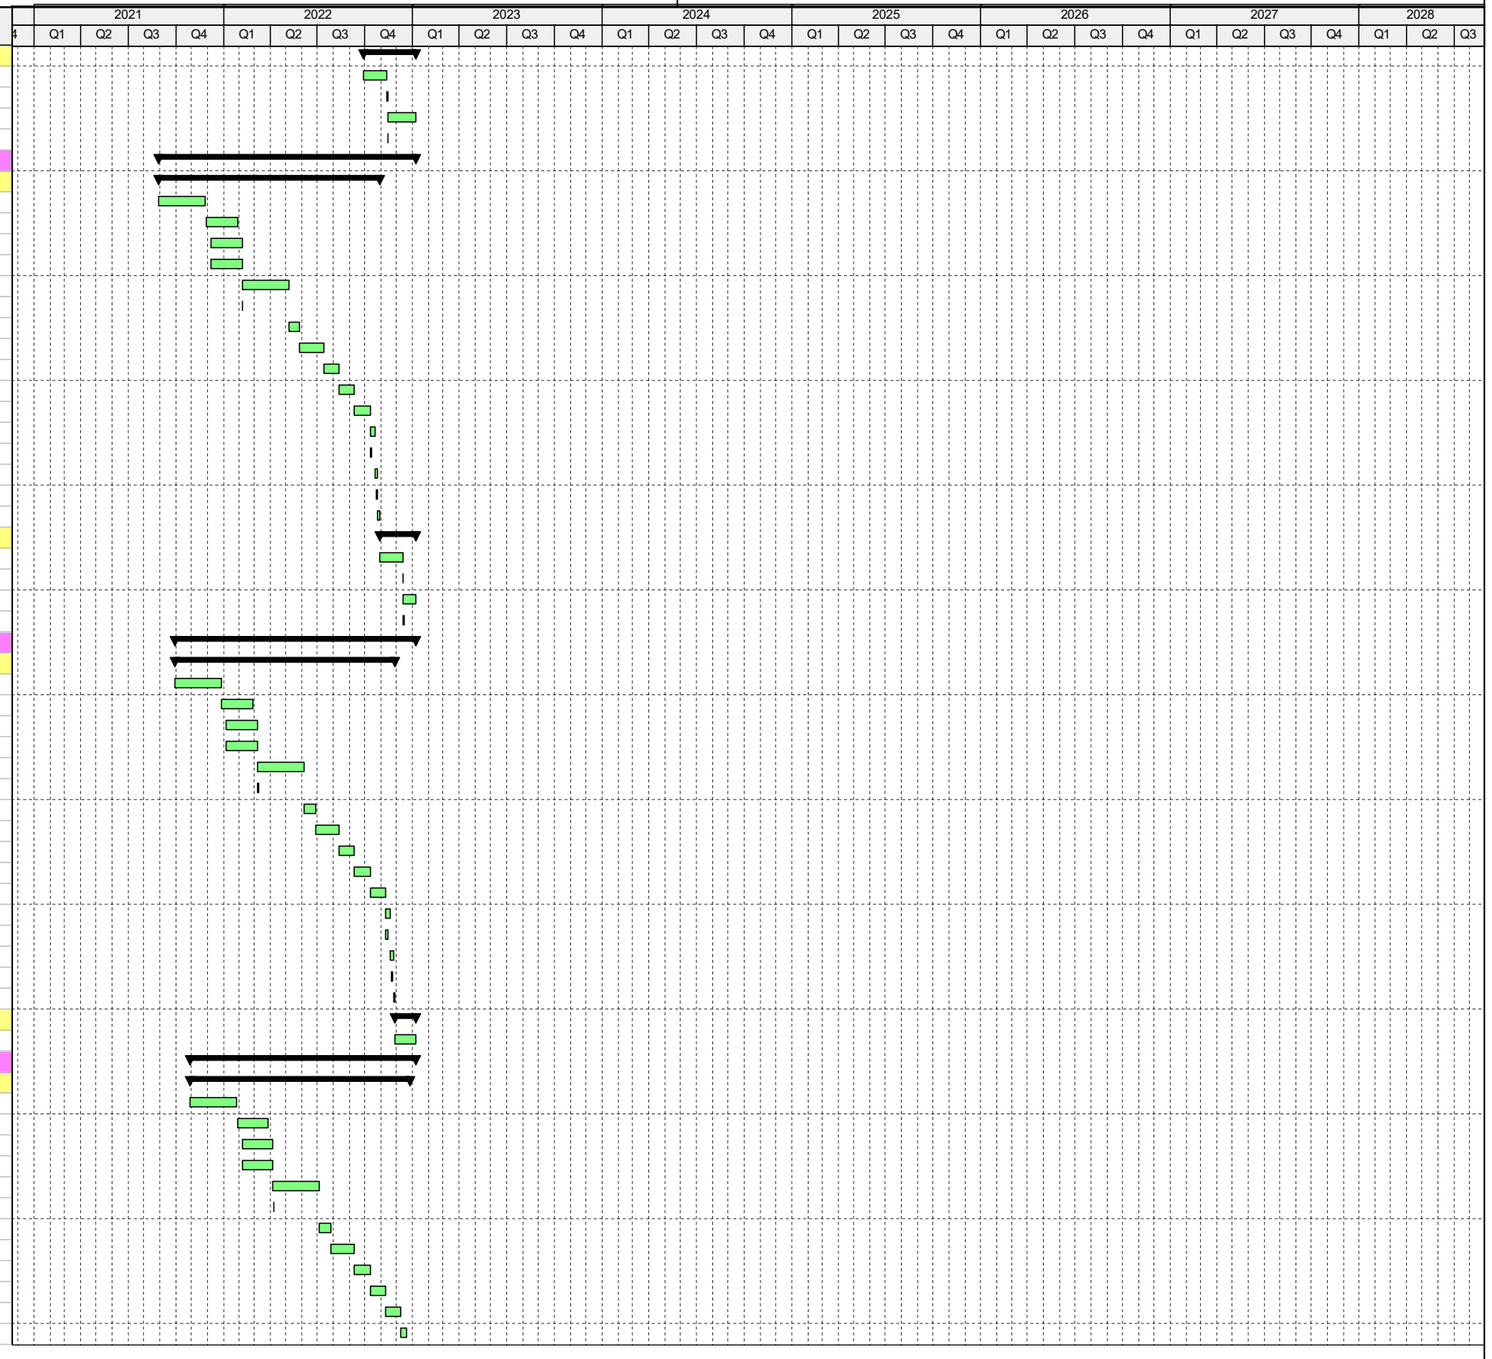

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-82(	Envío del permiso a la interventoría	3	11-Dec-22	14-Dec-22
P-82(	Respuesta al recurso de reposición de AAC	5	20-Dec-22	25-Dec-22
P-83(	Envío de recurso de reposición a Interventoría	3	21-Dec-22	24-Dec-22
P-83(	Envío del concepto de recurso de reposición a la Interventoría	3	25-Dec-22	28-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.5.9	**Permiso del Jardín Botánico de Bogota para ubicación de árbol**	10	28-Dec-22	07-Jan-23
P-83(	Preparación de documentacion	10	28-Dec-22	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.6	**Tramo 6**	405	28-Nov-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.1.6.8	**Permiso de tratamiento silvicutural y especies en veda (árboles**	405	28-Nov-21	07-Jan-23
P-17(	Levantamiento del Inventario Forestal	90	28-Nov-21	26-Feb-22
P-28(	Solicitud usuario y asignación de clave -Software - Cartera- Obtención Acta Código SIC	60	27-Feb-22	28-Apr-22
P-30(	Diseño paisajístico, Memoria Técnica, Balance de zonas verdes, Propuesta de compe	60	08-Mar-22	07-May-22
P-30(	Preparación de la documentación, Pago por Evaluación Silvicultural y Radicación ante	60	08-Mar-22	07-May-22
P-40(	Revisión Autoridad Ambiental	90	07-May-22	05-Aug-22
P-40(	Envío de radicación a interventoría	1	08-May-22	09-May-22
P-57(	Solicitud de Información Adicional o Complementos por AAC	22	05-Aug-22	27-Aug-22
P-62(	Revisión por la autoridad ambiental de información adicional o complementos	45	27-Aug-22	11-Oct-22
P-70(	Auto de Inicio del permiso	30	11-Oct-22	10-Nov-22
P-77(	Visita de evaluación Inventario Forestal AAC y expedición del concepto técnico	30	10-Nov-22	10-Dec-22
P-82(	Expedición del permiso de tratamiento silvicultural	28	10-Dec-22	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2	**Permiso estudio para recolección de especímenes especies silvestres c**	555	01-Jul-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.1	**Tramo 1**	523	01-Jul-21	06-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.1.4	**Permiso de estudio para la recolección de especímenes de esp**	4	01-Jul-21	05-Jul-21
P-89(	Se obtendra por un proveedor con permiso vigente	1	01-Jul-21	02-Jul-21
P-89(	Se enviara el permiso a la Interventoría	1	01-Jul-21	02-Jul-21
P-89(	Radicación a la autoridad ambiental del uso del permiso de colecta antes del incio de	1	02-Jul-21	03-Jul-21
P-90(	Envío de radicación a la interventoría	1	04-Jul-21	05-Jul-21
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.1.5	**Actualización de la Caracterización del Componente Biótico**	521	03-Jul-21	06-Dec-22
P-90(	Inventario de nidos	60	03-Jul-21	01-Sep-21
P-10(	Caracterización en campo (Colecta y observaciones)	60	01-Sep-21	31-Oct-21
P-14(	Elaboración de la caracterización	45	31-Oct-21	15-Dec-21
P-14(	Evaluación de los impactos ambientales	45	31-Oct-21	15-Dec-21
P-19(	Elaboración del Plan de Manejo de fauna	45	15-Dec-21	29-Jan-22
P-25(	Radicación del Plan de Manejo de fauna ante la SDA	1	29-Jan-22	30-Jan-22
P-25(	Pronunciamiento de AAC	60	30-Jan-22	31-Mar-22
P-25(	Envío de radicación del Plan de Manejo Ambiental a Interventoría	1	30-Jan-22	31-Jan-22
P-33(	Implementación del plan	250	31-Mar-22	06-Dec-22
P-33(	Envío a la interventoría del pronunciamiento de AAC	1	31-Mar-22	01-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.2	**Tramo 2**	523	31-Jul-21	05-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.2.4	**Permiso de estudio para la recolección de especímenes de esp**	4	31-Jul-21	04-Aug-21
P-10(	Se obtendra por un proveedor con permiso vigente	1	31-Jul-21	01-Aug-21
P-10(	Se enviara el permiso a la Interventoría	1	31-Jul-21	01-Aug-21
P-10(	Radicación a la autoridad ambiental del uso del permiso de colecta antes del incio de	1	01-Aug-21	02-Aug-21
P-10(	Envío de radicación a la interventoría	1	03-Aug-21	04-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.2.5	**Actualización de la Caracterización del Componente Biótico**	521	02-Aug-21	05-Jan-23
P-10(	Inventario de nidos	60	02-Aug-21	01-Oct-21
P-11(	Caracterización en campo (Colecta y observaciones)	60	01-Oct-21	30-Nov-21
P-17(	Elaboración de la caracterización	45	30-Nov-21	14-Jan-22
P-17(	Evaluación de los impactos ambientales	45	30-Nov-21	14-Jan-22
P-22(	Elaboración del Plan de Manejo de fauna	45	14-Jan-22	28-Feb-22
P-28(	Radicación del Plan de Manejo de fauna ante la SDA	1	28-Feb-22	01-Mar-22
P-28(	Pronunciamiento de AAC	60	01-Mar-22	30-Apr-22
P-28(	Envío de radicación del Plan de Manejo Ambiental a Interventoría	1	01-Mar-22	02-Mar-22
P-39(	Implementación del plan	250	30-Apr-22	05-Jan-23
P-39(	Envío a la interventoría del pronunciamiento de AAC	1	30-Apr-22	01-May-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.3	**Tramo 3**	495	30-Aug-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.3.4	**Permiso de estudio para la recolección de especímenes de esp**	4	30-Aug-21	03-Sep-21
P-10(	Se obtendra por un proveedor con permiso vigente	1	30-Aug-21	31-Aug-21
P-10(	Se enviara el permiso a la Interventoría	1	30-Aug-21	31-Aug-21
P-10(	Radicación a la autoridad ambiental del uso del permiso de colecta antes del incio de	1	31-Aug-21	01-Sep-21
P-10(	Envío de radicación a la interventoría	1	02-Sep-21	03-Sep-21
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.3.5	**Actualización de la Caracterización del Componente Biótico**	491	03-Sep-21	07-Jan-23
P-10(	Inventario de nidos	60	03-Sep-21	02-Nov-21

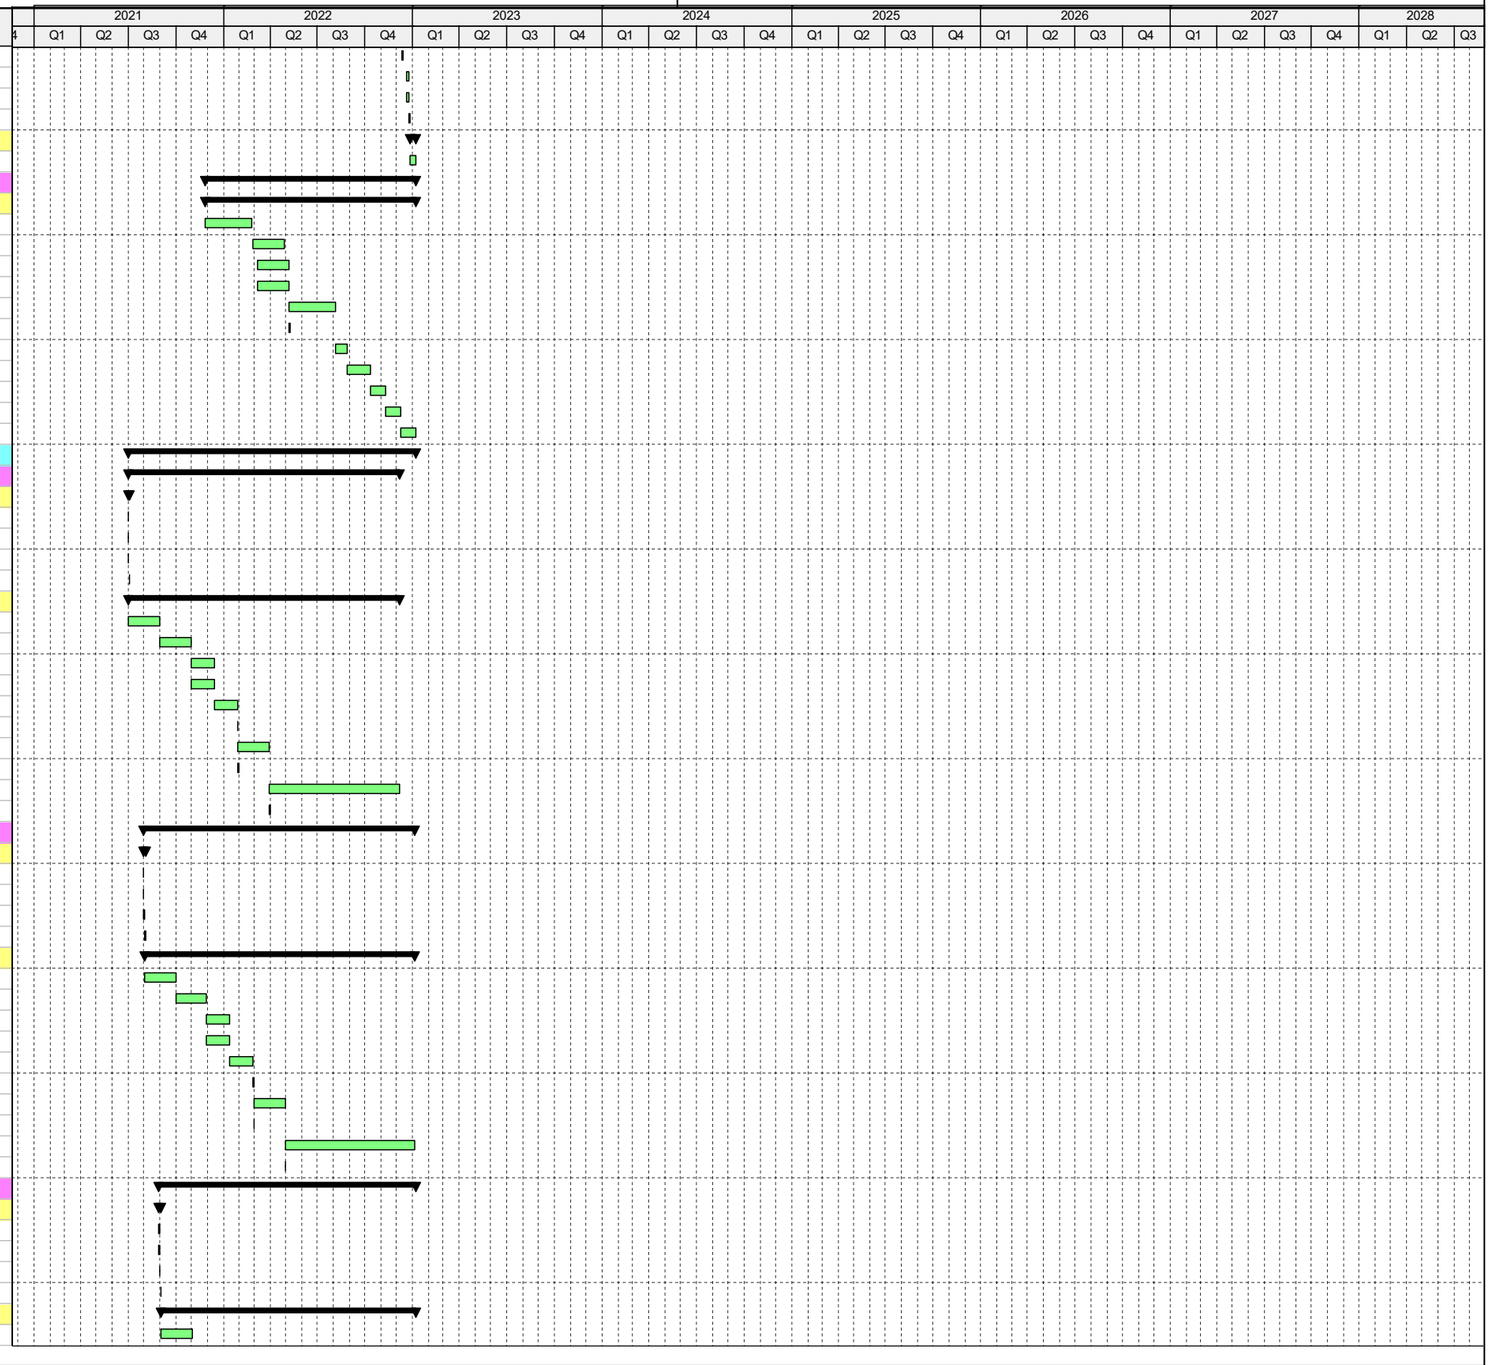


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-14'	Caracterización en campo (Colecta y observaciones)	60	02-Nov-21	01-Jan-22
P-20(	Elaboración de la caracterización	45	01-Jan-22	15-Feb-22
P-20(	Evaluación de los impactos ambientales	45	01-Jan-22	15-Feb-22
P-27'	Elaboración del Plan de Manejo de fauna	45	15-Feb-22	01-Apr-22
P-33'	Radicación del Plan de Manejo de fauna ante la SDA	1	01-Apr-22	02-Apr-22
P-33'	Pronunciamiento de AAC	60	02-Apr-22	01-Jun-22
P-33'	Envío de radicación del Plan de Manejo Ambiental a Interventoría	1	02-Apr-22	03-Apr-22
P-43'	Implementación del plan	220	01-Jun-22	07-Jan-23
P-43'	Envío a la interventoría del pronunciamiento de AAC	1	01-Jun-22	02-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.4 Tramo 4		465	29-Sep-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.4.4 Permiso de estudio para la recolección de especímenes de esp		4	29-Sep-21	03-Oct-21
P-11'	Se obtendra por un proveedor con permiso vigente	1	29-Sep-21	30-Sep-21
P-11'	Se enviara el permiso a la Interventoría	1	29-Sep-21	30-Sep-21
P-11(	Radicación a la autoridad ambiental del uso del permiso de colecta antes del incio de a	1	30-Sep-21	01-Oct-21
P-11'	Envío de radicación a la interventoría	1	02-Oct-21	03-Oct-21
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.4.5 Actualización de la Caracterización del Componente Biótico		461	03-Oct-21	07-Jan-23
P-11'	Inventario de nidos	60	03-Oct-21	02-Dec-21
P-17'	Caracterización en campo (Colecta y observaciones)	60	02-Dec-21	31-Jan-22
P-25(	Elaboración de la caracterización	45	31-Jan-22	17-Mar-22
P-25(	Evaluación de los impactos ambientales	45	31-Jan-22	17-Mar-22
P-30(	Elaboración del Plan de Manejo de fauna	45	17-Mar-22	01-May-22
P-37'	Radicación del Plan de Manejo de fauna ante la SDA	1	01-May-22	02-May-22
P-39'	Pronunciamiento de AAC	60	02-May-22	01-Jul-22
P-39'	Envío de radicación del Plan de Manejo Ambiental a Interventoría	1	02-May-22	03-May-22
P-49'	Implementación del plan	190	01-Jul-22	07-Jan-23
P-49'	Envío a la interventoría del pronunciamiento de AAC	1	01-Jul-22	02-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.5 Tramo 5		435	29-Oct-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.5.4 Permiso de estudio para la recolección de especímenes de esp		4	29-Oct-21	02-Nov-21
P-13(	Se obtendra por un proveedor con permiso vigente	1	29-Oct-21	30-Oct-21
P-13(	Se enviara el permiso a la Interventoría	1	29-Oct-21	30-Oct-21
P-14(	Radicación a la autoridad ambiental del uso del permiso de colecta antes del incio de a	1	30-Oct-21	31-Oct-21
P-14'	Envío de radicación a la interventoría	1	01-Nov-21	02-Nov-21
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.5.5 Actualización de la Caracterización del Componente Biótico		431	02-Nov-21	07-Jan-23
P-14'	Inventario de nidos	60	02-Nov-21	01-Jan-22
P-20(	Caracterización en campo (Colecta y observaciones)	60	01-Jan-22	02-Mar-22
P-28(	Elaboración de la caracterización	45	02-Mar-22	16-Apr-22
P-28(	Evaluación de los impactos ambientales	45	02-Mar-22	16-Apr-22
P-36'	Elaboración del Plan de Manejo de fauna	45	16-Apr-22	31-May-22
P-43'	Radicación del Plan de Manejo de fauna ante la SDA	1	31-May-22	01-Jun-22
P-43'	Pronunciamiento de AAC	60	01-Jun-22	31-Jul-22
P-43'	Envío de radicación del Plan de Manejo Ambiental a Interventoría	1	01-Jun-22	02-Jun-22
P-55(	Implementación del plan	160	31-Jul-22	07-Jan-23
P-55(	Envío a la interventoría del pronunciamiento de AAC	1	31-Jul-22	01-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.6 Tramo 6		405	28-Nov-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.6.4 Permiso de estudio para la recolección de especímenes de esp		4	28-Nov-21	02-Dec-21
P-17'	Se obtendra por un proveedor con permiso vigente	1	28-Nov-21	29-Nov-21
P-17'	Se enviara el permiso a la Interventoría	1	28-Nov-21	29-Nov-21
P-17'	Radicación a la autoridad ambiental del uso del permiso de colecta antes del incio de a	1	29-Nov-21	30-Nov-21
P-17(	Envío de radicación a la interventoría	1	01-Dec-21	02-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.2.6.5 Actualización de la Caracterización del Componente Biótico		401	02-Dec-21	07-Jan-23
P-17'	Inventario de nidos	60	02-Dec-21	31-Jan-22
P-25'	Caracterización en campo (Colecta y observaciones)	60	31-Jan-22	01-Apr-22
P-33'	Elaboración de la caracterización	45	01-Apr-22	16-May-22
P-33'	Evaluación de los impactos ambientales	45	01-Apr-22	16-May-22
P-42'	Elaboración del Plan de Manejo de fauna	45	16-May-22	30-Jun-22
P-47'	Radicación del Plan de Manejo de fauna ante la SDA	1	30-Jun-22	01-Jul-22
P-49'	Pronunciamiento de AAC	60	01-Jul-22	30-Aug-22
P-49'	Envío de radicación del Plan de Manejo Ambiental a Interventoría	1	01-Jul-22	02-Jul-22
P-62'	Implementación del plan	130	30-Aug-22	07-Jan-23
P-62'	Envío a la interventoría del pronunciamiento de AAC	1	30-Aug-22	31-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.3 Permiso de ubicación de planta de concreto		242	06-May-22	03-Jan-23
P-40250	Preparación y elaboración de Formato M-FO113	148	06-May-22	01-Oct-22

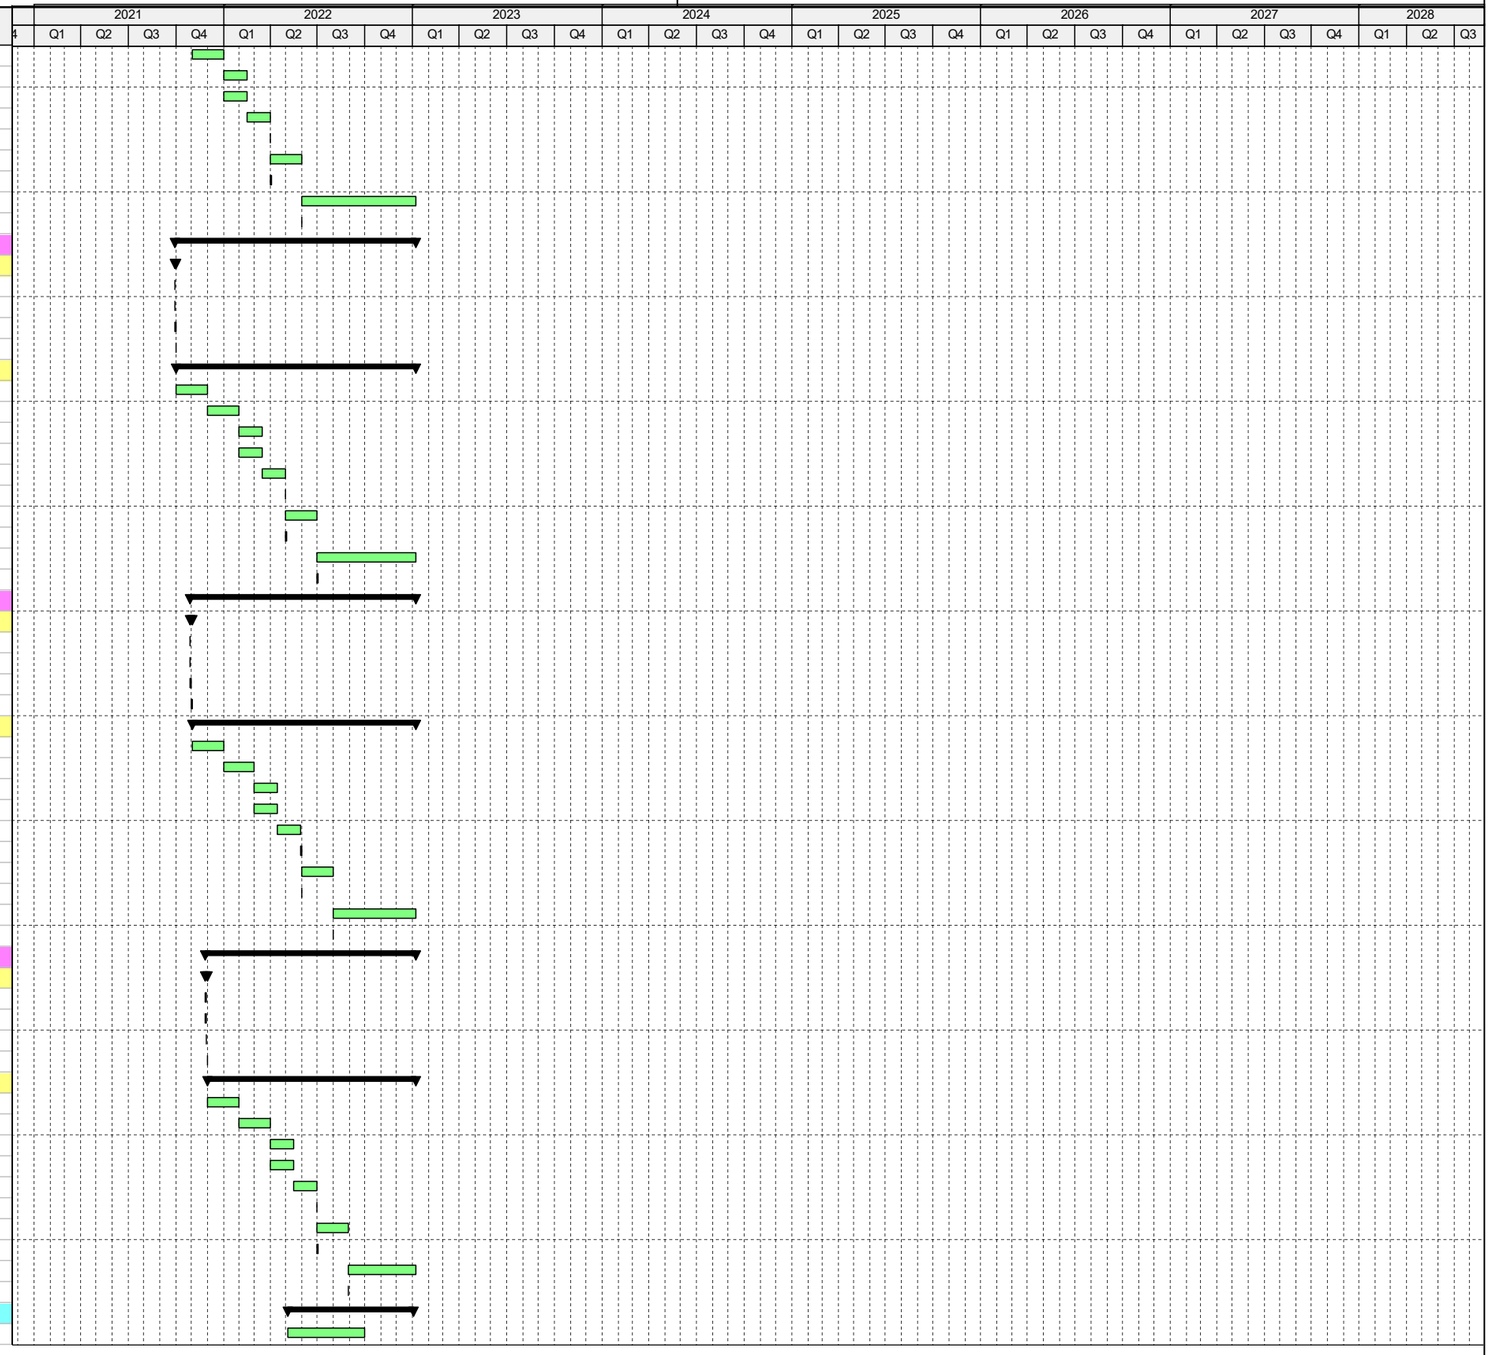

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-68650	Radicación del Formato y documentos a la Secretaría Distrital de Planeación - SDP	1	01-Oct-22	02-Oct-22
P-68660	Revisión y evaluación SDP	90	01-Oct-22	30-Dec-22
P-68680	Envío de radicación a Interventoría	1	02-Oct-22	03-Oct-22
P-83440	Expedición Acto Administrativo	1	30-Dec-22	31-Dec-22
P-83490	Envío de permiso a la Interventoría	3	31-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.4 Permiso de Ocupación de Cauces		149	11-Aug-22	07-Jan-23
P-58290	Preparación de documentación y radicación ante AAC	28	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64050	Envío de solicitud a la interventoría	1	08-Sep-22	09-Sep-22
P-70710	Pago de evaluación a la autoridad ambiental	1	08-Oct-22	09-Oct-22
P-70720	Revisión por la autoridad ambiental	28	08-Oct-22	05-Nov-22
P-76160	Solicitud de Información Adicional o Complementos	22	05-Nov-22	27-Nov-22
P-81230	Revisión por la autoridad ambiental de información adicional o complementos	28	27-Nov-22	25-Dec-22
P-83010	Expedición del permiso de ocupación de cauces	1	25-Dec-22	26-Dec-22
P-83060	Recurso de reposición	5	26-Dec-22	30-Dec-22
P-83070	Envío del permiso a la interventoría	3	26-Dec-22	29-Dec-22
P-83470	Respuesta al recurso de reposición de AAC	5	30-Dec-22	04-Jan-23
P-83510	Envío de recurso de reposición a Interventoría	3	31-Dec-22	03-Jan-23
P-83590	Envío de respuesta del recurso de reposición a la Interventoría	3	04-Jan-23	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.5 Lineamiento para intervención en EEP-ZMPA-CER		145	11-Aug-22	03-Jan-23
P-58300	Preparación de documentacion	60	11-Aug-22	10-Oct-22
P-70770	Radicación de solicitud ante AAC	50	10-Oct-22	29-Nov-22
P-81260	Respuesta de la AAC	32	29-Nov-22	31-Dec-22
P-81270	Envío de solicitud de radicación a Interventoría	1	29-Nov-22	30-Nov-22
P-83500	Envío de respuesta a interventoría	3	31-Dec-22	03-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.6 Permiso de Vertimientos		149	11-Aug-22	07-Jan-23
P-58310	Preparación de documentación y radicación ante AAC	28	11-Aug-22	08-Sep-22
P-64060	Envío de solicitud a la interventoría	1	08-Sep-22	09-Sep-22
P-70730	Pago de evaluación a la autoridad ambiental	1	08-Oct-22	09-Oct-22
P-70740	Revisión por la autoridad ambiental	28	08-Oct-22	05-Nov-22
P-76170	Solicitud de Información Adicional o Complementos	22	05-Nov-22	27-Nov-22
P-81240	Revisión por la autoridad ambiental de información adicional o complementos	28	27-Nov-22	25-Dec-22
P-83020	Expedición del permiso de vertimientos	1	25-Dec-22	26-Dec-22
P-83030	Recurso de reposición	5	25-Dec-22	30-Dec-22
P-83040	Envío del permiso a la interventoría	1	25-Dec-22	26-Dec-22
P-83450	Respuesta al recurso de reposición de AAC	5	30-Dec-22	04-Jan-23
P-83460	Envío de recurso de reposición a Interventoría	1	30-Dec-22	31-Dec-22
P-83570	Envío del permiso a la Interventoría	3	04-Jan-23	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.06.6.6.7 Registro de Vertimientos		121	08-Sep-22	07-Jan-23
P-64070	Preparación del formulario y radicación ante AAC	88	08-Sep-22	05-Dec-22
P-81640	Expedición del registro de vertimientos	30	05-Dec-22	04-Jan-23
P-81650	Envío de radicación a la interventoría	1	05-Dec-22	06-Dec-22
P-83580	Envío del registro a la interventoría	3	04-Jan-23	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.07 Gestion Financiera		620	28-Apr-21	08-Jan-23
P-6930	Cierre Financiero-Reporte de avance R1	0		28-Apr-21
P-13670	Cierre Financiero-Reporte de avance R2	0		25-Oct-21
P-37480	Cierre Financiero-Reporte de avance R3	0		23-Apr-22
P-83680	Cierre Financiero	0		08-Jan-23*
PLMB-T1-V04.1.08 Interfases		782	20-Oct-20	10-Dec-22
P-1330	Plan de gestion de Interfaz (No objecion)	180	20-Oct-20	18-Apr-21
P-6690	Informe de interfases	2	18-Apr-21	19-Apr-21
P-6760	Actualizacion del Informe de Interfases	600	19-Apr-21	10-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.09 Actividades de Construccion Fase Previa		556	01-Jul-21	08-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.09.01 UE304: Interseccion Especial Calle 72		511	15-Aug-21	08-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.09.01.1 Adecuacion de la Malla vial existente, Vias de acceso		84	15-Aug-21	06-Nov-21
P-8350	Adecuacion Malla vial (Transicional)	31	15-Aug-21	15-Sep-21
P-8360	Implementacion PMT del paso subterráneo de la calle 72 (Trasicional)	7	10-Sep-21	17-Sep-21
P-8520	Adecuacion Desvios (General)	30	07-Oct-21	06-Nov-21
P-8680	Implementacion PMT del paso subterraneo de la calle 72 (General)	7	30-Oct-21	06-Nov-21
PLMB-T1-V04.1.09.01.2 Fase 1 (Muros Pantalla, Vigas y Losa)		249	17-Sep-21	24-May-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.2.1 Construcción de muros pantalla(Demolicion, excavacion, vigas guias y		225	17-Sep-21	30-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.2.1.1 Sección 1		84	17-Sep-21	10-Dec-21
P-8840	Construccion Muro de Pantalla desde la sección A hasta la sección D	54	17-Sep-21	10-Nov-21

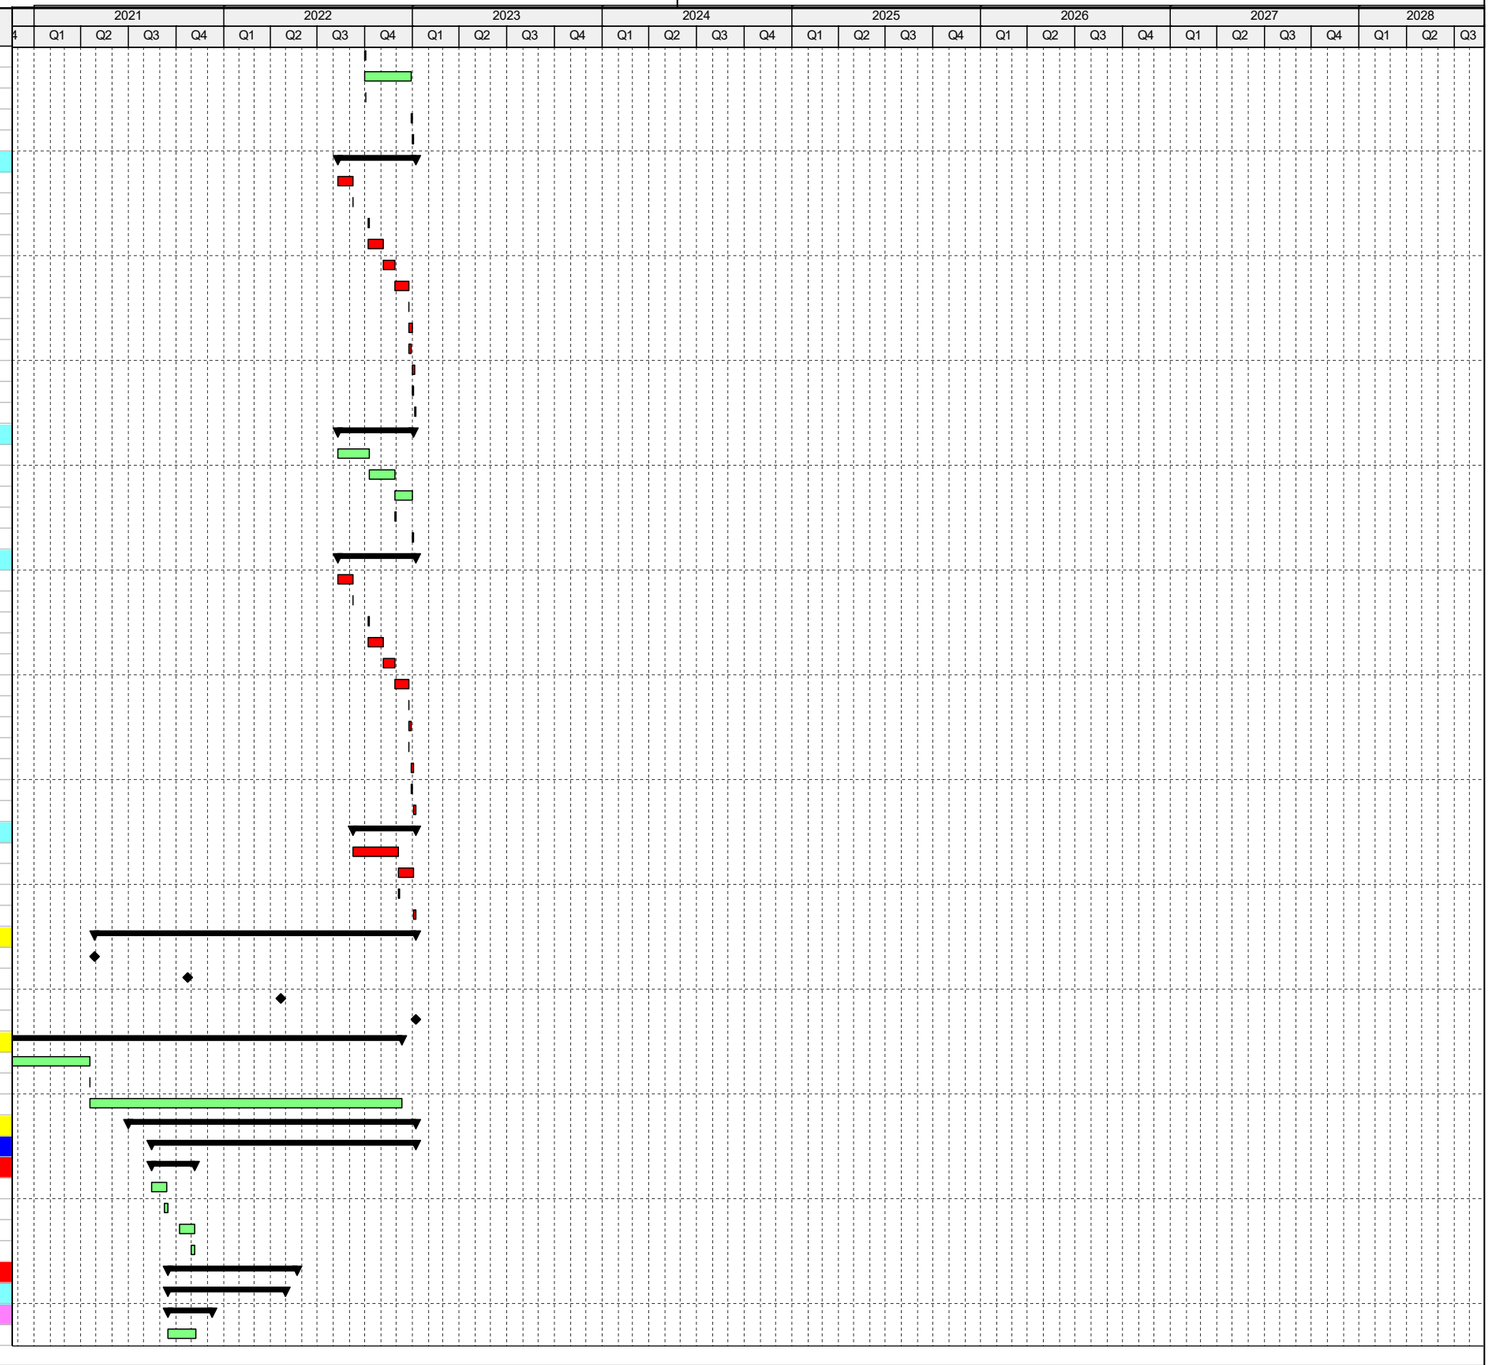

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-20470	Construccion Muro Pantalla sección E	30	10-Nov-21	10-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.09.01.2.1.2 Sección 2		67	22-Feb-22	30-Apr-22
P-11150	Construccion Muro de Pantalla desde la sección A hasta la sección C	67	22-Feb-22	30-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.2.1.3 Sección 3		44	17-Jan-22	02-Mar-22
P-11160	Construccion Muro de Pantalla desde la sección A hasta la sección D	28	17-Jan-22	14-Feb-22
P-20460	Construccion Muro Pantalla sección E	16	14-Feb-22	02-Mar-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.2.1.4 Sección 4		38	10-Dec-21	17-Jan-22
P-28900	Construccion Muro de Pantalla	38	10-Dec-21	17-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.2.2 Construcción de viga cabezal		195	10-Nov-21	24-May-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.2.2.1 Sección 1		65	10-Nov-21	14-Jan-22
P-14080	Construcción de viga cabezal desde la sección A hasta la sección D	65	10-Nov-21	14-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.2.2.2 Sección 2		65	14-Jan-22	20-Mar-22
P-20790	Construcción de viga cabezal desde la sección A hasta la sección B	65	14-Jan-22	20-Mar-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.2.2.3 Sección 3		65	20-Mar-22	24-May-22
P-39380	Construcción de viga cabezal desde la sección A hasta la sección D	65	20-Mar-22	24-May-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.2.3 Viga superior y losa		101	17-Jan-22	28-Apr-22
P-37670	Vaciado sección 3	24	17-Jan-22	10-Feb-22
P-28850	Vaciado sección 2	24	02-Mar-22	26-Mar-22
P-20800	Vaciado sección 1	30	24-Mar-22	23-Apr-22
P-49340	Vaciado sección 4	5	23-Apr-22	28-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.3 Fase 2 (Excavación Mecanizada, Construcción de vigas, losas y muros de li		449	16-Oct-21	08-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.09.01.3.1 Demolicion y Excavacion del Deprimido		180	14-Jan-22	13-Jul-22
P-47180	Demolicion y excavacion del deprimido	180	14-Jan-22	13-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.3.2 Losas y vigas de cimentación		180	14-Jan-22	13-Jul-22
P-68270	Losas y vigas de cimentación	180	14-Jan-22	13-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.3.3 Construccion de elementos no estructurales		106	07-Jun-22	21-Sep-22
P-68275	Construccion de bordillos de concreto	36	07-Jun-22	13-Jul-22
P-68280	Limpieza de pared de construcción	70	13-Jul-22	21-Sep-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.3.4 Sistema de drenaje aguas lluvias		270	16-Oct-21	13-Jul-22
P-68290	Sistema de drenaje aguas lluvias	270	16-Oct-21	13-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.3.5 Sistema eléctrico		65	21-Sep-22	25-Nov-22
P-82880	Sistema eléctrico	65	21-Sep-22	25-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.3.6 Estructura de Pavimento y urbanismo		290	17-Jan-22	03-Nov-22
P-82890	Estructura de pavimento y urbanismo	290	17-Jan-22	03-Nov-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.3.7 Sistema iluminación		20	17-Jan-22	06-Feb-22
P-82900	Sistema iluminación	20	17-Jan-22	06-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.3.8 Vias de servicio		77	13-Jul-22	28-Sep-22
A1330	Vias de servicio lados Nor-este, Nor-oeste,sur-este y sur-oeste	77	13-Jul-22	28-Sep-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.3.9 Espacio Publico		92	28-Sep-22	29-Dec-22
A1340	Espacio Publico costados Nor-este, Nor-oeste,sur-este y sur-oeste	92	28-Sep-22	29-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.09.01.3.10 Proceso de entrega y aprobación		10	29-Dec-22	08-Jan-23
P-83530	Proceso de entrega y aprobación	10	29-Dec-22	08-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.09.02 Traslado de redes		507	19-Aug-21	08-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.09.02.1 W1-Traslado de Redes		300	06-Mar-22	31-Dec-22
P-30230	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	60	06-Mar-22	05-May-22
P-40200	Traslado de redes E1 K2+100 +K2+300	150	05-May-22	02-Oct-22
P-40210	Traslado de redes IE1 K2+300 - K3+400	220	05-May-22	11-Dec-22
P-40220	Traslado de redes IE2-W1 K3+600 - K4+050	220	05-May-22	11-Dec-22
P-68710	Traslado de redes E2 K3+400 - K3+600	90	02-Oct-22	31-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.09.02.2 W2-Traslado de Redes		330	05-Feb-22	01-Jan-23
P-26260	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	60	05-Feb-22	06-Apr-22
P-35470	Traslado de redes IE2-W2 K4+050 - K4+500	175	06-Apr-22	28-Sep-22
P-35500	Traslado de redes IE3 K4+700 - K5+600	150	06-Apr-22	03-Sep-22
P-35510	Traslado de redes IE4 K5+750 - K6+500	270	06-Apr-22	01-Jan-23
P-35520	Traslado de redes IE5 K6+700 - K7+850	270	06-Apr-22	01-Jan-23
P-35530	Traslado de redes E6 K7+850 - K8+000	120	06-Apr-22	04-Aug-22
P-57760	Traslado de redes E5A&D K6+500 - K6+700	130	04-Aug-22	12-Dec-22
P-63540	Traslado de redes E4A&D K5+600 - K5+750	120	03-Sep-22	01-Jan-23
P-68460	Traslado de redes E3A&D K4+500 - K4+700	90	28-Sep-22	27-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.09.02.3 W3-Traslado de Redes		268	06-Apr-22	30-Dec-22
P-35580	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	60	06-Apr-22	05-Jun-22
P-43780	Traslado de redes E9A&D K12+000 - K12+200	120	03-Jun-22	01-Oct-22



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
P-43790	Traslado de redes E8 K10+650 - K10+850	120	05-Jun-22	03-Oct-22
P-43800	Traslado de redes E8 K10+850 - K12+000	150	05-Jun-22	02-Nov-22
P-68670	Traslado de redes E9-W3 K12+200 - K12+450	90	01-Oct-22	30-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.09.02.4 W4-Traslado de Redes		330	05-Feb-22	01-Jan-23
P-26270	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	60	05-Feb-22	06-Apr-22
P-35480	Traslado de redes E9-W4 K12+450 - K13+750	270	06-Apr-22	01-Jan-23
P-70760	Traslado de redes E10 K13+950 - K15+000(P)	85	06-Apr-22	30-Jun-22
P-35540	Traslado de redes E11 K15+200 - K16+200	210	06-Apr-22	02-Nov-22
P-35550	Traslado de redes E12-W4 K16+400 - K16+550	270	06-Apr-22	01-Jan-23
P-35560	Traslado de redes E10A&D K13+750 - K13+950	150	06-Apr-22	03-Sep-22
P-75440	Traslado de redes E12A&D K16+200 - K16+400	60	02-Sep-22	01-Nov-22
P-75450	Traslado de redes E11A&D K15+000 - K15+200	60	02-Nov-22	01-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.09.02.5 W5-Traslado de Redes		300	06-Mar-22	31-Dec-22
P-30240	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	60	06-Mar-22	05-May-22
P-40190	Traslado de redes E12-W5 K16+550 - K17+600	240	05-May-22	31-Dec-22
P-40230	Traslado de redes E13 K17+750 - K19+650	213	01-Jun-22	31-Dec-22
P-40240	Traslado de redes E14-W5 K19+850 - K20+300	123	01-Jun-22	02-Oct-22
P-68690	Traslado de redes E13A&D K17+600 - K17+750	90	02-Oct-22	31-Dec-22
P-68700	Traslado de redes E14A&D K19+650 - K19+850	90	02-Oct-22	31-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.09.02.6 W6-Traslado de Redes		507	19-Aug-21	08-Jan-23
P-10370	Traslado de redes WF6 K22+900 a K23+000 (paso subterráneo de la calle 72)	200	19-Aug-21	07-Mar-22
P-26280	Elaboracion, no objecion y aprobacion PMT	60	02-Apr-22	01-Jun-22
P-35490	Traslado de redes E15 K21+800 - K23+000	270	06-Apr-22	01-Jan-23
P-35570	Traslado de redes E14-W6 K20+300 - K21+600	200	01-Jun-22	18-Dec-22
P-40820	Traslado de redes E16A&D K23+000 - 23+200	210	01-Jun-22	28-Dec-22
P-65650	Traslado de redes E16 K23+200 - K23+900	120	10-Sep-22	08-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.09.02.7 Patio Taller - Traslado de Redes		96	15-Sep-21	12-Jan-22
TR1000	Seleccionar el contratista para el traslado de la red de MT	27	15-Sep-21	15-Oct-21
TR1010	Inicio de traslado de redes	0		15-Oct-21
TR1020	Construir la cimentación de los postes metálicos de MT	14	16-Oct-21	03-Nov-21
TR1030	Instalar los postes metálicos de MT	14	04-Nov-21	20-Nov-21
TR1040	Instalar circuitos de infraestructura eléctrica	13	22-Nov-21	06-Dec-21
TR1050	Remover los postes existentes	24	07-Dec-21	06-Jan-22
TR1060	Realizar pruebas funcionales	4	07-Jan-22	12-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.09.03 Patio Taller (Tratamiento del Suelo/Movimiento de tierra a cota de diseño)		449	01-Jul-21	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.09.03.1 Preparacion para construcción patio Taller		151	01-Jul-21	04-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.1.2 PMT para trabajos en Patio taller		20	22-Jul-21	14-Aug-21
PT1720	Aprobación del PMT para el patio taller	20	22-Jul-21	14-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.1.1 Obras Preliminares		151	01-Jul-21	04-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.1.1.1 Preparación y diseños		22	01-Jul-21	28-Jul-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.1.1.1.1 Documentos Técnicos		22	01-Jul-21	28-Jul-21
PT18	Versión preliminar del Método de Construcción	0		01-Jul-21
PT18	Cronograma específico - Plataforma de Trabajo	22	01-Jul-21	28-Jul-21
PT18	No Objeción del Plan de Inspección y Ensayo	0		16-Jul-21
PT18	Documentos técnicos aprobados y/o No Objetados	0		28-Jul-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.1.1.2 Preliminares		116	14-Aug-21	04-Jan-22
PT1890	Movilización	6	14-Aug-21	21-Aug-21
PT1891	Construir cuneta y tubería sur 01 K1+100 - K1+225	7	17-Aug-21	24-Aug-21
PT1970	Instalación del cerramiento perimetral	25	18-Aug-21	15-Sep-21
PT1980	Localización y conformación de la plataforma para el campamento	12	18-Aug-21	31-Aug-21
PT1892	Construir pondaje 02	5	25-Aug-21	30-Aug-21
PT1960	Mejoramiento de vía de servicio EAAB	20	26-Aug-21	17-Sep-21
PT1895	Construir cuneta norte 01 K1+225 - K1+550	18	31-Aug-21	20-Sep-21
PT1950	Construcción de vías internas de acceso	12	31-Aug-21	13-Sep-21
PT1990	Construccion de campamento y redes provisionales	14	01-Sep-21	16-Sep-21
PT1905	Construir cuneta y tubería sur 01A K1+050 - K0+700	20	21-Sep-21	13-Oct-21
PT1910	Construir cuneta sur 03 K0+200 - K0+000	6	14-Oct-21	21-Oct-21
PT1940	Construir cuneta sur 02A K0+725 - K0+355	25	22-Oct-21	22-Nov-21
PT1945	Construir cuneta sur 02B K0+355 - K0+225	10	23-Nov-21	03-Dec-21
PT1946	Construir cuneta norte 01A 02B K1+550 - K1+000	15	04-Dec-21	22-Dec-21
PT1947	Construir pondaje 01	9	23-Dec-21	04-Jan-22
PT2000	Obras preliminares finalizadas	0		04-Jan-22

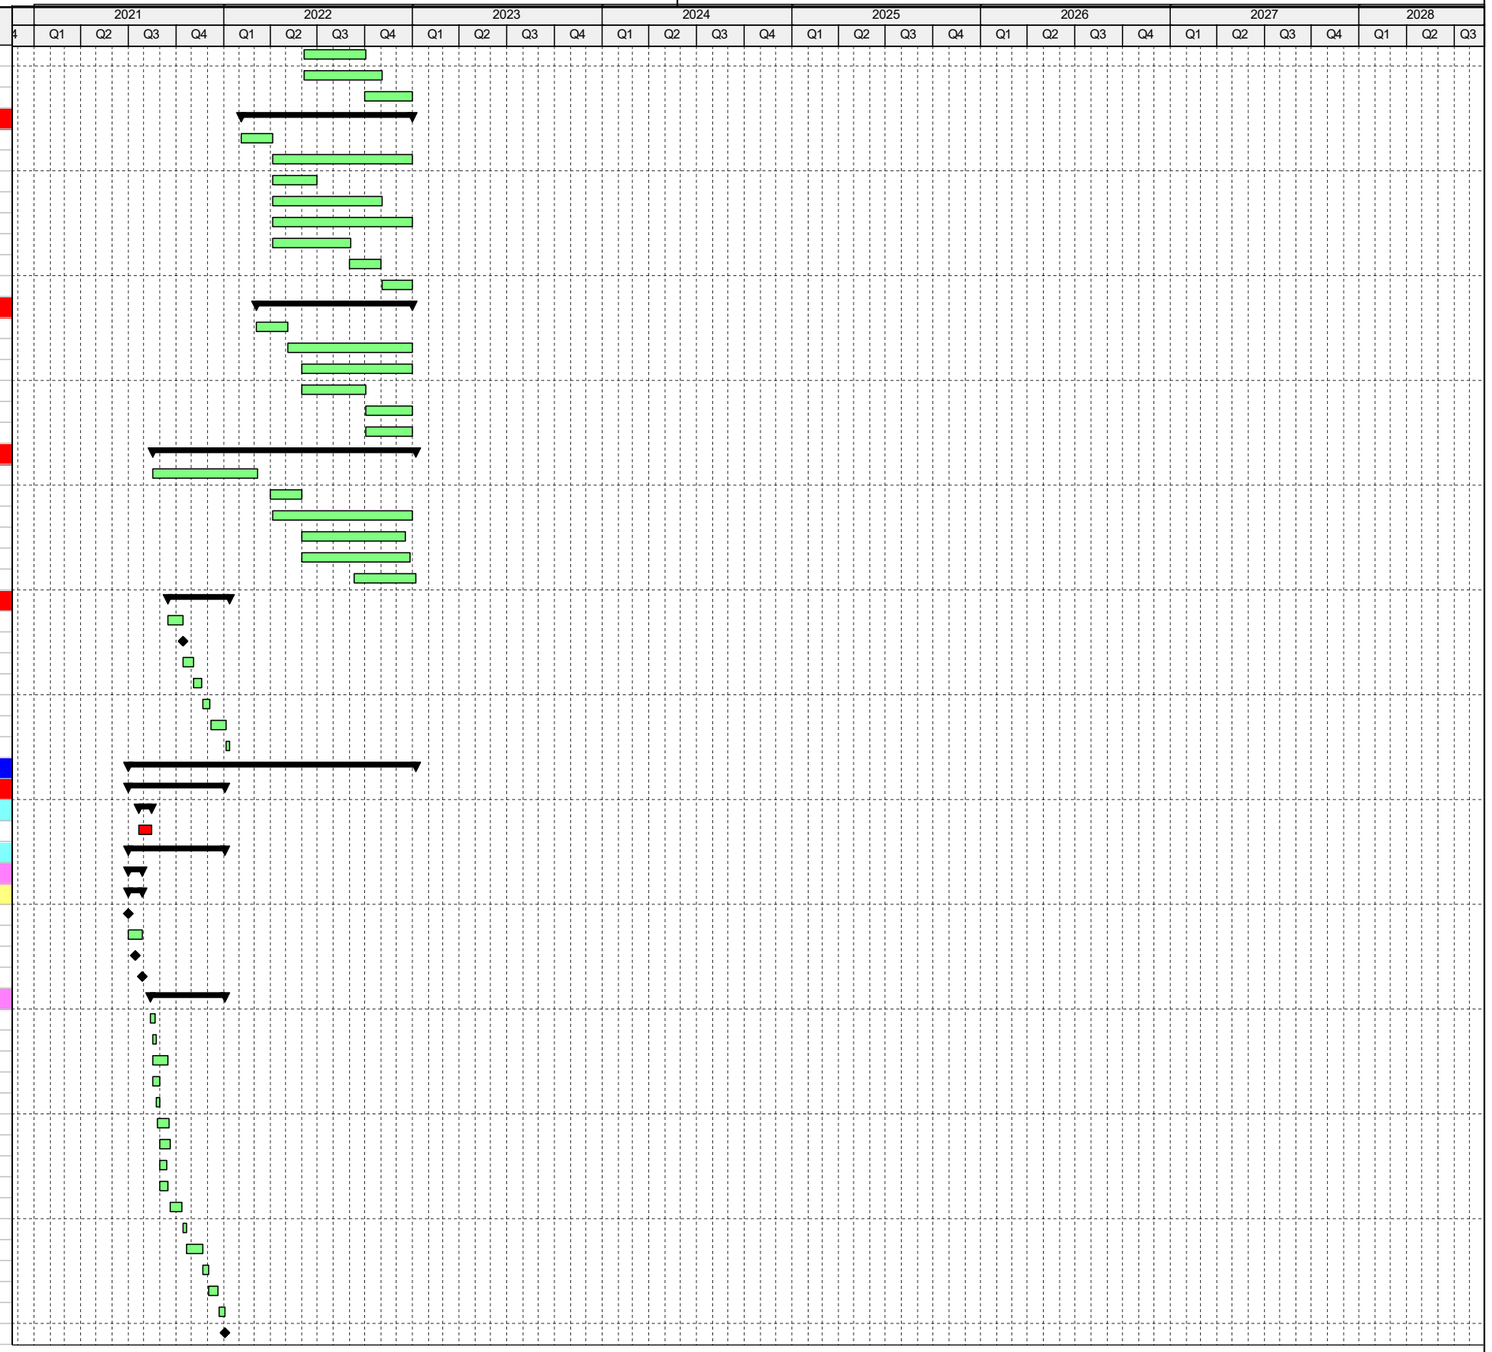


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.1.09.03.2	UE001: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	188	17-Aug-21	02-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.2.4	VÍA DE ACCESO INTERNA UE001	12	17-Aug-21	30-Aug-21
PT1000	Descapote y excavación mecanizada (vía de acceso)	8	17-Aug-21	25-Aug-21
PT1010	Relleno e=0,50 m (vía de acceso)	4	26-Aug-21	30-Aug-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.2.1	DESCAPOTE Y EXCAVACION MECANIZADA	11	31-Aug-21	13-Sep-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.2.1.1	ÁREA 1 - Área 3.680 m2	4	31-Aug-21	04-Sep-21
PT2010	UE001: Localización y replanteo	1	31-Aug-21	31-Aug-21
PT2020	UE001: Limpieza y el descapote del terreno	2	31-Aug-21	02-Sep-21
PT2030	UE001: Excavación con máquina	2	02-Sep-21	04-Sep-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.2.1.2	ÁREA 2 - Área 3.680 m2	4	04-Sep-21	08-Sep-21
PT2050	UE001: Limpieza y el descapote del terreno	2	04-Sep-21	07-Sep-21
PT2040	UE001: Localización y replanteo	1	04-Sep-21	06-Sep-21
PT2060	UE001: Excavación con máquina	2	07-Sep-21	08-Sep-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.2.1.3	ÁREA 3 - Área 3.680 m2	4	08-Sep-21	13-Sep-21
PT2080	UE001: Limpieza y el descapote del terreno	2	08-Sep-21	10-Sep-21
PT2070	UE001: Localización y replanteo	1	09-Sep-21	09-Sep-21
PT2090	UE001: Excavación con máquina	2	10-Sep-21	13-Sep-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.2.2	PREPARACION DE PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE SUELO	120	04-Sep-21	31-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.2.2.1	ÁREA 1 - Área 3.680 m2	80	04-Sep-21	11-Dec-21
PT2100	UE001: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	1	04-Sep-21	06-Sep-21
PT2105	UE001: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	1	14-Sep-21	15-Sep-21
PT2110	UE001: Construir pilotes CMC	21	16-Nov-21	11-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.2.2.2	ÁREA 2 - Área 3.680 m2	97	09-Sep-21	07-Jan-22
PT2120	UE001: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	1	09-Sep-21	09-Sep-21
PT2125	UE001: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	1	18-Sep-21	18-Sep-21
PT2130	UE001: Construir pilotes CMC	21	11-Dec-21	07-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.2.2.3	ÁREA 3 - Área 3.680 m2	111	15-Sep-21	31-Jan-22
PT2140	UE001: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	1	15-Sep-21	16-Sep-21
PT2145	UE001: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	1	24-Sep-21	25-Sep-21
PT2150	UE001: Construir pilotes CMC	19	07-Jan-22	31-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.2.3	RELLENO	92	11-Dec-21	02-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.2.3.1	ÁREA 1 - Área 3.680 m2	28	11-Dec-21	15-Jan-22
PT2160	UE001: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	12	11-Dec-21	25-Dec-21
PT2170	UE001: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	16	27-Dec-21	15-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.2.3.2	ÁREA 2 - Área 3.680 m2	27	08-Feb-22	11-Mar-22
PT2180	UE001: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	10	08-Feb-22	19-Feb-22
PT2190	UE001: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	17	19-Feb-22	11-Mar-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.2.3.3	ÁREA 3 - Área 3.680 m2	27	01-Mar-22	02-Apr-22
PT2200	UE001: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	10	01-Mar-22	12-Mar-22
PT2210	UE001: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	17	12-Mar-22	02-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.3	UE002: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	176	16-Oct-21	23-May-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.3.1	DESCAPOTE Y EXCAVACION MECANIZADA	57	16-Oct-21	28-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.3.1.1	ÁREA 1 - Área 3.680 m2	50	16-Oct-21	18-Dec-21
PT2220	UE002: Localización y replanteo	1	16-Oct-21	18-Oct-21
PT2230	UE002: Limpieza y el descapote del terreno	2	15-Dec-21	16-Dec-21
PT2240	UE002: Excavación con máquina	2	16-Dec-21	18-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.3.1.2	ÁREA 2 - Área 3.680 m2	4	18-Dec-21	23-Dec-21
PT2260	UE002: Limpieza y el descapote del terreno	2	18-Dec-21	21-Dec-21
PT2250	UE002: Localización y replanteo	1	18-Dec-21	20-Dec-21
PT2270	UE002: Excavación con máquina	2	21-Dec-21	23-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.3.1.3	ÁREA 3 - Área 3.680 m2	4	23-Dec-21	28-Dec-21
PT2290	UE002: Limpieza y el descapote del terreno	2	23-Dec-21	25-Dec-21
PT2280	UE002: Localización y replanteo	1	23-Dec-21	23-Dec-21
PT2300	UE002: Excavación con máquina	2	27-Dec-21	28-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.3.2	PREPARACION DE PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE SUELO	70	18-Dec-21	14-Mar-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.3.2.1	ÁREA 1 - Área 3.680 m2	30	18-Dec-21	26-Jan-22
PT1020	UE002: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	1	18-Dec-21	20-Dec-21
PT1025	UE002: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	1	29-Dec-21	30-Dec-21
PT1030	UE002: Construir pilotes CMC	21	30-Dec-21	26-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.3.2.2	ÁREA 2 - Área 3.680 m2	47	23-Dec-21	18-Feb-22
PT1040	UE002: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	2	23-Dec-21	24-Dec-21
PT1045	UE002: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	2	04-Jan-22	06-Jan-22

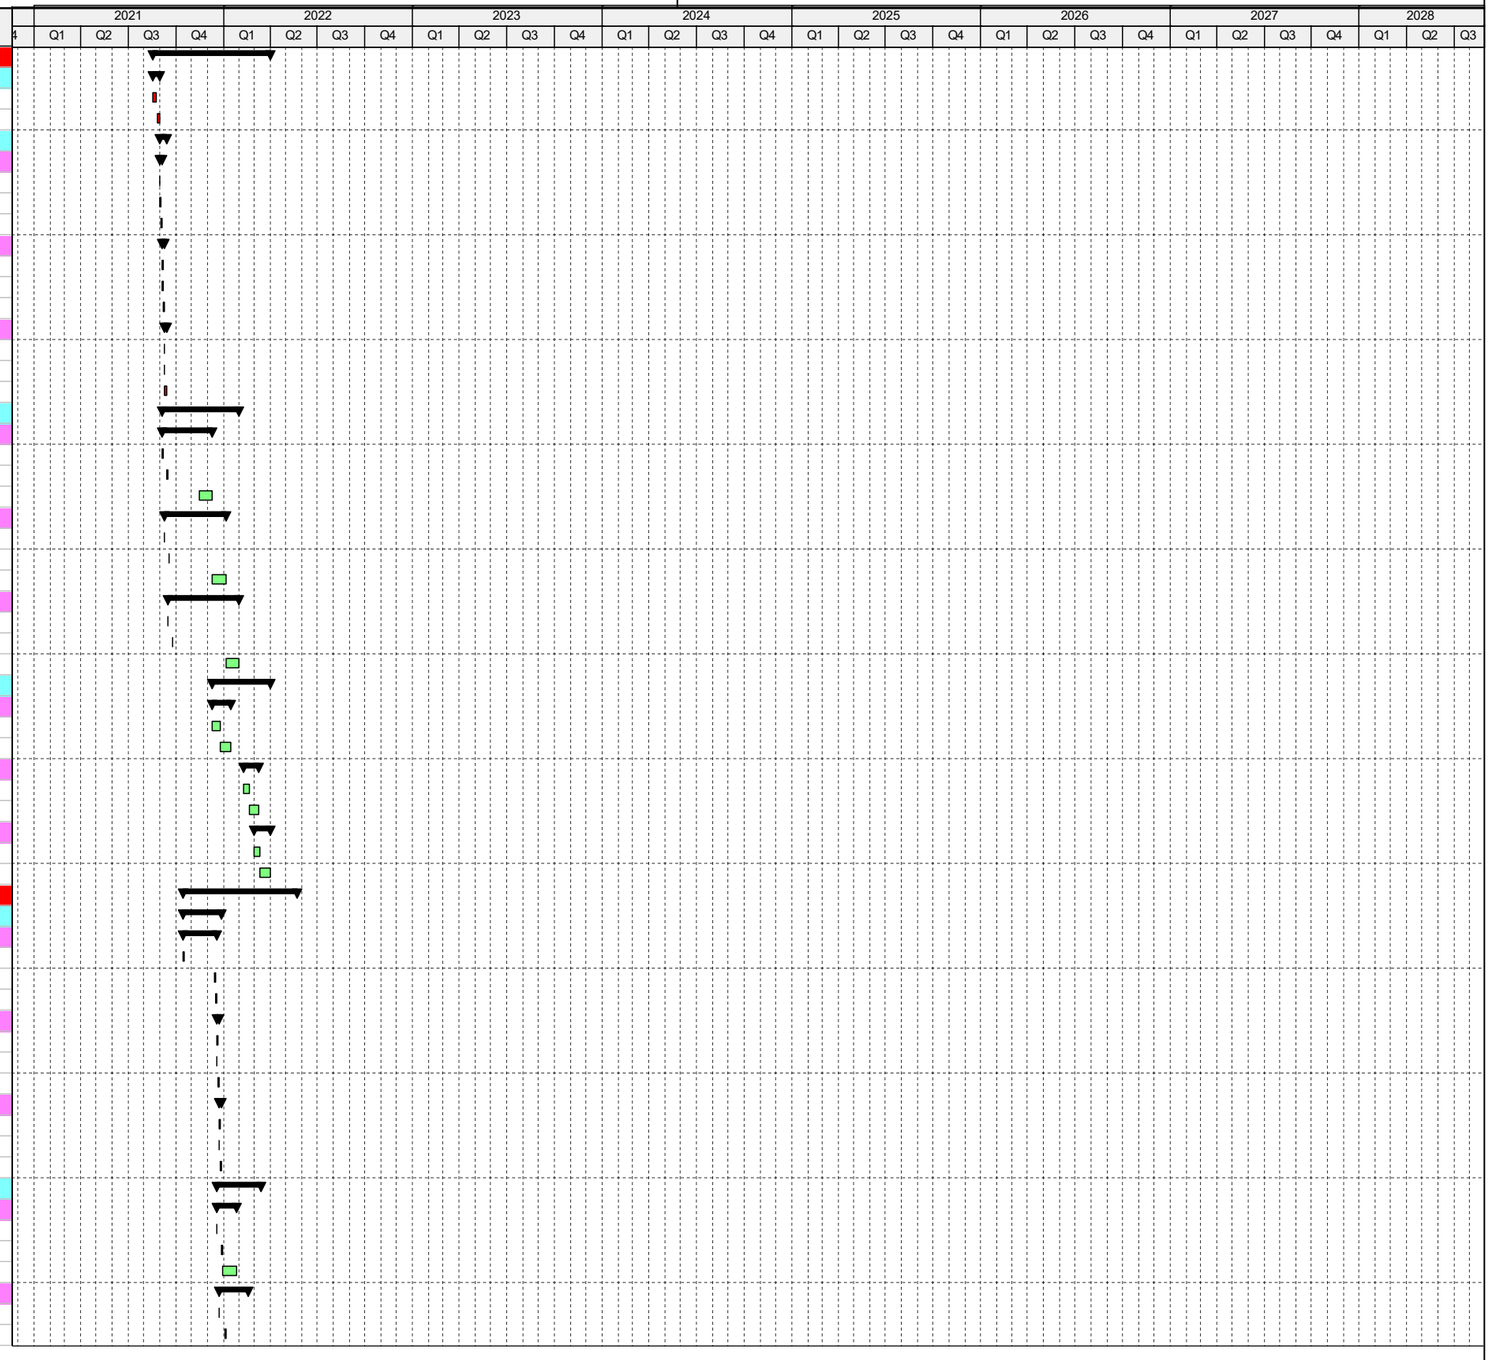


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PT1050	UE002: Construir pilotes CMC	20	26-Jan-22	18-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.3.2.3	ÁREA 3 - Área 3.680 m2	63	28-Dec-21	14-Mar-22
PT1060	UE002: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	1	28-Dec-21	29-Dec-21
PT1065	UE002: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	1	07-Jan-22	08-Jan-22
PT1070	UE002: Construir pilotes CMC	20	18-Feb-22	14-Mar-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.3.3	RELLENO	57	12-Mar-22	23-May-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.3.3.1	ÁREA 1 - Área 3.680 m2	24	12-Mar-22	13-Apr-22
PT1080	UE002: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	9	12-Mar-22	24-Mar-22
PT1090	UE002: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	15	24-Mar-22	13-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.3.3.2	ÁREA 2 - Área 3.680 m2	26	13-Apr-22	14-May-22
PT1100	UE002: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	10	13-Apr-22	25-Apr-22
PT1110	UE002: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	16	25-Apr-22	14-May-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.3.3.3	ÁREA 3 - Área 3.680 m2	26	20-Apr-22	23-May-22
PT1120	UE002: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	9	20-Apr-22	02-May-22
PT1130	UE002: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	17	03-May-22	23-May-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.4	UE003: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	177	04-Dec-21	12-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.4.1	DESCAPOTE Y EXCAVACION MECANIZADA	14	04-Dec-21	22-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.4.1.1	ÁREA 1 - Área 3.680 m2	6	04-Dec-21	11-Dec-21
PT1140	UE003: Localización y replanteo	1	04-Dec-21	06-Dec-21
PT1150	UE003: Limpieza y el descapote del terreno	2	06-Dec-21	07-Dec-21
PT1160	UE003: Excavación con máquina	3	09-Dec-21	11-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.4.1.2	ÁREA 2 - Área 3.680 m2	5	11-Dec-21	17-Dec-21
PT1180	UE003: Limpieza y el descapote del terreno	3	11-Dec-21	15-Dec-21
PT1170	UE003: Localización y replanteo	1	13-Dec-21	13-Dec-21
PT1190	UE003: Excavación con máquina	2	15-Dec-21	17-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.4.1.3	ÁREA 3 - Área 3.680 m2	4	17-Dec-21	22-Dec-21
PT1210	UE003: Limpieza y el descapote del terreno	2	17-Dec-21	20-Dec-21
PT1200	UE003: Localización y replanteo	1	17-Dec-21	18-Dec-21
PT1220	UE003: Excavación con máquina	2	20-Dec-21	22-Dec-21
PLMB-T1-V04.1.09.03.4.2	PREPARACION DE PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE SUELO	69	13-Dec-21	05-Mar-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.4.2.1	ÁREA 1 - Área 3.680 m2	28	13-Dec-21	17-Jan-22
PT1230	UE003: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	1	13-Dec-21	13-Dec-21
PT1235	UE003: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	1	22-Dec-21	22-Dec-21
PT1240	UE003: Construir pilotes CMC	19	23-Dec-21	17-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.4.2.2	ÁREA 2 - Área 3.680 m2	44	17-Dec-21	10-Feb-22
PT1250	UE003: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	1	17-Dec-21	18-Dec-21
PT1255	UE003: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	1	28-Dec-21	29-Dec-21
PT1260	UE003: Construir pilotes CMC	21	18-Jan-22	10-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.4.2.3	ÁREA 3 - Área 3.680 m2	59	24-Dec-21	05-Mar-22
PT1270	UE003: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	1	24-Dec-21	25-Dec-21
PT1275	UE003: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	1	05-Jan-22	05-Jan-22
PT1280	UE003: Construir pilotes CMC	20	11-Feb-22	05-Mar-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.4.3	RELLENO	105	03-Mar-22	12-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.4.3.1	ÁREA 1 - Área 3.680 m2	26	03-Mar-22	02-Apr-22
PT1290	UE003: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	10	03-Mar-22	14-Mar-22
PT1300	UE003: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	16	15-Mar-22	02-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.4.3.2	ÁREA 2 - Área 3.680 m2	27	04-Apr-22	07-May-22
PT1310	UE003: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	9	04-Apr-22	15-Apr-22
PT1320	UE003: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	18	16-Apr-22	07-May-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.4.3.3	ÁREA 3 - Área 3.680 m2	47	14-May-22	12-Jul-22
PT1330	UE003: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	9	14-May-22	25-May-22
PT1340	UE003: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	18	21-Jun-22	12-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.5	UE004: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	177	24-Jan-22	31-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.5.1	DESCAPOTE Y EXCAVACION MECANIZADA	10	24-Jan-22	04-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.5.1.1	ÁREA 1 - Área 3.680 m2	4	24-Jan-22	28-Jan-22
PT1350	UE004: Localización y replanteo	1	24-Jan-22	25-Jan-22
PT1360	UE004: Limpieza y el descapote del terreno	2	25-Jan-22	26-Jan-22
PT1370	UE004: Excavación con máquina	2	26-Jan-22	28-Jan-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.5.1.2	ÁREA 2 - Área 3.680 m2	3	28-Jan-22	31-Jan-22
PT1390	UE004: Limpieza y el descapote del terreno	2	28-Jan-22	31-Jan-22
PT1380	UE004: Localización y replanteo	1	28-Jan-22	29-Jan-22
PT1400	UE004: Excavación con máquina	2	29-Jan-22	31-Jan-22

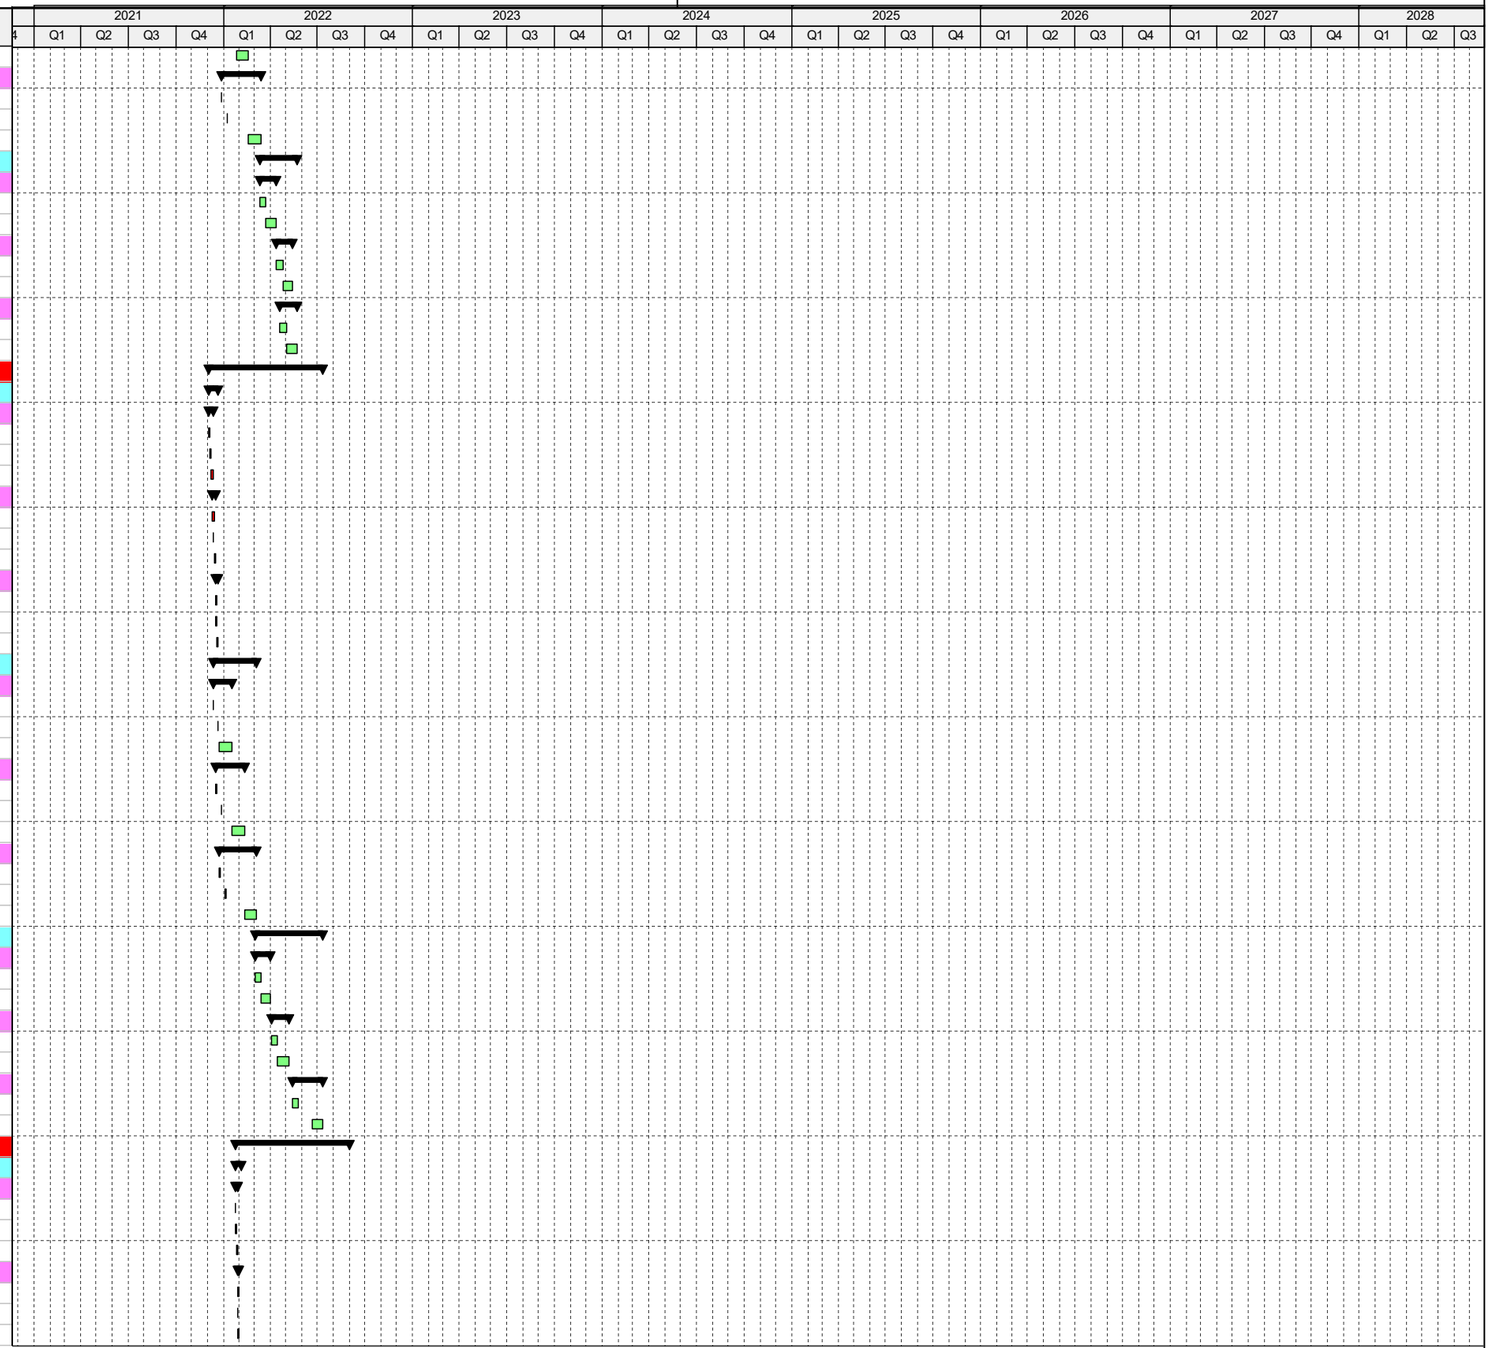

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.1.09.03.5.1.3	ÁREA 3 - Área 3.680 m2	4	31-Jan-22	04-Feb-22
PT1420	UE004: Limpieza y el descapote del terreno	2	31-Jan-22	02-Feb-22
PT1410	UE004: Localización y replanteo	1	01-Feb-22	01-Feb-22
PT1430	UE004: Excavación con máquina	2	02-Feb-22	04-Feb-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.5.2	PREPARACION DE PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE SUELO	67	28-Jan-22	20-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.5.2.1	ÁREA 1 - Área 3.680 m2	29	28-Jan-22	03-Mar-22
PT1440	UE004: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	1	28-Jan-22	29-Jan-22
PT1445	UE004: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	1	07-Feb-22	08-Feb-22
PT1450	UE004: Construir pilotes CMC	20	08-Feb-22	03-Mar-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.5.2.2	ÁREA 2 - Área 3.680 m2	47	31-Jan-22	26-Mar-22
PT1460	UE004: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	1	31-Jan-22	31-Jan-22
PT1465	UE004: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	1	09-Feb-22	09-Feb-22
PT1470	UE004: Construir pilotes CMC	19	03-Mar-22	26-Mar-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.5.2.3	ÁREA 3 - Área 3.680 m2	59	07-Feb-22	20-Apr-22
PT1480	UE004: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	1	07-Feb-22	08-Feb-22
PT1485	UE004: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	1	16-Feb-22	17-Feb-22
PT1490	UE004: Construir pilotes CMC	19	26-Mar-22	20-Apr-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.5.3	RELLENO	109	16-Apr-22	31-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.5.3.1	ÁREA 1 - Área 3.680 m2	29	16-Apr-22	21-May-22
PT1500	UE004: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	11	16-Apr-22	29-Apr-22
PT1510	UE004: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	18	29-Apr-22	21-May-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.5.3.2	ÁREA 2 - Área 3.680 m2	25	21-May-22	23-Jun-22
PT1520	UE004: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	9	21-May-22	02-Jun-22
PT1530	UE004: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	16	02-Jun-22	23-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.5.3.3	ÁREA 3 - Área 3.680 m2	28	27-Jul-22	31-Aug-22
PT1540	UE004: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	10	27-Jul-22	09-Aug-22
PT1550	UE004: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	18	09-Aug-22	31-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.6	UE005: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	176	15-Mar-22	20-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.6.1	DESCAPOTE Y EXCAVACION MECANIZADA	4	15-Mar-22	19-Mar-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.6.1.1	ÁREA 1 - Área 4.205 m2	4	15-Mar-22	19-Mar-22
PT1560	UE005: Localización y replanteo	1	15-Mar-22	16-Mar-22
PT1570	UE005: Limpieza y el descapote del terreno	2	16-Mar-22	17-Mar-22
PT1580	UE005: Excavación con máquina	2	18-Mar-22	19-Mar-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.6.2	PREPARACION DE PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE SUELO	34	27-Apr-22	08-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.6.2.1	ÁREA 1 - Área 4.205 m2	34	27-Apr-22	08-Jun-22
PT1590	UE005: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	1	27-Apr-22	28-Apr-22
PT1595	UE005: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	1	07-May-22	09-May-22
PT1600	UE005: Construir pilotes CMC	25	09-May-22	08-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.6.3	RELLENO	31	13-Sep-22	20-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.6.3.1	ÁREA 1 - Área 4.205 m2	31	13-Sep-22	20-Oct-22
PT1610	UE005: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	12	13-Sep-22	27-Sep-22
PT1620	UE005: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	19	27-Sep-22	20-Oct-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.7	UE006: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	177	04-May-22	09-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.7.1	DESCAPOTE Y EXCAVACION MECANIZADA	4	04-May-22	10-May-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.7.1.1	ÁREA 1 - Área 4.205 m2	4	04-May-22	10-May-22
PT1630	UE006: Localización y replanteo	1	04-May-22	05-May-22
PT1640	UE006: Limpieza y el descapote del terreno	2	05-May-22	07-May-22
PT1650	UE006: Excavación con máquina	2	07-May-22	10-May-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.7.2	PREPARACION DE PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE SUELO	48	10-May-22	08-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.7.2.1	ÁREA 1 - Área 4.205 m2	48	10-May-22	08-Jul-22
PT1660	UE006: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	1	10-May-22	11-May-22
PT1665	UE006: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	1	19-May-22	20-May-22
PT1670	UE006: Construir pilotes CMC	23	08-Jun-22	08-Jul-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.7.3	RELLENO	32	29-Oct-22	09-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.7.3.1	ÁREA 1 - Área 4.205 m2	32	29-Oct-22	09-Dec-22
PT1680	UE006: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	12	29-Oct-22	14-Nov-22
PT1690	UE006: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	20	14-Nov-22	09-Dec-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.8	UE007: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	161	23-Jun-22	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.09.03.8.1	DESCAPOTE Y EXCAVACION MECANIZADA	5	23-Jun-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.8.1.1	ÁREA 1 - Área 4.205 m2	5	23-Jun-22	28-Jun-22
PT1700	UE007: Localización y replanteo	1	23-Jun-22	23-Jun-22
PT1710	UE007: Limpieza y el descapote del terreno	2	24-Jun-22	25-Jun-22

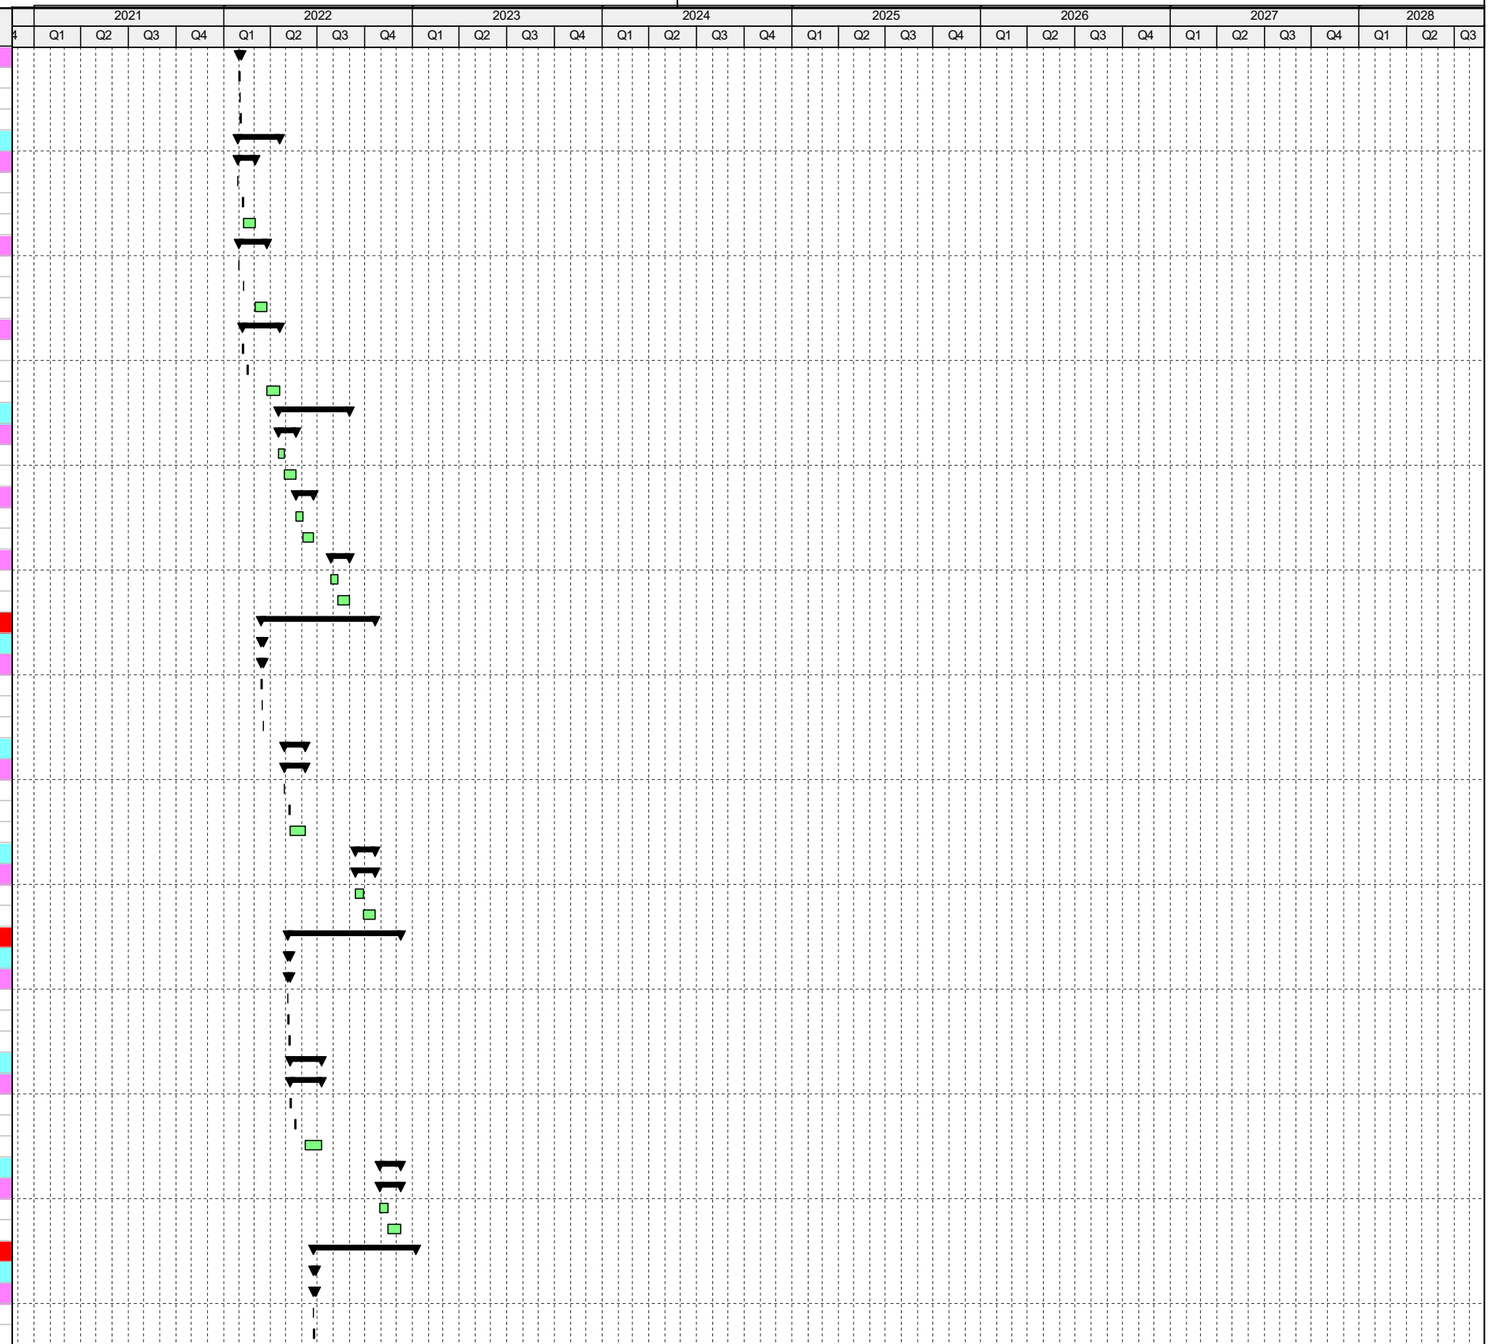


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PT1730	UE007: Excavación con máquina	2	25-Jun-22	28-Jun-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.8.2	PREPARACION DE PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE SUELO	32	28-Jun-22	06-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.8.2.1	ÁREA 1 - Área 4.205 m2	32	28-Jun-22	06-Aug-22
PT1740	UE007: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	1	28-Jun-22	29-Jun-22
PT1745	UE007: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	1	08-Jul-22	09-Jul-22
PT1750	UE007: Construir pilotes CMC	23	09-Jul-22	06-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.8.3	RELLENO	31	29-Nov-22	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.09.03.8.3.1	ÁREA 1 - Área 4.205 m2	31	29-Nov-22	07-Jan-23
PT1760	UE007: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	11	29-Nov-22	13-Dec-22
PT1770	UE007: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	20	13-Dec-22	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.09.03.9	UE008: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	120	12-Aug-22	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.09.03.9.1	DESCAPOTE Y EXCAVACION MECANIZADA	3	12-Aug-22	17-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.9.1.1	ÁREA 1 - Área 4.205 m2	3	12-Aug-22	17-Aug-22
PT1795	UE008: Limpieza y el descapote del terreno	1	12-Aug-22	15-Aug-22
PT1780	UE008: Localización y replanteo	1	12-Aug-22	13-Aug-22
PT1800	UE008: Excavación con máquina	2	16-Aug-22	17-Aug-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.9.2	PREPARACION DE PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE SUELO	33	17-Aug-22	24-Sep-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.9.2.1	ÁREA 1 - Área 4.205 m2	33	17-Aug-22	24-Sep-22
PT1810	UE008: Relleno e= 0,30 m (plataforma de trabajo) - capa con cal	1	17-Aug-22	18-Aug-22
PT1815	UE008: Relleno e= 0,20 m (plataforma de trabajo)	1	26-Aug-22	27-Aug-22
PT1820	UE008: Construir pilotes CMC	24	27-Aug-22	24-Sep-22
PLMB-T1-V04.1.09.03.9.3	RELLENO	33	26-Nov-22	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.09.03.9.3.1	ÁREA 1 - Área 4.205 m2	33	26-Nov-22	07-Jan-23
PT1830	UE008: Relleno primera fase - capa de transferencia con geomallas, e= 1,5 m	12	26-Nov-22	12-Dec-22
PT1840	UE008: Relleno segunda fase - final con material seleccionado, e=2,36 + 0,60 m	21	12-Dec-22	07-Jan-23
PLMB-T1-V04.1.09.03.10	Monitoreo y control	137	23-Aug-21	07-Feb-22
PT1841	Instalación de mojones de referencia para control de asentamientos	5	23-Aug-21	27-Aug-21
PT1842	Instalar celda de asentamiento # 1 - UE 001	2	13-Sep-21	15-Sep-21
PT1843	Instalar celda de asentamiento # 2 - UE 003	2	22-Dec-21	24-Dec-21
PT1844	Instalar celda de asentamiento # 3 - UE 004	2	04-Feb-22	07-Feb-22
PLMB-T1-V04.2	FASE DE CONSTRUCCION	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.01	OBRAS PRELIMINARES - FASE DE CONSTRUCCION	717	08-Jan-23	24-Dec-24
PLMB-T1-V04.2.01.01	Traslado de redes	600	08-Jan-23	30-Aug-24
PLMB-T1-V04.2.01.01.01	W1-Traslado de Redes	300	08-Jan-23	04-Nov-23
C-1220	Traslado de redes WF1 K0 +000 a K2+ 100	300	08-Jan-23	04-Nov-23
PLMB-T1-V04.2.01.01.02	W2-Traslado de Redes	300	04-Nov-23	30-Aug-24
C-4530	Traslado de redes IE6-W2 K8+000 - K8+500	300	04-Nov-23	30-Aug-24
PLMB-T1-V04.2.01.01.03	W3-Traslado de Redes	180	08-Jan-23	07-Jul-23
C-1250	Traslado de redes IE6-W3 K8+500 - K9+600	180	08-Jan-23	07-Jul-23
C-1280	Traslado de redes IE7 K9+800 - K10+650	180	08-Jan-23	07-Jul-23
C-1290	Traslado de redes E7A&D K9+600 - K9+800	150	08-Jan-23	07-Jun-23
PLMB-T1-V04.2.01.01.04	W4-Traslado de Redes	180	08-Jan-23	07-Jul-23
C-1300	Traslado de redes IE10 K13+950 - K15+000(C)	180	08-Jan-23	07-Jul-23
PLMB-T1-V04.2.01.01.05	W6-Traslado de Redes	120	07-Jul-23	04-Nov-23
C-3860	Traslado de redes E15A-D K21+600 - K21+800	120	07-Jul-23	04-Nov-23
PLMB-T1-V04.2.01.02	Permisos y Licencias	512	09-Jan-23	24-Dec-24
PLMB-T1-V04.2.01.02.1	Permisos y Licencias - Super estructuras del Viaducto	90	09-Jan-23	12-May-23
PLMB-T1-V04.2.01.02.1.1	Permisos y Licencias - Construccion	90	09-Jan-23	12-May-23
C-2370	SDP (Licencia para Intervención y Ocupación del Espacio Público)	90	09-Jan-23	12-May-23
C-2380	EAAB (conexión temporal de agua y alcantarillado para el campamento)	90	09-Jan-23	12-May-23
C-2390	ENEL (conexión temporal de energía Eléctrica para el campamento)	90	09-Jan-23	12-May-23
C-2400	Otros	90	09-Jan-23	12-May-23
PLMB-T1-V04.2.01.02.2	Permisos y Licencias - Construccion de Vias y Espacios Publicos	512	09-Jan-23	24-Dec-24
PLMB-T1-V04.2.01.02.2.1	Permisos y Licencias - Construccion	512	09-Jan-23	24-Dec-24
C-2410	SDP (Licencia para Intervención y Ocupación del Espacio Público)	512	09-Jan-23	24-Dec-24
C-2420	EAAB (conexión temporal de agua y alcantarillado para el campamento)	512	09-Jan-23	24-Dec-24
C-2430	Otros	512	09-Jan-23	24-Dec-24
PLMB-T1-V04.2.01.03	Area de Prefabricados y almacenamiento	220	18-Jan-23	26-Aug-23
C-2500	Aceptación del patio prefabricado de vigas en U y producción de prueba de vigas en U	220	18-Jan-23	26-Aug-23
PLMB-T1-V04.2.02	Gestion Social	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.1	INICIO TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1510	Gestión para la instalación de la valla fija en cada frente de obra según necesidad	1709	08-Jan-23	13-Sep-27




© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.2.02.2	PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO SOCIAL	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.1	PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN PUBLICA	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.1.1	Plan Estratégico de Comunicaciones	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1520	Presentar propuesta de implementación del PEC (Dentro de los 15 días hábiles de ca	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1530	Mantener informada a la comunidad sobre el desarrollo de las actividades	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.1.2	Sistema de información "Metro comunica" (Páqina web, mini site, Redes	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1540	Mantener informada a la ciudadanía sobre alcance, tiempo, actividades y característica	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1550	Entrega de parrilla de información (mensual)	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1560	Encuesta de percepción y satisfacción (semestral)	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.1.3	Metro en cifras de cumplimiento: Aplicación de encuestas de percepción	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1570	Medición y evaluación de cumplimiento de indicadores (Mensual)	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.1.4	Metro de Bogota es cultura	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1580	Campañas, estrategias espacios lúdicos y pedagógicos	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.1.5	Mecanismos de Divulgación del Proyecto	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1590	Funcionamiento oficina fija por frente de obra según necesidad	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1600	Disponibilidad puntos móviles de atención por frente de obra según necesidad	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1610	Entrega de volantes, afiches, folletos, infografía (Divulgación debe hacerse mín. 5 día	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1620	Tecnologías de información y comunicación	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.2	PROGRAMA METRO ESCUCHA, METRO RESUELVE	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1450	Atención al ciudadano	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1630	Generación de reportes (mensuales, trimestrales y anuales)	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1640	Comunicación y atención de PQRS- "Metro escucha - Metro resuelve"	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.3	PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1460	Hablemos de Metro de Bogota Reunión inicio de obras (por frente de obra)	365	08-Jan-23	08-Jan-24
C-1650	Distribución del comunicado para solicitar adecuación de bajantes de aguas lluvias	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1660	Medidas de mitigación ante corte de SP (Plantas de energia, carro tanques)	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1670	Gestión con Empresas de Servicios Públicos (Coordinar con entidades minimo una se	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1680	Reuniones con directivas Centros Educativos (Semestral)	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1690	Comités de Participación Zonal (Frecuencia Bimestral)	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1700	Reuniones informativas, extraordinarias y/o atencion a veedurias	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-2070	Inspección de predios con manejo inadecuado de aguas lluvias	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-4880	Reuniones de avance y seguimiento por zona 25%, 50% y 75% de ejecución de Obra	1344	08-Jan-24	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.4	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCION	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1710	Proyecto de Fortalecimiento ciudadano	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1720	Fortalecimiento al control social	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1730	Implementación de estrategias para la construcción y fortalecimiento del tejido urbano	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-2030	Reporte semestral (Mecanismo de control y seguimiento)	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.5	PROGRAMA DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1470	La EMB determinara de forma puntual la vinculación del Concesionario a la Mesa Inte	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1740	Según las necesidades de articulación interinstitucional, se remitir a la EMB un informe	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.6	PROGRAMA DE CULTURA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1750	Inventario de los accesos a garajes de los frentes de obra a intervenir	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1760	Reuniones informativas PMT (incluida en la reunión de inicio)	365	08-Jan-23	08-Jan-24*
C-1770	Construcción de la Cultura de Movilidad Sostenible para el Sector Educativo (mínimo 1	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1780	Taller de Movilidad Sostenible (Frecuencia Cuatrimestral)	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1790	Capacitación para conductores vinculados al proyecto	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1800	Prevención de accidentes	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1810	Coordinación con el sector Salud para la Movilidad Sostenible	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-2120	Reuniones cambio de perfil Av. Caracas	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.7	PROGRAMA DE PROTECCION A LA INSFRAESTRUCTURA Y BIENES DE TE	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1820	Levantamiento actas de vecindad.	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1830	Registro Fílmico Vias de desvío	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1840	Actas de construcción de acceso a garajes y rampas	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1850	Atención para daños de bienes a terceros	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1860	Programa de acompañamiento en el control de las vibraciones	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-2080	Proyecto de atención integral para las demoliciones relacionadas con los predios nece	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-2090	Proyecto de manejo de culatas y remanentes	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-13490	Cierre de las actas de vecindad	552	10-Mar-26	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.8	PROGRAMA DE INCLUSION SOCIO LABORAL	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1480	Implementación de estrategia para la generación de empleo	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1870	Articulación con la estrategia de empleo definido por la EMB	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1880	Jornadas de capacitación	1709	08-Jan-23	13-Sep-27

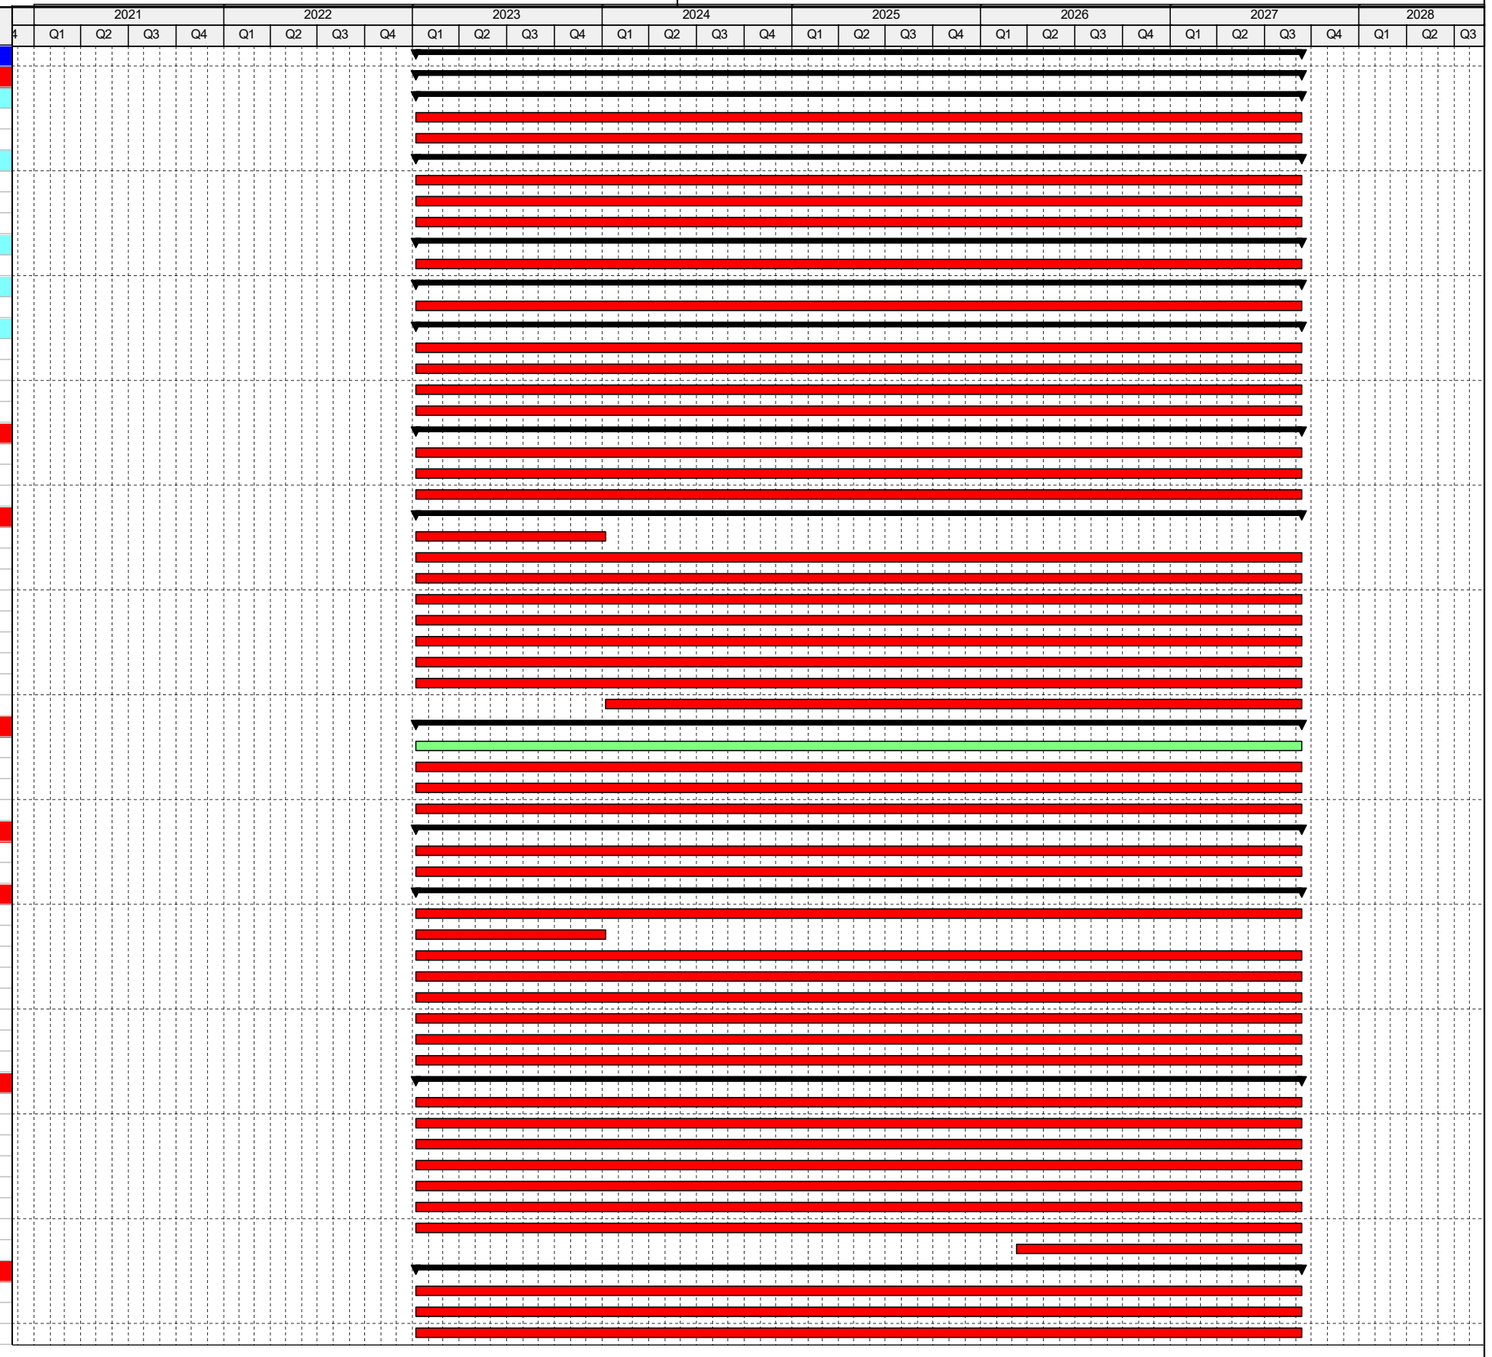

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.2.02.2.9	PROGRAMA DE MANEJO PARA LA SOSTENABILIDAD ECONOMICA DEL CO	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1890	Gestión cargue y descargue de mercancia	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1900	Capacitación a comerciantes para la gestión comercial y de mercadeo (plan anual - fa	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-2100	Elaboración e implementación del plan de mercadeo para la fase de construcción	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.10	PROGRAMA DE MANEJO PARA OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1490	Monitoreo de las dinamicas del comercio informal en el AID del proyecto.(Frecuencia Q	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.11	PROGRAMA DE OBSERVATORIO DE OCUPACIÓN Y VALOR DEL SUELO	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1500	Recolectar la información solicitada por la EMB para aportar al seguimiento de las dinâ	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.12	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO URBANO DE LA PLMB	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1910	Proyecto de sensibilizar y capacitar al personal vinculado al Proyecto Metro	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1920	Construir las estrategias para la implementacion de la Cultura Metro	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1930	Identificación de escenarios y actores para la implementación de la Cultura Metro de B	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.13	PROGRAMA DE MANEJO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTU	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.13.1	Protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC) de los ámbitos nacio	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1940	Actas de vecindad correspondientes a BIC y registro filmico previo a la llegada de maq	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1950	Capacitaciones de sensibilización y Patrimonio Cultural para personal vinculado al proy	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
A1300	Plan de manejo arqueológico	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-4870	Reuniones de información para propietarios de Bienes de Interés Cultural BIC- y terce	1344	08-Jan-24	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.14	PROGRAMA DE MANEJO PARA EL MONUMENTO DE LOS HEROES	85	19-Sep-24	13-Dec-24
C-7390	Socializar a comunidad del AI el 100% de acciones previstas para intervención y protec	2	19-Sep-24	21-Sep-24
C-7710	Implementar 100% de las estrategias definidas por la EMB para la intervervención del I	55	19-Oct-24	13-Dec-24
C-7720	Sensibilizar y capacitar al 100% de los trabajadores involucrados dentro de la PLMB	55	19-Oct-24	13-Dec-24
PLMB-T1-V04.2.02.2.15	PROGRAMA DE REASENTAMIENTO	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1960	Atención de las unidades sociales afectadas por la construcción de la PLMB. Program:	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.16	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1970	Divulgación de Planes de Manejo de Tránsito	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.2.17	PROGRAMA DE MANEJO PARA EL INFLUJO LABORAL	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1980	Jornadas de sensibilización para abordar el riesgo de violencia de genero	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-1990	Comite zonal de participación de mujeres y personas LGBTI	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-2000	Protocolo y plan de trabajo especifico a su área de intervención en razón a las mujeres	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-2010	Programa de sensibilización para abordar riesgo de violencia de genero (En alianza co	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-2020	Elaborar una política de cooperación con autoridades policiales para investigación de q	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.3	INFORMES DE GESTIÓN	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.3.1	INFORMES DE GESTIÓN SOCIAL	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-2040	Informes de Gestion Social (mensual)	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-2110	Presentar Informes de Cierre de cada una de las fases (Etapa Preoperativa)	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.02.4	COMITÉS	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-2050	Comite Social	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
C-2060	Comités de seguimiento integrados SST, Ambiental y Social	1709	08-Jan-23	13-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.03	Gestión Ambiental	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.03.1	PERMISOS AMBIENTALES	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.03.1.1	Permiso de tratamiento silvicutural y especies en veda (árboles y epifitas) SD	128	08-Jan-23	16-May-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.1.1	Tramo 2	8	08-Jan-23	16-Jan-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.1.1.9	Permiso del Jardín Botánico de Bogota para ubicación de árboles a	8	08-Jan-23	16-Jan-23
C-2280	Respuesta de la entidad	5	08-Jan-23	13-Jan-23
C-2470	Envío de respuesta de entidad a interventoría	3	13-Jan-23	16-Jan-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.1.2	Tramo 3	38	08-Jan-23	15-Feb-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.1.2.9	Permiso del Jardín Botánico de Bogota para ubicación de árboles a	38	08-Jan-23	15-Feb-23
C-2130	Respuesta de la entidad	35	08-Jan-23	12-Feb-23
C-2820	Envío de respuesta de entidad a interventoría	3	12-Feb-23	15-Feb-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.1.3	Tramo 4	68	08-Jan-23	17-Mar-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.1.3.9	Permiso del Jardín Botánico de Bogota para ubicación de árboles a	68	08-Jan-23	17-Mar-23
C-2140	Preparación de documentacion	4	08-Jan-23	12-Jan-23
C-2440	Radicación de Documentación	1	12-Jan-23	13-Jan-23
C-2450	Respuesta de la entidad	60	13-Jan-23	14-Mar-23
C-2460	Envío de radicado a Interventoría	1	13-Jan-23	14-Jan-23
C-3000	Envío de respuesta de entidad a interventoría	3	14-Mar-23	17-Mar-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.1.4	Tramo 5	98	08-Jan-23	16-Apr-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.1.4.9	Permiso del Jardín Botánico de Bogota para ubicación de árboles a	98	08-Jan-23	16-Apr-23
C-2150	Preparación de documentacion	34	08-Jan-23	11-Feb-23
C-2810	Radicación de Documentación	1	11-Feb-23	12-Feb-23
C-2830	Respuesta de la entidad	60	12-Feb-23	13-Apr-23

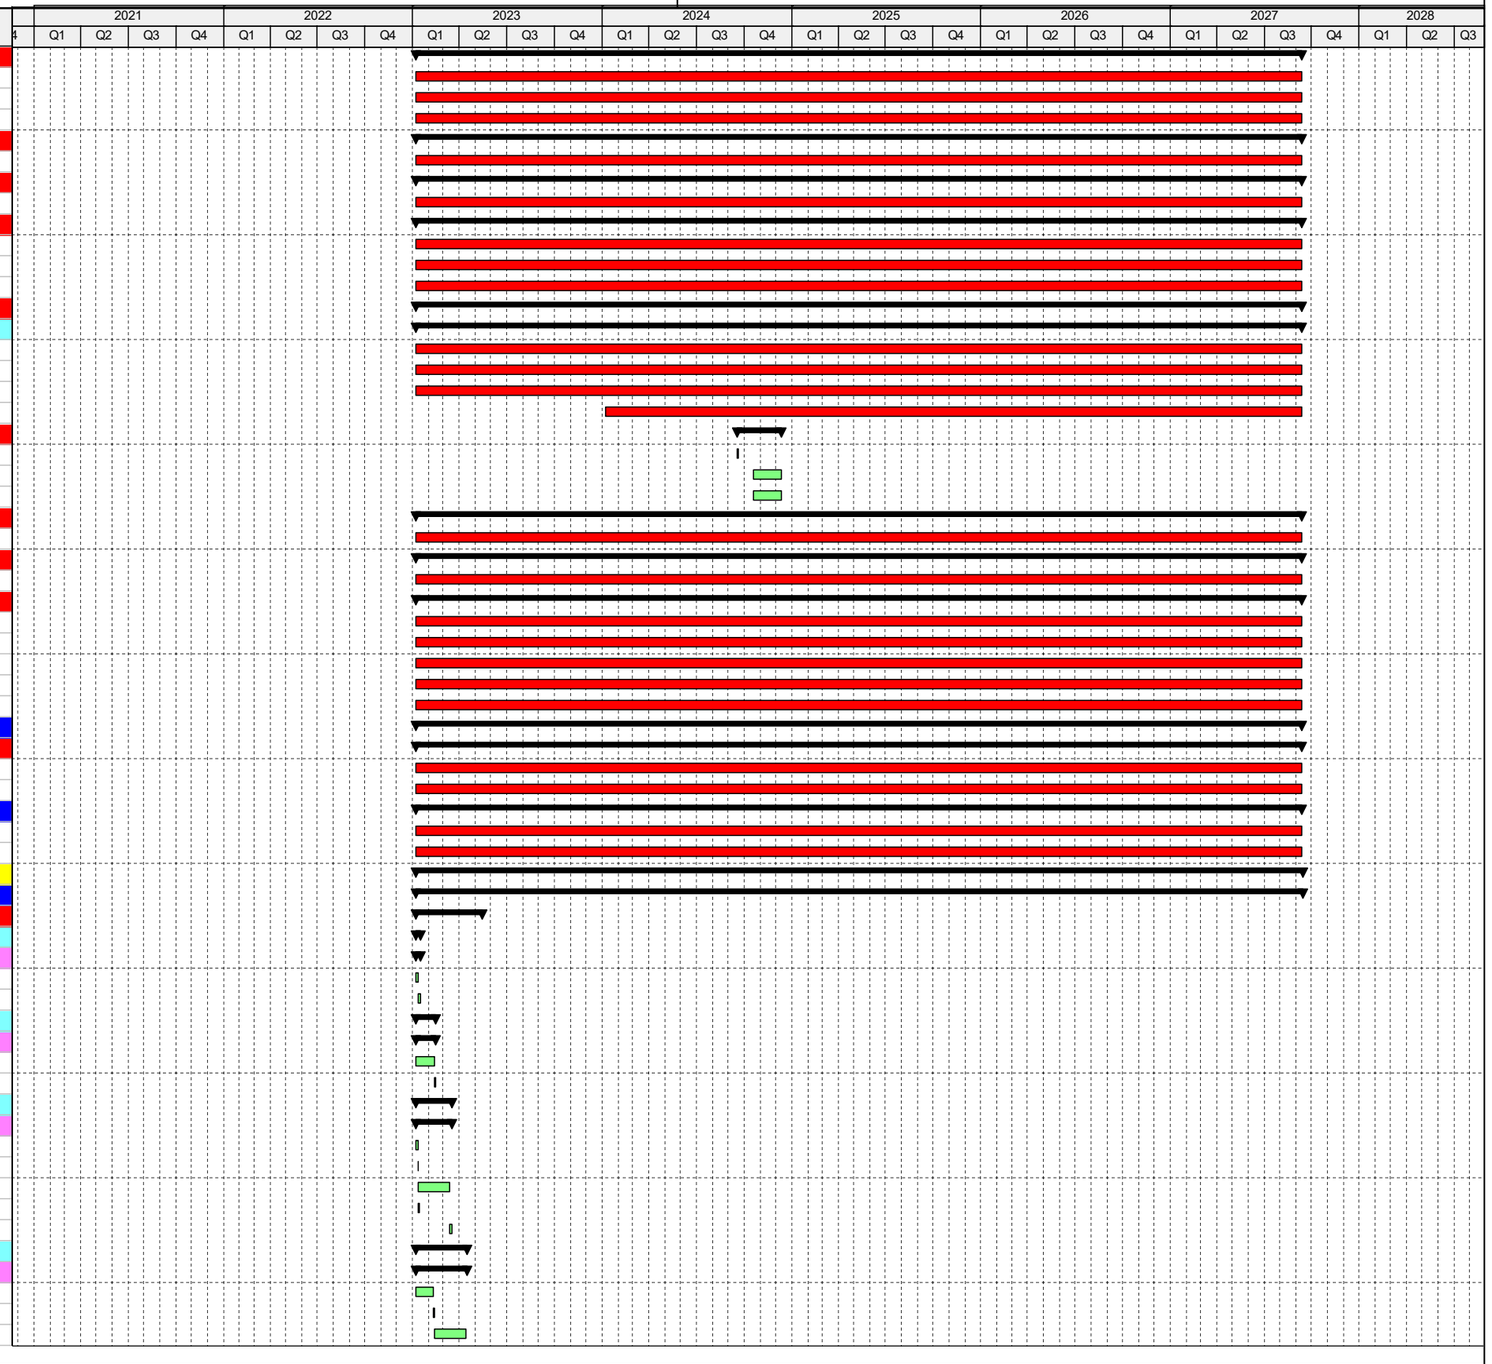


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-2840	Envío de radicado a Interventoría	1	12-Feb-23	13-Feb-23
C-3480	Envío de respuesta de entidad a interventoría	3	13-Apr-23	16-Apr-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.1.5	**Tramo 6**	119	17-Jan-23	16-May-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.1.5.8	**Permiso de tratamiento silvicutural y especies en veda (árboles y ej**	19	17-Jan-23	05-Feb-23
C-2480	Expedición del permiso de tratamiento silvicultural	1	17-Jan-23	18-Jan-23
C-2510	Recurso de reposición	10	18-Jan-23	28-Jan-23
C-2520	Envío del permiso a la interventoría	3	19-Jan-23	22-Jan-23
C-2530	Respuesta al recurso de reposición de AAC	5	28-Jan-23	02-Feb-23
C-2540	Envío de recurso de reposición a Interventoría	3	29-Jan-23	01-Feb-23
C-2550	Envío del concepto de recurso de reposición a la Interventoría	3	02-Feb-23	05-Feb-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.1.5.9	**Permiso del Jardín Botánico de Bogota para ubicación de árboles a**	99	06-Feb-23	16-May-23
C-2590	Preparación de documentacion	35	06-Feb-23	13-Mar-23
C-2990	Radicación de Documentación	1	13-Mar-23	14-Mar-23
C-3010	Respuesta de la entidad	60	14-Mar-23	13-May-23
C-3020	Envío de radicado a Interventoría	1	14-Mar-23	15-Mar-23
C-3590	Envío de respuesta de entidad a interventoría	3	13-May-23	16-May-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.2	**Permiso estudio para recolección de especímenes especies silvestres de div**	117	08-Jan-23	05-May-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.2.1	**Tramo 3**	27	08-Jan-23	04-Feb-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.2.1.5	**Actualización de la Caracterización del Componente Biótico**	27	08-Jan-23	04-Feb-23
C-2290	Implementación del plan	27	08-Jan-23	04-Feb-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.2.2	**Tramo 4**	57	08-Jan-23	06-Mar-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.2.2.5	**Actualización de la Caracterización del Componente Biótico**	57	08-Jan-23	06-Mar-23
C-2300	Implementación del plan	57	08-Jan-23	06-Mar-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.2.3	**Tramo 5**	87	08-Jan-23	05-Apr-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.2.3.5	**Actualización de la Caracterización del Componente Biótico**	87	08-Jan-23	05-Apr-23
C-2310	Implementación del plan	87	08-Jan-23	05-Apr-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.2.4	**Tramo 6**	117	08-Jan-23	05-May-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.2.4.5	**Actualización de la Caracterización del Componente Biótico**	117	08-Jan-23	05-May-23
C-2320	Implementación del plan	117	08-Jan-23	05-May-23
PLMB-T1-V04.2.03.1.3	**Permiso Generación de RCD - CAR**	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2160	Entrega mensual del informe de implementación a la interventoría	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2870	Entrega de reporte de implementación de la fase previa a la CAR (45 días)	1	21-Feb-23	22-Feb-23
C-2880	Entrega de radicación del reporte de implementación de la fase previa de la CAR a la	1	23-Feb-23	24-Feb-23*
PLMB-T1-V04.2.03.1.4	**Pin de Generador de RCD - SDA**	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2340	Envío del reporte mensual de RCD a SDA	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2350	Envío de radicación del reporte mensual a Interventoría	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.03.1.5	**Permiso de trabajo nocturno**	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-1350	Solicitud de permiso a las Alcaldías Menores	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-1360	Procesamiento del permiso en la Alcaldía	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-1370	Expedición del permiso de trabajo nocturno	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-1380	Envío de permiso a la Interventoría	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.03.1.6	**Permiso de Publicidad Exterior**	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2170	Elaboración de la valla por frentes de obra (Dirección Social)	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2180	Radicación de solicitud de permiso de publicidad exterior	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2190	Obtención del permiso	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2200	Envío del permiso a la Interventoría	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2210	Revisión por la Autoridad Ambiental	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2220	Radicación de póliza a AAC	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2230	Entrega de póliza	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2240	Envío de radicación de póliza a Interventoría	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2250	Envío de radicacion de solicitud a Interventoría	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.03.2	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.03.2.1	**Informe de cierre de Fase Previa de las actividades de Gestión Ambiental y de**	30	08-Jan-23	07-Feb-23
C-1400	Elaboración del informe	29	08-Jan-23	06-Feb-23
C-2580	Entrega del informe	1	06-Feb-23	07-Feb-23*
PLMB-T1-V04.2.03.2.2	**Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST**	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2260	Actualización permanente del Sistema de Gestión SST	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2270	Entrega Anual de la certificación de implementación del SG-SST expedido por la ARL	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.03.2.3	**Plan de Gestión del Riesgo de Desastres**	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-1420	Actualización semestral	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.03.2.4	**Matriz de Huella de Carbono**	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2330	Levantameinto Matriz Huella de Carbono (Mensual)	1710	08-Jan-23	14-Sep-27

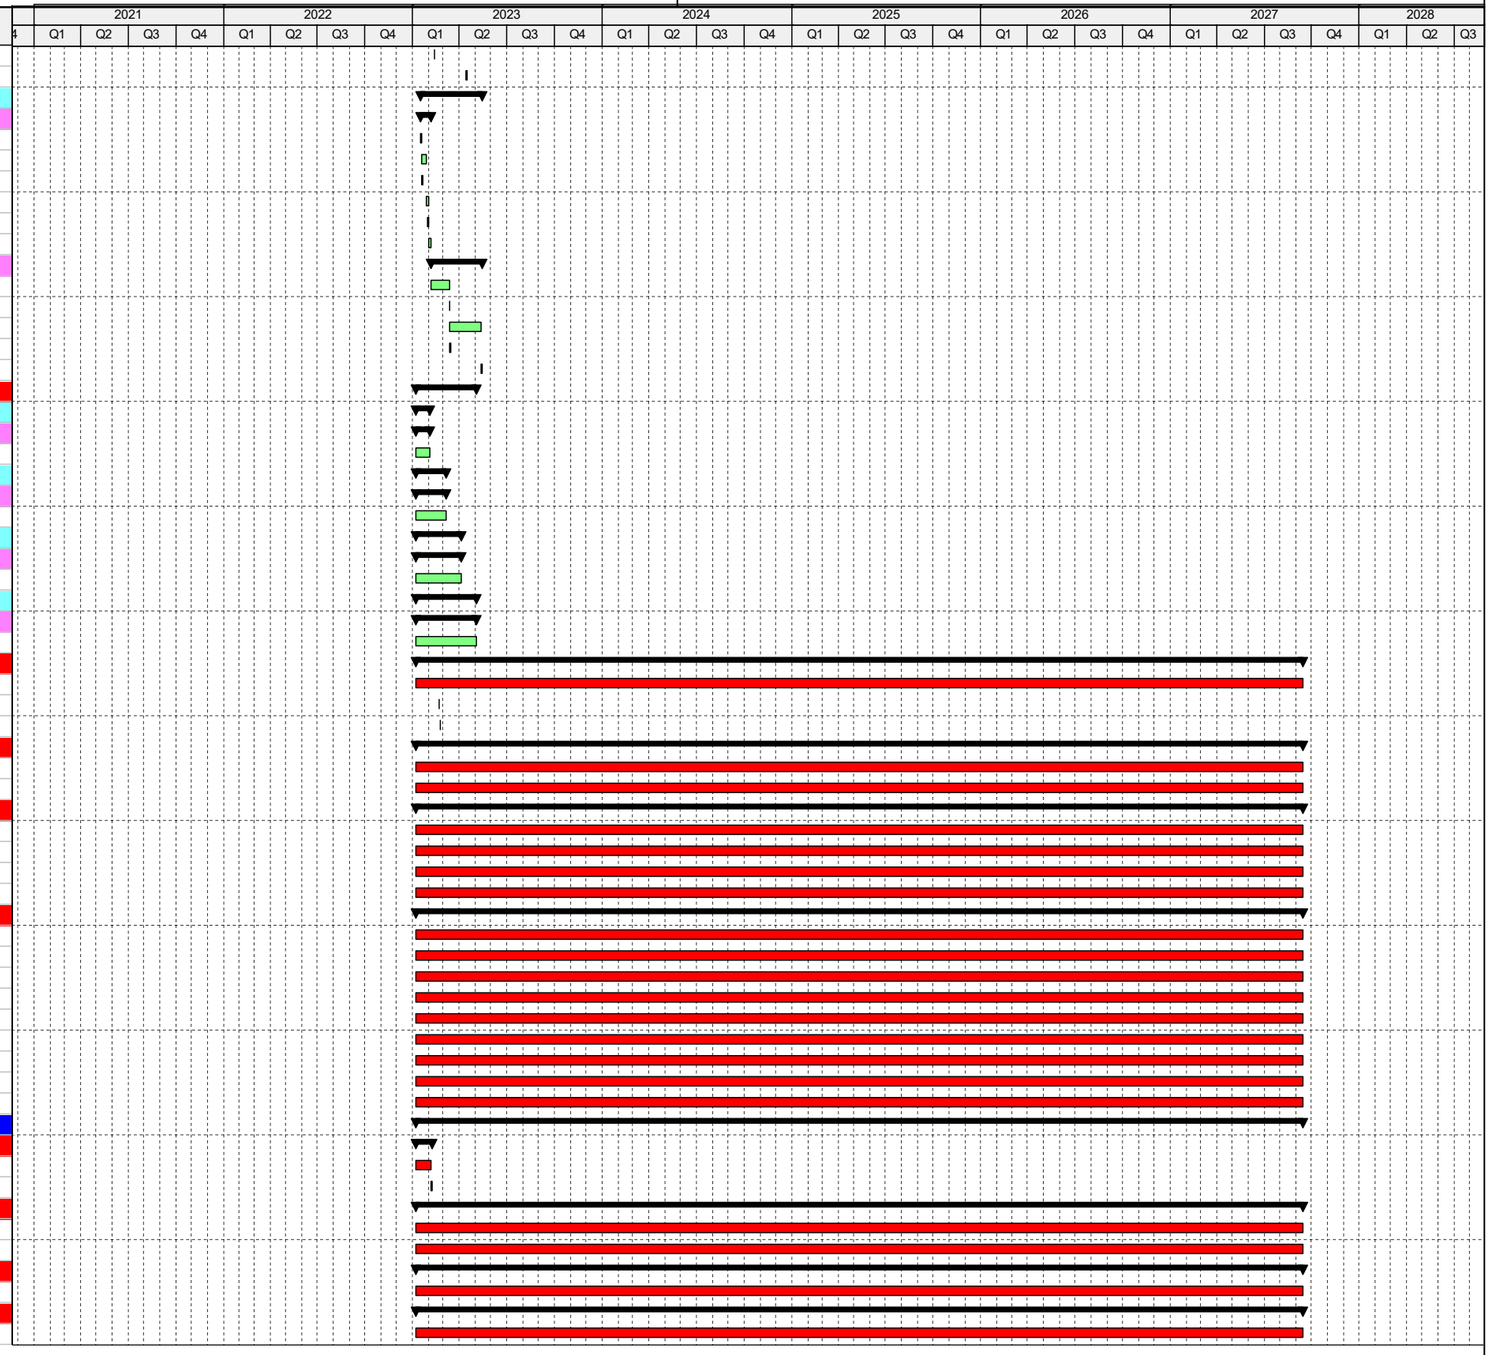


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-4840	Radicación del levantamiento de matriz huella de carbono (anual) a interventoría	1348	05-Jan-24	14-Sep-27
C-4850	Revisión y validación por interventoría	1348	05-Jan-24	14-Sep-27
C-4890	Respuesta a observaciones por parte del concesionario	1343	10-Jan-24	14-Sep-27
C-4900	Revisión por interventoría	1343	10-Jan-24	14-Sep-27
C-4990	Radicación a EMB	1338	15-Jan-24	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.03.2.5	Informe de Avance mensual de la Gestión Ambiental y SST por cada frente de	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-1410	Elaboración del Informe	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-2790	Entrega del Informe a la Interventoría	1677	10-Feb-23	14-Sep-27
C-2800	Revisión del Informe por la interventoría	1677	10-Feb-23	14-Sep-27
C-2850	Entrega de observaciones de la Interventoría al Concesionario	1667	20-Feb-23	14-Sep-27
C-2860	Atención de observaciones de la Interventoría por el Concesionario	1667	20-Feb-23	14-Sep-27
C-2890	Revisión y validacion de las observaciones por la Interventoría	1657	02-Mar-23	14-Sep-27
C-2900	Remisión del Informe a la EMB	1657	02-Mar-23	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.03.2.6	Comite Ambiental y SST Semanal	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-1430	Comite Ambiental y SST que se realiza semanal	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.03.2.7	Comite Integral Mensual	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-1440	Comite Intergral que se realiza una vez al mes	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.03.3	IMPLEMENTACIÓN	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.03.3.1	Implementación del PMAS y PMS del EIAS de la PLMB para las Entidades Mu	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
C-1390	Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social y del Plan de Monitoreo y Segu	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.04	Patio Taller	1680	08-Jan-23	15-Aug-27
PLMB-T1-V04.2.04.01	Patio Taller (Tratamiento del suelo/Movimiento de tierra a Cota de Diseño)	750	08-Jan-23	27-Jan-25
PLMB-T1-V04.2.04.01.1	UE009: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	150	08-Jan-23	07-Jun-23
C-1230	UE009: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	08-Jan-23	07-Feb-23
C-2710	UE009: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	07-Feb-23	09-Mar-23
C-2960	UE009: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	90	09-Mar-23	07-Jun-23
PLMB-T1-V04.2.04.01.2	UE010: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	150	07-Feb-23	07-Jul-23
C-2700	UE010: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	07-Feb-23	09-Mar-23
C-2970	UE010: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	09-Mar-23	08-Apr-23
C-3170	UE010: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	90	08-Apr-23	07-Jul-23
PLMB-T1-V04.2.04.01.3	UE011: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	210	09-Mar-23	05-Oct-23
C-2940	UE011: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	09-Mar-23	08-Apr-23
C-3180	UE011: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	08-Apr-23	08-May-23
C-3820	UE011: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	90	07-Jul-23	05-Oct-23
PLMB-T1-V04.2.04.01.4	UE012: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	180	08-Apr-23	05-Oct-23
C-3160	UE012: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	08-Apr-23	08-May-23
C-3550	UE012: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	08-May-23	07-Jun-23
C-3830	UE012: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	90	07-Jul-23	05-Oct-23
PLMB-T1-V04.2.04.01.5	UE013: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	150	08-May-23	05-Oct-23
C-3540	UE013: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	08-May-23	07-Jun-23
C-3690	UE013: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	07-Jun-23	07-Jul-23
C-3840	UE013: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	90	07-Jul-23	05-Oct-23
PLMB-T1-V04.2.04.01.6	UE014: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	150	07-Jun-23	04-Nov-23
C-3680	UE014: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	07-Jun-23	07-Jul-23
C-3850	UE014: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	07-Jul-23	06-Aug-23
C-3980	UE014: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	90	06-Aug-23	04-Nov-23
PLMB-T1-V04.2.04.01.7	UE015: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	210	07-Jul-23	02-Feb-24
C-3810	UE015: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	07-Jul-23	06-Aug-23
C-3990	UE015: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	06-Aug-23	05-Sep-23
C-4490	UE015: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	90	04-Nov-23	02-Feb-24
PLMB-T1-V04.2.04.01.8	UE016: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	180	06-Aug-23	02-Feb-24
C-3970	UE016: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	06-Aug-23	05-Sep-23
C-4190	UE016: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	05-Sep-23	05-Oct-23
C-4500	UE016: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	90	04-Nov-23	02-Feb-24
PLMB-T1-V04.2.04.01.9	UE017: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	150	05-Sep-23	02-Feb-24
C-4180	UE017: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	05-Sep-23	05-Oct-23
C-4340	UE017: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	05-Oct-23	04-Nov-23
C-4510	UE017: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	90	04-Nov-23	02-Feb-24
PLMB-T1-V04.2.04.01.10	UE018: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	130	05-Oct-23	12-Feb-24
C-4330	UE018: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	05-Oct-23	04-Nov-23
C-4520	UE018: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	04-Nov-23	04-Dec-23
C-4660	UE018: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	70	04-Dec-23	12-Feb-24



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.2.04.01.11	UE019: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	190	04-Nov-23	12-May-24
C-4480	UE019: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	04-Nov-23	04-Dec-23
C-4670	UE019: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	04-Dec-23	03-Jan-24
C-5200	UE019: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	90	12-Feb-24	12-May-24
PLMB-T1-V04.2.04.01.12	UE020: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	160	04-Dec-23	12-May-24
C-4650	UE020: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	04-Dec-23	03-Jan-24
C-4820	UE020: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	03-Jan-24	02-Feb-24
C-5210	UE020: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	90	12-Feb-24	12-May-24
PLMB-T1-V04.2.04.01.13	UE021: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	150	03-Jan-24	01-Jun-24
C-4810	UE021: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	03-Jan-24	02-Feb-24
C-5130	UE021: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	02-Feb-24	03-Mar-24
C-5340	UE021: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	90	03-Mar-24	01-Jun-24
PLMB-T1-V04.2.04.01.14	UE022: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	120	02-Feb-24	01-Jun-24
C-5120	UE022: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	02-Feb-24	03-Mar-24
C-5350	UE022: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	03-Mar-24	02-Apr-24
C-5630	UE022: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	60	02-Apr-24	01-Jun-24
PLMB-T1-V04.2.04.01.15	UE023: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	180	03-Mar-24	30-Aug-24
C-5330	UE023: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	03-Mar-24	02-Apr-24
C-5640	UE023: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	02-Apr-24	02-May-24
C-6480	UE023: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	90	01-Jun-24	30-Aug-24
PLMB-T1-V04.2.04.01.16	UE024: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	149	02-Apr-24	29-Aug-24
C-5620	UE024: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	02-Apr-24	02-May-24
C-5990	UE024: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	02-May-24	01-Jun-24
C-6490	UE024: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	89	01-Jun-24	29-Aug-24
PLMB-T1-V04.2.04.01.17	UE025: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	150	02-May-24	29-Sep-24
C-5980	UE025: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	02-May-24	01-Jun-24
C-6500	UE025: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	01-Jun-24	01-Jul-24
C-6740	UE025: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	90	01-Jul-24	29-Sep-24
PLMB-T1-V04.2.04.01.18	UE026: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	120	01-Jun-24	29-Sep-24
C-6470	UE026: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	01-Jun-24	01-Jul-24
C-6750	UE026: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	01-Jul-24	31-Jul-24
C-6930	UE026: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	60	31-Jul-24	29-Sep-24
PLMB-T1-V04.2.04.01.19	UE027: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	150	01-Jul-24	28-Nov-24
C-6730	UE027: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	01-Jul-24	31-Jul-24
C-6940	UE027: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	31-Jul-24	30-Aug-24
C-7530	UE027: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	60	29-Sep-24	28-Nov-24
PLMB-T1-V04.2.04.01.20	UE028: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	120	31-Jul-24	28-Nov-24
C-6920	UE028: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	31-Jul-24	30-Aug-24
C-7300	UE028: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	30-Aug-24	29-Sep-24
C-7540	UE028: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	60	29-Sep-24	28-Nov-24
PLMB-T1-V04.2.04.01.21	UE029: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	120	30-Aug-24	28-Dec-24
C-7290	UE029: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	30-Aug-24	29-Sep-24
C-7550	UE029: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	29-Sep-24	29-Oct-24
C-7790	UE029: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	60	29-Oct-24	28-Dec-24
PLMB-T1-V04.2.04.01.22	UE030: Patio y Talleres Adecuacion del Terreno	120	29-Sep-24	27-Jan-25
C-7520	UE030: Patio y Talleres - Adecuación del terreno	30	29-Sep-24	29-Oct-24
C-7800	UE030: Patio y Talleres - Adecuación de la Mejora Terreno-Terreno	30	29-Oct-24	28-Nov-24
C-7870	UE030: Patio y Talleres - Adecuación del Relleno de Terrenos	60	28-Nov-24	27-Jan-25
PLMB-T1-V04.2.04.02	Patio y talleres - Edificios	1680	08-Jan-23	15-Aug-27
PLMB-T1-V04.2.04.02.1	UE031: Edificio Estacion/E.-Administrativo/E. Oficinas/E. Restaurante/Caset	880	29-Sep-24	26-Feb-27
C-7510	UE031-Edificio-Patio taller-Edificio administrativo-Civil y estructura	550	29-Sep-24	02-Apr-26
C-13920	UE031-Edificio-Patio taller-Edificio-Administrativo-Decoración	210	02-Apr-26	29-Oct-26
C-16050	UE031 - Red de servicio público (instalaciones físicas del CCO de respaldo)	120	29-Oct-26	26-Feb-27
PLMB-T1-V04.2.04.02.2	UE032: Patios Talleres - Edificio - Hall de Cocheras	720	27-Jan-25	17-Jan-27
C-8610	UE032-Patio taller-Edificio-Estacionamiento-Garaje-Civil y Estructura	480	27-Jan-25	22-May-26
C-14650	UE032-Patio taller-Edificio-Aparcamiento-Decoración	240	22-May-26	17-Jan-27
C-14660	UE032-Patio taller-Edificio-Garaje de estacionamiento-Red de tuberías de servicio púb	240	22-May-26	17-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.04.02.3	UE033: Patios Talleres - Edificio- Locales Tecnicos	510	27-Jan-25	21-Jun-26
C-8620	UE033-Edificio de Patio taller-Edificio técnico-Civil y estructura	390	27-Jan-25	21-Feb-26
C-13310	UE033-Patio taller-Edificación-Edificación Técnica-Civil-Decoración	60	21-Feb-26	22-Apr-26
C-14280	UE033-Patio taller-Edificio-Edificio técnico-Red de tuberías de servicio público-civil	60	22-Apr-26	21-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.04.02.4	UE034: Patios Talleres -Edificio- Maquina de Lavado	240	26-Apr-25	22-Dec-25

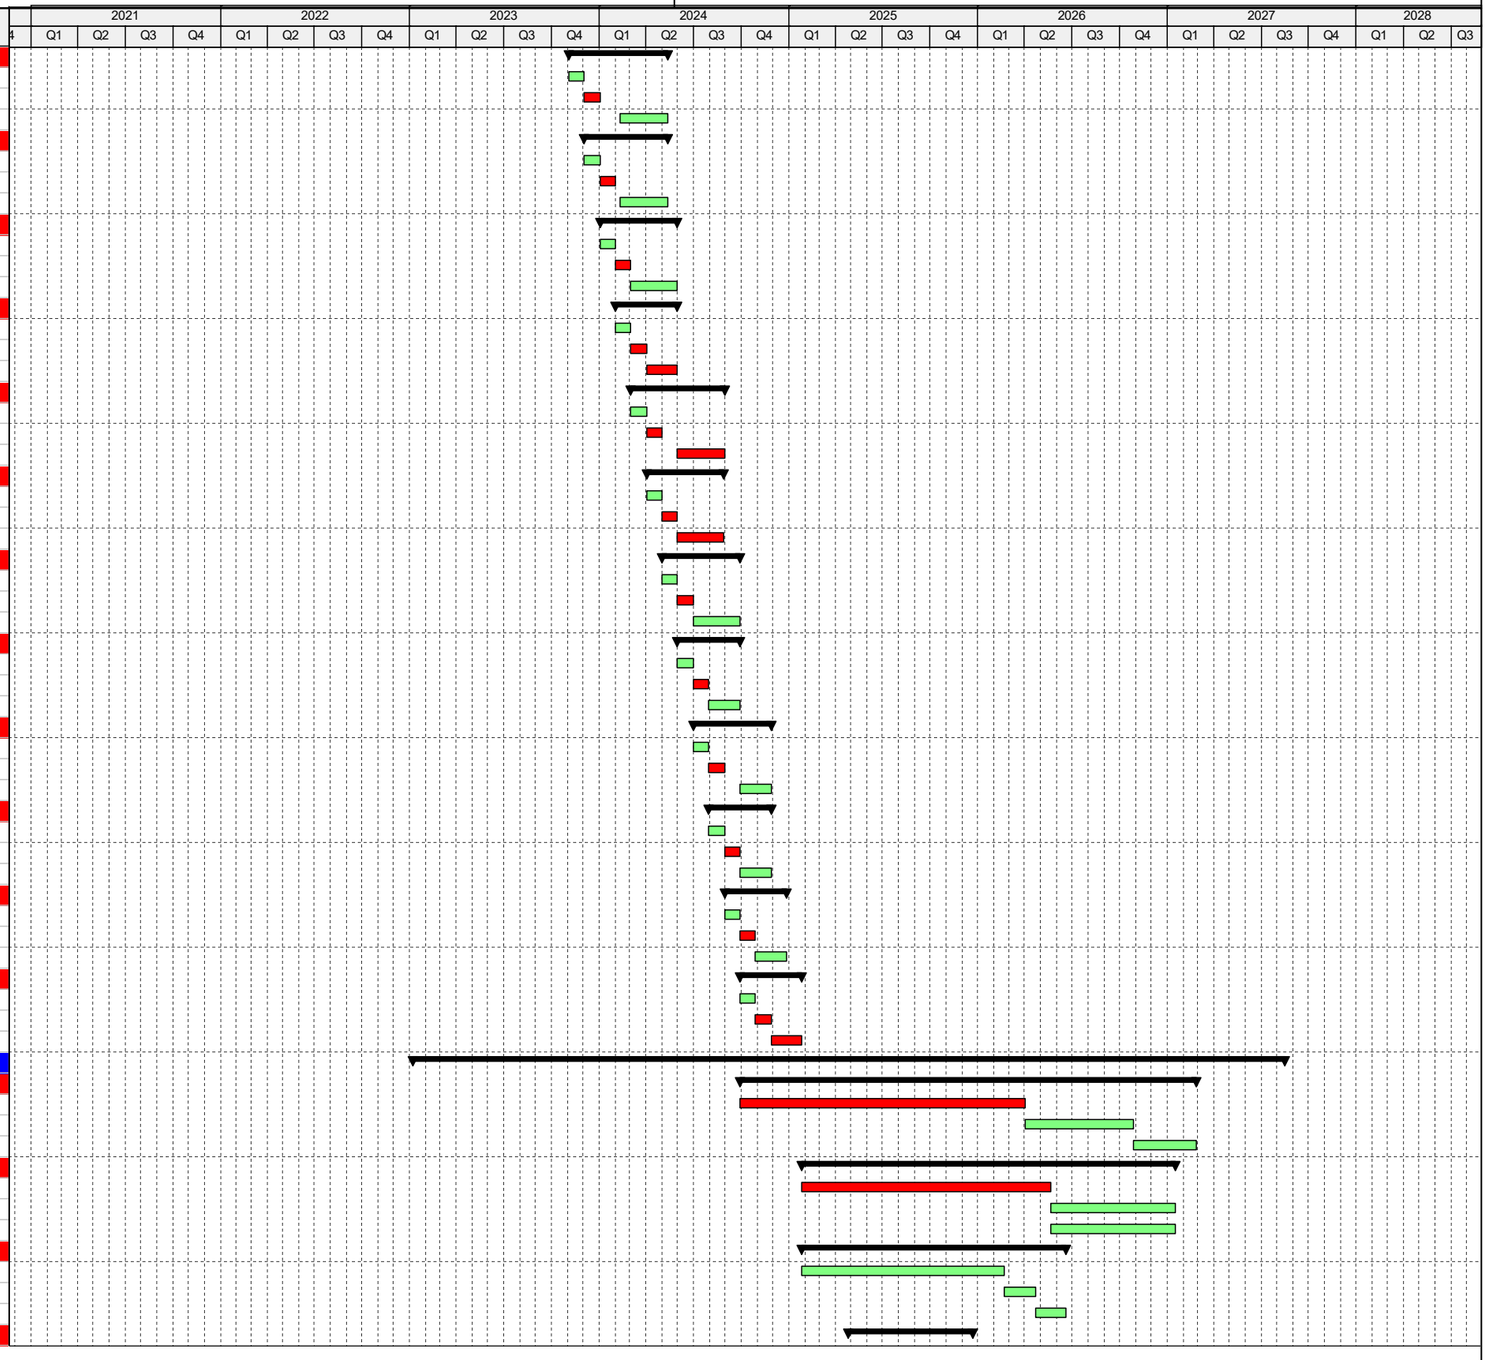


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-9790	UE034-Patio taller-Edificio-Cochera de lavado-Civil y Estructura	120	26-Apr-25	24-Aug-25
C-11290	UE034-Patio taller-Edificio-Lavado de coches-Decoración de garaje	60	24-Aug-25	23-Oct-25
C-11860	UE034-Patio taller-Edificio-Cochera de lavado-Red de Tuberías de Servicio Público	60	23-Oct-25	22-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.04.02.5	UE035: Patios Talleres - Edificio- Taller de Mantenimiento de Infraestructura	450	27-Jan-25	22-Apr-26
C-8630	UE035-Patio taller-Edificio-Mantenimiento de infraestructura Almacén-Civil y estructura	240	27-Jan-25	24-Sep-25
C-11570	UE035-Patio taller-Edificio-Infraestructura Mantenimiento Almacén-Decoración	90	24-Sep-25	23-Dec-25
C-12430	UE035-Patio taller-Edificio-Mantenimiento de infraestructura Almacén-Red de tuberías	120	23-Dec-25	22-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.04.02.6	UE036: Patios Talleres - Edificio- Taller de Mantenimiento Mayor y Menor	720	29-Sep-24	19-Sep-26
C-8640	UE036-Patio taller-Edificio-Revisión y taller de reparación menor-Civil y estructura	480	29-Sep-24	22-Jan-26
C-14670	UE036-Patio taller-Edificio-Revisión y reparación menor Taller-Decoración	240	22-Jan-26	19-Sep-26
C-14680	UE036-Patio taller-Edificio-Revisión y taller de reparación menor-Red de tuberías de se	240	22-Jan-26	19-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.04.02.7	UE037: Patios Talleres - Edificio- Tanque SCI, Tratamiento agua/almacen de	270	25-Jun-25	22-Mar-26
C-10570	UE037-Patio taller-Civil y estructura	150	25-Jun-25	22-Nov-25
C-12130	UE037-Patio taller-Decoración	90	22-Nov-25	20-Feb-26
C-12140	UE037-Patio taller-Red de tuberías de servicio público	120	22-Nov-25	22-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.04.02.8	UE038: Patios Talleres - Urbanismo	1080	29-Aug-24	14-Aug-27
C-7170	UE038-Estructura civil	300	29-Aug-24	25-Jun-25
C-8120	UE038-Estructura de pista (pista de prueba)	120	27-Dec-24	26-Apr-25
C-10580	UE038-Construcción de carreteras y pavimentos	365	25-Jun-25	25-Jun-26
C-10590	UE038-Valla e iluminación	240	25-Jun-25	20-Feb-26
C-10600	UE038-Estructura de vía (otra vía en Patio taller)	312	25-Jun-25	03-May-26
C-13270	UE038-Red de servicio público	180	20-Feb-26	19-Aug-26
C-15520	UE038-Paisajismo y Urbanismo	360	19-Aug-26	14-Aug-27
PLMB-T1-V04.2.04.02.9	Monitoreo	1680	08-Jan-23	15-Aug-27
C-1310	Instrumentacion y Monitoreo	1680	08-Jan-23	15-Aug-27
PLMB-T1-V04.2.05	Construccion estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y capiteles	1450	08-Jan-23	28-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.05.01	W1- Viaducto - Cimentaciones, pilas y capiteles: K0 + 000 a K4+050	1216	08-Jan-23	08-May-26
PLMB-T1-V04.2.05.01.1	UE091:W1- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K0+000 a K0	1206	18-Jan-23	08-May-26
C-2490	W1-UE091: Viaducto-Infraestructura-Pile infraestructura (viga continua)	246	18-Jan-23	21-Sep-23
C-4230	W1-UE091: Viaducto-Infraestructura-Renovación de espacios públicos y divisores centi	45	21-Sep-23	05-Nov-23
C-10230	W1-UE091: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	60	19-May-25	18-Jul-25
C-10980	W1-UE091: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	80	18-Jul-25	06-Oct-25
C-13840	W1-UE091: Viaducto-Infraestructura-Renovación de espacios públicos y divisiones cen	45	24-Mar-26	08-May-26
PLMB-T1-V04.2.05.01.2	UE090:W1- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K0+300 a K0	369	20-Mar-25	24-Mar-26
C-9400	W1-UE090: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	60	20-Mar-25	19-May-25
C-9780	W1-UE090: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	85	25-Apr-25	19-Jul-25
C-13060	W1-UE090: Viaducto-Infraestructura-Renovación de espacios públicos y particiones ce	60	23-Jan-26	24-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.05.01.3	UE089:W1- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K0+650 a K1	399	20-Dec-24	23-Jan-26
C-8030	W1-UE089: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	90	20-Dec-24	20-Mar-25
C-8540	W1-UE089: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	100	15-Jan-25	25-Apr-25
C-11890	W1-UE089: Viaducto-Infraestructura-Renovación de espacios públicos y divisores centi	90	25-Oct-25	23-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.05.01.4	UE088:W1- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K1+030 a K1	394	21-Sep-24	20-Oct-25
C-7400	W1-UE088: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	90	21-Sep-24	20-Dec-24
C-7950	W1-UE088: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	126	14-Dec-24	19-Apr-25
C-11260	W1-UE088: Viaducto-Infraestructura-Renovación de espacios públicos y divisiones cen	66	15-Aug-25	20-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.05.01.5	UE087:W1- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K1+340 a K1	388	23-Jul-24	15-Aug-25
C-6810	W1-UE087: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	60	23-Jul-24	21-Sep-24
C-7410	W1-UE087: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	84	21-Sep-24	14-Dec-24
C-10460	W1-UE087: Viaducto-Infraestructura-Renovación de espacios públicos y divisiones cen	60	16-Jun-25	15-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.05.01.6	UE086:W1- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K1+600 a K2	428	14-Apr-24	16-Jun-25
C-5760	W1-UE086: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	100	14-Apr-24	23-Jul-24
C-6780	W1-UE086: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	135	17-Jul-24	29-Nov-24
C-9620	W1-UE086: Viaducto-Infraestructura-Renovación de espacios públicos y divisiones cen	75	02-Apr-25	16-Jun-25
PLMB-T1-V04.2.05.01.7	UE085:W1- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K2+050 a K2	413	15-Jan-24	03-Mar-25
C-4980	W1-UE085: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	90	15-Jan-24	14-Apr-24
C-5770	W1-UE085: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	90	18-Apr-24	17-Jul-24
C-8410	W1-UE085: Viaducto-Infraestructura-Renovación de espacios públicos y divisiones cen	60	02-Jan-25	03-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.05.01.8	UE084:W1- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K2+480 a K2	388	26-Nov-23	18-Dec-24
C-4590	W1-UE084: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	50	26-Nov-23	15-Jan-24
C-5170	W1-UE084: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	75	03-Feb-24	18-Apr-24
C-7700	W1-UE084: Viaducto-Infraestructura-Renovación de espacios públicos y divisores centi	60	19-Oct-24	18-Dec-24
PLMB-T1-V04.2.05.01.9	UE083:W1- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K2+790 a K3	388	27-Sep-23	19-Oct-24

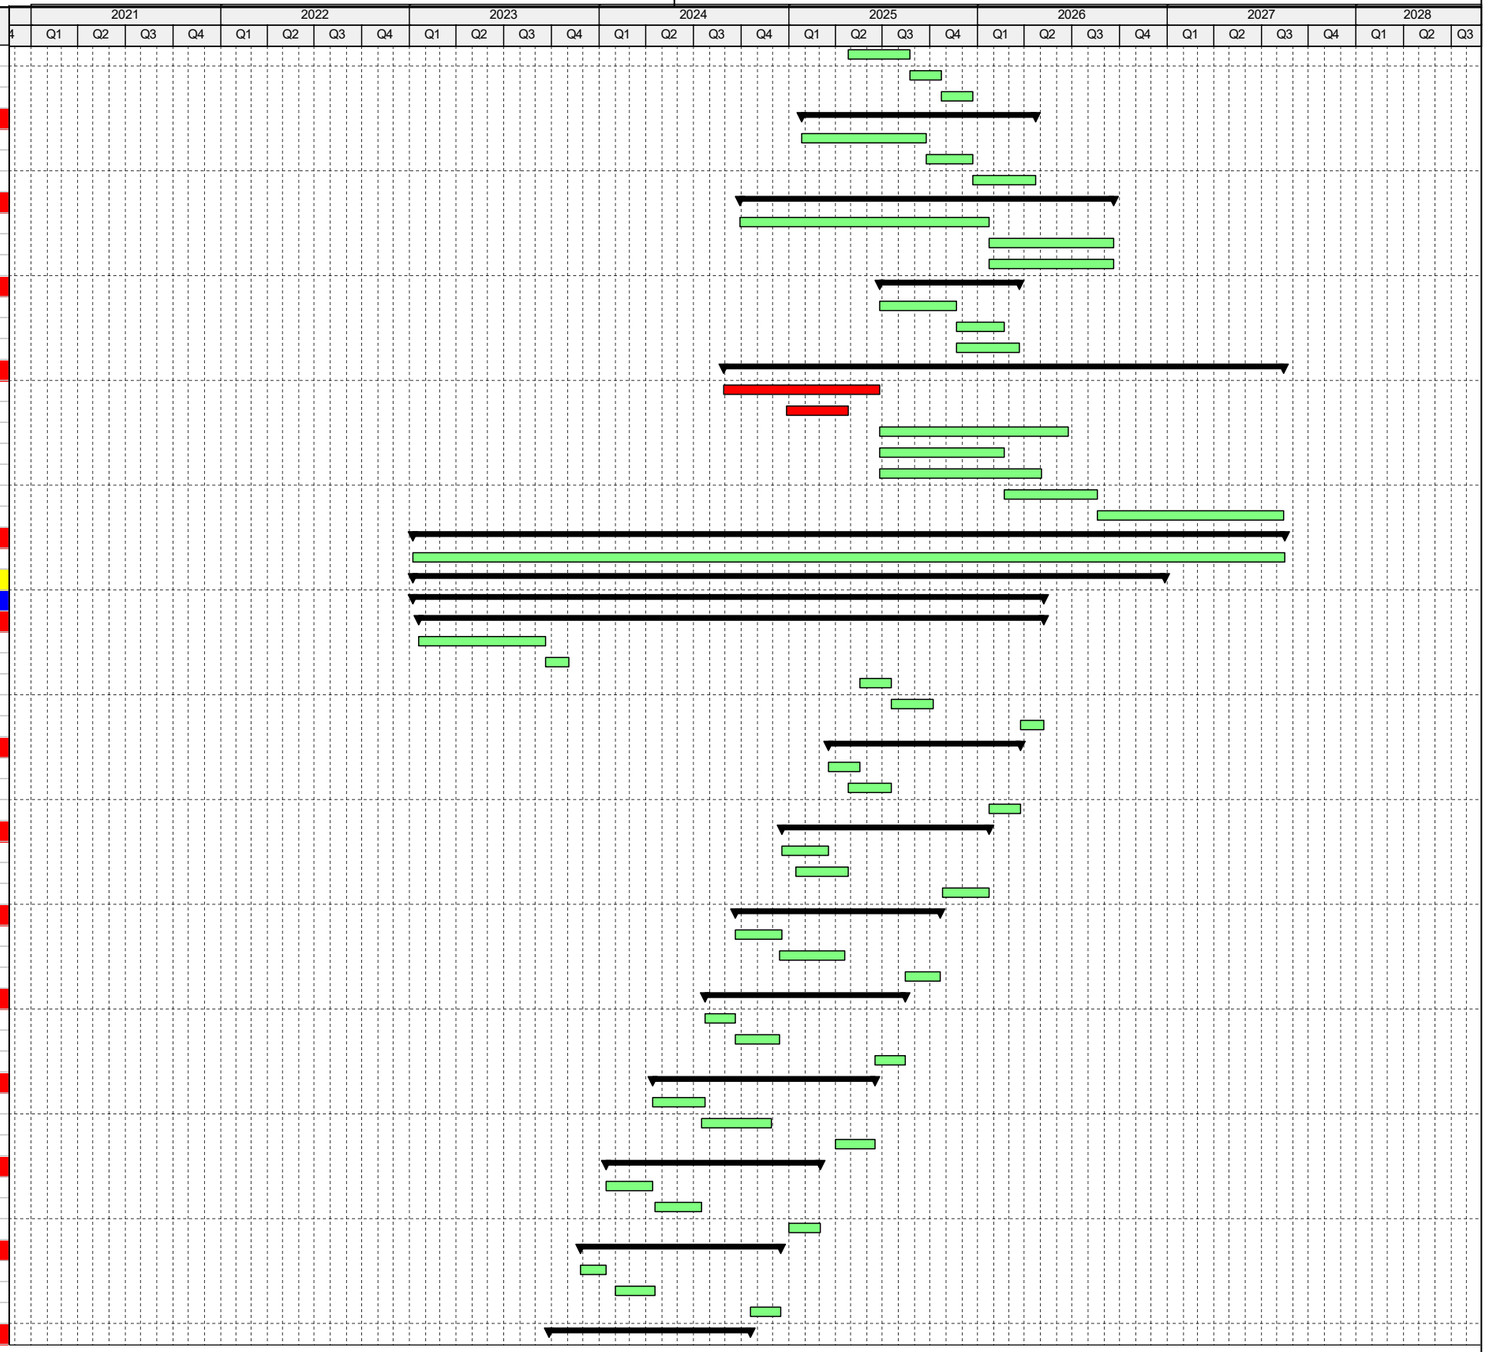


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-4270	W1-UE083: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	60	27-Sep-23	26-Nov-23
C-4600	W1-UE083: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	69	26-Nov-23	03-Feb-24
C-5370	W1-UE083: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	04-Mar-24	03-May-24
C-7080	W1-UE083: Viaducto-Infraestructura- Partición central de renovación y carril exterior mi	60	20-Aug-24	19-Oct-24
PLMB-T1-V04.2.05.01.10	**UE082:W1- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K3+040 a K**	**409**	**08-Jul-23**	**20-Aug-24**
C-3870	W1-UE082: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	81	08-Jul-23	27-Sep-23
C-4250	W1-UE082: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	100	26-Sep-23	04-Jan-24
C-4830	W1-UE082: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	04-Jan-24	04-Mar-24
C-6560	W1-UE082: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril exterior m	60	21-Jun-24	20-Aug-24
PLMB-T1-V04.2.05.01.11	**UE081:W1- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K3+440 a K**	**438**	**29-Mar-23**	**09-Jun-24**
C-3040	W1-UE081: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	101	29-Mar-23	08-Jul-23
C-3880	W1-UE081: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	80	08-Jul-23	26-Sep-23
C-4260	W1-UE081: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	26-Sep-23	25-Nov-23
C-5670	W1-UE081: Viaducto-Infraestructura- Renovación del tabique central y carril mixto exte	60	10-Apr-24	09-Jun-24
PLMB-T1-V04.2.05.01.12	**UE080:W1- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K3+760 a K**	**442**	**08-Jan-23**	**25-Mar-24**
C-1000	W1-UE080: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	80	08-Jan-23	29-Mar-23
C-3050	W1-UE080: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabe	120	29-Mar-23	27-Jul-23
C-3930	W1-UE080: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carril mixto dentro de ur	45	27-Jul-23	10-Sep-23
C-5010	W1-UE080: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril exterior m	60	25-Jan-24	25-Mar-24
PLMB-T1-V04.2.05.02	**W2: Viaducto - Cimentaciones, pilas y capiteles: K4+050 a K8+470**	**1254**	**08-Jan-23**	**15-Jun-26**
PLMB-T1-V04.2.05.02.1	**UE079:W2- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K4+050 to K4**	**460**	**08-Jan-23**	**12-Apr-24**
C-1010	W2-UE079: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	100	08-Jan-23	18-Apr-23
C-2570	W2-UE079: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabe	120	05-Feb-23	05-Jun-23
C-3620	W2-UE079: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	90	05-Jun-23	03-Sep-23
C-4920	W2-UE079: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril mixto exte	90	13-Jan-24	12-Apr-24
PLMB-T1-V04.2.05.02.2	**UE078:W2- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K4+480 to K4**	**390**	**18-Apr-23**	**12-May-24**
C-3490	W2-UE078: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	90	18-Apr-23	17-Jul-23
C-3630	W2-UE078: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabe	90	05-Jun-23	03-Sep-23
C-4070	W2-UE078: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	30	03-Sep-23	03-Oct-23
C-5730	W2-UE078: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril mixto exte	30	12-Apr-24	12-May-24
PLMB-T1-V04.2.05.02.3	**UE077:W2- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K4+740 to K5**	**372**	**17-Jul-23**	**23-Jul-24**
C-3910	W2-UE077: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	70	17-Jul-23	25-Sep-23
C-4080	W2-UE077: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabe	90	03-Sep-23	02-Dec-23
C-4450	W2-UE077: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carril mixto dentro de ur	60	02-Nov-23	01-Jan-24
C-6420	W2-UE077: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril mixto exte	60	24-May-24	23-Jul-24
PLMB-T1-V04.2.05.02.4	**UE076:W2- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K5+110 to K5**	**362**	**25-Sep-23**	**21-Sep-24**
C-4240	W2-UE076: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	70	25-Sep-23	04-Dec-23
C-4540	W2-UE076: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabe	90	12-Nov-23	10-Feb-24
C-4910	W2-UE076: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	11-Jan-24	11-Mar-24
C-6820	W2-UE076: Viaducto-Infraestructura- Renovación de la partición central y carril mixto e:	60	23-Jul-24	21-Sep-24
PLMB-T1-V04.2.05.02.5	**UE075:W2- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K5+405 to K5**	**347**	**04-Dec-23**	**15-Nov-24**
C-4620	W2-UE075: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	90	04-Dec-23	03-Mar-24
C-5000	W2-UE075: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabe	90	21-Jan-24	20-Apr-24
C-5780	W2-UE075: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	30	20-Apr-24	20-May-24
C-7640	W2-UE075: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril mixto exte	30	16-Oct-24	15-Nov-24
PLMB-T1-V04.2.05.02.6	**UE074:W2- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K5+760 to K6**	**389**	**03-Mar-24**	**27-Mar-25**
C-5290	W2-UE074: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	75	03-Mar-24	17-May-24
C-5500	W2-UE074: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabe	110	31-Mar-24	19-Jul-24
C-6060	W2-UE074: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	90	20-May-24	18-Aug-24
C-8090	W2-UE074: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril mixto exte	90	27-Dec-24	27-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.05.02.7	**UE073:W2- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K6+170 to K6**	**374**	**17-May-24**	**26-May-25**
C-6020	W2-UE073: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	65	17-May-24	21-Jul-24
C-6790	W2-UE073: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabe	90	19-Jul-24	17-Oct-24
C-7370	W2-UE073: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carril mixto dentro de ur	60	17-Sep-24	16-Nov-24
C-9490	W2-UE073: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril mixto exte	60	27-Mar-25	26-May-25
PLMB-T1-V04.2.05.02.8	**UE072:W2- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K6+545 to K6**	**339**	**21-Jul-24**	**25-Jun-25**
C-6800	W2-UE072: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	75	21-Jul-24	04-Oct-24
C-7470	W2-UE072: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabe	90	27-Sep-24	26-Dec-24
C-8070	W2-UE072: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carril mixto dentro de ur	30	26-Dec-24	25-Jan-25
C-10280	W2-UE072: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril exterior m	30	26-May-25	25-Jun-25
PLMB-T1-V04.2.05.02.9	**UE071:W2- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K6+760 to K7**	**381**	**04-Oct-24**	**20-Oct-25**
C-7580	W2-UE071: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	75	04-Oct-24	18-Dec-24

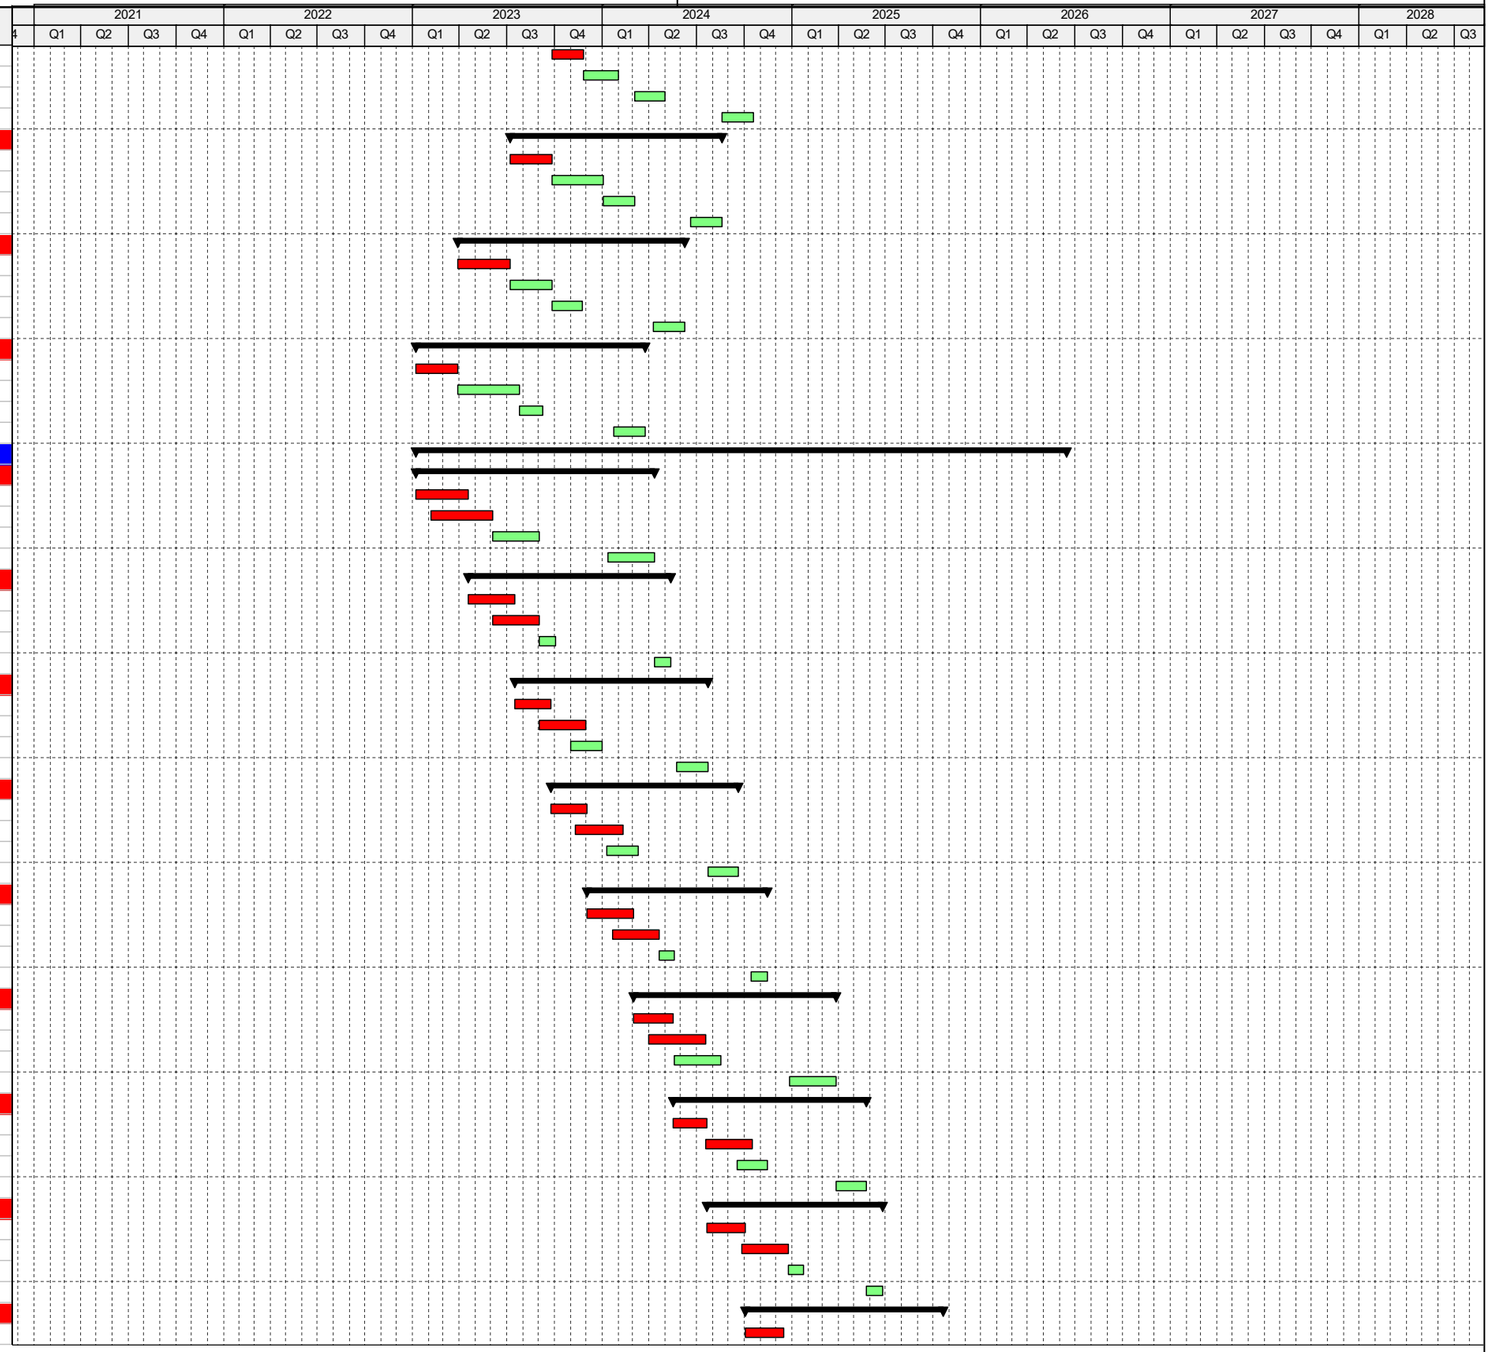

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-8080	W2-UE071: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	100	26-Dec-24	05-Apr-25
C-8660	W2-UE071: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	90	04-Feb-25	05-May-25
C-10990	W2-UE071: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril mixto exte	90	22-Jul-25	20-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.05.02.10	UE070:W2- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K7+215 to K	436	18-Dec-24	27-Feb-26
C-8000	W2-UE070: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	110	18-Dec-24	07-Apr-25
C-9140	W2-UE070: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	120	16-Mar-25	14-Jul-25
C-10180	W2-UE070: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carril mixto dentro de ur	90	15-May-25	13-Aug-25
C-12180	W2-UE070: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril exterior m	90	29-Nov-25	27-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.05.02.11	UE069:W2- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K7+800 to K	356	07-Apr-25	29-Mar-26
C-9660	W2-UE069: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	60	07-Apr-25	06-Jun-25
C-10740	W2-UE069: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	60	14-Jul-25	12-Sep-25
C-11340	W2-UE069: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	45	28-Aug-25	12-Oct-25
C-13370	W2-UE069: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril mixto exte	30	27-Feb-26	29-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.05.02.12	UE068:W2- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K8+025 to K	374	06-Jun-25	15-Jun-26
C-10400	W2-UE068: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	90	06-Jun-25	04-Sep-25
C-11380	W2-UE068: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	120	04-Sep-25	02-Jan-26
C-12220	W2-UE068: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	03-Dec-25	01-Feb-26
C-14530	W2-UE068: Viaducto-Infraestructura- Renovación de la partición central y carril mixto e:	34	12-May-26	15-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.05.03	W3- Viaducto - Cimentaciones, pilas y capiteles: K8 + 470 a K12 + 450	1320	08-Jan-23	20-Aug-26
PLMB-T1-V04.2.05.03.1	UE067:W3- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K8+470 to K	180	02-Oct-24	31-Mar-25
C-7560	W3-UE067: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	70	02-Oct-24	11-Dec-24
C-7810	W3-UE067: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga frontal (ir	90	01-Nov-24	30-Jan-25
C-8650	W3-UE067: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	30-Jan-25	31-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.05.03.2	UE066:W3- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K8+820 to K	525	24-Jun-24	01-Dec-25
C-6600	W3-UE066: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	100	24-Jun-24	02-Oct-24
C-6850	W3-UE066: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	155	24-Jul-24	26-Dec-24
C-8440	W3-UE066: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	05-Jan-25	06-Mar-25
C-11160	W3-UE066: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril exterior m	120	03-Aug-25	01-Dec-25
C-11170	W3-UE066 Viaducto-Infraestructura- Renovación de la partición central durante el segu	120	03-Aug-25	01-Dec-25
C-11180	W3-UE066: Viaducto-Infraestructura-La segunda renovación de carril mixto dentro del :	120	03-Aug-25	01-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.05.03.3	UE065:W3- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K9+430 to K	420	26-Jun-25	20-Aug-26
C-10640	W3-UE065: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	90	26-Jun-25	24-Sep-25
C-11050	W3-UE065: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	120	22-Jul-25	19-Nov-25
C-12210	W3-UE065: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	29-Nov-25	28-Jan-26
C-14330	W3-UE065 Viaducto-Infraestructura- Renovación del tabique central durante el seguno	60	27-Apr-26	26-Jun-26
C-15090	W3-UE065: Viaducto-Infraestructura-La segunda renovación de carril mixto dentro del :	55	26-Jun-26	20-Aug-26
PLMB-T1-V04.2.05.03.4	UE064:W3- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K9+830 to K1	465	25-Apr-24	03-Aug-25
C-5840	W3-UE064: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	60	25-Apr-24	24-Jun-24
C-6450	W3-UE064: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	90	25-May-24	23-Aug-24
C-7320	W3-UE064: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	02-Sep-24	01-Nov-24
C-10370	W3-UE064 Viaducto-Infraestructura- Renovación de la partición central durante el segu	60	04-Jun-25	03-Aug-25
C-10380	W3-UE064: Viaducto-Infraestructura-La segunda renovación de carril mixto dentro de u	60	04-Jun-25	03-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.05.03.5	UE063:W3- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K10+035 to K	515	06-Jan-24	04-Jun-25
C-4860	W3-UE063: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	110	06-Jan-24	25-Apr-24
C-5180	W3-UE063: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	135	05-Feb-24	19-Jun-24
C-6650	W3-UE063: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carril mixto dentro del ár	60	29-Jun-24	28-Aug-24
C-8990	W3-UE063: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril exterior m	90	06-Mar-25	04-Jun-25
C-9000	W3-UE063 Viaducto-Infraestructura- Renovación del tabique central durante el seguno	90	06-Mar-25	04-Jun-25
C-9010	W3-UE063: Viaducto-Infraestructura-La segunda renovación de carril mixto dentro del :	90	06-Mar-25	04-Jun-25
PLMB-T1-V04.2.05.03.6	UE062:W3- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K10+560 to K	535	18-Sep-23	06-Mar-25
C-4210	W3-UE062: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	110	18-Sep-23	06-Jan-24
C-4390	W3-UE062: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	165	18-Oct-23	31-Mar-24
C-5680	W3-UE062: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	10-Apr-24	09-Jun-24
C-7910	W3-UE062 Viaducto-Infraestructura- Renovación del tabique central durante el seguno	90	06-Dec-24	06-Mar-25
C-7920	W3-UE062: Viaducto-Infraestructura-La segunda renovación de carril mixto dentro de u	90	06-Dec-24	06-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.05.03.7	UE061:W3- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K10+820 to K	538	17-Jun-23	06-Dec-24
C-3710	W3-UE061: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	110	17-Jun-23	05-Oct-23
C-3920	W3-UE061: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	150	17-Jul-23	14-Dec-23
C-4700	W3-UE061: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	24-Dec-23	22-Feb-24
C-6990	W2-UE061: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril exterior m	120	08-Aug-24	06-Dec-24
C-7000	W3-UE061 Viaducto-Infraestructura- Renovación de la partición central durante el segu	120	08-Aug-24	06-Dec-24
C-7010	W3-UE061: Viaducto-Infraestructura-La segunda renovación de carril mixto dentro de u	120	08-Aug-24	06-Dec-24

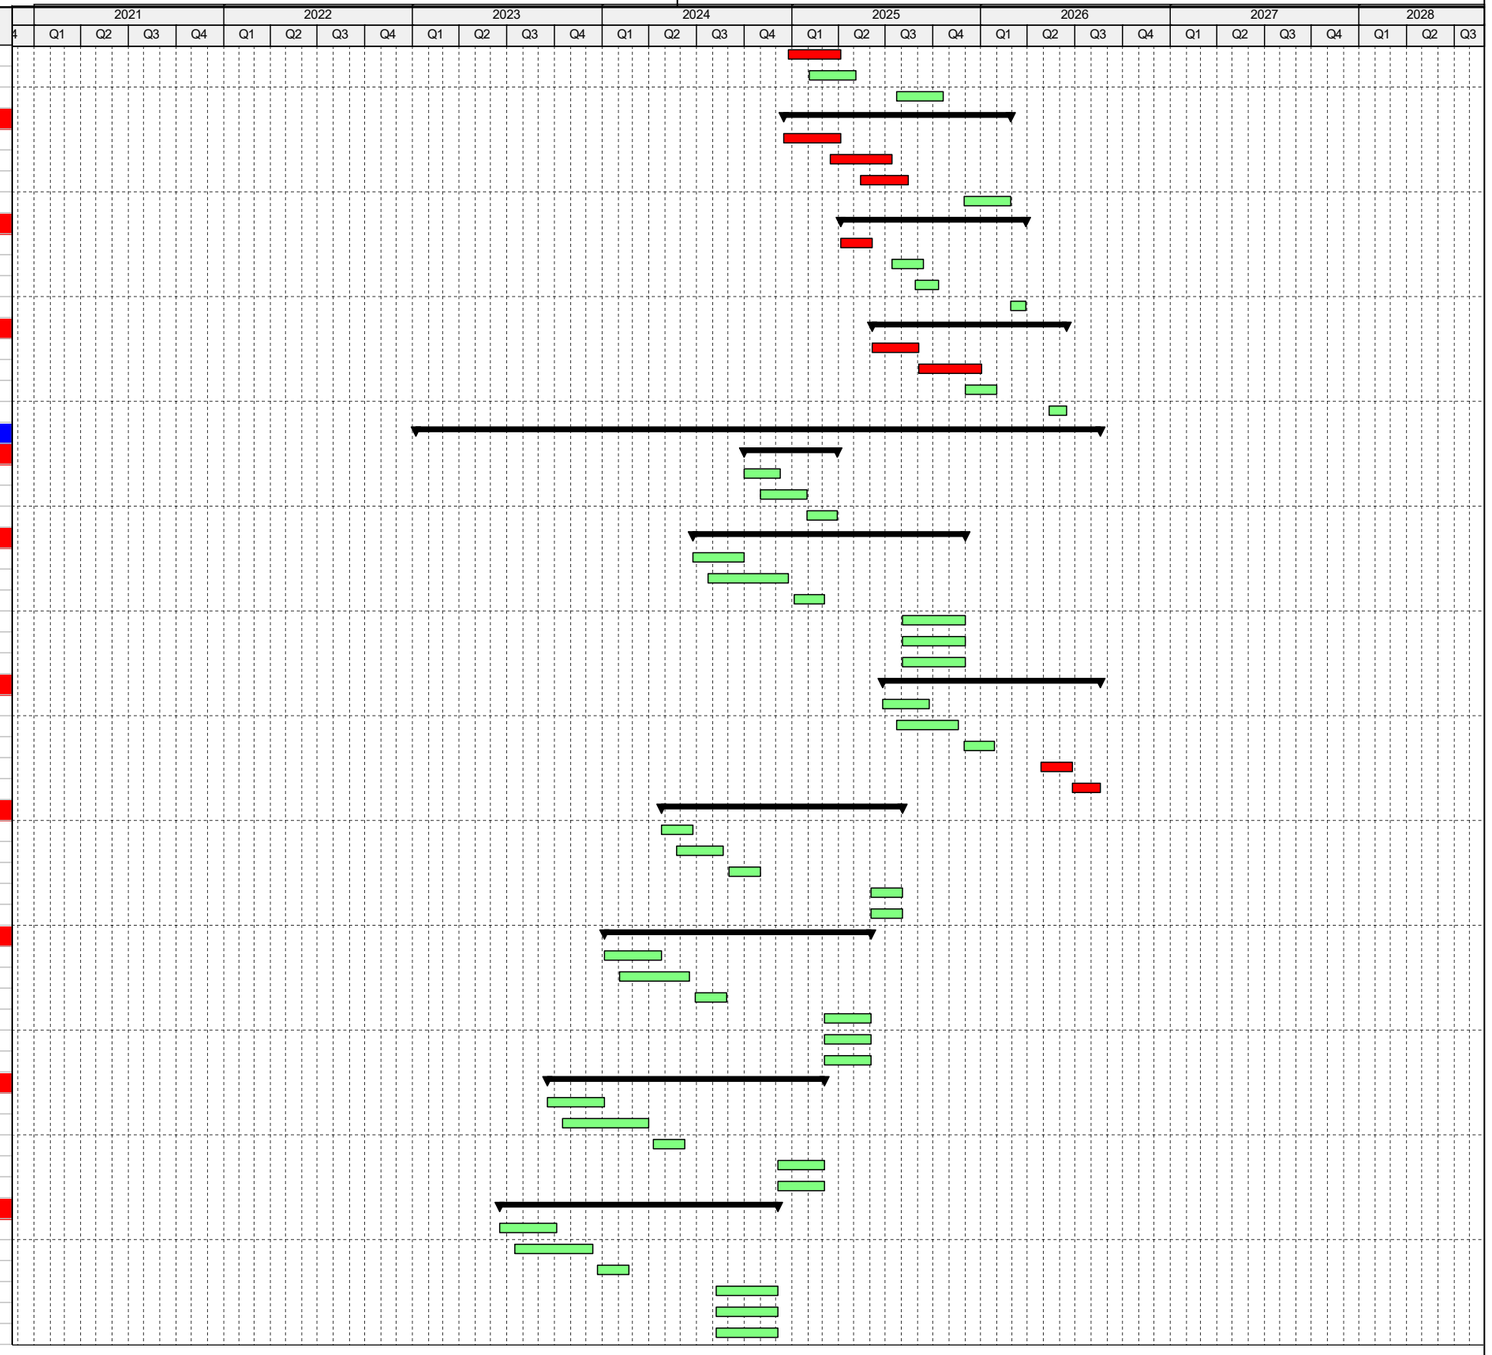


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.2.05.03.8	UE060:W3- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K11+440 to K	500	09-Mar-23	21-Jul-24
C-2920	W3-UE060: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	110	09-Mar-23	27-Jun-23
C-3070	W3-UE060: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	150	08-Apr-23	05-Sep-23
C-4090	W3-UE060: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	05-Sep-23	04-Nov-23
C-5790	W3-UE060: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril mixto exte	90	22-Apr-24	21-Jul-24
C-5800	W3-UE060 Viaducto-Infraestructura- Renovación de la partición central durante el segu	90	22-Apr-24	21-Jul-24
C-5810	W3-UE060: Viaducto-Infraestructura-La segunda renovación de carril mixto dentro de u	90	22-Apr-24	21-Jul-24
PLMB-T1-V04.2.05.03.9	UE193:W3- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K11+880 to K	436	19-Dec-24	28-Feb-26
C-7730	W3-UE193: Construcción de edificios de viaductos: demolición de la estación BRT orig	30	19-Dec-24	18-Jan-25
C-7940	W3-UE193: Cimentación de pilotes de infraestructura de viaducto	60	18-Jan-25	19-Mar-25
C-8450	W3-UE193: Tapas de pilotes de infraestructura de viaducto, muelles, cojines de soport	120	13-Feb-25	13-Jun-25
C-9020	W3-UE193: Construcción de la restauración de la estación BRT viaducto-NQS-Sena (E	120	14-Apr-25	12-Aug-25
C-10650	W3-UE193: Construcción de edificios viaductos-renovación de carril BRT dentro del pri	60	12-Aug-25	11-Oct-25
C-12230	W3-UE193: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril exterior m	60	30-Dec-25	28-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.05.03.10	UE059:W3- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K12+230 to	1207	08-Jan-23	29-Apr-26
C-1210	W3-UE059: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilote para parte de rejilla continu	60	08-Jan-23	09-Mar-23
C-2930	W3-UE059: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	100	09-Mar-23	17-Jun-23
C-8700	W3-UE059: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	70	19-Mar-25	28-May-25
C-9030	W3-UE059: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	90	14-Apr-25	13-Jul-25
C-10390	W3-UE059: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	13-Jul-25	11-Sep-25
C-13400	W3-UE059: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril mixto exte	30	30-Mar-26	29-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.05.04	W4- Viaducto - Cimentaciones, pilas y capiteles: K12 + 450 a K16 + 610	1077	08-Jan-23	20-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.05.04.1	UE058:W4- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K12+745 to K	496	08-Jan-23	18-May-24
C-1020	W4-UE058: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	115	08-Jan-23	03-May-23
C-2560	W4-UE058: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	140	03-Feb-23	23-Jun-23
C-3030	W4-UE058: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	120	25-Mar-23	23-Jul-23
C-5250	W4-UE058: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril mixto exte	90	18-Feb-24	18-May-24
PLMB-T1-V04.2.05.04.2	UE057:W4- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K13+250 to K	441	03-May-23	17-Jul-24
C-3510	W4-UE057: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	70	03-May-23	12-Jul-23
C-3600	W4-UE057: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	90	29-May-23	27-Aug-23
C-3940	W4-UE057: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	28-Jul-23	26-Sep-23
C-6050	W4-UE057: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril exterior m	60	18-May-24	17-Jul-24
PLMB-T1-V04.2.05.04.3	UE056:W4- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K13+600 to K	461	12-Jul-23	15-Oct-24
C-3890	W4-UE056: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	100	12-Jul-23	20-Oct-23
C-4000	W4-UE056: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	60	07-Aug-23	06-Oct-23
C-4350	W4-UE056: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	30	06-Oct-23	05-Nov-23
C-7060	W4-UE056: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril exterior m	60	16-Aug-24	15-Oct-24
PLMB-T1-V04.2.05.04.4	UE055:W4- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K13+990 to K	541	20-Oct-23	13-Apr-25
C-4400	W4-UE055: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	150	20-Oct-23	18-Mar-24
C-4580	W4-UE055: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	180	15-Nov-23	13-May-24
C-4970	W4-UE055: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	150	14-Jan-24	12-Jun-24
C-7990	W4-UE055: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril mixto exte	120	14-Dec-24	13-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.05.04.5	UE054:W4- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K14+620 to K	511	18-Mar-24	11-Aug-25
C-5450	W4-UE054: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	115	18-Mar-24	11-Jul-24
C-5750	W4-UE054: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	150	13-Apr-24	10-Sep-24
C-6540	W4-UE054: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	120	12-Jun-24	10-Oct-24
C-9720	W4-UE054: Viaducto-Infraestructura- Renovación de partición central y carril exterior m	120	13-Apr-25	11-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.05.04.6	UE194:W4- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K15+015 to K	359	05-Mar-23	27-Feb-24
C-1030	W4-UE194: Construcción de edificios viaductos: demolición de la estación BRT origina	33	05-Mar-23	07-Apr-23
C-2780	W4-UE194: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	90	07-Apr-23	06-Jul-23
C-3640	W4-UE194: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	60	01-Aug-23	30-Sep-23
C-3960	W4-UE194: Infraestructura-HOSPITAL (B02T) BRT	120	30-Sep-23	28-Jan-24
C-4610	W4-UE194: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	30	28-Jan-24	27-Feb-24
PLMB-T1-V04.2.05.04.7	UE053:W4- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K15+280 to K	176	11-Jul-24	03-Jan-25
C-6760	W4-UE053: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	90	11-Jul-24	09-Oct-24
C-6970	W4-UE053: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	120	06-Aug-24	04-Dec-24
C-7890	W4-UE053: Viaducto-Infraestructura-primera renovación de carril mixto dentro de un ár	30	04-Dec-24	03-Jan-25
PLMB-T1-V04.2.05.04.8	UE195:W4- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K15+505 to K	356	27-Feb-24	17-Feb-25
C-4760	W4-UE195: Construcción de edificios viaductos: demolición de la estación BRT origina	30	27-Feb-24	28-Mar-24
C-5060	W4-UE195: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	75	28-Mar-24	11-Jun-24
C-5280	W4-UE195: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	120	23-Apr-24	21-Aug-24
C-6610	W4-UE195: Infraestructura-TERCER MILENIO (B03) BRT	120	21-Aug-24	19-Dec-24




© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-7740	W4-UE195: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	19-Dec-24	17-Feb-25
PLMB-T1-V04.2.05.04.9	UE052:W4- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K15+700 to K	176	17-Feb-25	12-Aug-25
C-8040	W4-UE052: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	80	17-Feb-25	08-May-25
C-8550	W4-UE052: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	120	15-Mar-25	13-Jul-25
C-9390	W4-UE052: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	90	14-May-25	12-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.05.04.10	UE196:W4- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K16+060 to	296	17-Feb-25	10-Dec-25
C-8050	W3-UE196: Construcción de edificios viaductos: demolición de la estación BRT origina	30	17-Feb-25	19-Mar-25
C-9080	W4-UE196: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	60	08-May-25	07-Jul-25
C-9680	W4-UE196: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	70	03-Jun-25	12-Aug-25
C-10480	W4-UE196: Infraestructura- JIMENEZ (B04T) BRT	120	12-Aug-25	10-Dec-25
C-11520	W4-UE196: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	30	10-Nov-25	10-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.05.04.11	UE051:W4- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K16+410 to	166	07-Jul-25	20-Dec-25
C-10100	W4-UE051: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	45	07-Jul-25	21-Aug-25
C-10420	W4-UE051: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	80	02-Aug-25	21-Oct-25
C-11610	W4-UE051: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	30	20-Nov-25	20-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.05.05	W5- Viaducto - Cimentaciones, pilas y capiteles: K16 + 610 a K20 + 340	796	08-Jan-23	14-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.05.05.1	UE197:W5- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K16+610 to K	236	08-Jan-23	01-Sep-23
C-1040	W5-UE197: Construcción de edificios viaductos: demolición de la estación BRT origina	30	08-Jan-23	07-Feb-23
C-2600	W5-UE197: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	60	07-Feb-23	08-Apr-23
C-2910	W5-UE197: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	60	05-Mar-23	04-May-23
C-3520	W5-UE197: Infraestructura- Calle 19 (B05) BRT	120	04-May-23	01-Sep-23
C-3610	W5-UE197: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carril mixto dentro del ár	90	03-Jun-23	01-Sep-23
PLMB-T1-V04.2.05.05.2	UE050:W5- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K17+095 to K	216	08-Jan-23	12-Aug-23
C-1050	W5-UE050: Viaducto-Infraestructura: quitar la estación CALLE 22-BRT existente	30	08-Jan-23	07-Feb-23
C-3080	W5-UE050: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	60	08-Apr-23	07-Jun-23
C-3530	W5-UE050: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	70	04-May-23	13-Jul-23
C-3900	W5-UE050: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carril mixto dentro de ur	30	13-Jul-23	12-Aug-23
PLMB-T1-V04.2.05.05.3	UE049:W5- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K17+330 to K	146	07-Jun-23	31-Oct-23
C-3650	W5-UE049: Fundación viaducto-infraestructura-pilote	61	07-Jun-23	07-Aug-23
C-3750	W5-UE049: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	90	03-Jul-23	01-Oct-23
C-4040	W5-UE049: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	01-Sep-23	31-Oct-23
PLMB-T1-V04.2.05.05.4	UE048:W5- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K17+570 to K	327	08-Jan-23	01-Dec-23
C-1240	W5-UE048: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes (rejilla continua)	60	08-Jan-23	09-Mar-23
C-2950	W5-UE048: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	90	09-Mar-23	07-Jun-23
C-4010	W5-UE048: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	30	07-Aug-23	06-Sep-23
C-4060	W5-UE048: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	60	02-Sep-23	01-Nov-23
C-4440	W5-UE048: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	30	01-Nov-23	01-Dec-23
PLMB-T1-V04.2.05.05.5	UE198:W5- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K17+940 to K	247	15-Oct-23	17-Jun-24
C-4360	W5-UE198: Construcción de edificios viaductos: demolición de la estación BRT origina	30	15-Oct-23	14-Nov-23
C-4550	W5-UE198: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	50	14-Nov-23	03-Jan-24
C-4750	W5-UE198: Viaducto-Infraestructura-capotaje, columna, viga de cabecera (incluidos los	50	30-Dec-23	18-Feb-24
C-5260	W5-UE198: Infraestructura- Calle 26 (B06) BRT	120	18-Feb-24	17-Jun-24
PLMB-T1-V04.2.05.05.6	UE047:W5- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K18+190 to K	256	14-Nov-23	27-Jul-24
C-4560	W5-UE047: Viaducto-Infraestructura: quitar la estación CALLE 34 BRT existente	30	14-Nov-23	14-Dec-23
C-4770	W5-UE047: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	140	03-Jan-24	22-May-24
C-5040	W5-UE047: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	150	29-Jan-24	27-Jun-24
C-5460	W5-UE047: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	130	19-Mar-24	27-Jul-24
PLMB-T1-V04.2.05.05.7	UE199:W5 Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K18+820 to K	340	08-Jan-23	14-Dec-23
C-1060	W5-UE199: Construcción de edificios de viaductos: demolición de la estación BRT orig	30	08-Jan-23	07-Feb-23
C-2610	W5-UE199: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	50	07-Feb-23	29-Mar-23
C-3060	W5-UE199: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	70	29-Mar-23	07-Jun-23
C-3660	W5-UE199: Infraestructura-V (B07) BRT	130	07-Jun-23	15-Oct-23
C-4370	W5-UE199: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	15-Oct-23	14-Dec-23
PLMB-T1-V04.2.05.05.8	UE046:W5- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K19+110 to K	146	22-May-24	15-Oct-24
C-6070	W5-UE046: Fundación viaducto-infraestructura-pilote	70	22-May-24	31-Jul-24
C-6550	W5-UE046: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	90	17-Jun-24	15-Sep-24
C-6980	W5-UE046: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	70	06-Aug-24	15-Oct-24
PLMB-T1-V04.2.05.05.9	UE045:W5- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K19+410 to K	131	31-Jul-24	09-Dec-24
C-6910	W5-UE045: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	50	31-Jul-24	19-Sep-24
C-7130	W5-UE045: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	75	26-Aug-24	09-Nov-24
C-7620	W5-UE045: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	10-Oct-24	09-Dec-24
PLMB-T1-V04.2.05.05.10	UE200:W5- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K19+630 to	330	14-Dec-23	08-Nov-24

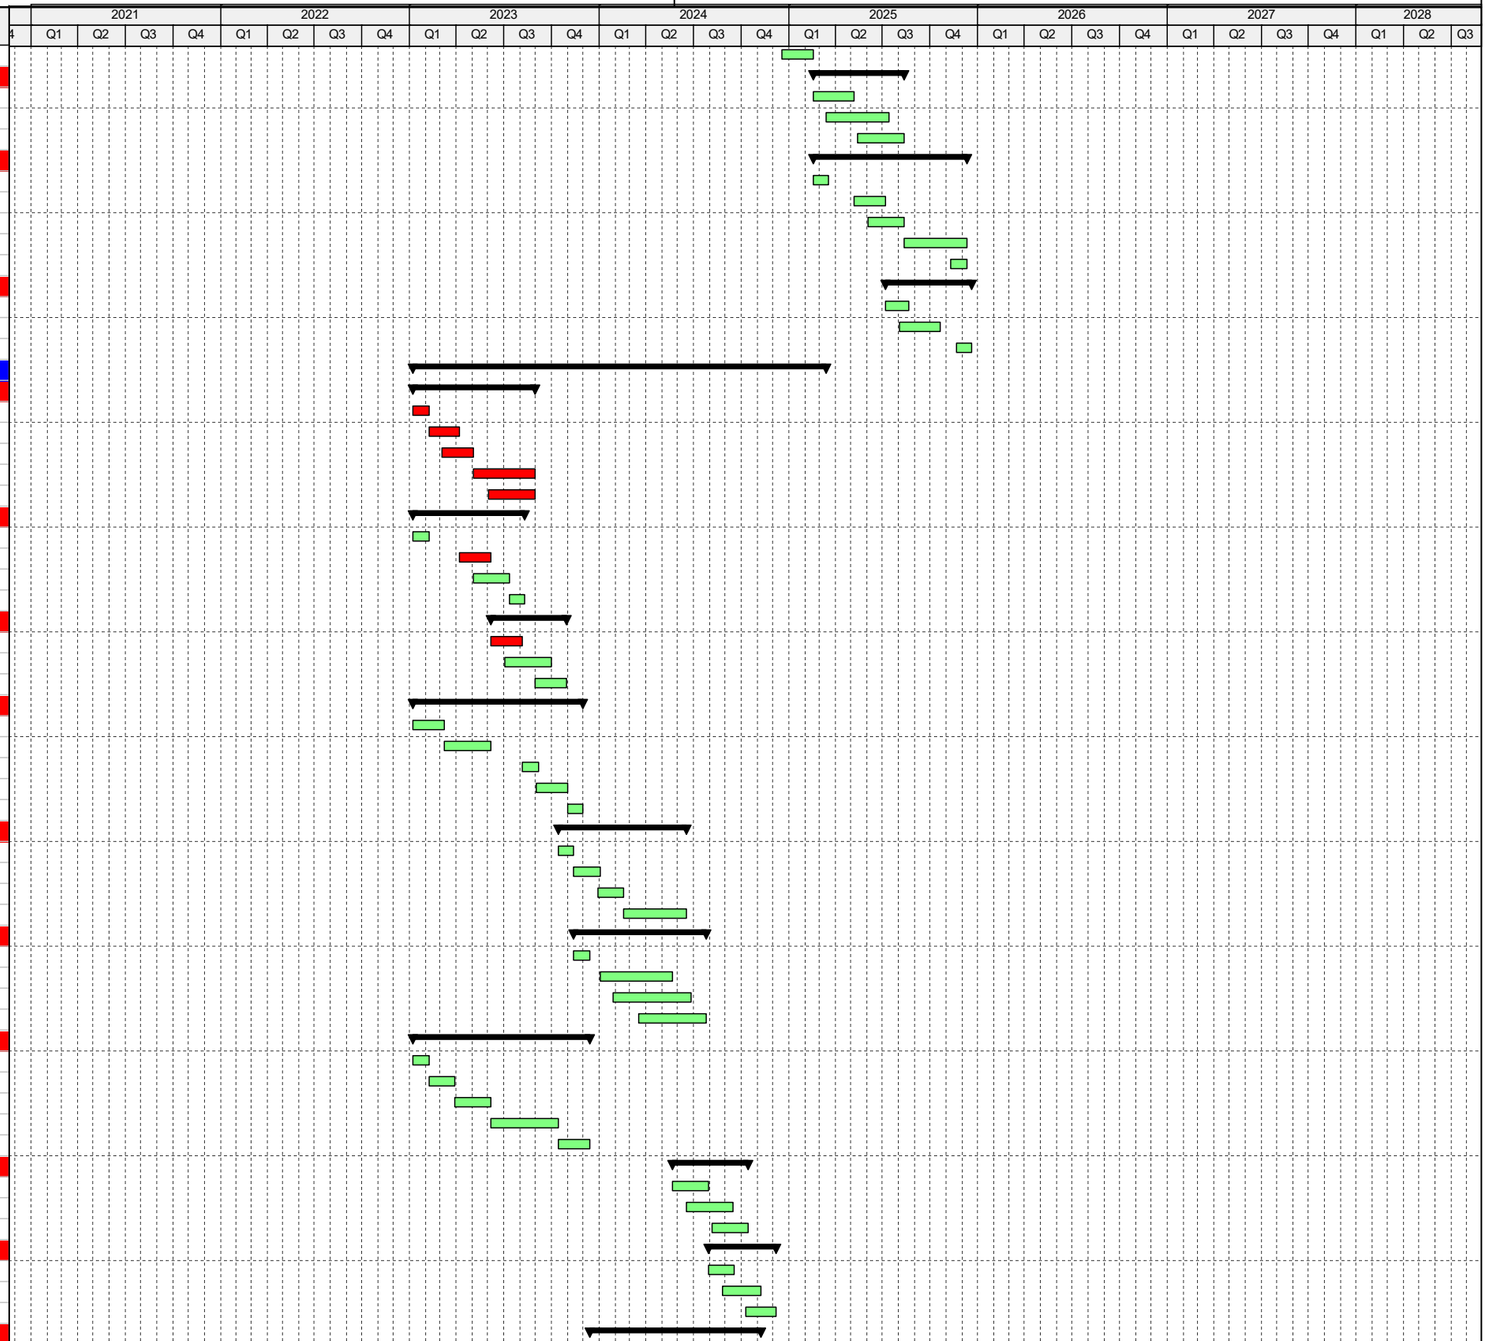


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-4680	W5-UE200: Construcción de edificios viaductos: demolición de la estación BRT origina	30	14-Dec-23	13-Jan-24
C-4930	W5-UE200: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	60	13-Jan-24	13-Mar-24
C-5380	W5-UE200: Viaducto-Infraestructura-capotaje, columna, viga de cabecera (incluidos los	60	13-Mar-24	12-May-24
C-6000	W5-UE200: Infraestructura- Calle 45 (B08T) BRT	120	12-May-24	09-Sep-24
C-7330	W5-UE200: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carril mixto dentro del ár	60	09-Sep-24	08-Nov-24
PLMB-T1-V04.2.05.05.11	UE044:W5- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K19+920 to	176	19-Sep-24	14-Mar-25
C-7380	W5-UE044: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	90	19-Sep-24	18-Dec-24
C-7630	W5-UE044: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	120	15-Oct-24	12-Feb-25
C-7960	W5-UE044: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	90	14-Dec-24	14-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.05.06	W6 - Viaducto - Cimentaciones, pilas y capiteles: K20 + 340 a K23 + 864	980	08-Jan-23	14-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.05.06.1	UE201:W6- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K20+340 to K	450	08-Jan-23	02-Apr-24
C-1070	W6-UE201: Construcción de edificios viaductos: demolición de la estación BRT origina	30	08-Jan-23	07-Feb-23
C-2620	W6-UE201: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	60	07-Feb-23	08-Apr-23
C-3090	W6-UE201: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	90	08-Apr-23	07-Jul-23
C-3760	W6-UE201: Infraestructura: Marly (B09) BRT	150	07-Jul-23	04-Dec-23
C-4630	W6-UE201: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carril mixto dentro de ur	120	04-Dec-23	02-Apr-24
PLMB-T1-V04.2.05.06.2	UE043:W6- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K20+800 to K	300	08-Apr-23	02-Feb-24
C-3100	W6-UE043: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	90	08-Apr-23	07-Jul-23
C-3770	W6-UE043: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	120	07-Jul-23	04-Nov-23
C-4460	W6-UE043: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	90	04-Nov-23	02-Feb-24
PLMB-T1-V04.2.05.06.3	UE042:W6- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles:K21+215 to K	260	07-Jul-23	23-Mar-24
C-3780	W6-UE042: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	70	07-Jul-23	15-Sep-23
C-4200	W6-UE042: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	100	15-Sep-23	24-Dec-23
C-4710	W6-UE042: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carril mixto dentro de ur	90	24-Dec-23	23-Mar-24
PLMB-T1-V04.2.05.06.4	UE202:W6- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K21+555 to K	370	04-Dec-23	08-Dec-24
C-4640	W6-UE202: Construcción de edificios viaductos: demolición de la estación BRT origina	30	04-Dec-23	03-Jan-24
C-4780	W6-UE202: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	70	03-Jan-24	13-Mar-24
C-5390	W6-UE202: Viaducto-Infraestructura-capotaje, columna, viga de cabecera (incluidos los	60	13-Mar-24	12-May-24
C-6010	W6-UE202: Infraestructura- Calle 63 (B10T) BRT	120	12-May-24	09-Sep-24
C-7340	W6-UE202: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	90	09-Sep-24	08-Dec-24
PLMB-T1-V04.2.05.06.5	UE041:W6- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles:K21+840 to K	176	13-Mar-24	05-Sep-24
C-5400	W6-UE041: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	45	13-Mar-24	27-Apr-24
C-5660	W6-UE041: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	60	08-Apr-24	07-Jun-24
C-6520	W6-UE041: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carril mixto dentro del ár	90	07-Jun-24	05-Sep-24
PLMB-T1-V04.2.05.06.6	UE203:W6- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K22+040 to K	390	08-Jan-23	02-Feb-24
C-1080	W6-UE203: Construcción de edificios de viaductos: demolición de la estación BRT orig	30	08-Jan-23	07-Feb-23
C-2630	W6-UE203: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	60	07-Feb-23	08-Apr-23
C-3110	W6-UE203: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabec	60	08-Apr-23	07-Jun-23
C-3670	W6-UE203: Infraestructura- Flores (B11) BRT	150	07-Jun-23	04-Nov-23
C-4470	W6-UE203: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carril mixto dentro de ur	90	04-Nov-23	02-Feb-24
PLMB-T1-V04.2.05.06.7	UE040:W6- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K22+350 to K	291	02-Feb-24	19-Nov-24
C-5070	W6-UE040: Viaducto-Infraestructura: quitar la estación BRT existente	30	02-Feb-24	03-Mar-24
C-5850	W6-UE040: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	50	27-Apr-24	16-Jun-24
C-6410	W6-UE040: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	90	23-May-24	21-Aug-24
C-7090	W6-UE040: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carril mixto dentro de ur	90	21-Aug-24	19-Nov-24
PLMB-T1-V04.2.05.06.8	UE204:W6- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K22+560 to K	370	09-Sep-24	14-Sep-25
C-7350	W6-UE204: Construcción de edificios viaductos: demolición de la estación BRT origina	30	09-Sep-24	09-Oct-24
C-7590	W6-UE204: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	70	09-Oct-24	18-Dec-24
C-8010	W6-UE204: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	90	18-Dec-24	18-Mar-25
C-9150	W6-UE204: Infraestructura- Calle 72 (B12) BRT	120	18-Mar-25	16-Jul-25
C-10750	W6-UE204: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carriles mixtos dentro de	60	16-Jul-25	14-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.05.06.9	UE205:W6- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K22+980 to K	490	08-Jan-23	12-May-24
C-1090	W6-UE205: Construcción de edificios viaductos: demolición de la estación BRT origina	30	08-Jan-23	07-Feb-23
C-2640	W6-UE205: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	70	07-Feb-23	18-Apr-23
C-3500	W6-UE205: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	60	18-Apr-23	17-Jun-23
C-3720	W6-UE205: Sección 65S- Calle 76 sur (B13ST) BRT	120	17-Jun-23	15-Oct-23
C-4380	W6-UE205: Construcción de edificios viaductos: demolición de la estación BRT origina	30	15-Oct-23	14-Nov-23
C-4570	W6-UE205: Sección 65N- Calle 76 norte (B13NT) BRT	120	14-Nov-23	13-Mar-24
C-5410	W6-UE205: Viaducto-Infraestructura-primera renovación de carril mixto dentro de un ár	60	13-Mar-24	12-May-24
PLMB-T1-V04.2.05.06.10	UE039:W6- Viaducto-Infraestructura-Cimentac.Pilas.Capiteles: K23+380 to	266	18-Dec-24	10-Sep-25
C-8020	W6-UE039: Viaducto-Infraestructura-Cimentación de pilotes	150	18-Dec-24	17-May-25
C-8510	W6-UE039: Casquete de pilote de infraestructura de viaducto, columna, viga de cabez	180	13-Jan-25	12-Jul-25

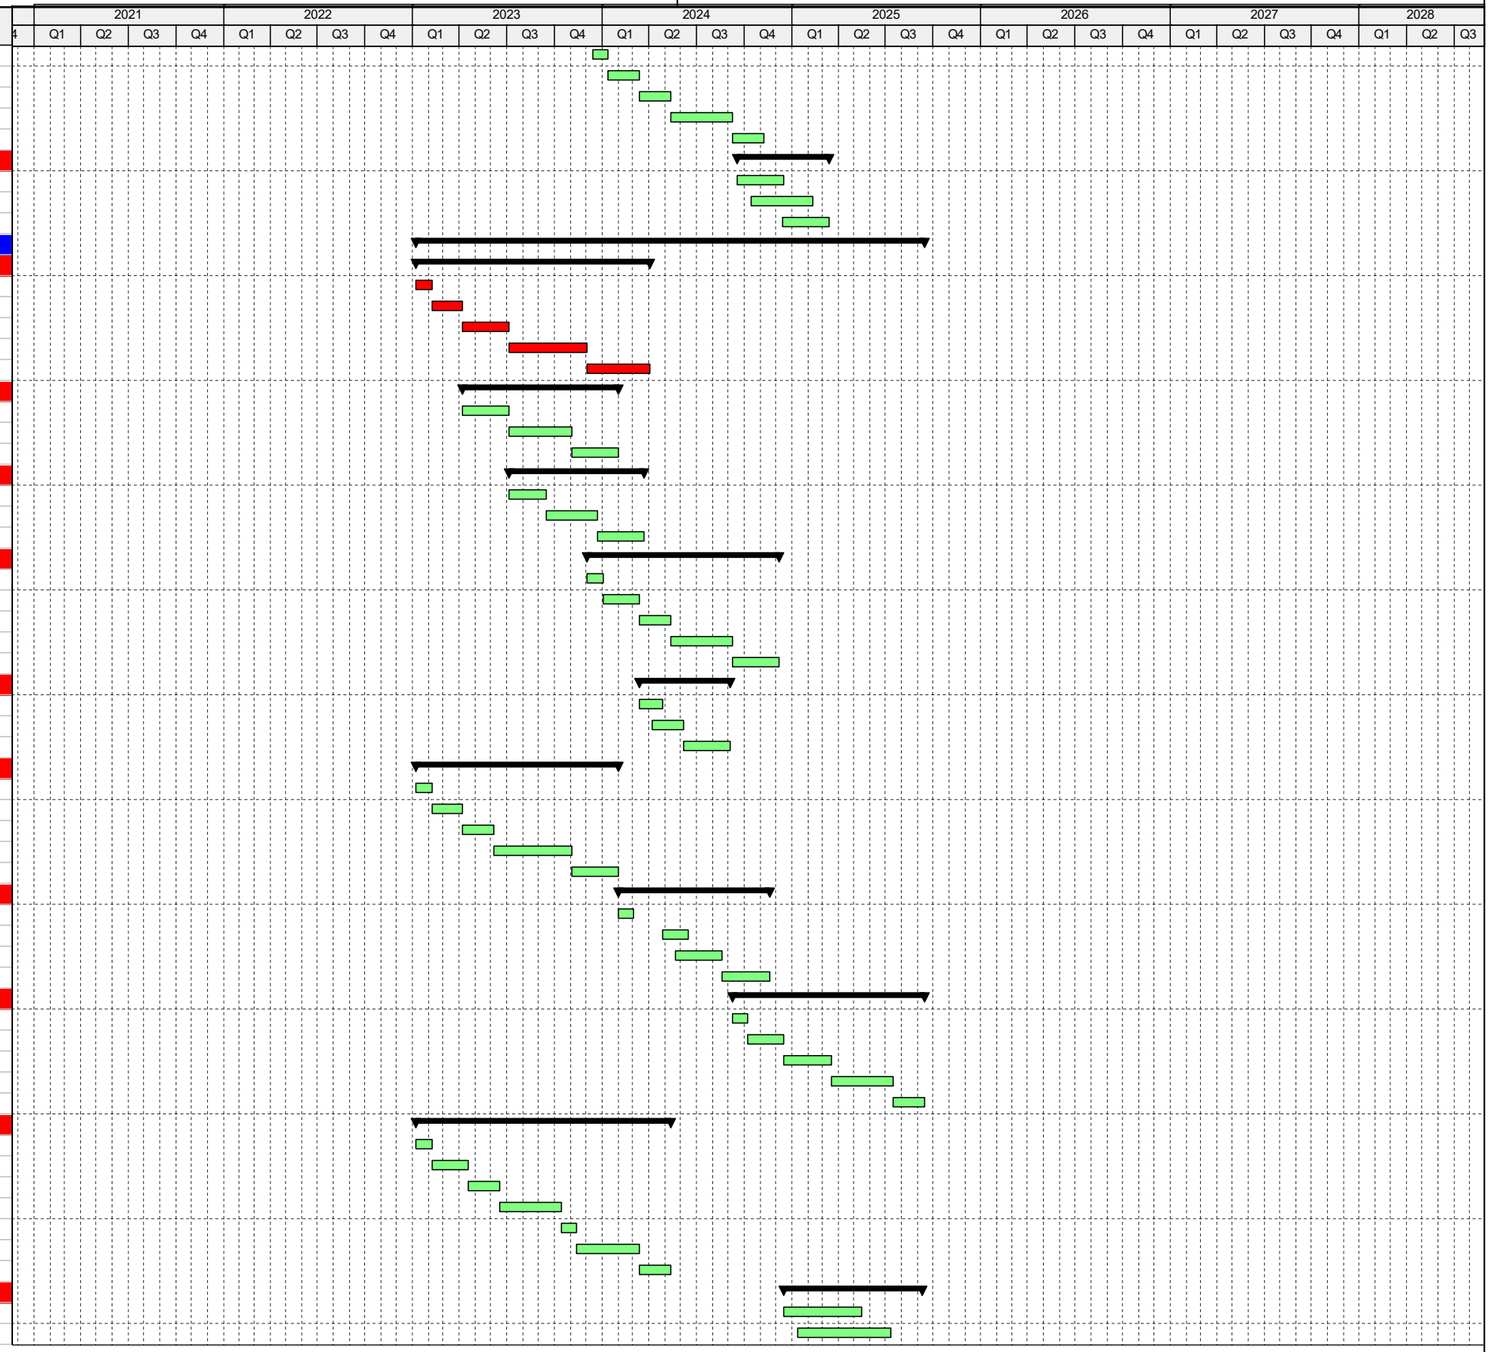

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-10690	W6-UE039: Viaducto-Infraestructura-La primera renovación de carril mixto dentro del ái	60	12-Jul-25	10-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.05.07	Monitoreo	1450	08-Jan-23	28-Dec-26
C-1320	Instrumentacion y Monitoreo	1450	08-Jan-23	28-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.06	Estructura de la superficie del haz del viaducto	1350	12-May-23	21-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.06.01	Fabricacion de viga U	840	26-Aug-23	13-Dec-25
C-4030	Prefabricado de vigas en U	840	26-Aug-23	13-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.06.02	W1-Construcción Tablero de viga U Viaducto/dispositivos de drenaje Sec. K0+00	884	21-Sep-23	21-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.06.02.1	UE157: Construcc.Tablero de viga U Viaductos /Sistemas drenaje cubierta S	884	21-Sep-23	21-Feb-26
C-4220	W1-UE157-Viaducto- (36 + 53 + 36) m haz continuo	220	21-Sep-23	28-Apr-24
C-5860	W1-UE157-Sistema viaducto-tablero (persianas, barandillas de protección, etc.) y Dispo	30	28-Apr-24	28-May-24
C-12730	W1-UE157-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	23	24-Dec-25	16-Jan-26
C-13080	W1-UE157-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	29	23-Jan-26	21-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.06.02.2	UE156: Construcc.Tablero de viga U Viaductos /Sistemas drenaje cubierta S	90	25-Oct-25	23-Jan-26
C-11900	W1-UE156-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	60	25-Oct-25	24-Dec-25
C-12740	W1-UE156-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	24-Dec-25	23-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.06.02.3	UE155: Construcc.Tablero de viga U Viaductos /Sistemas drenaje cubierta S	120	06-Aug-25	04-Dec-25
C-11200	W1-UE155-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	80	06-Aug-25	25-Oct-25
C-11910	W1-UE155-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	40	25-Oct-25	04-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.06.02.4	UE154: Construcc.Tablero de viga U Viaductos, /Sistemas drenaje cubierta S	102	26-May-25	05-Sep-25
C-10290	W1-UE154-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	72	26-May-25	06-Aug-25
C-11210	W1-UE154-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	06-Aug-25	05-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.06.02.5	UE153: Construcc.Tablero de viga U Viaductos, /Sistemas drenaje cubierta S	84	02-Apr-25	25-Jun-25
C-9630	W1-UE153-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	54	02-Apr-25	26-May-25
C-10300	W1-UE153-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	26-May-25	25-Jun-25
PLMB-T1-V04.2.06.02.6	UE152: Construcc.Tablero de viga U Viaductos, /Sistemas drenaje cubierta S	135	02-Jan-25	17-May-25
C-8420	W1-UE152-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	90	02-Jan-25	02-Apr-25
C-9640	W1-UE152-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	45	02-Apr-25	17-May-25
PLMB-T1-V04.2.06.02.7	UE151: Construcc.Tablero de viga U Viaductos /Sistemas drenaje cubierta S	115	27-Sep-24	20-Jan-25
C-7480	W1-UE151- Montaje de vigas en forma de U de viaducto	97	27-Sep-24	02-Jan-25
C-8430	W1-UE151-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	18	02-Jan-25	20-Jan-25
PLMB-T1-V04.2.06.02.8	UE150: Construcc.Tablero de viga U Viaductos, /Sistemas drenaje cubierta S	84	04-Aug-24	27-Oct-24
C-6950	W1-UE150-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	54	04-Aug-24	27-Sep-24
C-7490	W1-UE150-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	27-Sep-24	27-Oct-24
PLMB-T1-V04.2.06.02.9	UE149: Construcc.Tablero de viga U Viaductos, /Sistemas drenaje cubierta S	64	21-Jun-24	24-Aug-24
C-6570	W1-UE149-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	44	21-Jun-24	04-Aug-24
C-6960	W1-UE149-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	20	04-Aug-24	24-Aug-24
PLMB-T1-V04.2.06.02.10	UE148: Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta S	102	10-Apr-24	21-Jul-24
C-5690	W1-UE148-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	72	10-Apr-24	21-Jun-24
C-6580	W1-UE148-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	21-Jun-24	21-Jul-24
PLMB-T1-V04.2.06.02.11	UE147: Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta S	106	25-Jan-24	10-May-24
C-5020	W1-UE147-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	76	25-Jan-24	10-Apr-24
C-5700	W1-UE147-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	10-Apr-24	10-May-24
PLMB-T1-V04.2.06.02.12	UE146: Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta S	150	27-Sep-23	24-Feb-24
C-4280	W1-UE146-Viaduct-Girer-erecting Machine instalación y aceptación	30	27-Sep-23	27-Oct-23
C-4420	W1-UE146-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	90	27-Oct-23	25-Jan-24
C-5030	W1-UE146-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	25-Jan-24	24-Feb-24
PLMB-T1-V04.2.06.03	W2-Construcción Tablero de viga U Viaducto/dispositivos de drenaje Sec. K4+05	1135	12-May-23	21-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.06.03.1	UE145: Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta S	275	12-May-23	12-Feb-24
C-3560	W2-UE145- Licencia de viaducto (permiso de transporte de vigas en U, permiso de ma	90	12-May-23	10-Aug-23
C-4290	W2-UE145-Viaduct-Girer-erecting Machine instalación y aceptación	30	27-Sep-23	27-Oct-23
C-4430	W2-UE145-Viaduct-U Montaje de vigas en forma de U	78	27-Oct-23	13-Jan-24
C-4940	W2-UE145-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	13-Jan-24	12-Feb-24
PLMB-T1-V04.2.06.03.2	UE144:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	90	13-Jan-24	12-Apr-24
C-4950	W2-UE144-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	60	13-Jan-24	13-Mar-24
C-5420	W2-UE144-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	13-Mar-24	12-Apr-24
PLMB-T1-V04.2.06.03.3	UE143: Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta S	102	13-Mar-24	23-Jun-24
C-5430	W2-UE143-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	72	13-Mar-24	24-May-24
C-6430	W2-UE143-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	24-May-24	23-Jun-24
PLMB-T1-V04.2.06.03.4	UE142:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	85	24-May-24	17-Aug-24
C-6440	W2-UE142-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	60	24-May-24	23-Jul-24
C-6830	W2-UE142-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	25	23-Jul-24	17-Aug-24
PLMB-T1-V04.2.06.03.5	UE141: Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta :1	105	23-Jul-24	05-Nov-24

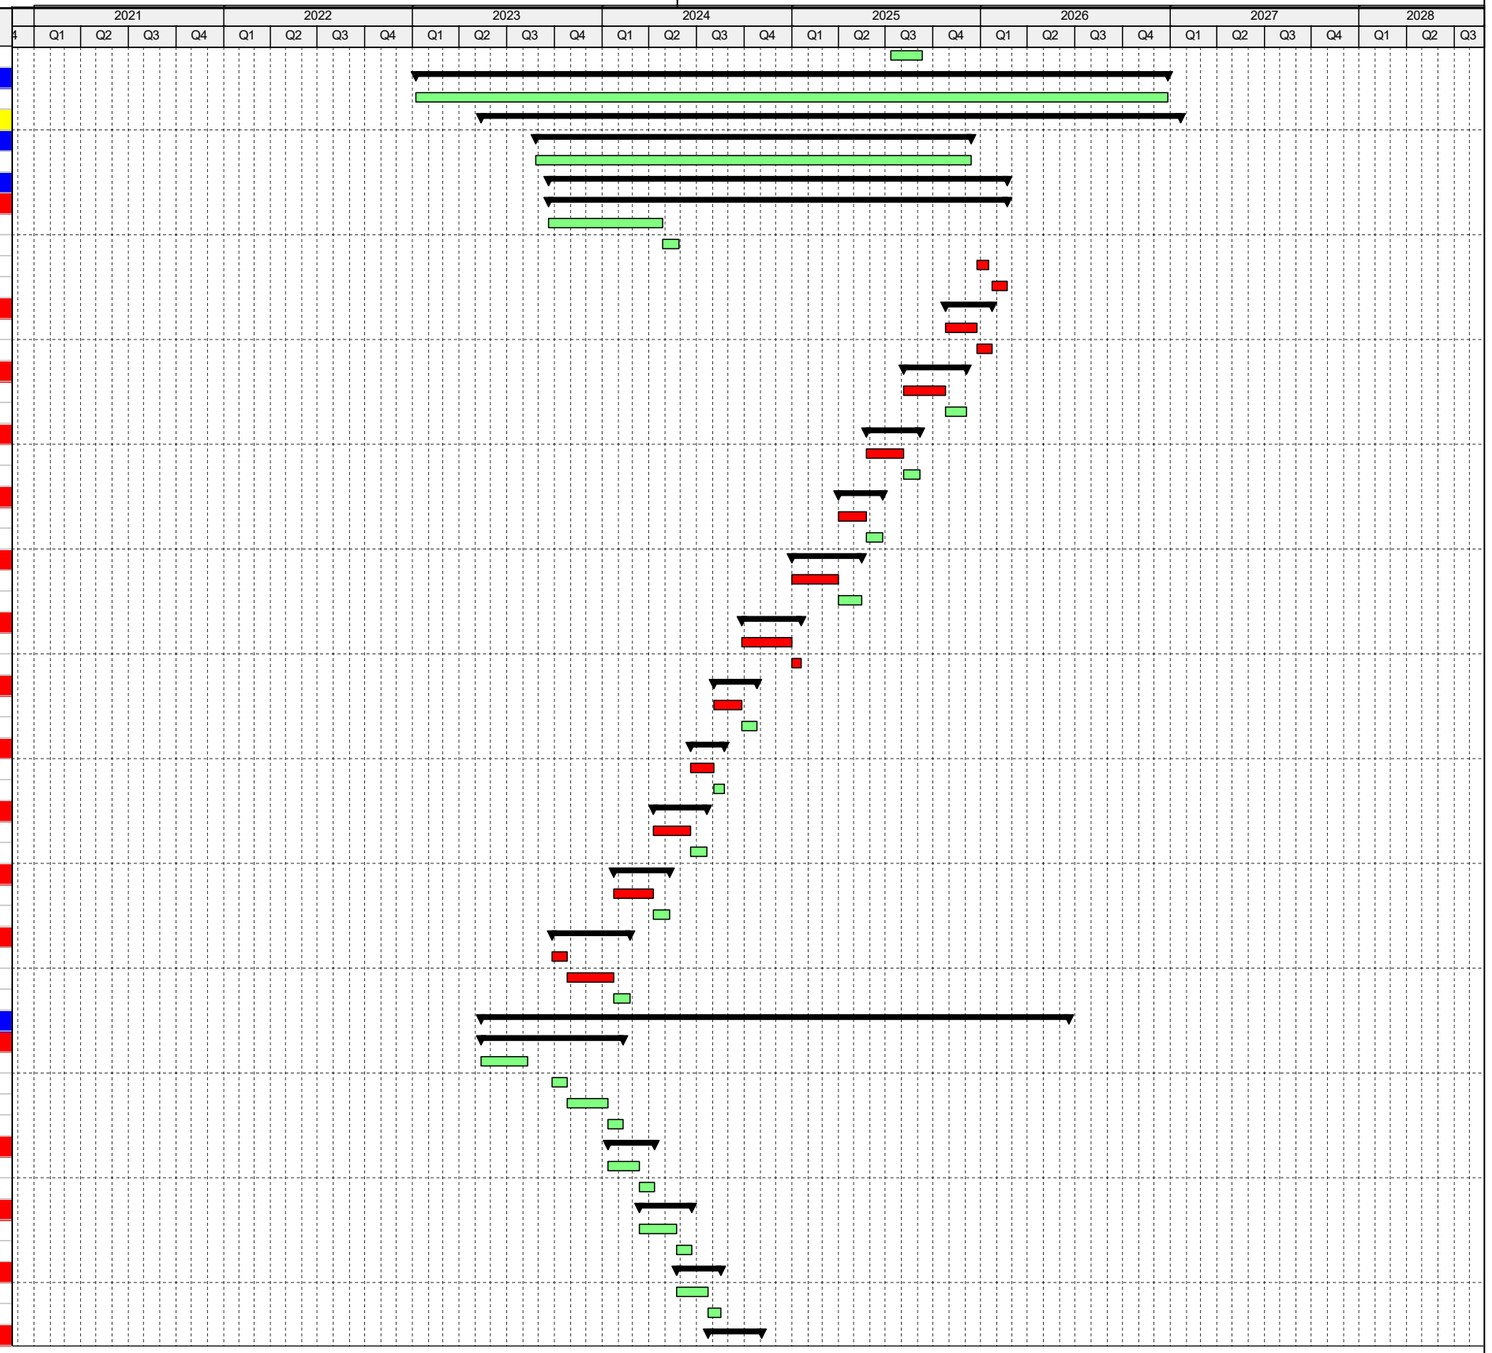

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-6840	W2-UE141-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	85	23-Jul-24	16-Oct-24
C-7650	W2-UE141-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	20	16-Oct-24	05-Nov-24
PLMB-T1-V04.2.06.03.6	UE140:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	102	16-Oct-24	26-Jan-25
C-7660	W2-UE140-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	72	16-Oct-24	27-Dec-24
C-8100	W2-UE140-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	27-Dec-24	26-Jan-25
PLMB-T1-V04.2.06.03.7	UE139: Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta S	96	27-Dec-24	02-Apr-25
C-8110	W2-UE139-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	66	27-Dec-24	03-Mar-25
C-8970	W2-UE139-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	03-Mar-25	02-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.06.03.8	UE138:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta :2(	90	03-Mar-25	01-Jun-25
C-8980	W2-UE138-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	60	03-Mar-25	02-May-25
C-10020	W2-UE138-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	02-May-25	01-Jun-25
PLMB-T1-V04.2.06.03.9	UE137:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	108	05-May-25	21-Aug-25
C-10040	W2-UE137-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	78	05-May-25	22-Jul-25
C-11000	W2-UE137-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	22-Jul-25	21-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.06.03.10	UE136:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta S	158	13-Aug-25	18-Jan-26
C-11250	W2-UE136-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	108	13-Aug-25	29-Nov-25
C-12190	W2-UE136-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	50	29-Nov-25	18-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.06.03.11	UE135:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta :(	110	29-Nov-25	19-Mar-26
C-12200	W2-UE135-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	80	29-Nov-25	17-Feb-26
C-13210	W2-UE135-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	17-Feb-26	19-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.06.03.12	UE134:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta S	124	17-Feb-26	21-Jun-26
C-13220	W2-UE134-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	84	17-Feb-26	12-May-26
C-14540	W2-UE134-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	40	12-May-26	21-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.06.04	W3-Construccion Tablero de viga U Viaducto/dispositivos de drenaje Sec. K8+47	1075	17-Jun-23	27-May-26
PLMB-T1-V04.2.06.04.1	UE133:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	95	11-Jul-25	14-Oct-25
C-10670	W3-UE133-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	65	11-Jul-25	14-Sep-25
C-11500	W2-UE133-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	14-Sep-25	14-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.06.04.2	UE132:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	158	25-Mar-25	30-Aug-25
C-9460	W3-UE132-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	108	25-Mar-25	11-Jul-25
C-10680	W2-UE132-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	50	11-Jul-25	30-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.06.04.3	UE131:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	115	01-Feb-26	27-May-26
C-13120	W3-UE131-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	85	01-Feb-26	27-Apr-26
C-14340	W2-UE131-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	27-Apr-26	27-May-26
PLMB-T1-V04.2.06.04.4	UE130:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	90	14-Jan-25	14-Apr-25
C-8520	W3-UE130-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	70	14-Jan-25	25-Mar-25
C-9470	W2-UE130-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	20	25-Mar-25	14-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.06.04.5	UE129:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	135	16-Oct-24	28-Feb-25
C-7670	W3-UE129-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	90	16-Oct-24	14-Jan-25
C-8530	W3-UE129-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	45	14-Jan-25	28-Feb-25
PLMB-T1-V04.2.06.04.6	UE128:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	79	08-Aug-24	26-Oct-24
C-7020	W3-UE128-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	69	08-Aug-24	16-Oct-24
C-7680	W3-UE128-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	10	16-Oct-24	26-Oct-24
PLMB-T1-V04.2.06.04.7	UE127:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	158	22-Apr-24	27-Sep-24
C-5820	W3-UE127-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	108	22-Apr-24	08-Aug-24
C-7030	W3-UE127-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	50	08-Aug-24	27-Sep-24
PLMB-T1-V04.2.06.04.8	UE126:Construcc.Tablero viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sect	250	05-Oct-23	11-Jun-24
C-4320	W3-UE126-Viaduct-Licensing (permiso de transporte de vigas en U, permiso de máqui	30	05-Oct-23	04-Nov-23
C-4690	W3-UE126-Instalación y aceptación del puente viaducto	30	14-Dec-23	13-Jan-24
C-4960	W3-UE126-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	100	13-Jan-24	22-Apr-24
C-5830	W3-UE126-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	50	22-Apr-24	11-Jun-24
PLMB-T1-V04.2.06.04.9	UE125:Construc.Tablero viga U Viaducto/Sistema Drenaje .33:K11+880 to K	100	11-Oct-25	19-Jan-26
C-11510	W3-UE125-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	80	11-Oct-25	30-Dec-25
C-12250	W3-UE125-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	20	30-Dec-25	19-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.06.04.10	UE124:Construc.Tablero viga U Viaducto/Sistema Drenaje Sect.34: K12+2	1037	17-Jun-23	19-Apr-26
C-3730	W3-UE124-Viaducto (44 + 55+44) m haz continuo	251	17-Jun-23	23-Feb-24
C-12240	W3-UE124-Instalación y aceptación del puente viaducto	30	30-Dec-25	29-Jan-26
C-12800	W3-UE124-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	60	29-Jan-26	30-Mar-26
C-12810	W3-UE124-Viaducto (70 + 70) m puente de estructura de acero	60	29-Jan-26	30-Mar-26
C-13440	W3-UE124-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	20	30-Mar-26	19-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.06.05	W4-Construccion Tablero de viga U Viaducto/dispositivos de drenaje Sec. K12+4	1081	23-Jun-23	08-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.06.05.1	UE123:Construc.Tablero viga U Viaducto/Sistema Drenaje Sect.35: K12+74	285	23-Jun-23	03-Apr-24
C-3740	W4-UE123-Licencia de viaducto (permiso de transporte de vigas en U, permiso de má	60	23-Jun-23	22-Aug-23



Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-4020	W4-UE123-Instalación y aceptación del puente viaducto	60	22-Aug-23	21-Oct-23
C-4410	W4-UE123-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	120	21-Oct-23	18-Feb-24
C-5230	W4-UE123-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	45	18-Feb-24	03-Apr-24
PLMB-T1-V04.2.06.05.2	UE122:Construc.Tablero viga U Viaducto/Sistema Drenaje Sect.36: K13+25	120	18-Feb-24	17-Jun-24
C-5240	W4-UE122-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	90	18-Feb-24	18-May-24
C-6030	W4-UE122-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	18-May-24	17-Jun-24
PLMB-T1-V04.2.06.05.3	UE121:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	120	18-May-24	15-Sep-24
C-6040	W4-UE121-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	90	18-May-24	16-Aug-24
C-7040	W4-UE121-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	16-Aug-24	15-Sep-24
PLMB-T1-V04.2.06.05.4	UE120:Construc.Tablero viga U Viaducto/Sistema Drenaje Sect. 38:K13+99	180	16-Aug-24	12-Feb-25
C-7050	Montaje de vigas en forma de U W4-UE120-Viaduct-U	120	16-Aug-24	14-Dec-24
C-7970	W4-UE120-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	60	14-Dec-24	12-Feb-25
PLMB-T1-V04.2.06.05.5	UE119:Construc.Tablero viga U Viaducto/Sistema Drenaje Sect.39:K14+620	130	14-Dec-24	23-Apr-25
C-7980	W4-UE119-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	90	14-Dec-24	14-Mar-25
C-9120	W4-UE119-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.)	40	14-Mar-25	23-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.06.05.6	UE118:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	90	14-Mar-25	12-Jun-25
C-9130	W4-UE118- Montaje de vigas en forma de U de viaducto	60	14-Mar-25	13-May-25
C-10110	W4-UE118-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.)	30	13-May-25	12-Jun-25
PLMB-T1-V04.2.06.05.7	UE117:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	90	13-May-25	11-Aug-25
C-10120	W4-UE117-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	60	13-May-25	12-Jul-25
C-10700	W4-UE117-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.)	30	12-Jul-25	11-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.06.05.8	UE116:Construc.Tablero viga U Viaducto/Sistema Drenaje Sect.42: K15+50	90	12-Jul-25	10-Oct-25
C-10710	W4-UE116-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	60	12-Jul-25	10-Sep-25
C-11460	W4-UE116-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.)	30	10-Sep-25	10-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.06.05.9	UE115:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	120	10-Sep-25	08-Jan-26
C-11470	W4-UE115-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	90	10-Sep-25	09-Dec-25
C-12320	W4-UE115-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.)	30	09-Dec-25	08-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.06.05.10	UE114:Construc.Tablero viga U Viaducto/Sistema Drenaje Sect. 44: K16+0	120	10-Dec-25	09-Apr-26
C-12330	W4-UE114-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	90	10-Dec-25	10-Mar-26
C-13460	W4-UE114-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.)	30	10-Mar-26	09-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.06.05.11	UE113:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta S	90	10-Mar-26	08-Jun-26
C-13470	W4-UE113-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	60	10-Mar-26	09-May-26
C-14460	W4-UE113-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.)	30	09-May-26	08-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.06.06	W5-Construccion Tablero de viga U Viaducto/dispositivos de drenaje Sec. K16+6	976	12-May-23	13-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.06.06.1	UE112:Construc.Tablero viga U Viaducto/Sistema Drenaje Sect.46:K16+610	276	12-May-23	13-Feb-24
C-3570	W5-UE112-Viaduct-Licensing (permiso de transporte de vigas en U, permiso de máqui	90	12-May-23	10-Aug-23
C-4050	W5-UE112-Instalación y aceptación del puente viaducto	30	01-Sep-23	01-Oct-23
C-4300	W5-UE112-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	90	01-Oct-23	30-Dec-23
C-4720	W5-UE112-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.)	45	30-Dec-23	13-Feb-24
PLMB-T1-V04.2.06.06.2	UE111:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	120	30-Dec-23	28-Apr-24
C-4730	W5-UE111-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	90	30-Dec-23	29-Mar-24
C-5470	W5-UE111-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.)	30	29-Mar-24	28-Apr-24
PLMB-T1-V04.2.06.06.3	UE110:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	120	29-Mar-24	27-Jul-24
C-5480	W5-UE110-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	90	29-Mar-24	27-Jun-24
C-6620	W5-UE110-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.)	30	27-Jun-24	27-Jul-24
PLMB-T1-V04.2.06.06.4	UE109:Construc.Tablero viga U Viaducto/Sistema Drenaje cubierta Sect.49:	446	07-Jun-23	26-Aug-24
C-3700	W5-UE109-Viaduct- (58+100+60) m haz continuo	300	07-Jun-23	02-Apr-24
C-6630	W5-UE109-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	30	27-Jun-24	27-Jul-24
C-6860	W5-UE109-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	27-Jul-24	26-Aug-24
PLMB-T1-V04.2.06.06.5	UE108:Construc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sec	90	27-Jul-24	25-Oct-24
C-6870	W5-UE108-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	60	27-Jul-24	25-Sep-24
C-7430	W5-UE108-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	25-Sep-24	25-Oct-24
PLMB-T1-V04.2.06.06.6	UE107:Construc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sec	180	25-Sep-24	24-Mar-25
C-7440	W5-UE107-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	120	25-Sep-24	23-Jan-25
C-8570	W5-UE107-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	60	23-Jan-25	24-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.06.06.7	UE106:Construc.Tablero viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sect.5	90	23-Jan-25	23-Apr-25
C-8580	W5-UE106-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	60	23-Jan-25	24-Mar-25
C-9410	W5-UE106-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	24-Mar-25	23-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.06.06.8	UE105:Construc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sec	90	24-Mar-25	22-Jun-25
C-9420	W5-UE105-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	60	24-Mar-25	23-May-25
C-10240	W5-UE105-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	23-May-25	22-Jun-25
PLMB-T1-V04.2.06.06.9	UE104:Construc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sec	90	23-May-25	21-Aug-25




© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-10250	W5-UE104-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	60	23-May-25	22-Jul-25
C-11010	W5-UE104-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	22-Jul-25	21-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.06.06.10	UE103:Construc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cub.Sect.5	90	22-Jul-25	20-Oct-25
C-11020	W5-UE103-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	60	22-Jul-25	20-Sep-25
C-11530	W5-UE103-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	20-Sep-25	20-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.06.06.11	UE102: Construc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Se	115	20-Sep-25	13-Jan-26
C-11540	W5-UE102-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	80	20-Sep-25	09-Dec-25
C-12340	W5-UE102-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	35	09-Dec-25	13-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.06.07	W6-Construccion Tablero de viga U Viaducto/dispositivos de drenaje Sec. K20+3	1055	07-Jul-23	27-May-26
PLMB-T1-V04.2.06.07.1	UE101:Construc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sec	454	07-Jul-23	03-Oct-24
C-3790	W6-UE101-Licencia de viaducto (permiso de transporte de vigas en U, permiso de má	90	07-Jul-23	05-Oct-23
C-5510	W6-UE101-Instalación y aceptación del puente viaducto	60	02-Apr-24	01-Jun-24
C-6460	W6-UE101-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	84	01-Jun-24	24-Aug-24
C-7100	W6-UE101-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	40	24-Aug-24	03-Oct-24
PLMB-T1-V04.2.06.07.2	UE100:Construc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sec	107	24-Aug-24	09-Dec-24
C-7110	Montaje de vigas en forma de U W6-UE100-Viaducto	72	24-Aug-24	04-Nov-24
C-7820	W6-UE100-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	35	04-Nov-24	09-Dec-24
PLMB-T1-V04.2.06.07.3	UE099:Construc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sec	96	04-Nov-24	08-Feb-25
C-7830	W6-UE099- Montaje de vigas en forma de U de viaducto	66	04-Nov-24	09-Jan-25
C-8480	W6-UE099-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	09-Jan-25	08-Feb-25
PLMB-T1-V04.2.06.07.4	UE098:Construc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sec	93	09-Jan-25	12-Apr-25
C-8490	W6-UE098-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	63	09-Jan-25	13-Mar-25
C-9090	W6-UE098-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	13-Mar-25	12-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.06.07.5	UE097:Construc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sec	66	13-Mar-25	18-May-25
C-9100	W6-UE097-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	36	13-Mar-25	18-Apr-25
C-9740	W6-UE097-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	18-Apr-25	18-May-25
PLMB-T1-V04.2.06.07.6	UE096:Construc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sec	90	18-Apr-25	17-Jul-25
C-9750	W6-UE096-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	60	18-Apr-25	17-Jun-25
C-10490	W6-UE096-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	17-Jun-25	17-Jul-25
PLMB-T1-V04.2.06.07.7	UE095:Construc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sec	72	17-Jun-25	28-Aug-25
C-10500	W6-UE095- Montaje de vigas en forma de U de viaducto	42	17-Jun-25	29-Jul-25
C-11130	W6-UE095-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	29-Jul-25	28-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.06.07.8	UE094:Construc.Tablero viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sect.6	102	29-Jul-25	08-Nov-25
C-11140	W6-UE094-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	72	29-Jul-25	09-Oct-25
C-11730	W6-UE094-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	30	09-Oct-25	08-Nov-25
PLMB-T1-V04.2.06.07.9	UE093:Construc.Tablero viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta Sect.6	104	09-Oct-25	21-Jan-26
C-11740	W6-UE093-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	84	09-Oct-25	01-Jan-26
C-12770	W6-UE093-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	20	01-Jan-26	21-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.06.07.10	UE092:Construcc.Tablero de viga U Viaductos/Sistemas drenaje cubierta S	146	01-Jan-26	27-May-26
C-12780	W6-UE092-Viaducto-Montaje de vigas en forma de U	96	01-Jan-26	07-Apr-26
C-14030	W6-UE092-Sistema de cubierta de viaducto (persianas, barandillas de protección, etc.	50	07-Apr-26	27-May-26
PLMB-T1-V04.2.06.08	Monitoreo	1350	12-May-23	21-Jan-27
C-3580	Instrumentacion y Monitoreo	1350	12-May-23	21-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.07	Estaciones Metro - Nave central	1225	13-Mar-24	21-Jul-27
PLMB-T1-V04.2.07.01	W1- Estación 1- Estaciones Metro - Nave central - (Estación Mezzanine)	520	20-Jan-25	24-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.07.01.1	UE158:Estacion 1 - Estaciones Metro Nave Central - Estructura	490	20-Jan-25	25-May-26
C-8560	Estación W1-UE158 Estación 1-Ejecución de actividades de superestructura (vigas, co	280	20-Jan-25	27-Oct-25
C-11950	Estación W1-UE158 Estación 1: Instalación. Externo. instalaciones de servicio público	210	27-Oct-25	25-May-26
PLMB-T1-V04.2.07.01.2	UE159: Estacion 1 - Estaciones Metro Nave Central - Acabados	240	27-Oct-25	24-Jun-26
C-11960	W1-UE159: Acabado del piso del pasillo de la estación 1-Estación central	240	27-Oct-25	24-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.07.02	W1- Estación 2- Estaciones Metro - Nave central - (Estación Mezzanine)	1012	10-Apr-24	17-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.07.02.1	UE160: Estacion 2 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	979	10-Apr-24	15-Dec-26
C-5710	W1-UE160 Estación 2-Ejecución de las actividades de la superestructura (vigas, colum	559	10-Apr-24	21-Oct-25
C-11830	W1-UE160: Estación 2-exter. Instalaciones de servicio público instalación de red de tub	420	21-Oct-25	15-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.07.02.2	UE161: Estacion 2 - Estaciones Metro Nave Central - Acabados	453	21-Oct-25	17-Jan-27
C-11840	W1-UE161: Acabado del piso del pasillo de la estación 2 de la estación central	453	21-Oct-25	17-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.07.03	W2- Estación 3- Estaciones Metro - Nave central - (Estación Simple)	420	13-Mar-24	07-May-25
PLMB-T1-V04.2.07.03.1	UE162:Estacion 3 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	410	13-Mar-24	27-Apr-25
C-5440	Estación W2-UE162 Estación 3-Execut. de superstruc. actividades (vigas, columnas, lc	210	13-Mar-24	09-Oct-24
C-7600	W2-Estación 3-Instalar. Instalación de servicio público externo-red de tuberías (red de a	200	09-Oct-24	27-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.07.03.2	UE163: Estacion 3 - Estaciones Metro Nave Central - Acabados	210	09-Oct-24	07-May-25
C-7610	W2-UE163: Acabado del piso del pasillo de la estación central de la estación 3	210	09-Oct-24	07-May-25

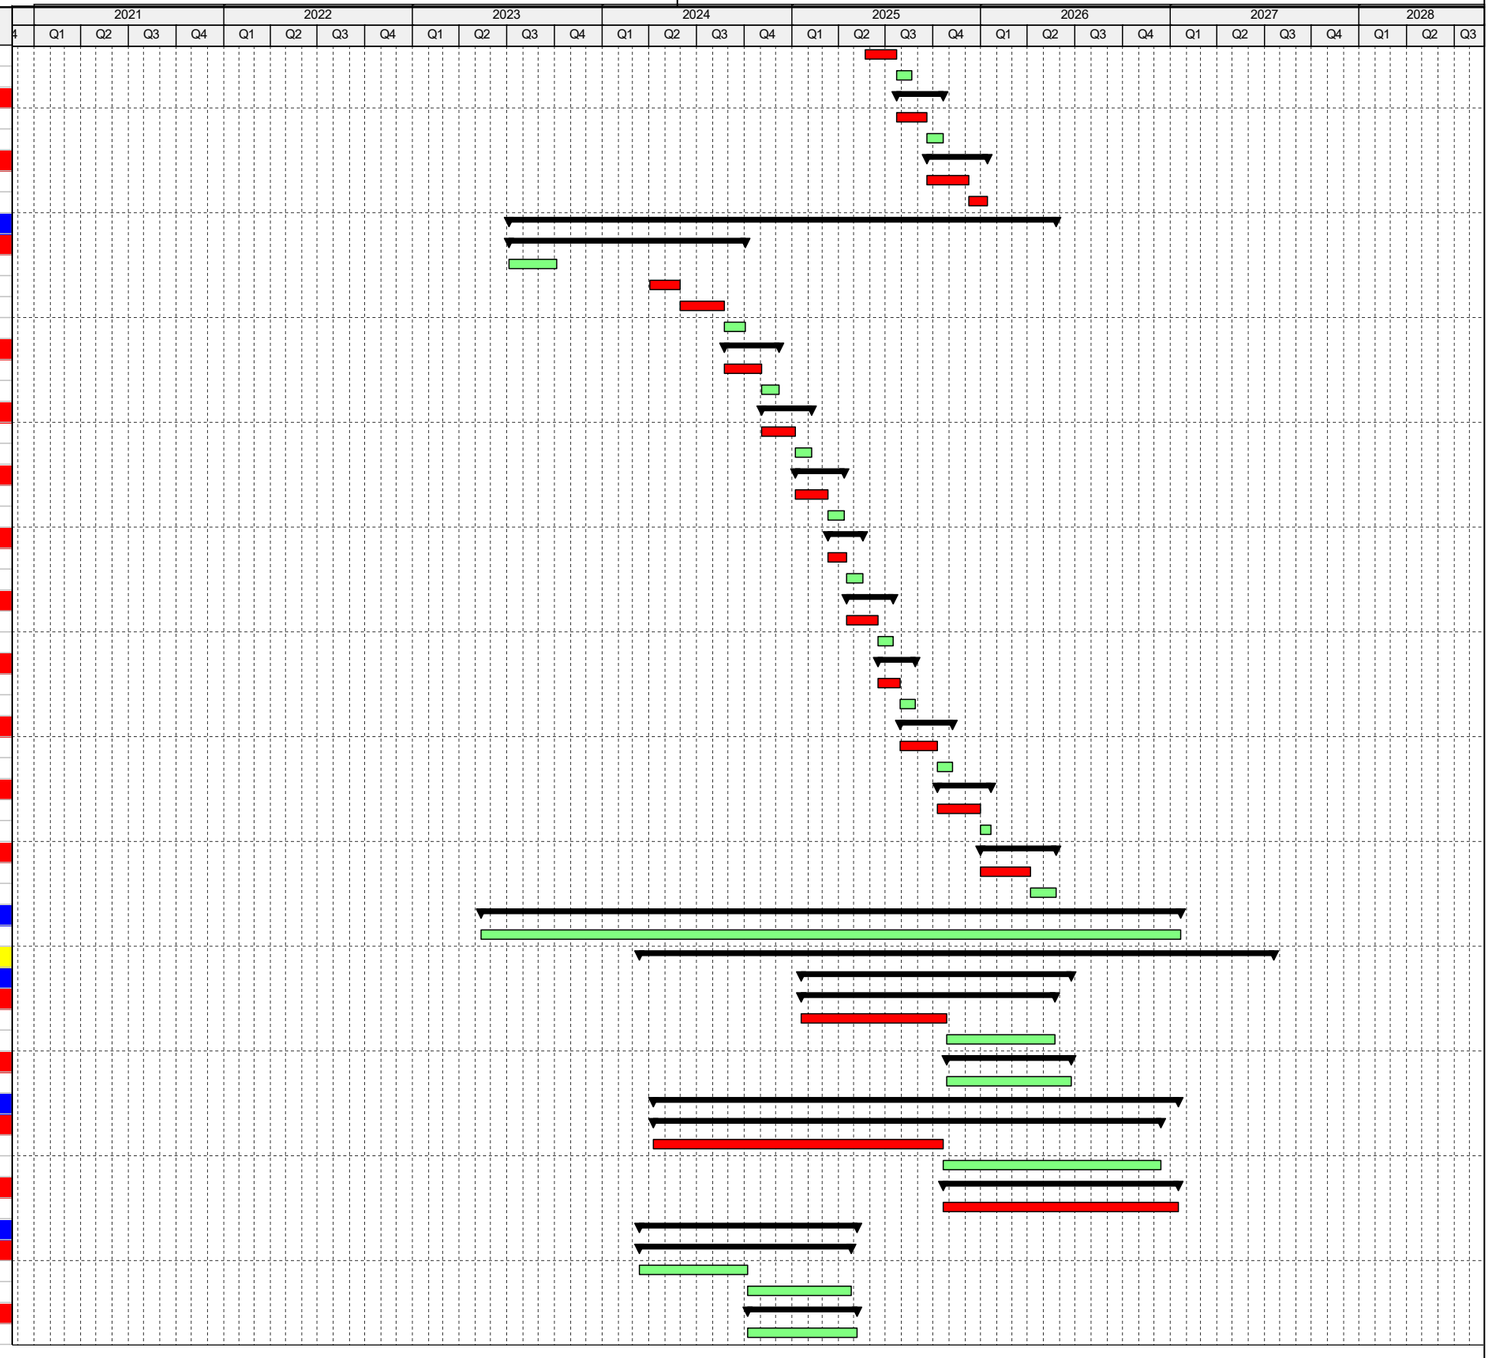


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.2.07.04	W2- Estación 4- Estaciones Metro - Nave central - (Estación Simple)	420	16-Oct-24	10-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.07.04.1	UE164:Estacion 4 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	390	16-Oct-24	10-Nov-25
C-7690	Estación W2-UE164 Estación 4-Ejecución de superestructura. actividades (vigas, colun	210	16-Oct-24	14-May-25
C-10150	W2-UE164-Estación 4-Instalación de servicio público externo-red de tuberías (red de a	180	14-May-25	10-Nov-25
PLMB-T1-V04.2.07.04.2	UE165:Estacion 4 - Estaciones Metro Nave Central - Acabados	210	14-May-25	10-Dec-25
C-10160	W2-UE165: Acabado del piso del pasillo de la estación central de la estación 4	210	14-May-25	10-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.07.05	W2- Estación 5- Estaciones Metro - Nave central - (Estación Simple)	432	02-May-25	08-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.07.05.1	UE166:Estacion 5 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	412	02-May-25	18-Jun-26
C-10030	Estación W2-UE166 Estación 5-Ejecución de superestructura. actividades (vigas, colun	180	02-May-25	29-Oct-25
C-12080	W2-UE166: Estación 5-Instalación de servicio público externo-red de tuberías (red de a	220	10-Nov-25	18-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.07.05.2	UE167:Estacion 5 - Estaciones Metro Nave Central - Acabados	210	10-Dec-25	08-Jul-26
C-12410	W2-UE167: Acabado del piso del pasillo de la estación central de la estación 5	210	10-Dec-25	08-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.07.06	W2- Estación 6- Estaciones Metro - Nave central - (Estación Mezzanine)	490	17-Feb-26	22-Jun-27
PLMB-T1-V04.2.07.06.1	UE168:Estacion 6 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	460	17-Feb-26	23-May-27
C-13230	Estación W2-UE168 Estación 6-Ejecución de superestructura. actividades (vigas, colun	250	17-Feb-26	25-Oct-26
C-15980	W2-UE168: Estación 6-Instalación de servicio público externo-red de tuberías (red de a	210	25-Oct-26	23-May-27
PLMB-T1-V04.2.07.06.2	UE169:Estacion 6 - Estaciones Metro Nave Central - Acabados	240	25-Oct-26	22-Jun-27
C-15990	W2-UE169: Acabado del piso del pasillo de la estación central de la estación 6	240	25-Oct-26	22-Jun-27
PLMB-T1-V04.2.07.07	W3- Estación 7- Estaciones Metro - Nave central - (Estación Especial)	420	27-May-26	21-Jul-27
PLMB-T1-V04.2.07.07.1	UE170:Estacion 7 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	420	27-May-26	21-Jul-27
C-14840	Estación W3-UE170 Estación 7-Ejecución de superestructura. actividades (vigas, colun	210	27-May-26	23-Dec-26
C-16240	W3-UE170: Estación 7-Instalación de servicio público externo-red de tuberías (red de a	210	23-Dec-26	21-Jul-27
PLMB-T1-V04.2.07.07.2	UE171:Estacion 7 - Estaciones Metro Nave Central - Acabados	210	23-Dec-26	21-Jul-27
C-16250	W3-UE171: Estación 7: acabado del piso del pasillo de la estación central	210	23-Dec-26	21-Jul-27
PLMB-T1-V04.2.07.08	W3- Estación 8- Estaciones Metro - Nave central - (Estación Mezzanine)	480	26-Oct-24	18-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.07.08.1	UE172:Estacion 8 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	450	26-Oct-24	19-Jan-26
C-7760	Estación W3-UE172 Estación 8-Ejecución de superestructura. actividades (vigas, colun	240	26-Oct-24	23-Jun-25
C-10550	W3-UE172: Estación 8-Instalación de servicio público externo-red de tuberías (red de a	210	23-Jun-25	19-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.07.08.2	UE173:Estacion 8 - Estaciones Metro Nave Central - Acabados	240	23-Jun-25	18-Feb-26
C-10560	W3-UE173: Acabado del piso del pasillo de la octava estación-estación central	240	23-Jun-25	18-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.07.09	W3- Estación 9- Estaciones Metro - Nave central - (Estación de Transferencia)	300	19-Jan-26	15-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.07.09.1	UE174:Estacion 9 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	270	19-Jan-26	16-Oct-26
C-12440	Estación W3-UE174 Estación 9-Ejecución de superestructura. actividades (vigas, colun	180	19-Jan-26	18-Jul-26
C-13700	W3-UE174: Estación 9-Instalación de servicio público externo-red de tuberías (red de a	180	19-Apr-26	16-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.07.09.2	UE175:Estacion 9 Estaciones Metro Nave Central - Acabados	210	19-Apr-26	15-Nov-26
C-13710	W3-UE175: Estación 9: acabado del piso del pasillo de la estación central	210	19-Apr-26	15-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.07.10	W4-Estación 10- Estaciones Metro - Nave central - (Estación Simple)	520	15-Sep-24	17-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.07.10.1	UE176:Estacion 10 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	500	15-Sep-24	28-Jan-26
C-7360	Estación W4-UE176 Estación 10-Ejecución de superestructura. actividades (vigas, colu	280	15-Sep-24	22-Jun-25
C-10520	W4-UE176: Estación 10: Instalación de servicio público externo, red de tuberías (red d	220	22-Jun-25	28-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.07.10.2	UE177:Estacion 10- Estaciones Metro Nave Central - Acabados	240	22-Jun-25	17-Feb-26
C-10530	W4-UE177: Acabado del piso del pasillo de la décima estación-estación central	240	22-Jun-25	17-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.07.11	W4- Estación 11- Estaciones Metro - Nave central - (Estación de Transferencia)	490	12-Jun-25	15-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.07.11.1	UE178:Estacion 11 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	460	12-Jun-25	15-Sep-26
C-10430	Estación W4-UE178 Estación 11-Ejecución de superestructura. actividades (vigas, colu	280	12-Jun-25	19-Mar-26
C-13610	W4-UE178: Estación 11-Instalación de servicio público externo-red de tuberías (red de	180	19-Mar-26	15-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.07.11.2	UE179:Estacion 11 Estaciones Metro Nave Central - Acabados	210	19-Mar-26	15-Oct-26
C-13620	W4-UE179: Estación 11-Trabajos Arquitectónicos (fachadas, cerramientos, cubierta, pa	210	19-Mar-26	15-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.07.12	W4- Estación 12- Estaciones Metro - Nave central - (Estación de Transferencia)	430	09-Apr-26	13-Jun-27
PLMB-T1-V04.2.07.12.1	UE180:Estacion 12 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	430	09-Apr-26	13-Jun-27
C-14080	Estación W4-UE180 Estación 12-Ejecución de superestructura. actividades (vigas, colu	250	09-Apr-26	15-Dec-26
C-16210	W4-UE180: Estación 12-Instalación de servicio público externo-red de tuberías (red de	180	15-Dec-26	13-Jun-27
PLMB-T1-V04.2.07.12.2	UE181:Estacion 12 Estaciones Metro Nave Central - Acabados	180	15-Dec-26	13-Jun-27
C-16220	W4-UE181: Acabado del piso del pasillo de la duodécima estación-estación central	180	15-Dec-26	13-Jun-27
PLMB-T1-V04.2.07.13	W5- Estación 13- Estaciones Metro - Nave central - (Estación Simple + OCC)	405	26-Aug-24	05-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.07.13.1	UE182:Estacion 13 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	375	26-Aug-24	05-Sep-25
C-7140	W5-UE182 Estación 13-Ejecución de superestructura. actividades (vigas, columnas, lo	195	26-Aug-24	09-Mar-25
C-9050	W5-UE182: Estación 13-Instalación de servicio público externo-red de tuberías (red de	180	09-Mar-25	05-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.07.13.2	UE183:Estacion 13 Estaciones Metro Nave Central - Acabados	210	09-Mar-25	05-Oct-25
C-9060	W5-UE183: Acabado del piso del pasillo de la estación 13-Estación central	210	09-Mar-25	05-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.07.14	W5- Estación 14- Estaciones Metro - Nave central - (Estación de Transferencia)	450	20-Oct-25	13-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.07.14.1	UE184:Estacion 14 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	440	20-Oct-25	03-Jan-27

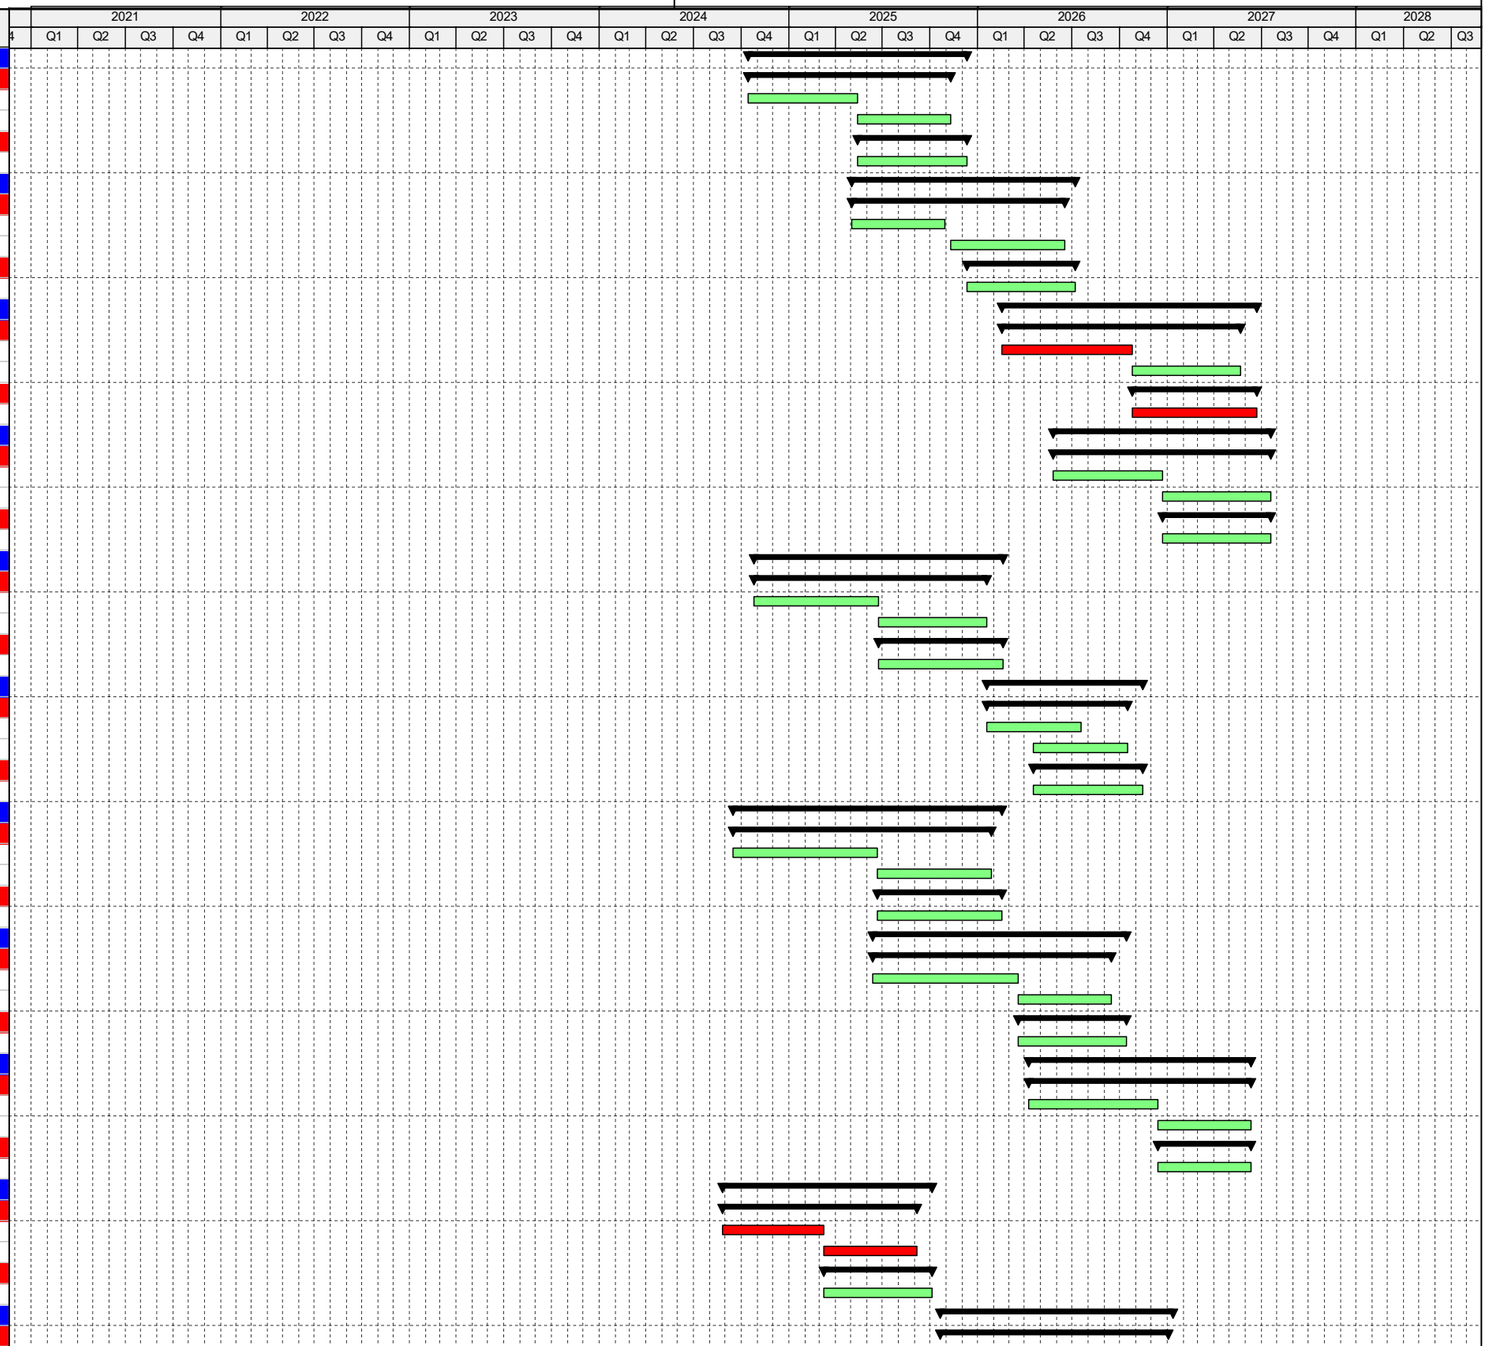

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-11810	Estación W5-UE184 Estación 14-Ejecución de superestructura. actividades (vigas, colu	240	20-Oct-25	17-Jun-26
C-14960	W5-UE184: Estación 14-Instalación de servicio público externo-red de tuberías (red de	200	17-Jun-26	03-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.07.14.2	UE185:Estacion 14 Estaciones Metro Nave Central - Acabados	210	17-Jun-26	13-Jan-27
C-14970	W5-UE185: Estacion 14 Nave Central Acabados	210	17-Jun-26	13-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.07.15	W6-Estación 15- Estaciones Metro - Nave central - (Estación de Transferencia)	450	12-Apr-25	06-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.07.15.1	UE186:Estacion 15 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	420	12-Apr-25	06-Jun-26
C-9690	Estación W6-UE186 Estación 15-Ejecución de superestructura. actividades (vigas, colu	240	12-Apr-25	08-Dec-25
C-12300	W6-UE186: Estación 15-Instalación de servicio público externo-red de tuberías (red de	180	08-Dec-25	06-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.07.15.2	UE187:Estacion 15 Estaciones Metro Nave Central - Acabados	210	08-Dec-25	06-Jul-26
C-12310	W6-UE187: Acabado del piso del pasillo de la estación central de la 15 estación	210	08-Dec-25	06-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.07.16	W6- Estación 16- Estaciones Metro - Nave central - (Estación de Transferencia)	410	21-Jan-26	07-Mar-27
PLMB-T1-V04.2.07.16.1	UE188:Estacion 16 Estaciones Metro Nave Central - Estructura	380	21-Jan-26	05-Feb-27
C-13010	Estación W6-UE188 Estación 16-Ejecución de superestructura. actividades (vigas, colu	200	21-Jan-26	09-Aug-26
C-15390	W6-UE188: Estación 16-Instalación de servicio público externo-red de tuberías (red de	180	09-Aug-26	05-Feb-27
PLMB-T1-V04.2.07.16.2	UE189:Estacion 16 Estaciones Metro Nave Central - Acabados	210	09-Aug-26	07-Mar-27
C-15400	W6-UE189: Finalización del piso del pasillo de la estación 16 de la estación central	210	09-Aug-26	07-Mar-27
PLMB-T1-V04.2.07.17	Monitoreo	1163	10-Apr-24	17-Jun-27
C-5720	Instrumentacion y Monitoreo	1163	10-Apr-24	17-Jun-27
PLMB-T1-V04.2.08	Estaciones Metro - Edificios de Acceso	1670	08-Jan-23	05-Aug-27
PLMB-T1-V04.2.08.01	W2-Estación 3- Edificio de Acceso Oriente	850	08-Jan-23	07-May-25
PLMB-T1-V04.2.08.01.1	UE305: Estacion 3 Edificio de acceso Oriente - Estructura	450	08-Jan-23	02-Apr-24
C-1100	W2-UE305: Estación 3 Edificio de Acceso Oriente - Actividades preliminares de prepar	90	08-Jan-23	08-Apr-23
C-3120	W2-UE305: Estación 3 Edificio de Acceso Oriente - Estructura desde los cimientos has	360	08-Apr-23	02-Apr-24
PLMB-T1-V04.2.08.01.2	UE306: Estacion 3 Edificio de acceso Oriente - Acabados	400	02-Apr-24	07-May-25
C-5520	W2-UE306: Estación 3 Edificio de Acceso Oriente - Fachadas, cubierta, particiones, pi	400	02-Apr-24	07-May-25
PLMB-T1-V04.2.08.02	W2-Estación 3- Edificio de acceso Occidene	660	08-Jan-23	29-Oct-24
PLMB-T1-V04.2.08.02.1	UE307: Estacion 3 Edificio de acceso Occidene - Estructura	450	08-Jan-23	02-Apr-24
C-1110	W2-UE307: Estación 3 Edificio de Acceso Occidente - Actividades preliminares de prep	90	08-Jan-23	08-Apr-23
C-3130	W2-UE307: Estación 3 Edificio de Acceso Occidente - Estructura desde los cimientos h	360	08-Apr-23	02-Apr-24
PLMB-T1-V04.2.08.02.2	UE308: Estacion 3 Edificio de acceso Occidene - Acabados	210	02-Apr-24	29-Oct-24
C-5530	W2-UE308: Estación 3-Acceso occidental-Acabado de edificios	210	02-Apr-24	29-Oct-24
PLMB-T1-V04.2.08.03	W2-Estación 4- Edificio Acceso Norte	600	02-Apr-24	23-Nov-25
PLMB-T1-V04.2.08.03.1	UE309: Estacion 4 Edificio de acceso Norte - Estructura	390	02-Apr-24	27-Apr-25
C-5540	W2-UE309: Estación 4 Edificio de Acceso Norte - Actividades preliminares de preparac	30	02-Apr-24	02-May-24
C-5890	W2-UE309: Estación 4 Edificio de Acceso Norte - Estructura desde los cimientos hasta	360	02-May-24	27-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.08.03.2	UE310: Estacion 4 Edificio de acceso Norte - Acabados	210	27-Apr-25	23-Nov-25
C-9810	W2-UE310: Acabado del edificio de acceso norte de la estación 4	210	27-Apr-25	23-Nov-25
PLMB-T1-V04.2.08.04	W2-Estación 4- Edificio de Acceso Sur	600	02-Apr-24	23-Nov-25
PLMB-T1-V04.2.08.04.1	UE311: Estacion 4 Edificio de acceso Sur - Estructura	390	02-Apr-24	27-Apr-25
C-5550	W2-UE311: Estación 4 Edificio de Acceso Sur - Actividades preliminares de preparació	30	02-Apr-24	02-May-24
C-5900	W2-UE311: Estación 4 Edificio de Acceso Sur - Estructura desde los cimientos hasta l	360	02-May-24	27-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.08.04.2	UE312: Estacion 4 Edificio de acceso Sur - Acabados	210	27-Apr-25	23-Nov-25
C-9820	W2-UE312: Estación 4-Acceso sur-Acabado del edificio	210	27-Apr-25	23-Nov-25
PLMB-T1-V04.2.08.05	W2-Estación 5- Edificio Acceso Norte	600	27-Apr-25	18-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.08.05.1	UE313: Estacion 5 Edificio de acceso Norte - Estructura	390	27-Apr-25	22-May-26
C-9830	W2-UE313: Estación 5 Edificio de Acceso Norte - Actividades preliminares de preparac	30	27-Apr-25	27-May-25
C-10310	W2-UE313: Estación 5 Edificio de Acceso Norte - Estructura desde los cimientos hasta	360	27-May-25	22-May-26
PLMB-T1-V04.2.08.05.2	UE314: Estacion 5 Edificio de acceso Norte - Acabados	210	22-May-26	18-Dec-26
C-14690	W2-UE314: Acabado del edificio de acceso norte de la estación 5	210	22-May-26	18-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.08.06	W2-Estación 5- Edificio Acceso Sur	600	27-Apr-25	18-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.08.06.1	UE315: Estacion 5 Edificio de acceso Sur - Estructura	390	27-Apr-25	22-May-26
C-9840	W2-UE315: Estación 5 Edificio de Acceso Sur - Actividades preliminares de preparació	30	27-Apr-25	27-May-25
C-10320	W2-UE315: Estación 5 Edificio de Acceso Sur - Estructura desde los cimientos hasta l	360	27-May-25	22-May-26
PLMB-T1-V04.2.08.06.2	UE316: Estacion 5 Edificio de acceso Sur - Acabados	210	22-May-26	18-Dec-26
C-14700	W2-UE316: Edificio de la estación 5 hasta el acabado sur	210	22-May-26	18-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.08.07	W3-Estación 7- Edificio Acceso Norte	660	14-Oct-25	05-Aug-27
PLMB-T1-V04.2.08.07.1	UE317:Estacion 7 Edificio de acceso Norte - Estructura	450	14-Oct-25	07-Jan-27
C-11790	W3-UE317: Estación 7 Edificio de Acceso Norte - Actividades preliminares de preparac	90	14-Oct-25	12-Jan-26
C-12910	.W3-UE317: Estación 7 Edificio de Acceso Norte - Estructura desde los cimientos hast	360	12-Jan-26	07-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.08.07.2	UE318: Estacion 7 Edificio de acceso Norte - Acabados	210	07-Jan-27	05-Aug-27
C-16330	W3-UE318: Estación 7-Acceso norte al edificio: decoración y acabado	210	07-Jan-27	05-Aug-27
PLMB-T1-V04.2.08.08	W3-Estación 7- Edificio Acceso Sur	660	14-Oct-25	05-Aug-27

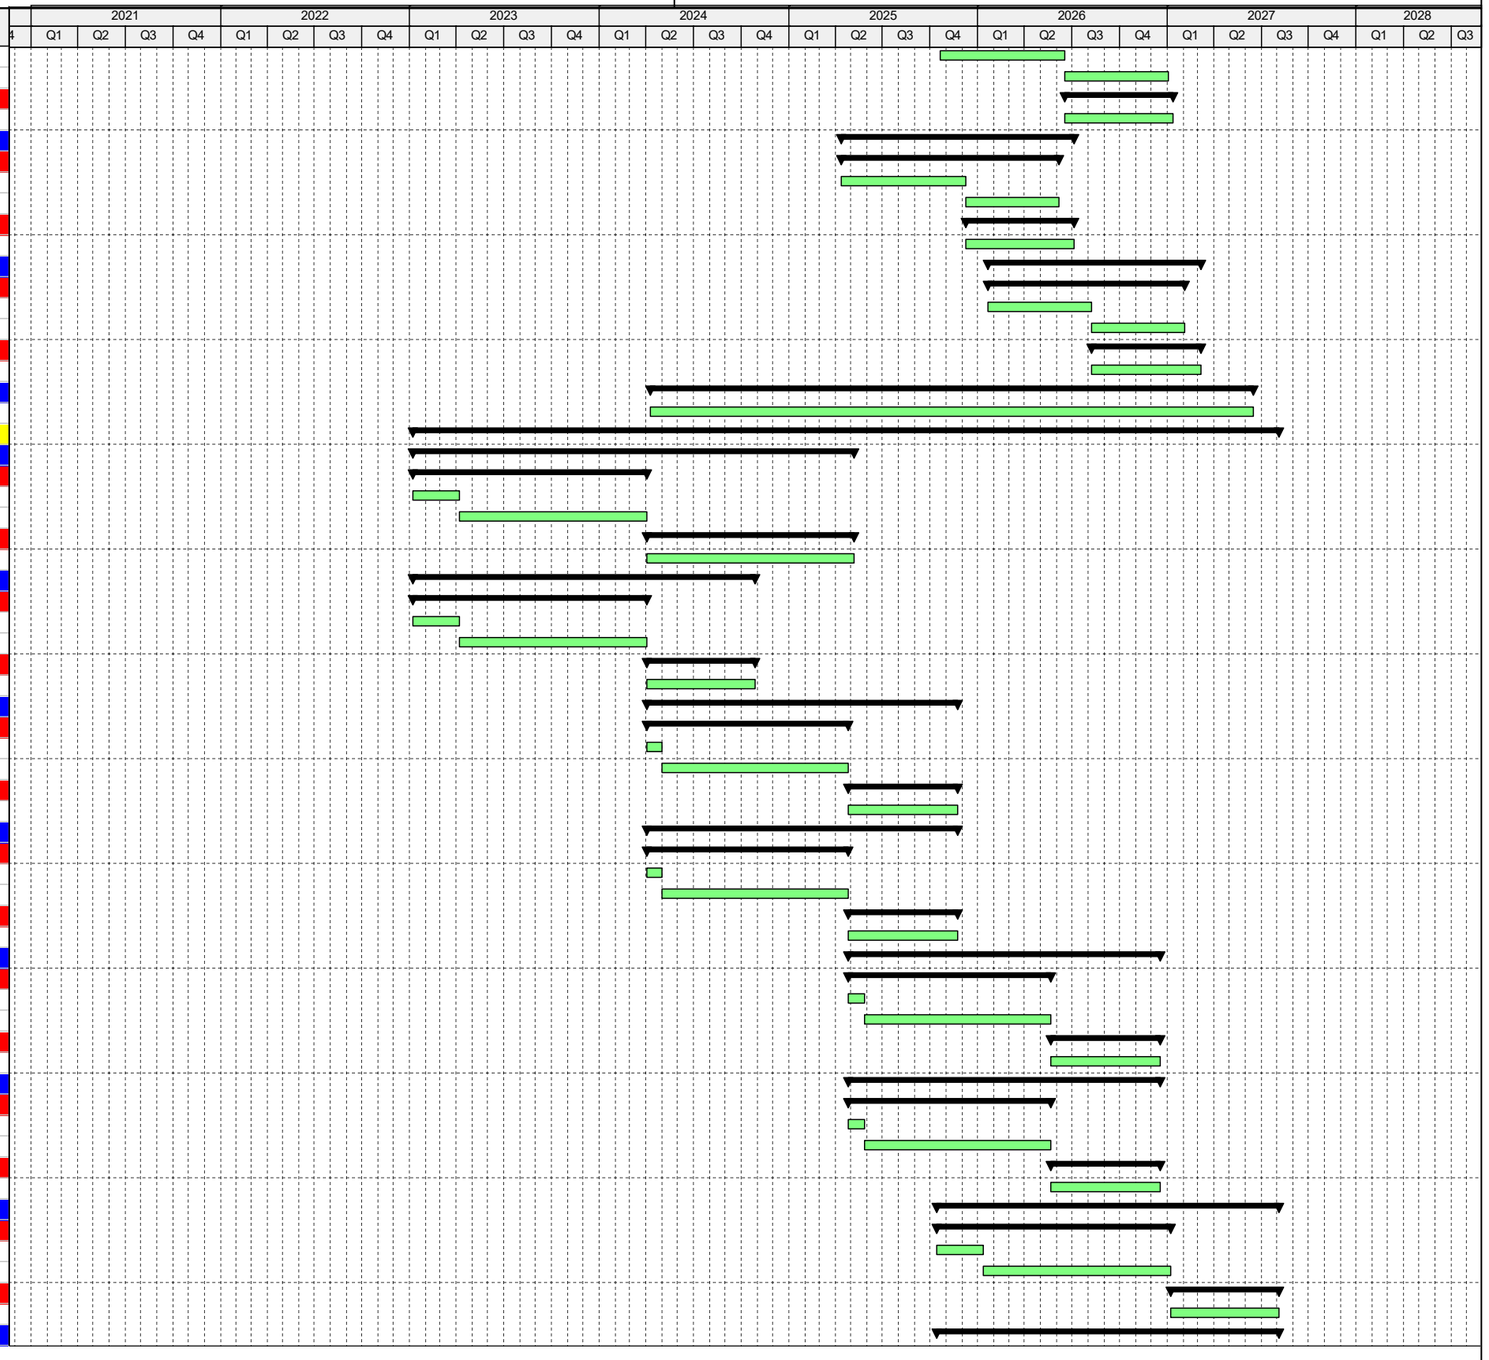


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.2.08.08.1	UE319:Estacion 7 Edificio de acceso Sur - Estructura	450	14-Oct-25	07-Jan-27
C-11800	W3-UE319: Estación 7 Edificio de Acceso Sur - Actividades preliminares de preparació	90	14-Oct-25	12-Jan-26
C-12920	W3-UE319: Estación 7 Edificio de Acceso Sur - Estructura desde los cimientos hasta l	360	12-Jan-26	07-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.08.08.2	UE320: Estacion 7 Edificio de acceso Sur - Acabados	210	07-Jan-27	05-Aug-27
C-16340	W3-UE320: Estación 7-Acceso sur-Acabado del edificio	210	07-Jan-27	05-Aug-27
PLMB-T1-V04.2.08.09	W3-Estación 9- Edificio Acceso Este	600	26-Feb-25	19-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.08.09.1	UE321: Estacion 9 Edificio de acceso Este - Estructura	390	26-Feb-25	23-Mar-26
C-8730	W3-UE321: Estación 9 Edificio de Acceso Oriente - Actividades preliminares de prepar	30	26-Feb-25	28-Mar-25
C-9500	W3-UE321: Estación 9 Edificio de Acceso Oriente - Estructura desde los cimientos has	360	28-Mar-25	23-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.08.09.2	UE322: Estacion 9 Edificio de acceso Este - Acabados	210	23-Mar-26	19-Oct-26
C-13720	W3-UE322: Estación 9-Acceso este-Acabado del edificio	210	23-Mar-26	19-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.08.10	W3- Estación 9- Edificio 2 Acceso Oeste	600	26-Feb-25	19-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.08.10.1	UE325:Estacion 9 Edificio de acceso Oeste - Estructura	390	26-Feb-25	23-Mar-26
C-8750	W3-UE325: Estación 9 Edificio de Acceso Occidente 2 - Actividades preliminares de pr	30	26-Feb-25	28-Mar-25
C-9520	W3-UE325: Estación 9 Edificio de Acceso Occidente 2 - Estructura desde los cimiento	360	28-Mar-25	23-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.08.10.2	UE326: Estacion 9 Edificio de acceso Oeste -Acabados	210	23-Mar-26	19-Oct-26
C-13740	W3-UE326: Estación 9-Acceso Oeste Edificio 2 Acabado	210	23-Mar-26	19-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.08.11	W3-Estación 9- Edificio Acceso Occidental	600	26-Feb-25	19-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.08.11.1	UE323:Estacion 9 Edificio de acceso Occidental - Estructura	390	26-Feb-25	23-Mar-26
C-8740	W3-UE323: Estación 9 Edificio de Acceso Occidente - Actividades preliminares de prep	30	26-Feb-25	28-Mar-25
C-9510	W3-UE323: Estación 9 Edificio de Acceso Occidente - Estructura desde los cimientos h	360	28-Mar-25	23-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.08.11.2	UE324: Estacion 9 Edificio de acceso Occidental - Acabados	210	23-Mar-26	19-Oct-26
C-13730	W3-UE324: Estación 9-Acceso occidental-Acabado de edificios	210	23-Mar-26	19-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.08.12	W4-Estación 10- Edificio Acceso Sur	600	02-Apr-24	23-Nov-25
PLMB-T1-V04.2.08.12.1	UE329: Estacion 10 Edificio de acceso Sur - Estructura	390	02-Apr-24	27-Apr-25
C-5570	W4-UE329: Estación 10 Edificio de Acceso Sur - Actividades preliminares de preparac	30	02-Apr-24	02-May-24
C-5920	W4-UE329: Estación 10 Edificio de Acceso Sur - Estructura desde los cimientos hasta	360	02-May-24	27-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.08.12.2	UE330: Estacion 10 Edificio de acceso Sur - Acabados	210	27-Apr-25	23-Nov-25
C-9850	W4-UE330: Estación 10-Acceso Sur-Acabado del edificio	210	27-Apr-25	23-Nov-25
PLMB-T1-V04.2.08.13	W4-Estación 10- Edificio Acceso Norte	630	02-Apr-24	23-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.08.13.1	UE327: Estacion 10 Edificio de acceso Norte - Estructura	390	02-Apr-24	27-Apr-25
C-5560	W4-UE327: Estación 10 Edificio de Acceso Norte - Actividades preliminares de prepar	30	02-Apr-24	02-May-24
C-5910	W4-UE327: Estación 10 Edificio de Acceso Norte - Estructura desde los cimientos has	360	02-May-24	27-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.08.13.2	UE328: Estacion 10 Edificio de acceso Norte - Acabados	210	27-May-25	23-Dec-25
C-10330	W4-UE328: Acabado del edificio de acceso norte de la estación 10	210	27-May-25	23-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.08.14	W4-Estación 11- Edificio Acceso Occidental	660	08-Jan-23	29-Oct-24
PLMB-T1-V04.2.08.14.1	UE333: Estacion 11 Edificio de acceso Occidental - Estructura	450	08-Jan-23	02-Apr-24
C-1130	W4-UE333: Estación 11 Edificio de Acceso Occidente - Actividades preliminares de pr	90	08-Jan-23	08-Apr-23
C-3150	W4-UE333: Estación 11 Edificio de Acceso Occidente - Estructura desde los cimientos	360	08-Apr-23	02-Apr-24
PLMB-T1-V04.2.08.14.2	UE334: Estacion 11 Edificio de acceso Occidental - Acabados	210	02-Apr-24	29-Oct-24
C-5580	W4-UE334: Estación 11-Acceso occidental-Acabado de edificios	210	02-Apr-24	29-Oct-24
PLMB-T1-V04.2.08.15	W4-Estación 11- Edificio Acceso Este	870	08-Jan-23	27-May-25
PLMB-T1-V04.2.08.15.1	UE331: Estacion 11 Edificio de acceso Este - Estructura	450	08-Jan-23	02-Apr-24
C-1120	W4-UE331: Estación 11 Edificio de Acceso Oriente - Actividades preliminares de prepa	90	08-Jan-23	08-Apr-23
C-3140	W4-UE331: Estación 11 Edificio de Acceso Oriente - Estructura desde los cimientos ha	360	08-Apr-23	02-Apr-24
PLMB-T1-V04.2.08.15.2	UE332: Estacion 11 Edificio de acceso Este - Acabados	210	29-Oct-24	27-May-25
C-7780	W4-UE332: Estación 11 Edificio de Acceso Oriente - Fachadas, cubierta, particiones, p	210	29-Oct-24	27-May-25
PLMB-T1-V04.2.08.16	W4-Estación 12- Edificio Acceso Occidental	600	26-Feb-25	19-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.08.16.1	UE337: Estacion 12 Edificio de acceso Occidental - Estructura	390	26-Feb-25	23-Mar-26
C-8770	W4-UE337: Estación 12 Edificio de Acceso Occidente - Actividades preliminares de pr	30	26-Feb-25	28-Mar-25
C-9540	W4-UE337: Estación 12 Edificio de Acceso Occidente - Estructura desde los cimientos	360	28-Mar-25	23-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.08.16.2	UE338: Estacion 12 Edificio de acceso Occidental - Acabados	210	23-Mar-26	19-Oct-26
C-13760	W4-UE338: Estación 12-Acceso occidental-Acabado de edificios	210	23-Mar-26	19-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.08.17	W4-Estación 12- Edificio Acceso Occidente 2	600	26-Feb-25	19-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.08.17.1	UE339: Estacion 12 Edificio de acceso Occidente 2 - Estructura	390	26-Feb-25	23-Mar-26
C-8780	W4-UE339: Estación 12 Edificio de Acceso Occidente 2 - Actividades preliminares de p	30	26-Feb-25	28-Mar-25
C-9550	W4-UE339: Estación 12 Edificio de Acceso Occidente 2 - Estructura desde los cimient	360	28-Mar-25	23-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.08.17.2	UE340: Estacion 12 Edificio de acceso Occidente 2 - Acabados	210	23-Mar-26	19-Oct-26
C-13770	W4-UE340: Estación 12-Edificio de acceso oeste 2-Decoración y acabado	210	23-Mar-26	19-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.08.18	W4-Estación 12- Acceso Oriente Edificio	600	26-Feb-25	19-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.08.18.1	UE335: Estacion 12 Edificio de acceso Oriente - Estructura	390	26-Feb-25	23-Mar-26
C-8760	W4-UE335: Estación 12 Edificio de Acceso Oriente - Actividades preliminares de prepa	30	26-Feb-25	28-Mar-25

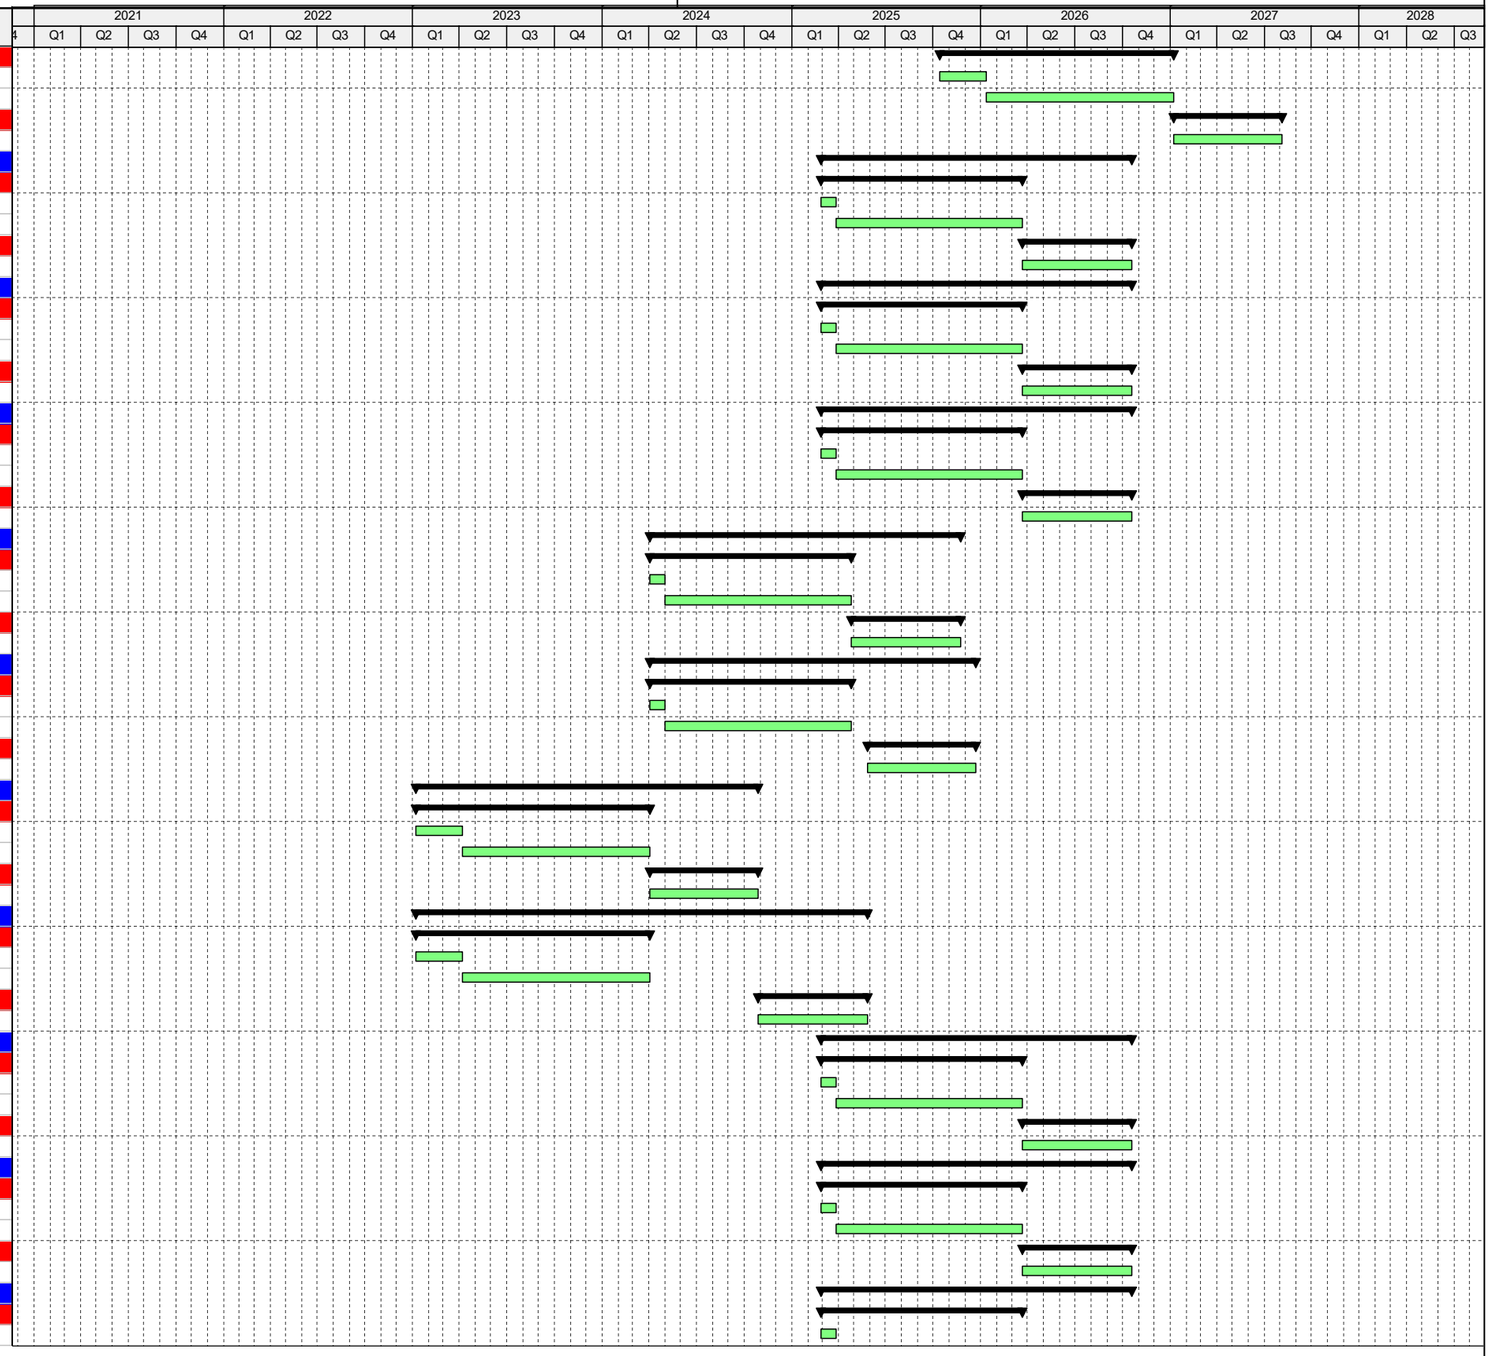


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-9530	W4-UE335: Estación 12 Edificio de Acceso Oriente - Estructura desde los cimientos ha	360	28-Mar-25	23-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.08.18.2	UE336: Estacion 12 Edificio de acceso Oriente - Acabados	210	23-Mar-26	19-Oct-26
C-13750	W4-UE336: Estación 12 Edificio de Acceso Oriente - Fachadas, cubierta, particiones, p	210	23-Mar-26	19-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.08.19	W5-Estación 13- Edificio Acceso Occidental	600	08-Jan-23	30-Aug-24
PLMB-T1-V04.2.08.19.1	UE343: Estacion 13 Edificio de acceso Occidental - Estructura	390	08-Jan-23	02-Feb-24
C-1340	W5-UE343: Estación 13 Edificio de Acceso Oriente - Actividades preliminares de prep	30	08-Jan-23	07-Feb-23
C-2660	W5-UE343: Estación 13 Edificio de Acceso Occidente - Estructura desde los cimientos	360	07-Feb-23	02-Feb-24
PLMB-T1-V04.2.08.19.2	UE344: Estacion 13 Edificio de acceso Occidental - Acabados	210	02-Feb-24	30-Aug-24
C-5080	W5-UE344: Estación 13-Acceso occidental-Acabado de edificios	210	02-Feb-24	30-Aug-24
PLMB-T1-V04.2.08.20	W5-Estación 13- Edesificio Acceso Oriente	810	08-Jan-23	28-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.08.20.1	UE341: Estacion 13 Edificio de acceso Oriente - Estructura	390	08-Jan-23	02-Feb-24
C-1140	W5-UE341: Estación 13 Edificio de Acceso Oriente - Actividades preliminares de prep	30	08-Jan-23	07-Feb-23
C-2650	W5-UE341: Estación 13 Edificio de Acceso Oriente - Estructura desde los cimientos ha	360	07-Feb-23	02-Feb-24
PLMB-T1-V04.2.08.20.2	UE342: Estacion 13 Edificio de acceso Oriente - Acabados	210	30-Aug-24	28-Mar-25
C-7180	W5-UE342: Estación 13-Acceso este-Acabado del edificio	210	30-Aug-24	28-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.08.21	W5-Estación 14- Edificio Acceso Occidental	1020	08-Jan-23	24-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.08.21.1	UE347: Estacion 14 Edificio de acceso Occidente - Estructura	390	08-Jan-23	02-Feb-24
C-1160	W5-UE347: Estación 14 Edificio de Acceso Occidente - Actividades preliminares de pr	30	08-Jan-23	07-Feb-23
C-2680	W5-UE347: Estación 14 Edificio de Acceso Occidente - Estructura desde los cimientos	360	07-Feb-23	02-Feb-24
PLMB-T1-V04.2.08.21.2	UE348: Estacion 14 Edificio de acceso Occidente - Acabados	210	28-Mar-25	24-Oct-25
C-9560	W5-UE348: Estación 14-Acceso occidental-Acabado de edificios	210	28-Mar-25	24-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.08.22	W5-Estación 14- Edificio 2 Acceso Occidente	1230	08-Jan-23	22-May-26
PLMB-T1-V04.2.08.22.1	UE349: Estacion 14 Edificio de acceso Occidente - Estructura	390	08-Jan-23	02-Feb-24
C-1170	W5-UE349: Estación 14 Edificio de Acceso Occidente 2 - Actividades preliminares de	30	08-Jan-23	07-Feb-23
C-2690	W5-UE349: Estación 14 Edificio de Acceso Occidente 2 - Estructura desde los cimient	360	07-Feb-23	02-Feb-24
PLMB-T1-V04.2.08.22.2	UE350: Estacion 14 Edificio de acceso Occidente - Acabados	210	24-Oct-25	22-May-26
C-11880	W5-UE350: Estación 14-Edificio 2 de Acceso Oeste-Decoración y Acabado	210	24-Oct-25	22-May-26
PLMB-T1-V04.2.08.23	W5-Estación 14- Edificio Acceso Oriente	1230	08-Jan-23	22-May-26
PLMB-T1-V04.2.08.23.1	UE345: Estacion 14 Edificio de acceso Oriente - Estructura	390	08-Jan-23	02-Feb-24
C-1150	W5-UE345: Estación 14 Edificio de Acceso Oriente - Actividades preliminares de prep	30	08-Jan-23	07-Feb-23
C-2670	W5-UE345: Estación 14 Edificio de Acceso Oriente - Estructura desde los cimientos ha	360	07-Feb-23	02-Feb-24
PLMB-T1-V04.2.08.23.2	UE346: Estacion 14 Edificio de acceso Oriente - Acabados	210	24-Oct-25	22-May-26
C-11870	W5-UE346: Estación 14-Acceso este al edificio: decoración y acabado	210	24-Oct-25	22-May-26
PLMB-T1-V04.2.08.24	W6-Estación 15- Edificio Acceso Occidental	600	02-Feb-24	24-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.08.24.1	UE353: Estacion 15 Edificio de acceso Occidental - Estructura	390	02-Feb-24	26-Feb-25
C-5100	W6-UE353: Estación 15 Edificio de Acceso Occidente - Actividades preliminares de pr	30	02-Feb-24	03-Mar-24
C-5310	W6-UE353: Estación 15 Edificio de Acceso Occidente - Estructura desde los cimientos	360	03-Mar-24	26-Feb-25
PLMB-T1-V04.2.08.24.2	UE354: Estacion 15 Edificio de acceso Occidental - Acabados	210	26-Feb-25	24-Sep-25
C-8800	W6-UE354: Estación 15-Acceso Oeste-Acabado de edificios	210	26-Feb-25	24-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.08.25	W6-Estación 15- Edificio Acceso Occidente 2	600	02-Feb-24	24-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.08.25.1	UE355: Estacion 15 Edificio de acceso Occidente - Estructura	390	02-Feb-24	26-Feb-25
C-5110	W6-UE355-Estación 15 Edificio de Acceso Occidente 2 - Actividades preliminares de pr	30	02-Feb-24	03-Mar-24
C-5320	W6-UE355-Station 15- Edificio de Acceso Occidente 2 - Estructura desde los cimientos	360	03-Mar-24	26-Feb-25
PLMB-T1-V04.2.08.25.2	UE356: Estacion 15 Edificio de acceso Occidente - Acabados	210	26-Feb-25	24-Sep-25
C-8810	W6-UE356: Estación 15-Acceso oeste 2 Edificio-Decoración y acabado	210	26-Feb-25	24-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.08.26	W6-Estación 15- Edificio Acceso Oriente	600	02-Feb-24	24-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.08.26.1	UE351: Estacion 15 Edificio de acceso Oriente - Estructura	390	02-Feb-24	26-Feb-25
C-5090	W6-UE351: Estación 15 Edificio de Acceso Oriente - Actividades preliminares de prep	30	02-Feb-24	03-Mar-24
C-5300	W6-UE351: Estación 15 Edificio de Acceso Oriente - Estructura desde los cimientos ha	360	03-Mar-24	26-Feb-25
PLMB-T1-V04.2.08.26.2	UE352: Estacion 15 Edificio de acceso Oriente - Acabados	210	26-Feb-25	24-Sep-25
C-8790	W6-UE352: Inspección de la estación 15-Este edificio-trabajos de decoración y decora	210	26-Feb-25	24-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.08.27	W6-Estación 16- Edificio Acceso Occidental	600	27-Apr-25	18-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.08.27.1	UE359: Estacion 16 Edificio de acceso Occidental - Estructura	390	27-Apr-25	22-May-26
C-9870	W6-UE359: Preparación del edificio de acceso oeste de la estación 16	30	27-Apr-25	27-May-25
C-10350	W6-UE359: Estación 16 Edificio de Acceso Occidente - Estructura desde los cimientos	360	27-May-25	22-May-26
PLMB-T1-V04.2.08.27.2	UE360: Estacion 16 Edificio de acceso Occidental - Acabados	210	22-May-26	18-Dec-26
C-14720	W6-UE360: Estación 16-Acceso occidental-Acabado de edificios	210	22-May-26	18-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.08.28	W6-Estación 16- Edificio Acceso Oriente	600	27-Apr-25	18-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.08.28.1	UE357: Estacion 16 Edificio de acceso Oriente - Estructura	390	27-Apr-25	22-May-26
C-9860	W6-UE357: Estación 16 Edificio de Acceso Oriente - Actividades preliminares de prep	30	27-Apr-25	27-May-25
C-10340	W6-UE357: Estación 16 Edificio de Acceso Oriente - Estructura desde los cimientos ha	360	27-May-25	22-May-26
PLMB-T1-V04.2.08.28.2	UE358: Estacion 16 Edificio de acceso Oriente - Acabados	210	22-May-26	18-Dec-26

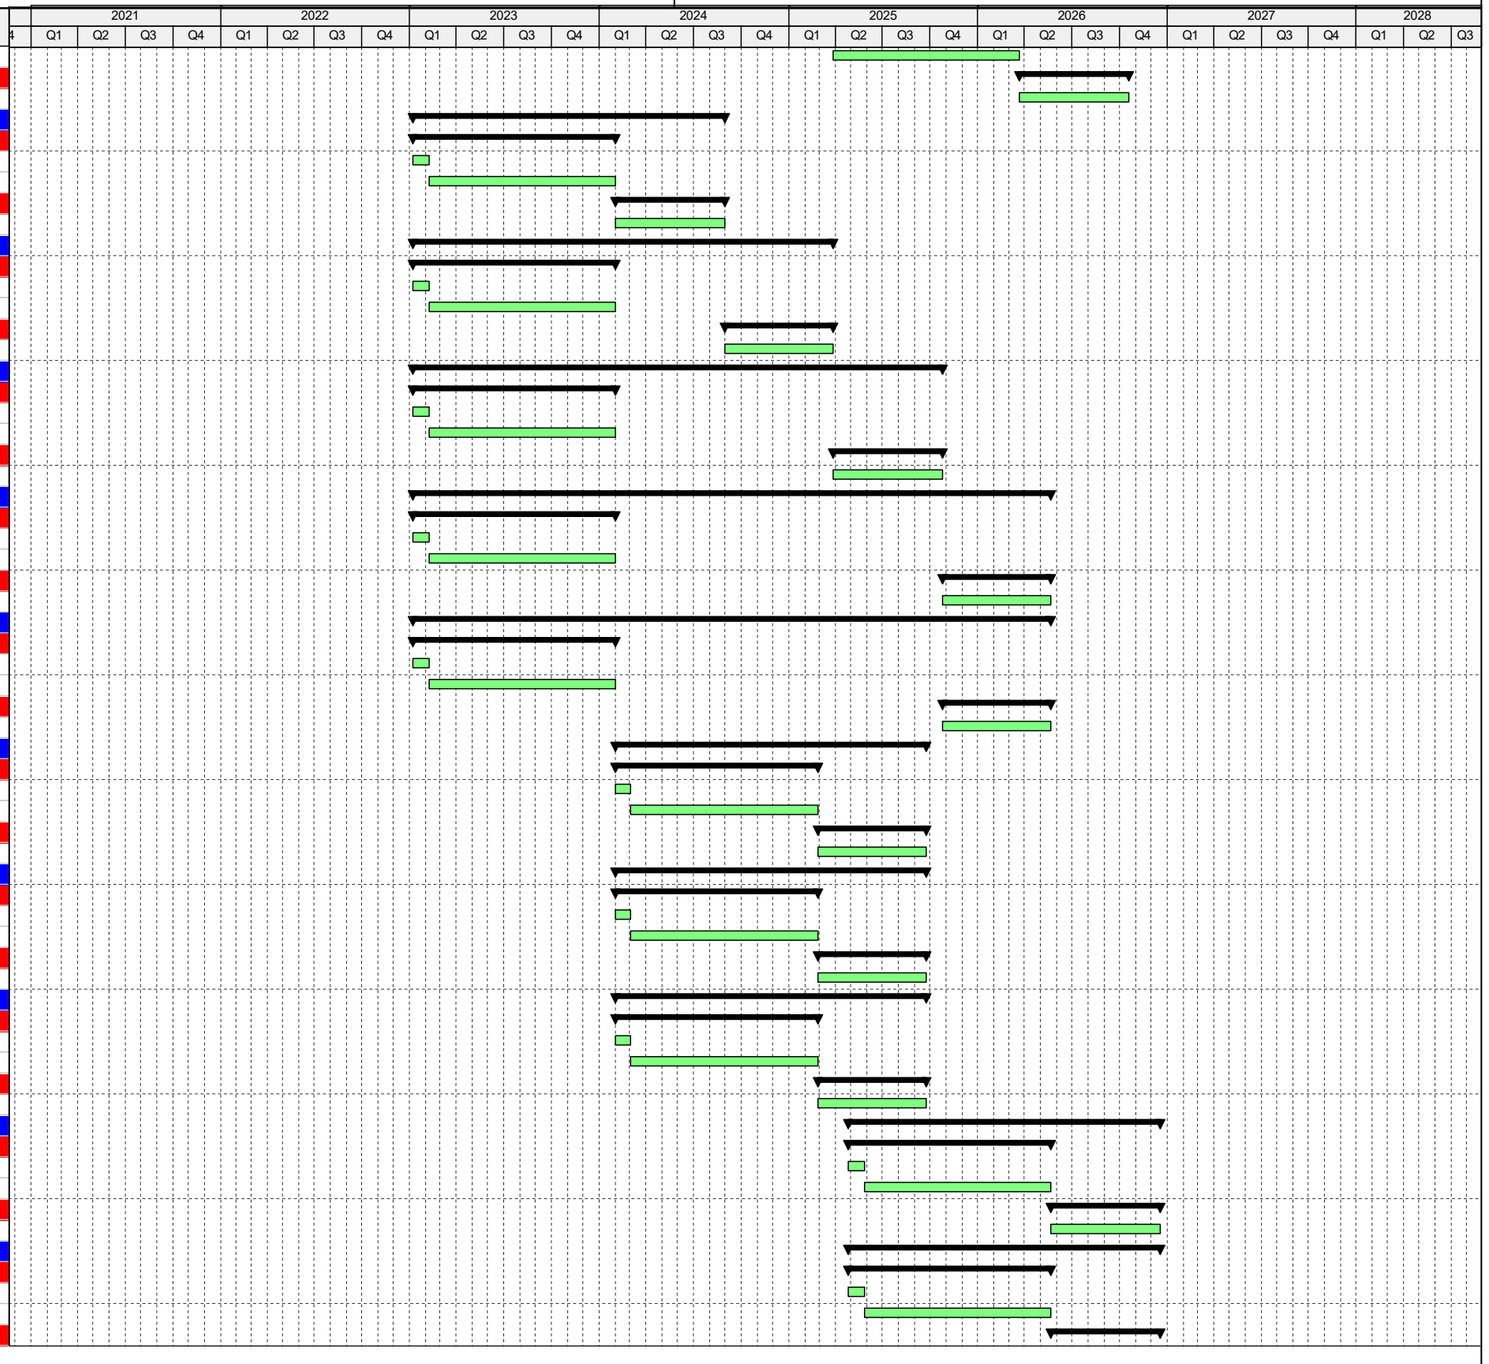


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-14710	W6-UE358: Acabado del edificio de acceso este de la estación 16	210	22-May-26	18-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.08.06.29	Monitoreo	1670	08-Jan-23	05-Aug-27
C-1330	Instrumentacion y Monitoreo	1670	08-Jan-23	05-Aug-27
PLMB-T1-V04.2.09	Estación Metro - MEP (mecánicos-eléctricos-hidrosanitarios)	1315	02-Feb-24	09-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.09.01	UE361:Estación 1-Edificio Acceso MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosani	300	19-Nov-25	15-Sep-26
C-12100	W1-UE361: Estación 1-Nave central	300	19-Nov-25	15-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.09.02	UE362:Estación 2-Edificio Acceso -MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosar	300	19-Nov-25	15-Sep-26
C-12110	W1-UE362: Estación 2-Nave central	300	19-Nov-25	15-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.09.03	UE363:Estación 3-Edificio Acceso -MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosar	596	02-Apr-24	19-Nov-25
C-5650	W2-UE363: Estación 3-Edificio de acceso-MEP	496	02-Apr-24	11-Aug-25
C-6770	W2-UE363: Estación 3-Navecentral	496	11-Jul-24	19-Nov-25
PLMB-T1-V04.2.09.04	UE364:Estación 4-Edificio Acceso -MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosar	454	14-May-25	11-Aug-26
C-10170	W2-UE364: Estación 4-Nave central	365	14-May-25	14-May-26
C-11230	W2-UE364: Estación 4-Edificio de acceso-MEP	365	11-Aug-25	11-Aug-26
PLMB-T1-V04.2.09.05	UE365:Estación 5-Edificio Acceso -MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosar	483	14-May-26	09-Sep-27
C-14580	W2-UE365: Estación 5-Nave central	394	14-May-26	12-Jun-27
C-15470	W2-UE365: Estación 5-Edificio de acceso-MEP	394	11-Aug-26	09-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.09.06	UE366:Estación 6-Edificio Acceso -MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosar	340	15-Sep-26	21-Aug-27
C-15690	W2-UE366: Estación 6-Nave central	340	15-Sep-26	21-Aug-27
PLMB-T1-V04.2.09.07	UE367:Estación 7-Edificio Acceso -MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosar	305	24-Sep-26	26-Jul-27
C-15820	W3-UE367: Estación 7-Nave central	300	24-Sep-26	21-Jul-27
C-16360	W3-UE367: Estación 7-Edificio de acceso-MEP	200	07-Jan-27	26-Jul-27
PLMB-T1-V04.2.09.08	UE368:Estación 8-Edificio Acceso -MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosar	392	25-Mar-25	21-Apr-26
C-9480	W3-UE368: Estación 8-Nave central	392	25-Mar-25	21-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.09.09	UE369:Estación 9-Edificio Acceso -MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosar	362	23-Mar-26	20-Mar-27
C-13830	W3-UE369: Estación 9-Edificio de acceso-MEP	333	23-Mar-26	19-Feb-27
C-14130	W3-UE369: Estación 9-Nave central	333	21-Apr-26	20-Mar-27
PLMB-T1-V04.2.09.10	UE370:Estación 10-Edificio Acceso -MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosa	397	24-Mar-25	25-Apr-26
C-9430	W4-UE370: Estación 10-Nave central	363	24-Mar-25	22-Mar-26
C-10010	W4-UE370: Estación 10-Edificio de acceso-MEP	363	27-Apr-25	25-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.09.11	UE371:Estación 11-Edificio Acceso -MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosa	398	22-Mar-26	24-Apr-27
C-13660	W4-UE371: Estación 11-Nave central	364	22-Mar-26	21-Mar-27
C-14310	W4-UE371: Estación 11-Edificio de acceso-MEP	364	25-Apr-26	24-Apr-27
PLMB-T1-V04.2.09.12	UE372:Estación 12-Edificio Acceso -MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosa	444	25-Apr-26	13-Jul-27
C-14320	W4-UE372: Estación 12- Edificio de acceso-MEP	180	25-Apr-26	22-Oct-26
C-15700	W4-UE372: Estación 12-Nave central	300	16-Sep-26	13-Jul-27
PLMB-T1-V04.2.09.13	UE373:Estación 13-Edificio Acceso -MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosa	785	02-Feb-24	28-Mar-26
C-5140	W5-UE373: Estación 13-Edificio de acceso-MEP	384	02-Feb-24	20-Feb-25
C-9070	W5-UE373: Estación 13-Nave central	384	09-Mar-25	28-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.09.14	UE374:Estación 14-Edificio Acceso -MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosa	1079	02-Feb-24	16-Jan-27
C-5150	W5-UE374: Estación 14-Edificio de acceso-MEP	350	02-Feb-24	17-Jan-25
C-13630	W5-UE374: Estación 14-Nave central	303	19-Mar-26	16-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.09.15	UE375:Estación 15-Edificio Acceso -MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosa	775	26-Feb-25	12-Apr-27
C-8940	W6-UE375: Estación 15-Edificio de acceso-MEP	364	26-Feb-25	25-Feb-26
C-13870	W6-UE375: Estación 15-Nave central	380	28-Mar-26	12-Apr-27
PLMB-T1-V04.2.09.16	UE376:Estación 16-Edificio Acceso -MEP-trabajos mecanicos-electricos-hidrosa	391	11-May-26	06-Jun-27
C-14520	W6-UE376: Estación 16-Nave central	380	11-May-26	26-May-27
C-14810	W6-UE376: Estación 16-Edificio de acceso-MEP	380	22-May-26	06-Jun-27
PLMB-T1-V04.2.09.17	Monitoreo	1278	02-Feb-24	03-Aug-27
C-5160	Instrumentacion y Monitoreo	1278	02-Feb-24	03-Aug-27
PLMB-T1-V04.2.10	Sistema de alimentación eléctrica - Obra civil - Subestaciones Receptoras (SER)	720	08-Jan-23	28-Dec-24
PLMB-T1-V04.2.10.01	UE190: Sistema de alimentacion electrica- Obra civil - Subestaciones Receptora	480	08-Jan-23	02-May-24
C-1180	UE190: Subestat.-varios entornos. permisos, construc. permisos, equipm. permisos y c	240	08-Jan-23	05-Sep-23
C-4100	UE190: Subestación-Ingeniería Civil-20% de avance	240	05-Sep-23	02-May-24
PLMB-T1-V04.2.10.02	UE191: Sistema de alimentacion electrica- Obra civil - Subestaciones Receptora	720	08-Jan-23	28-Dec-24
C-1190	UE191: Subestat.-varios entornos. permisos, construc. permisos, equipm. permisos y c	360	08-Jan-23	03-Jan-24
C-4790	UE191: Subestación-Ingeniería Civil-40% de avance	360	03-Jan-24	28-Dec-24
PLMB-T1-V04.2.10.03	UE192: Sistema de alimentacion electrica- Obra civil - Subestaciones Receptora	720	08-Jan-23	28-Dec-24
C-1200	UE192: Subestat.-varios entornos. permisos, construc. permisos, equipm. permisos y c	360	08-Jan-23	03-Jan-24
C-4800	UE192: Subestación-Ingeniería Civil-40% de avance	360	03-Jan-24	28-Dec-24
PLMB-T1-V04.2.11	Renovar y reconfigurar la red de carreteras existente	921	30-Dec-23	08-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.11.01	W4: Adecuación de Red vial existente/ Reconfiguración Separador entre calzada I	421	13-May-25	08-Jul-26

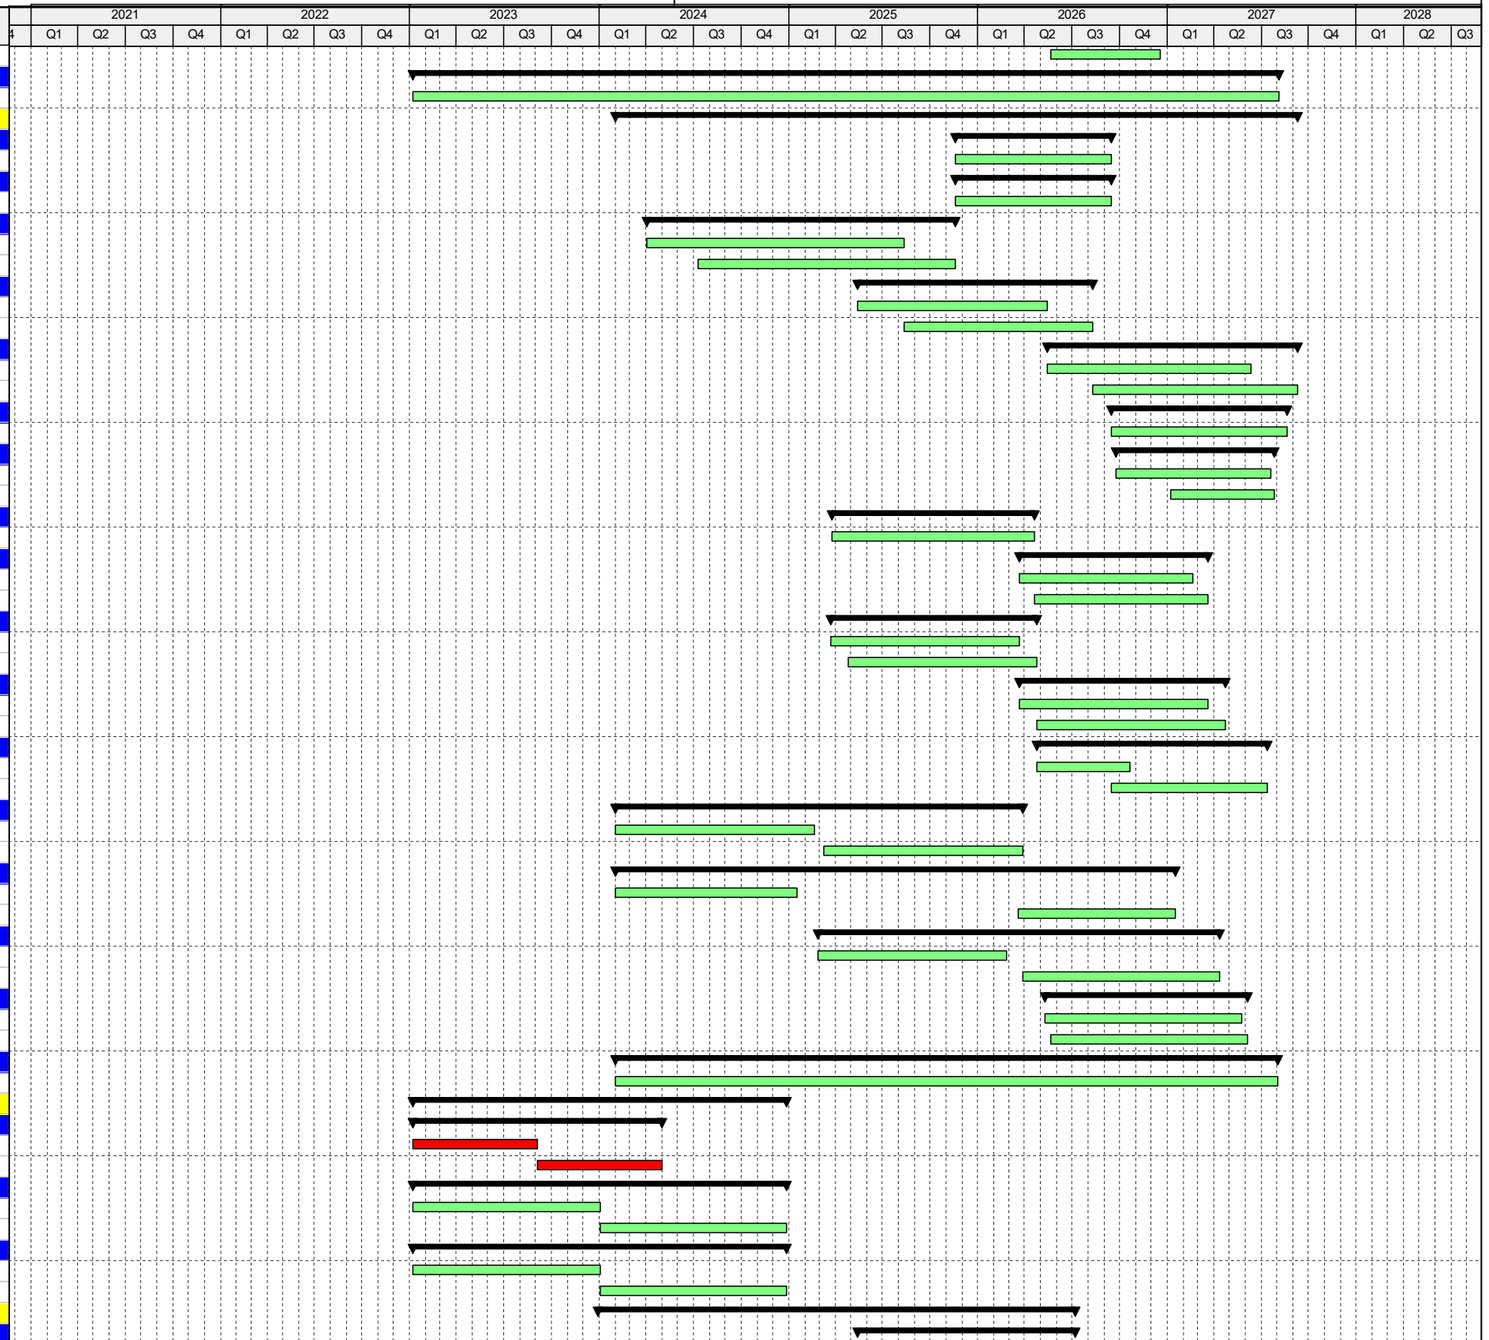

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.2.11.01.1	UE232: Adecuación Malla Vial Existente /Separodor entre calzada Secc.40:	120	13-May-25	10-Sep-25
C-10130	Solicitud del permiso de construcción.	60	13-May-25	12-Jul-25
C-10720	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	60	12-Jul-25	10-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.11.01.2	UE231: Adecuación Malla Vial Existente /Separodor entre calzada Secc.41:	90	12-Jul-25	10-Oct-25
C-10730	Solicitud del permiso de construcción.	30	12-Jul-25	11-Aug-25
C-11480	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	10-Sep-25	10-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.11.01.3	UE230: Adecuación Malla Vial Existente /Separodor entre calzada Secc.42:	60	10-Sep-25	09-Nov-25
C-11490	Solicitud del permiso de construcción.	30	10-Sep-25	10-Oct-25
C-11770	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	10-Oct-25	09-Nov-25
PLMB-T1-V04.2.11.01.4	UE229: Adecuación Malla Vial Existente /Separodor entre calzada Secc.43:	60	09-Dec-25	07-Feb-26
C-12390	Solicitud del permiso de construcción.	30	09-Dec-25	08-Jan-26
C-12850	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	08-Jan-26	07-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.11.01.5	UE228: Adecuación Malla Vial Existente /Separodor entre calzada Secc.44:	60	10-Mar-26	09-May-26
C-13480	Solicitud del permiso de construcción.	30	10-Mar-26	09-Apr-26
C-14090	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	09-Apr-26	09-May-26
PLMB-T1-V04.2.11.01.6	UE227: Adecuación Malla Vial Existente /Separodor entre calzada Secc.45:	60	09-May-26	08-Jul-26
C-14500	Solicitud del permiso de construcción.	30	09-May-26	08-Jun-26
C-14920	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	08-Jun-26	08-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.11.02	W5: Adecución de Red vial existente/ Reconfiguración Separador entre calzada I	770	30-Dec-23	07-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.11.02.1	UE226: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.46: K16	60	30-Dec-23	28-Feb-24
C-4740	Solicitud del permiso de construcción.	30	30-Dec-23	29-Jan-24
C-5050	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	29-Jan-24	28-Feb-24
PLMB-T1-V04.2.11.02.2	UE225: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.47: K17	60	29-Mar-24	28-May-24
C-5490	Solicitud del permiso de construcción.	30	29-Mar-24	28-Apr-24
C-5880	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	28-Apr-24	28-May-24
PLMB-T1-V04.2.11.02.3	UE224: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.48: K17	60	27-Jun-24	26-Aug-24
C-6640	Solicitud del permiso de construcción.	30	27-Jun-24	27-Jul-24
C-6890	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	27-Jul-24	26-Aug-24
PLMB-T1-V04.2.11.02.4	UE223: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.49: K17	60	27-Jul-24	25-Sep-24
C-6900	Solicitud del permiso de construcción.	30	27-Jul-24	26-Aug-24
C-7160	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	26-Aug-24	25-Sep-24
PLMB-T1-V04.2.11.02.5	UE222: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.50: K17	60	25-Sep-24	24-Nov-24
C-7460	Solicitud del permiso de construcción.	30	25-Sep-24	25-Oct-24
C-7750	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	25-Oct-24	24-Nov-24
PLMB-T1-V04.2.11.02.6	UE221: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.51: K18	60	23-Jan-25	24-Mar-25
C-8590	Solicitud del permiso de construcción.	30	23-Jan-25	22-Feb-25
C-8720	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	22-Feb-25	24-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.11.02.7	UE220: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.52: K18	60	24-Mar-25	23-May-25
C-9450	Solicitud del permiso de construcción.	30	24-Mar-25	23-Apr-25
C-9770	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	23-Apr-25	23-May-25
PLMB-T1-V04.2.11.02.8	UE219: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.53: K19	60	23-May-25	22-Jul-25
C-10270	Solicitud del permiso de construcción.	30	23-May-25	22-Jun-25
C-10540	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	22-Jun-25	22-Jul-25
PLMB-T1-V04.2.11.02.9	UE218: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.54: K19	60	22-Jul-25	20-Sep-25
C-11040	Solicitud del permiso de construcción.	30	22-Jul-25	21-Aug-25
C-11280	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	21-Aug-25	20-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.11.02.10	UE217: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.55: K1	60	20-Sep-25	19-Nov-25
C-11560	Solicitud del permiso de construcción.	30	20-Sep-25	20-Oct-25
C-11820	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	20-Oct-25	19-Nov-25
PLMB-T1-V04.2.11.02.11	UE216: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.56: K1	60	09-Dec-25	07-Feb-26
C-12400	Solicitud del permiso de construcción.	30	09-Dec-25	08-Jan-26
C-12860	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	08-Jan-26	07-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.11.03	W6: Adecución de Red vial existente/ Reconfiguración Separador entre calzada I	651	24-Aug-24	06-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.11.03.1	UE215: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.57: K20	60	24-Aug-24	23-Oct-24
C-7120	Solicitud del permiso de construcción.	30	24-Aug-24	23-Sep-24
C-7420	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	23-Sep-24	23-Oct-24
PLMB-T1-V04.2.11.03.2	UE214: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.58:K20	60	04-Nov-24	03-Jan-25
C-7840	Solicitud del permiso de construcción.	30	04-Nov-24	04-Dec-24
C-7900	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	04-Dec-24	03-Jan-25
PLMB-T1-V04.2.11.03.3	UE213: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.59:K21	60	09-Jan-25	10-Mar-25
C-8500	Solicitud del permiso de construcción.	30	09-Jan-25	08-Feb-25
C-8690	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	08-Feb-25	10-Mar-25

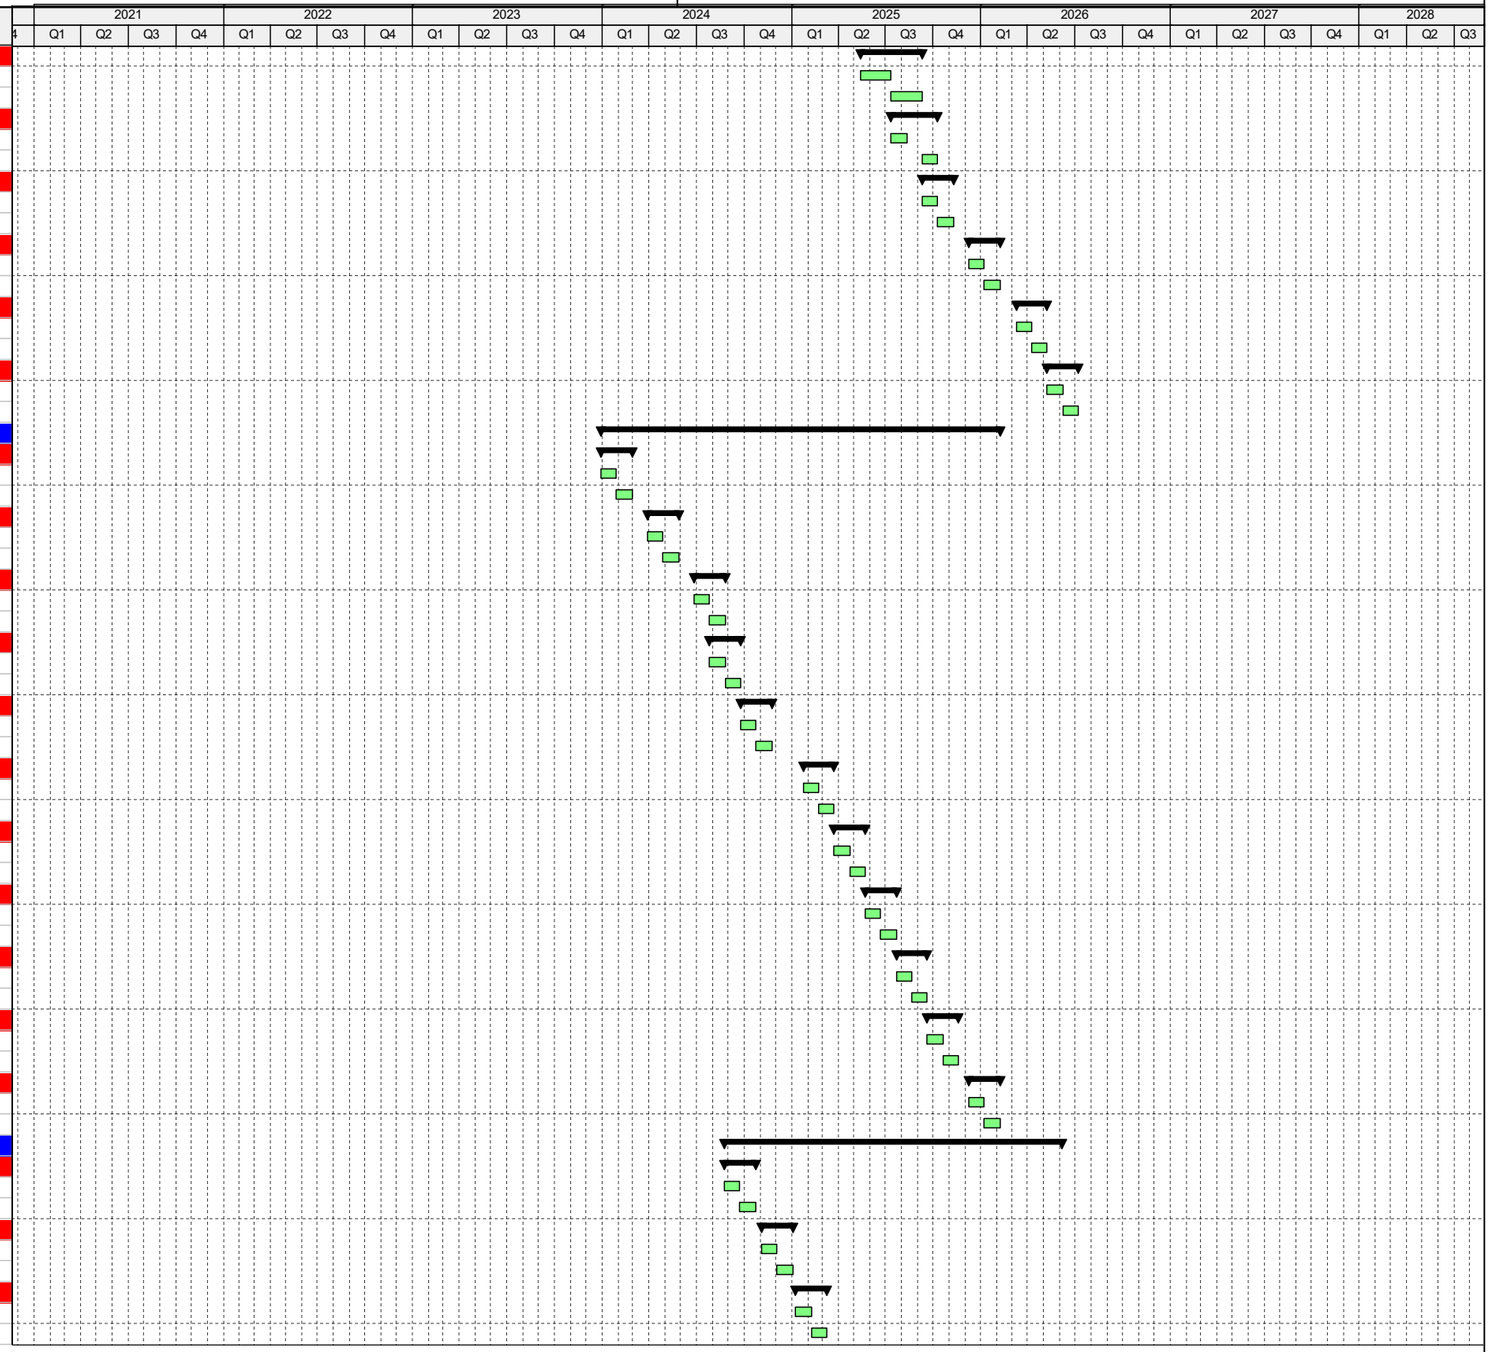


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.2.11.03.4	UE212: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.60:K21	60	13-Mar-25	12-May-25
C-9110	Solicitud del permiso de construcción.	30	13-Mar-25	12-Apr-25
C-9710	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	12-Apr-25	12-May-25
PLMB-T1-V04.2.11.03.5	UE211: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.61:K21	60	18-Apr-25	17-Jun-25
C-9760	Solicitud del permiso de construcción.	30	18-Apr-25	18-May-25
C-10220	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	18-May-25	17-Jun-25
PLMB-T1-V04.2.11.03.6	UE210: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.62:K22	60	17-Jun-25	16-Aug-25
C-10510	Solicitud del permiso de construcción.	30	17-Jun-25	17-Jul-25
C-10970	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	17-Jul-25	16-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.11.03.7	UE209: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.63: K22	60	29-Jul-25	27-Sep-25
C-11150	Solicitud del permiso de construcción.	30	29-Jul-25	28-Aug-25
C-11360	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	28-Aug-25	27-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.11.03.8	UE208: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.64: K22	60	09-Oct-25	08-Dec-25
C-11750	Solicitud del permiso de construcción.	30	09-Oct-25	08-Nov-25
C-12070	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	08-Nov-25	08-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.11.03.9	UE207: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.65: K22	60	01-Jan-26	02-Mar-26
C-12790	Solicitud del permiso de construcción.	30	01-Jan-26	31-Jan-26
C-13110	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	31-Jan-26	02-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.11.03.10	UE206: Adecuación Malla Existente /Separodor entre calzada Secc.66: K2	60	07-Apr-26	06-Jun-26
C-14070	Solicitud del permiso de construcción.	30	07-Apr-26	07-May-26
C-14450	Adecuación de la red vial existente y reconfiguración del separador incluyendo espacio	30	07-May-26	06-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.12	Proyecto de mejoramiento del Espacio Publico	1047	12-Feb-24	24-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.12.01	W1: Obras de mejoramiento del espacio publico Sec. K0+000 al K4+050	730	24-Dec-24	24-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.12.01.1	UE298: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 1: K0 + 000 to	30	24-Nov-26	24-Dec-26
C-16170	W1-UE298: Proyecto de reconstrucción del espacio público-Sección 1: K0 + 000 a K0	30	24-Nov-26	24-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.12.01.2	UE297: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 2: K0 + 300 to	30	25-Sep-26	25-Oct-26
C-15850	W1-UE297: Obras de mejora del espacio público-Sección 2: K0 + 300 a K0 + 650	30	25-Sep-26	25-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.12.01.3	UE296: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 3: K0 + 650 to	45	11-Aug-26	25-Sep-26
C-15480	W1-UE296: Proyecto de mejora del espacio público-Sección 3: K0 + 650 a K1 + 030	45	11-Aug-26	25-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.12.01.4	UE295: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 4: K1 + 030 to	90	13-May-26	11-Aug-26
C-14570	W1-UE295: Obras de mejora del espacio público - Sección 4: K1 + 030 a K1 + 340	90	13-May-26	11-Aug-26
PLMB-T1-V04.2.12.01.5	UE294: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 5: K1 + 340 to	70	04-Mar-26	13-May-26
C-13450	W1-UE294: Proyecto de mejora del espacio público-Sección 5: K1 + 340 a K1 + 600	70	04-Mar-26	13-May-26
PLMB-T1-V04.2.12.01.6	UE293: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 6: K1 + 600 to	35	28-Jan-26	04-Mar-26
C-13100	W1-UE293: Obras de mejora del espacio público-Sección 6: K1 + 600 a K2 + 050	35	28-Jan-26	04-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.12.01.7	UE292: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 7: K2 + 050 to	90	30-Oct-25	28-Jan-26
C-12030	W1-UE292: Obras de mejora del espacio público-Sección 7: K2 + 050 a K2 + 480	90	30-Oct-25	28-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.12.01.8	UE291: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 8: K2 + 480 to	80	11-Aug-25	30-Oct-25
C-11240	W1-UE291: Obras de mejora del espacio público-Sección 8: K2 + 480 a K2 + 790	80	11-Aug-25	30-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.12.01.9	UE290: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 9: K2 + 790 to	60	12-Jun-25	11-Aug-25
C-10440	W1-UE290: Obras de mejora del espacio público-Sección 9: K2 + 790 a K3 + 040	60	12-Jun-25	11-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.12.01.10	UE289: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 10: K3+040 t	30	13-May-25	12-Jun-25
C-10140	W1-UE289: Obras de mejora del espacio público-Sección 10: K3 + 040 a K3 + 440	30	13-May-25	12-Jun-25
PLMB-T1-V04.2.12.01.11	UE288: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 11: K3 + 440	90	12-Feb-25	13-May-25
C-8710	W1-UE288: Obras de mejora del espacio público-Sección 11: K3 + 440 a K3 + 760	90	12-Feb-25	13-May-25
PLMB-T1-V04.2.12.01.12	UE287: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 12: K3 + 760	50	24-Dec-24	12-Feb-25
C-8060	W1-UE287: Obras de mejora del espacio público-Sección 12: K3 + 760 a K4 + 050	50	24-Dec-24	12-Feb-25
PLMB-T1-V04.2.12.02	W2: Obras de mejoramiento del espacio publico Sec. K4+050 al K8+470	890	12-Feb-24	21-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.12.02.1	UE286: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 13: K4 + 050 t	30	12-Feb-24	13-Mar-24
C-5190	W2-UE286: Obras de mejora del espacio público-Sección 13: K4 + 050 a K4 + 480	30	12-Feb-24	13-Mar-24
PLMB-T1-V04.2.12.02.2	UE285: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 14: K4 + 480 t	30	12-Apr-24	12-May-24
C-5740	W2-UE285: Obras de mejora del espacio público-Sección 14: K4 + 480 a K4 + 740	30	12-Apr-24	12-May-24
PLMB-T1-V04.2.12.02.3	UE284: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 15: K4 + 740 t	30	23-Jun-24	23-Jul-24
C-6590	W2-UE284: Obras de mejora del espacio público-Sección 15: K4 + 740 a K5 + 110	30	23-Jun-24	23-Jul-24
PLMB-T1-V04.2.12.02.4	UE283: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 16: K5 + 110 t	30	17-Aug-24	16-Sep-24
C-7070	W2-UE283: Obras de mejora del espacio público-Sección 16: K5 + 110 a K5 + 405	30	17-Aug-24	16-Sep-24
PLMB-T1-V04.2.12.02.5	UE282: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 17: K5 + 405 t	30	05-Nov-24	05-Dec-24
C-7850	W2-UE282: Obras de mejora del espacio público-Sección 17: K5 + 405 a K5 + 760	30	05-Nov-24	05-Dec-24
PLMB-T1-V04.2.12.02.6	UE281: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 18: K5 + 760 t	30	26-Jan-25	25-Feb-25
C-8600	W2-UE281: Obras de mejora del espacio público-Sección 18: K5 + 760 a K6 + 170	30	26-Jan-25	25-Feb-25
PLMB-T1-V04.2.12.02.7	UE280: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 19: K6 + 170 t	30	02-Apr-25	02-May-25
C-9650	W2-UE280: Obras de mejora del espacio público-Sección 19: K6 + 170 a K6 + 545	30	02-Apr-25	02-May-25

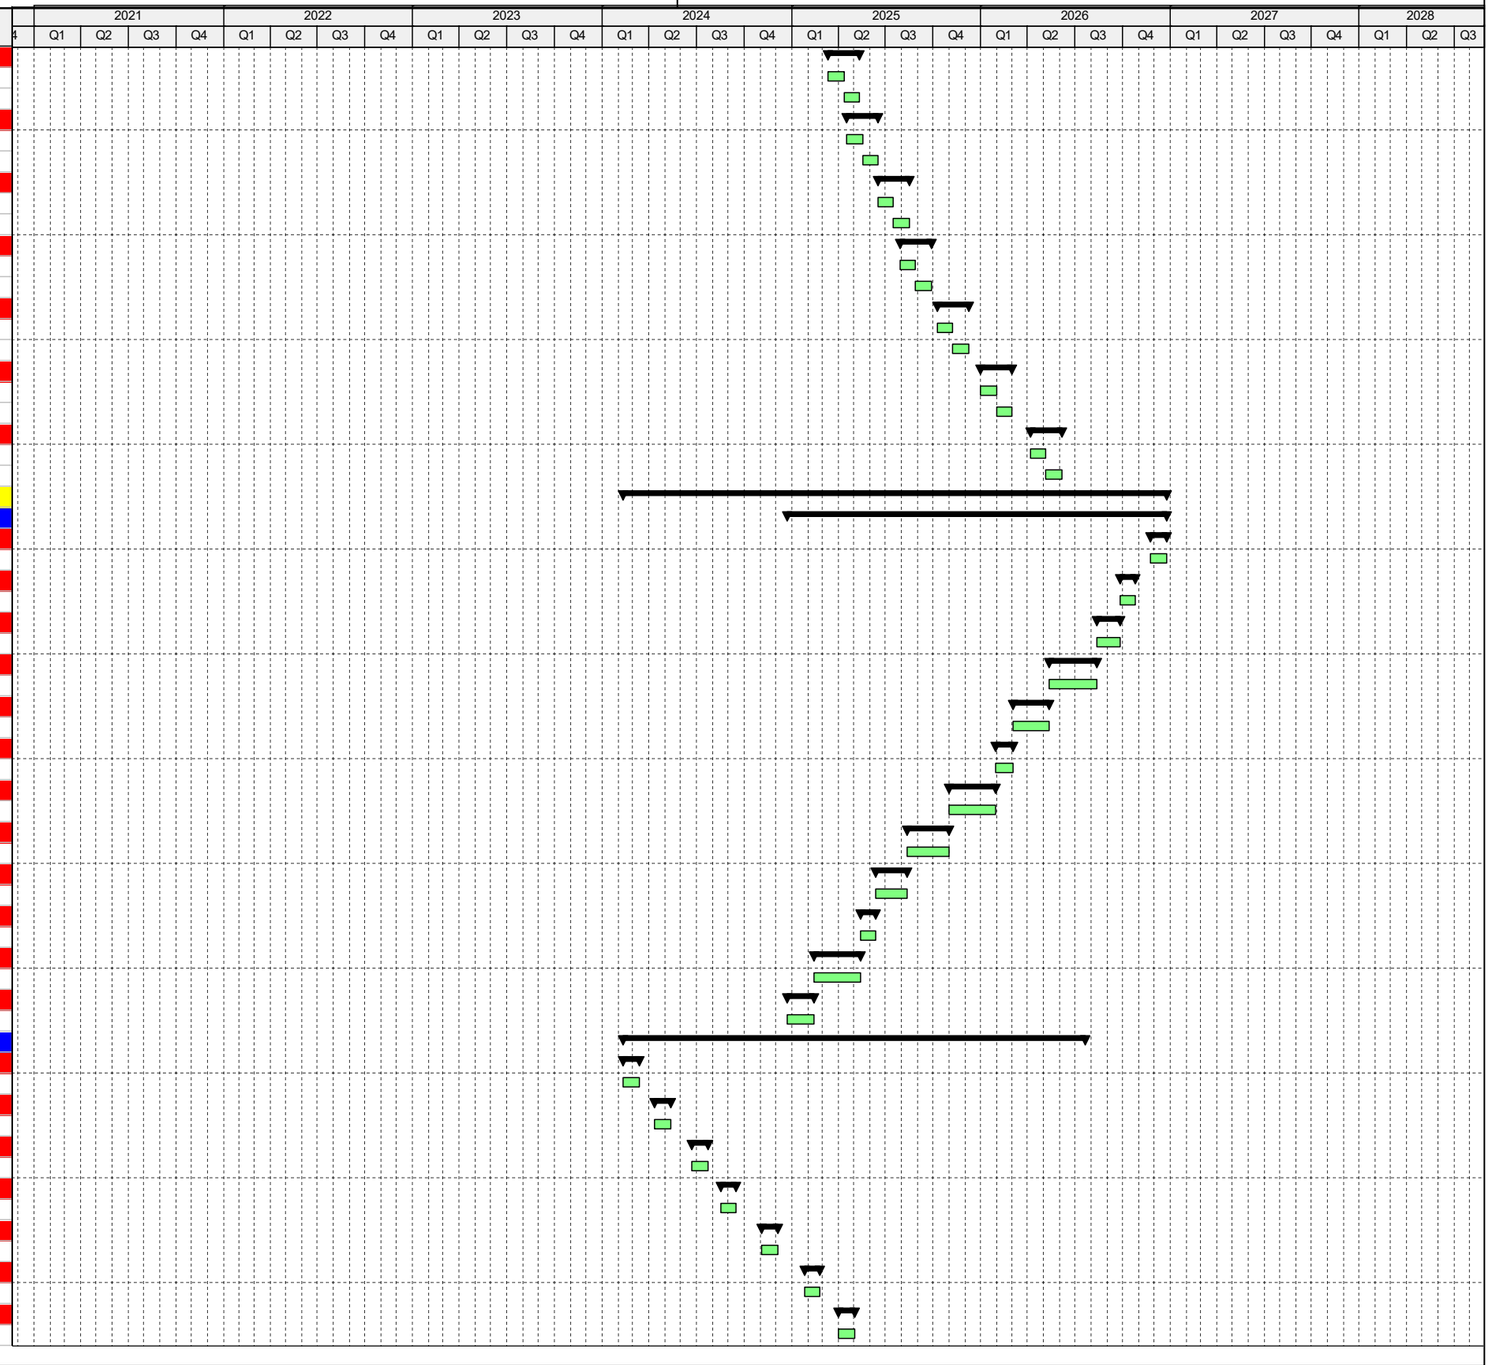

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.2.12.02.8	UE279: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 20: K6 + 545 t	30	01-Jun-25	01-Jul-25
C-10360	W2-UE279: Obras de mejora del espacio público-Sección 20: K6 + 545 a K6 + 760	30	01-Jun-25	01-Jul-25
PLMB-T1-V04.2.12.02.9	UE278: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 21: K6 + 760 t	30	21-Aug-25	20-Sep-25
C-11270	W2-UE278: Obras de mejora del espacio público-Sección 21: K6 + 760 a K7 + 215	30	21-Aug-25	20-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.12.02.10	UE277: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 22: K7 + 215	30	18-Jan-26	17-Feb-26
C-12990	W2-UE277: Obras de mejora del espacio público-Sección 22: K7 + 215 a K7 + 800	30	18-Jan-26	17-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.12.02.11	UE276: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 23: K7 + 800	30	19-Mar-26	18-Apr-26
C-13640	W2-UE276: Obras de mejora del espacio público-Sección 23: K7 + 800 a K8 + 025	30	19-Mar-26	18-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.12.02.12	UE275: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 24: K8 + 025	30	21-Jun-26	21-Jul-26
C-15000	W2-UE275: Obras de mejora del espacio público-Sección 24: K8 + 025 a K8 + 470	30	21-Jun-26	21-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.12.03	W3: Obras de mejoramiento del espacio publico Sec. K8+470 al K12+450	745	11-Jun-24	26-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.12.03.1	UE274: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 25: K8 + 470 t	30	14-Oct-25	13-Nov-25
C-11780	W3-UE274: Obras de mejora del espacio público-Sección 25: K8 + 470 a K8 + 820	30	14-Oct-25	13-Nov-25
PLMB-T1-V04.2.12.03.2	UE273: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 26: K8 + 820 t	30	30-Aug-25	29-Sep-25
C-11370	W3-UE273: Obras de mejora del espacio público-Sección 26: K8 + 820 a K9 + 430	30	30-Aug-25	29-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.12.03.3	UE272: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 27: K9 + 430 t	30	27-May-26	26-Jun-26
C-14850	W3-UE272: Obras de mejora del espacio público-Sección 27: K9 + 430 a K9 + 830	30	27-May-26	26-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.12.03.4	UE271: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 28: K9+ 830 tc	30	14-Apr-25	14-May-25
C-9730	W3-UE271: Obras de mejora del espacio público-Sección 28: K9 + 830 a K10 + 035	30	14-Apr-25	14-May-25
PLMB-T1-V04.2.12.03.5	UE270: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 29: K10+ 035	30	28-Feb-25	30-Mar-25
C-8960	W3-UE270: Obras de mejora del espacio público-Sección 29: K10 + 035 a K10 + 560	30	28-Feb-25	30-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.12.03.6	UE269: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 30: K10+ 560	30	27-Oct-24	26-Nov-24
C-7770	W3-UE269: Obras de mejora del espacio público-Sección 30: K10 + 560 a K10 + 820	30	27-Oct-24	26-Nov-24
PLMB-T1-V04.2.12.03.7	UE268: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 31: K10 + 820	30	27-Sep-24	27-Oct-24
C-7500	W3-UE268: Obras de mejora del espacio público-Sección 31: K10 + 820 a K11 + 440	30	27-Sep-24	27-Oct-24
PLMB-T1-V04.2.12.03.8	UE267: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 32: K11+ 440	30	11-Jun-24	11-Jul-24
C-6530	W3-UE267: Obras de mejora del espacio público-Sección 32: K11 + 440 a K11 + 880	30	11-Jun-24	11-Jul-24
PLMB-T1-V04.2.12.03.9	UE266: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 33: K11+ 880	30	19-Jan-26	18-Feb-26
C-12450	W3-UE266: Obras de mejora del espacio público-Sección 33: K11 + 880 a K12 + 230	30	19-Jan-26	18-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.12.03.10	UE265: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 34: K12 + 23	30	19-Apr-26	19-May-26
C-13780	W3-UE265: Obras de mejora del espacio público-Sección 34: K12 + 230 a K12 + 745	30	19-Apr-26	19-May-26
PLMB-T1-V04.2.12.04	W4: Obras de mejoramiento del espacio publico Sec. K12 + 450 al K16+610	869	02-Jun-24	19-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.12.04.1	UE264: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 35: K12+ 745	90	02-Jun-24	31-Aug-24
C-6510	W4-UE264: Obras de mejora del espacio público-Sección 35: K12 + 745 a K13 + 250	90	02-Jun-24	31-Aug-24
PLMB-T1-V04.2.12.04.2	UE263: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 36: K13+ 250	90	31-Aug-24	29-Nov-24
C-7310	W4-UE263: Obras de mejora del espacio público-Sección 36: K13 + 250 a K13 + 600	90	31-Aug-24	29-Nov-24
PLMB-T1-V04.2.12.04.3	UE262: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 37: K13+ 600	90	29-Nov-24	27-Feb-25
C-7880	W4-UE262: Obras de mejora del espacio público-Sección 37: K13 + 600 a K13 + 990	90	29-Nov-24	27-Feb-25
PLMB-T1-V04.2.12.04.4	UE261: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 38: K13+ 990	80	27-Feb-25	18-May-25
C-8950	W4-UE261: Obras de mejora del espacio público-Sección 38: K13 + 990 a K14 + 620	80	27-Feb-25	18-May-25
PLMB-T1-V04.2.12.04.5	UE260: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 39: K14+ 620	80	18-May-25	06-Aug-25
C-10200	W4-UE260: Obras de mejora del espacio público-Sección 39: K14 + 620 a K15 + 015	80	18-May-25	06-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.12.04.6	UE259: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 40: K15+ 015	80	06-Aug-25	25-Oct-25
C-11220	W4-UE259: Obras de mejora del espacio público-Sección 40: K15 + 015 a K15 + 280	80	06-Aug-25	25-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.12.04.7	UE258: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 41: K15+280 t	80	25-Oct-25	13-Jan-26
C-11920	W4-UE258: Obras de mejora del espacio público-Sección 41: K15 + 280 a K15 + 505	80	25-Oct-25	13-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.12.04.8	UE257: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 42: K15+ 505	80	13-Jan-26	03-Apr-26
C-12930	W4-UE257: Obras de mejora del espacio público-Sección 42: K15 + 505 a K15 + 700	80	13-Jan-26	03-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.12.04.9	UE256: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 43: K15+ 700	80	03-Apr-26	22-Jun-26
C-13990	W4-UE256: Obras de mejora del espacio público-Sección 43: K15 + 700 a K16 + 060	80	03-Apr-26	22-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.12.04.10	UE255: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 44: K16+ 060	60	22-Jun-26	21-Aug-26
C-15040	W4-UE255: Obras de mejora del espacio público-Sección 44: K16 + 060 a K16 + 410	60	22-Jun-26	21-Aug-26
PLMB-T1-V04.2.12.04.11	UE254: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 45: K16+ 410	59	21-Aug-26	19-Oct-26
C-15530	W4-UE254: Obras de mejora del espacio público-Sección 45: K16 + 410 a K16 + 610	59	21-Aug-26	19-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.12.05	W5: Obras de mejoramiento del espacio publico Sec. K16+ 610 al K20+340	765	13-Feb-24	19-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.12.05.1	UE253: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 46: K16+ 610	60	13-Feb-24	13-Apr-24
C-5220	W5-UE253: Obras de mejora del espacio público-Sección 46: K16 + 610 a K17 + 095	60	13-Feb-24	13-Apr-24
PLMB-T1-V04.2.12.05.2	UE252: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 47: K17+ 095	60	28-Apr-24	27-Jun-24
C-5870	W5-UE252: Obras de mejora del espacio público-Sección 47: K17 + 095 a K17 + 330	60	28-Apr-24	27-Jun-24
PLMB-T1-V04.2.12.05.3	UE251: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 48: K17+ 330	60	27-Jul-24	25-Sep-24
C-6880	W5-UE251: Obras de mejora del espacio público-Sección 48: K17 + 330 a K17 + 570	60	27-Jul-24	25-Sep-24
PLMB-T1-V04.2.12.05.4	UE250: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 49: K17+ 570	60	25-Sep-24	24-Nov-24



© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-7450	W5-UE250: Obras de mejora del espacio público-Sección 49: K17 + 570 a K17 + 940	60	25-Sep-24	24-Nov-24
PLMB-T1-V04.2.12.05.5	UE249: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 50: K17+ 940	60	24-Nov-24	23-Jan-25
C-7860	W5-UE249: Obras de mejora del espacio público-Sección 50: K17 + 940 a K18 + 190	60	24-Nov-24	23-Jan-25
PLMB-T1-V04.2.12.05.6	UE248: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 51: K18+ 190	60	24-Mar-25	23-May-25
C-9440	W5-UE248: Obras de mejora del espacio público-Sección 51: K18 + 190 a K18 + 820	60	24-Mar-25	23-May-25
PLMB-T1-V04.2.12.05.7	UE247: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 52: K18+ 820	60	23-May-25	22-Jul-25
C-10260	W5-UE247: Obras de mejora del espacio público-Sección 52: K18 + 820 a K19 + 110	60	23-May-25	22-Jul-25
PLMB-T1-V04.2.12.05.8	UE246: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 53: K19+ 110	60	22-Jul-25	20-Sep-25
C-11030	W5-UE246: Obras de mejora del espacio público-Sección 53: K19 + 110 a K19 + 410	60	22-Jul-25	20-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.12.05.9	UE245: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 54: K19+410 t	60	20-Sep-25	19-Nov-25
C-11550	W5-UE245: Obras de mejora del espacio público-Sección 54: K19 + 410 a K19 + 630	60	20-Sep-25	19-Nov-25
PLMB-T1-V04.2.12.05.10	UE244: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 55: K19+630	60	19-Nov-25	18-Jan-26
C-12120	W5-UE244: Obras de mejora del espacio público-Sección 55: K19 + 630 a K19 + 920	60	19-Nov-25	18-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.12.05.11	UE243: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 56: K19+920	60	18-Jan-26	19-Mar-26
C-13000	W5-UE243: Obras de mejora del espacio público-Sección 56: K19 + 920 a K20 + 340	60	18-Jan-26	19-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.12.06	W6: Obras de mejoramiento del espacio publico Sec.K20 + 340 al K23+864	641	03-Oct-24	06-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.12.06.1	UE242: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 57: K20+ 340	30	03-Oct-24	02-Nov-24
C-7570	W6-UE242: Obras de mejora del espacio público-Sección 57: K20 + 340 a K20 + 800	30	03-Oct-24	02-Nov-24
PLMB-T1-V04.2.12.06.2	UE241: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 58: K20+ 800	30	09-Dec-24	08-Jan-25
C-7930	W6-UE241: Obras de mejora del espacio público-Sección 58: K20 + 800 a K21 + 215	30	09-Dec-24	08-Jan-25
PLMB-T1-V04.2.12.06.3	UE240: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 59: K21+ 215	30	08-Feb-25	10-Mar-25
C-8680	W6-UE240: Obras de mejora del espacio público-Sección 59: K21 + 215 a K21 + 555	30	08-Feb-25	10-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.12.06.4	UE239: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 60: K21+ 555	30	12-Apr-25	12-May-25
C-9700	W6-UE239: Obras de mejora del espacio público-Sección 60: K21 + 555 a K21 + 840	30	12-Apr-25	12-May-25
PLMB-T1-V04.2.12.06.5	UE238: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 61: K21+ 840	30	18-May-25	17-Jun-25
C-10210	W6-UE238: Obras de mejora del espacio público-Sección 61: K21 + 840 a K22 + 040	30	18-May-25	17-Jun-25
PLMB-T1-V04.2.12.06.6	UE237: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 62: K22+ 040	30	17-Jul-25	16-Aug-25
C-10960	W6-UE237: Obras de mejora del espacio público-Sección 62: K22 + 040 a K22 + 350	30	17-Jul-25	16-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.12.06.7	UE236: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 63: K22+ 350	30	28-Aug-25	27-Sep-25
C-11350	W6-UE236: Obras de mejora del espacio público-Sección 63: K22 + 350 a K22 + 560	30	28-Aug-25	27-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.12.06.8	UE235: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 64: K22+ 560	30	08-Nov-25	08-Dec-25
C-12060	W6-UE235: Obras de mejora del espacio público-Sección 64: K22 + 560 a K22 + 980	30	08-Nov-25	08-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.12.06.9	UE234: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 65: K22+ 980	30	21-Jan-26	20-Feb-26
C-13020	W6-UE234: Obras de mejora del espacio público-Sección 65: K22 + 980 a K23 + 380	30	21-Jan-26	20-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.12.06.10	UE233: Obras de Mejoramiento del espacio público - Sección 66: K23+380	30	06-Jun-26	06-Jul-26
C-14910	W6-UE233: Obras de mejora del espacio público-Sección 66: K23 + 380 a K23 + 864	30	06-Jun-26	06-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.13	Malla Vial existente Est.7 - Estructura, Cimentaciones, Columnas/ intersección de	1010	08-Jan-23	14-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.13.01	UE299:Estación 7 - Puente costado norte - Estructura, Cimentaciones, Columnas	480	03-Mar-24	26-Jun-25
C-5360	UE299: Proyecto del puente del lado norte de la estación 7 (incluida la demolición orig	480	03-Mar-24	26-Jun-25
PLMB-T1-V04.2.13.02	UE300:Estación 7 - Puente Lado Norte - Tableros y obras Complementarias	120	16-Jun-25	14-Oct-25
C-10470	UE300: Puente costado norte - Tableros y obras complementarias.	120	16-Jun-25	14-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.13.03	UE301:Estación 7 - Estructura, Cimentaciones, Columnas puente Vehicular	360	09-Mar-23	03-Mar-24
C-2980	UE301: Proyecto del puente del lado sur de la estación 7	360	09-Mar-23	03-Mar-24
PLMB-T1-V04.2.13.04	UE302:Estación 7 - Lado Sur Puente - Tableros y obras Complementarias	500	08-Jan-23	22-May-24
C-2360	Manejo PMT requerido para la construcción de puentes Av.68	60	08-Jan-23	09-Mar-23
C-5270	UE302: Estación 7-Sistema de plataforma de puente del lado sur y obras auxiliares	90	22-Feb-24	22-May-24
PLMB-T1-V04.2.13.05	UE303: Adecucion Malla vial - Estructuras intersecciones Viales Calle13	420	02-Aug-23	25-Sep-24
C-3950	UE303-Calle13 UAP -Varios permisos ambientales .: construccion, equipo. y otros tipo:	60	02-Aug-23	01-Oct-23
C-4310	UE303-Calle13 UAP - Construcción	330	01-Oct-23	26-Aug-24
C-7150	UE303-Calle13 UAP - Aceptación, abierta al tráfico	30	26-Aug-24	25-Sep-24
PLMB-T1-V04.2.14	Insfraestructura Vial - Superestructura de via férrea	583	13-Jun-25	17-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.14.01	W1- Insfraestructura Vial - Superestructura de via férrea Seccion - K0+000 to K4+	391	06-Oct-25	01-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.14.01.01	UE505:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 1:K0+000 a K0+	58	04-Sep-26	01-Nov-26
C-15660	W1-UE505-Puente elevado sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	30	04-Sep-26	04-Oct-26
C-15890	W1-UE505-Soldadura de carril-vía sin balasto de puente elevado; Alivio y bloqueo de t	28	04-Oct-26	01-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.14.01.02	UE504:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 2: K0+300 a K0+	58	07-Aug-26	04-Oct-26
C-15380	W1-UE504-Puente Elevado sin balasto construcción de lecho de vía sin balasto.	28	07-Aug-26	04-Sep-26
C-15670	W1-UE504-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten:	28	06-Sep-26	04-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.14.01.03	UE503:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 3:K0+650 a K1+	58	10-Jul-26	06-Sep-26
C-15170	W1-UE503-Puente Elevado sin balasto construcción de lecho de vía sin balasto.	28	10-Jul-26	07-Aug-26
C-15410	W1-UE503-Puente elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tens	28	09-Aug-26	06-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.14.01.04	UE502:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 4: K1+030 a K1	58	12-Jun-26	09-Aug-26

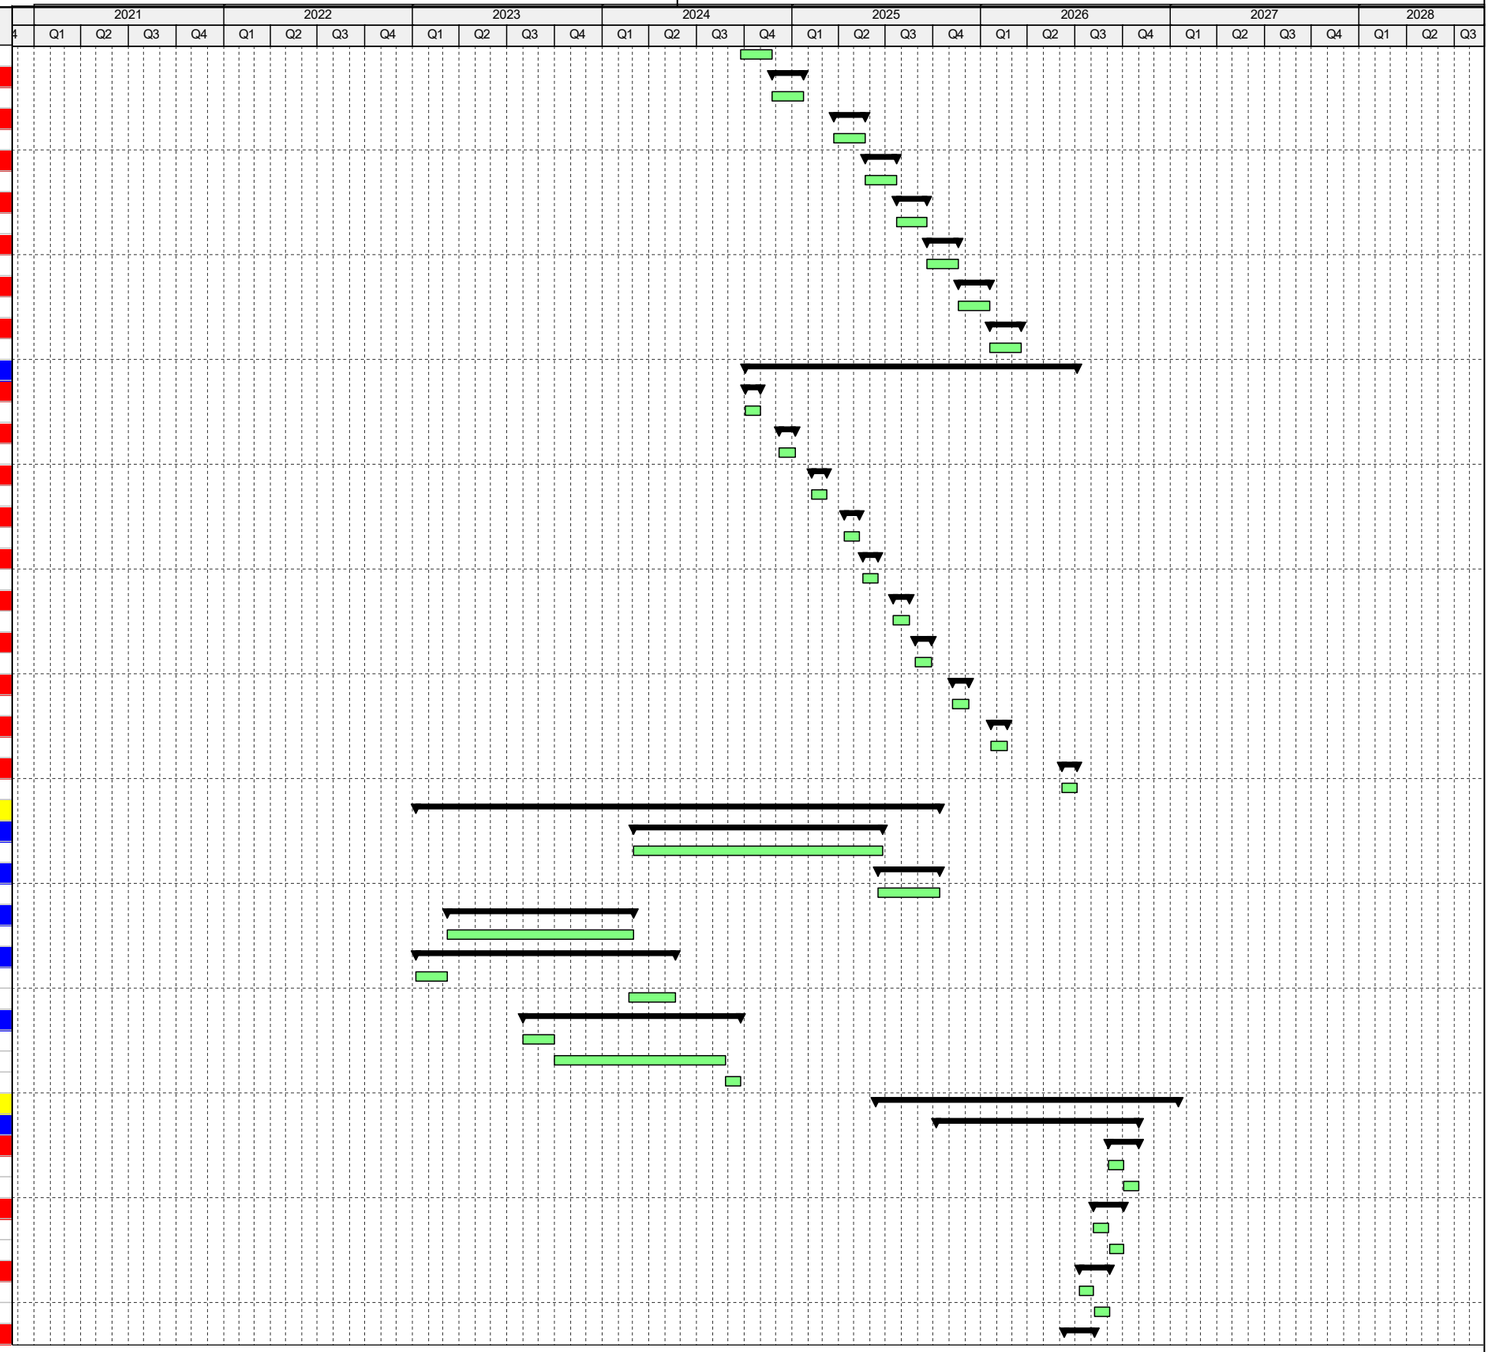

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-14930	W1-UE502-Puente Elevado sin balasto construcción de lecho de vía sin balasto.	28	12-Jun-26	10-Jul-26
C-15200	W1-UE502-Puente Elevado soldadura carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensión	28	12-Jul-26	09-Aug-26
PLMB-T1-V04.2.14.01.05	UE501:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 5: K1+340 a K1	58	15-May-26	12-Jul-26
C-14590	W1-UE501-Puente elevado sin balasto Construcción de lecho de pista sin balasto	28	15-May-26	12-Jun-26
C-14940	W1-UE501-Soldadura de carril-vía sin balasto de puente elevado; Alivio y bloqueo de t	28	14-Jun-26	12-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.14.01.06	UE500:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 6: K1+600 a K2	58	17-Apr-26	14-Jun-26
C-14110	W1-UE500-Puente elevado sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	28	17-Apr-26	15-May-26
C-14620	W1-UE500-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	28	17-May-26	14-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.14.01.07	UE499:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 7: K2+050 a K2	58	20-Mar-26	17-May-26
C-13650	W1-UE499-Puente Elevado sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	28	20-Mar-26	17-Apr-26
C-14120	W1-UE499-Puente Elevado de soldadura vía-carril sin balasto; Alivio y bloqueo de tens	28	19-Apr-26	17-May-26
PLMB-T1-V04.2.14.01.08	UE498:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 8: K2+480 a K2	58	20-Feb-26	19-Apr-26
C-13280	W1-UE498-Puente elevado sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	28	20-Feb-26	20-Mar-26
C-13670	W1-UE498-Puente Elevado de soldadura vía-carril sin balasto; Alivio y bloqueo de tens	28	22-Mar-26	19-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.14.01.09	UE497:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 9: K2+790 to K	58	23-Jan-26	22-Mar-26
C-13070	W1-UE497-Puente elevado sin balasto construcción de plataforma sin balasto	28	23-Jan-26	20-Feb-26
C-13320	W1-UE497-Puente Elevado de soldadura vía-carril sin balasto; Alivio y bloqueo de tens	28	22-Feb-26	22-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.14.01.10	UE496:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 10: K3+040 to K	58	26-Dec-25	22-Feb-26
C-12750	W1-UE496-Puente Elevado sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	28	26-Dec-25	23-Jan-26
C-13090	W1-UE496-Puente Elevado de soldadura vía-carril sin balasto; Alivio y bloqueo de tens	28	25-Jan-26	22-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.14.01.11	UE495:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 11: K 3+440 to K	58	28-Nov-25	25-Jan-26
C-12160	W1-UE495-Puente Elevado sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	28	28-Nov-25	26-Dec-25
C-12760	W1-UE495-Puente Elevado de soldadura vía-carril sin balasto; Alivio y bloqueo de tens	28	28-Dec-25	25-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.14.01.12	UE494:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 12: K3+760 to K	83	06-Oct-25	28-Dec-25
C-11720	W1-UE494-Puente Elevado sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	53	06-Oct-25	28-Nov-25
C-12170	W1-UE494-Puente Elevado de soldadura vía-carril sin balasto; Alivio y bloqueo de tens	30	28-Nov-25	28-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.14.02	W2 - Insfraestructura Vial - Superestructura de via férrea Sección -K4+050 to K8	380	02-Jan-26	17-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.14.02.01	UE493:Balasto pista /Superestructura via ferrea /Infraestructura vialducto 1	76	02-Jan-26	19-Mar-26
C-12820	W2-UE493-Puente Elevado sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	51	02-Jan-26	22-Feb-26
C-13330	W2-UE493-Puente elevador Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	25	22-Feb-26	19-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.14.02.02	UE492:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 14: K4+480 to K	65	22-Feb-26	28-Apr-26
C-13340	W2-UE492-Puente Elevado sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	35	22-Feb-26	29-Mar-26
C-13880	W2-UE492-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	29-Mar-26	28-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.14.02.03	UE491:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 15: K4+740 to K	55	29-Mar-26	23-May-26
C-13890	W2-UE491-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	29-Mar-26	28-Apr-26
C-14350	W2-UE491-Puente elevador Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	25	28-Apr-26	23-May-26
PLMB-T1-V04.2.14.02.04	UE490:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 16: K5+110 to K	55	28-Apr-26	22-Jun-26
C-14360	W2-UE490-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	28-Apr-26	28-May-26
C-14860	W2-UE490-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	25	28-May-26	22-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.14.02.05	UE489:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 17: K5+405 to K	55	28-May-26	22-Jul-26
C-14870	W2-UE489-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	28-May-26	27-Jun-26
C-15100	W2-UE489-Puente Elevado soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tens	25	27-Jun-26	22-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.14.02.06	UE488:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 18: K5+760 to K	55	27-Jun-26	21-Aug-26
C-15110	W2-UE488-Elevat. Puente sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	30	27-Jun-26	27-Jul-26
C-15340	W2-UE488-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	25	27-Jul-26	21-Aug-26
PLMB-T1-V04.2.14.02.07	UE487:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 19: K6+170 to K	50	27-Jul-26	15-Sep-26
C-15350	W2-UE487-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	25	27-Jul-26	21-Aug-26
C-15540	W2-UE487-Puente elevador Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	25	21-Aug-26	15-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.14.02.08	UE486:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 20: K6+545 to K	50	21-Aug-26	10-Oct-26
C-15550	W2-UE486-Elevat. Puente sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	25	21-Aug-26	15-Sep-26
C-15710	W2-UE486-Puente Elevado soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tens	25	15-Sep-26	10-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.14.02.09	UE485:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 21: K6+760 to K	50	15-Sep-26	04-Nov-26
C-15720	W2-UE485-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	25	15-Sep-26	10-Oct-26
C-15900	W2-UE485-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	25	10-Oct-26	04-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.14.02.10	UE484:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 22: K7+215 to K	50	10-Oct-26	29-Nov-26
C-15910	W2-UE484-Puente elevado sin balasto construcción de plataforma sin balasto	25	10-Oct-26	04-Nov-26
C-16070	W2-UE484-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	25	04-Nov-26	29-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.14.02.11	UE483:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 23: K7+800 to K	50	04-Nov-26	24-Dec-26
C-16080	W2-UE483-Puente Elevado sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	25	04-Nov-26	29-Nov-26
C-16180	W2-UE483-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	25	29-Nov-26	24-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.14.02.12	UE482:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 24: K8+025 to K	49	29-Nov-26	17-Jan-27
C-16190	W2-UE482-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	25	29-Nov-26	24-Dec-26




© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-16270	W2-UE482-Elevat. puente de soldadura vía-carril sin balasto; Alivio y bloqueo de tensió	24	24-Dec-26	17-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.14.03	W3- Insfraestructura Vial - Superestructura de via férrea Sección -K8+470 to K12+	561	13-Jun-25	26-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.14.03.01	UE481:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 25: K8+470 to K	90	17-Aug-26	15-Nov-26
C-15240	W3-UE481-Puente elevado sin balasto construcción de plataforma sin balasto	60	17-Aug-26	16-Oct-26
C-15750	W3-UE481-Puente Elevado de soldadura vía-carril sin balasto; Alivio y bloqueo de tens	30	16-Oct-26	15-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.14.03.02	UE480:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 26: K8+820 to K	90	18-Jun-26	16-Sep-26
C-14790	W3-UE480-Puente elevado sin balasto construcción de plataforma sin balasto	60	18-Jun-26	17-Aug-26
C-15250	W3-UE480-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	17-Aug-26	16-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.14.03.03	UE479:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 27: K9+430 to K	71	16-Oct-26	26-Dec-26
C-15760	W3-UE479-Puente elevado sin balasto construcción de plataforma sin balasto	40	16-Oct-26	25-Nov-26
C-16060	W3-UE479-Puente elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	31	25-Nov-26	26-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.14.03.04	UE478:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 28: K9+830 to K	60	26-Oct-25	25-Dec-25
C-11930	W3-UE478-Puente elevado sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	26-Oct-25	25-Nov-25
C-12150	W3-UE478-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	25-Nov-25	25-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.14.03.05	UE477:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 29: K10+035 a	60	26-Sep-25	25-Nov-25
C-11620	W3-UE477-Puente elevado sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	26-Sep-25	26-Oct-25
C-11940	W3-UE477-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	26-Oct-25	25-Nov-25
PLMB-T1-V04.2.14.03.06	UE476:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 30: K10+560 a	60	27-Aug-25	26-Oct-25
C-11320	W3-UE476-Puente elevado sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	27-Aug-25	26-Sep-25
C-11630	W3-UE476-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	26-Sep-25	26-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.14.03.07	UE475:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 31: K10+820 a	60	28-Jul-25	26-Sep-25
C-11110	W3-UE475-Puente elevado sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	28-Jul-25	27-Aug-25
C-11330	W3-UE475-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	27-Aug-25	26-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.14.03.08	UE474:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 32: K11+440 a	75	13-Jun-25	27-Aug-25
C-10450	W3-UE474-Puente elevado sin balasto construcción de plataforma sin balasto	45	13-Jun-25	28-Jul-25
C-11120	W3-UE474-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	28-Jul-25	27-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.14.03.09	UE473:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 33: K11+880 a	90	18-Feb-26	19-May-26
C-13040	W3-UE473-Puente Elevado sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	60	18-Feb-26	19-Apr-26
C-13790	W3-UE473-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	19-Apr-26	19-May-26
PLMB-T1-V04.2.14.03.10	UE472:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 34: K12+230 a	90	19-Apr-26	18-Jul-26
C-13800	W3-UE472-Puente elevado sin balasto construcción de plataforma sin balasto	60	19-Apr-26	18-Jun-26
C-14800	W3-UE472-Puente Elevado soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tens	30	18-Jun-26	18-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.14.04	W4-Insfraestructura Vial - Superestructura de via férrea Sección - K12+450 a K1	435	10-Oct-25	19-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.14.04.01	UE471:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 35: K12 +745 a	90	10-Oct-25	08-Jan-26
C-11760	W4-UE471-Puente elevado sin balasto construcción de plataforma sin balasto	60	10-Oct-25	09-Dec-25
C-12350	W4-UE471-Puente Elevado de soldadura vía-carril sin balasto; Alivio y bloqueo de tens	30	09-Dec-25	08-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.14.04.02	UE470:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 36: K13+250 a	75	08-Jan-26	24-Mar-26
C-12840	W4-UE470-Puente Elevado sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	45	08-Jan-26	22-Feb-26
C-13350	W4-UE470-Puente Elevado Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	22-Feb-26	24-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.14.04.03	UE469:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 37: K13+600 a	60	22-Feb-26	23-Apr-26
C-13360	W4-UE469-Elevat. Puente sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	30	22-Feb-26	24-Mar-26
C-13850	W4-UE469-Elevat. puente de soldadura vía-carril sin balasto; Alivio y bloqueo de tensió	30	24-Mar-26	23-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.14.04.04	UE468:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 38: K13+990 a	60	24-Mar-26	23-May-26
C-13860	W4-UE468-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	24-Mar-26	23-Apr-26
C-14290	W4-UE468-Elevat.bridge Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensión	30	23-Apr-26	23-May-26
PLMB-T1-V04.2.14.04.05	UE467:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 39: K14+620 a	60	23-Apr-26	22-Jun-26
C-14300	W4-UE467-Elevate.bridge construcción de plataforma sin balasto sin balasto	30	23-Apr-26	23-May-26
C-14820	W4-UE467-Puente elevador Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	23-May-26	22-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.14.04.06	UE466:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 40: K15+015 a	60	23-May-26	22-Jul-26
C-14830	W4-UE466-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	23-May-26	22-Jun-26
C-15050	W4-UE466-Puente elevador Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	22-Jun-26	22-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.14.04.07	UE465:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 41: K15+280 a	60	22-Jun-26	21-Aug-26
C-15060	W4-UE465-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	22-Jun-26	22-Jul-26
C-15270	W4-UE465-Elevat.bridge Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensión	30	22-Jul-26	21-Aug-26
PLMB-T1-V04.2.14.04.08	UE464:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 42: K15+505 to	60	22-Jul-26	20-Sep-26
C-15280	W4-UE464-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	22-Jul-26	21-Aug-26
C-15560	W4-UE464-Elevat.bridge Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensión	30	21-Aug-26	20-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.14.04.09	UE463:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 43: K15+700 to	60	21-Aug-26	20-Oct-26
C-15570	W4-UE463-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	21-Aug-26	20-Sep-26
C-15800	W4-UE463-Puente elevador Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	20-Sep-26	20-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.14.04.10	UE462:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 44: K16+060 to	60	20-Sep-26	19-Nov-26
C-15810	W4-UE462-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	20-Sep-26	20-Oct-26




© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-15960	W4-UE462-Elevat.bridge soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensión	30	20-Oct-26	19-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.14.04.11	UE461:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 45: K16+410 to	60	20-Oct-26	19-Dec-26
C-15970	W4-UE461-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	20-Oct-26	19-Nov-26
C-16130	W4-UE461-Puente elevador Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	19-Nov-26	19-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.14.05	W5-Insfraestructura Vial - Superestructura de via férrea Sección - K16+610 to K2	369	13-Jan-26	17-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.14.05.01	UE460:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 46: K16+610 a	75	13-Jan-26	29-Mar-26
C-12940	W5-UE460-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	45	13-Jan-26	27-Feb-26
C-13380	W5-UE460-Elevat. puente de soldadura vía-carril sin balasto; Alivio y bloqueo de tensi	30	27-Feb-26	29-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.14.05.02	UE459:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 47: K17+095 a	60	27-Feb-26	28-Apr-26
C-13390	W5-UE459-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	27-Feb-26	29-Mar-26
C-13900	W5-UE459-Puente elevador Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	29-Mar-26	28-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.14.05.03	UE458:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 48: K17+330 a	60	29-Mar-26	28-May-26
C-13910	W5-UE458-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	29-Mar-26	28-Apr-26
C-14370	W5-UE458-Elevat.bridge Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensió	30	28-Apr-26	28-May-26
PLMB-T1-V04.2.14.05.04	UE457:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 49: K17+570 a	60	28-Apr-26	27-Jun-26
C-14380	W5-UE457-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	28-Apr-26	28-May-26
C-14880	W5-UE457-Puente elevador Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	28-May-26	27-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.14.05.05	UE456:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 50: K17+940 a	60	28-May-26	27-Jul-26
C-14890	W5-UE456-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	28-May-26	27-Jun-26
C-15120	W5-UE456-Elevat.bridge Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensió	30	27-Jun-26	27-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.14.05.06	UE455:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 51: K18+190 a	60	27-Jun-26	26-Aug-26
C-15130	W5-UE455-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	27-Jun-26	27-Jul-26
C-15360	W5-UE455-Elevat.bridge Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensió	30	27-Jul-26	26-Aug-26
PLMB-T1-V04.2.14.05.07	UE454:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 52: K18+820 to	60	27-Jul-26	25-Sep-26
C-15370	W5-UE454-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	27-Jul-26	26-Aug-26
C-15590	W5-UE454-Elevat.bridge Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensió	30	26-Aug-26	25-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.14.05.08	UE453:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 53: K19+110 to	60	26-Aug-26	25-Oct-26
C-15600	W5-UE453-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	26-Aug-26	25-Sep-26
C-15830	W5-UE453-Puente elevador Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	25-Sep-26	25-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.14.05.09	UE452:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 54: K19+410 to	60	25-Sep-26	24-Nov-26
C-15840	W5-UE452-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	25-Sep-26	25-Oct-26
C-16000	W5-UE452-Elevat.bridge soldadura carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensión de	30	25-Oct-26	24-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.14.05.10	UE451:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 55: K19+630 to	60	25-Oct-26	24-Dec-26
C-16010	W5-UE451-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	25-Oct-26	24-Nov-26
C-16150	W5-UE451-Puente elevador Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de ten	30	24-Nov-26	24-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.14.05.11	UE450:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 56: K19+920 to	54	24-Nov-26	17-Jan-27
C-16160	W5-UE450-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	24-Nov-26	24-Dec-26
C-16280	W5-UE450-Elevat.bridge Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensió	24	24-Dec-26	17-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.14.06	W6-Insfraestructura Vial - Superestructura de via férrea Sección - K20+340 to K2	330	21-Jan-26	17-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.14.06.01	UE449:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 57: K20+340 to	60	21-Jan-26	22-Mar-26
C-13030	W6-UE449-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	21-Jan-26	20-Feb-26
C-13290	W6-UE449-Elevat.bridge Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensió	30	20-Feb-26	22-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.14.06.02	UE448:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 58: K20+800 to	60	20-Feb-26	21-Apr-26
C-13300	W6-UE448-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	20-Feb-26	22-Mar-26
C-13680	W6-UE448-Elevat.bridge Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensió	30	22-Mar-26	21-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.14.06.03	UE447:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 59: K21+215 to	60	22-Mar-26	21-May-26
C-13690	W6-UE447-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	22-Mar-26	21-Apr-26
C-14140	W6-UE447-Elevat.bridge Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensió	30	21-Apr-26	21-May-26
PLMB-T1-V04.2.14.06.04	UE446:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 60: K21+555 to	60	21-Apr-26	20-Jun-26
C-14150	W6-UE446-Elevat. Puente sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	30	21-Apr-26	21-May-26
C-14630	W6-UE446-Elevat.bridge Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensió	30	21-May-26	20-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.14.06.05	UE445:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 61: K21+840 to	60	21-May-26	20-Jul-26
C-14640	W6-UE445-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	21-May-26	20-Jun-26
C-14980	W6-UE445-Elevat. puente de soldadura vía-carril sin balasto; Alivio y bloqueo de tensi	30	20-Jun-26	20-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.14.06.06	UE444:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 62: K22+040 to	60	20-Jun-26	19-Aug-26
C-14990	W6-UE444-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	20-Jun-26	20-Jul-26
C-15220	W6-UE444-Elevat.bridge Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensió	30	20-Jul-26	19-Aug-26
PLMB-T1-V04.2.14.06.07	UE443:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 63: K22+350 to	60	20-Jul-26	18-Sep-26
C-15230	W6-UE443-Elevat. Puente sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	30	20-Jul-26	19-Aug-26
C-15500	W6-UE443-Elevat.bridge Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensió	30	19-Aug-26	18-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.14.06.08	UE442:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 64: K22+560 to	60	19-Aug-26	18-Oct-26
C-15510	W6-UE442-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	19-Aug-26	18-Sep-26

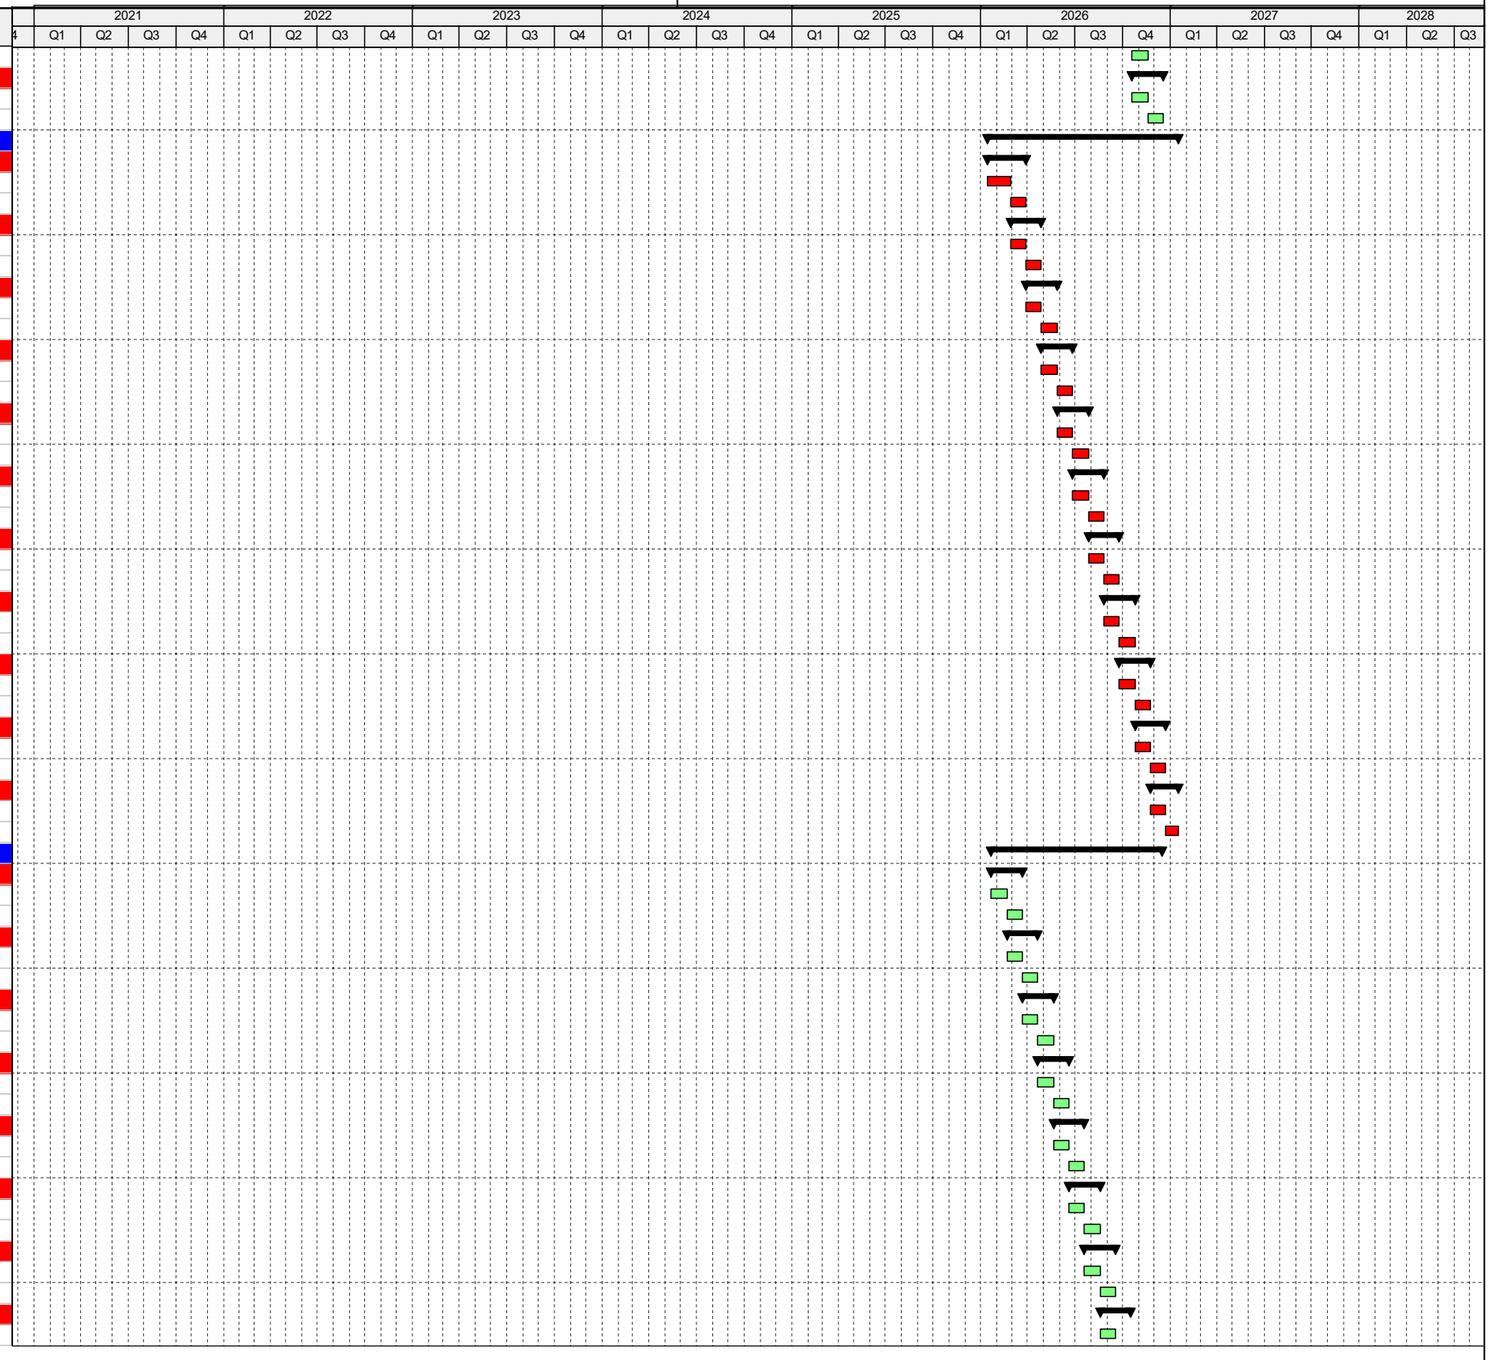


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-15730	W6-UE442-Elevat.bridge soldadura carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensión de	30	18-Sep-26	18-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.14.06.09	UE441:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 65: K22+980 to	60	18-Sep-26	17-Nov-26
C-15740	W6-UE441-Elevat. Puente sin balasto Construcción de lecho de vía sin balasto	30	18-Sep-26	18-Oct-26
C-15930	W6-UE441-Elevat. puente de soldadura vía-carril sin balasto; Alivio y bloqueo de tensió	30	18-Oct-26	17-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.14.06.10	UE440:Insfraestructura Vial - Superestructura de via ferrea 66: K23+380 to	60	18-Oct-26	17-Dec-26
C-15940	W6-UE440-Puente elevador sin balasto construcción de plataforma sin balasto	30	18-Oct-26	17-Nov-26
C-16100	W6-UE440-Elevat.bridge Soldadura de carril-vía sin balasto; Alivio y bloqueo de tensió	30	17-Nov-26	17-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.15	Patio y talleres - Equipos	871	26-Apr-25	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.15.1	UE377:Suministro del 50% de acuerdo al AT8	180	04-Oct-25	02-Apr-26
C-11640	UE377-equipo pesado	180	04-Oct-25	02-Apr-26
C-11650	Equipamiento ferroviario específico UE377	180	04-Oct-25	02-Apr-26
C-11660	UE377-Equipo de taller estándar	180	04-Oct-25	02-Apr-26
C-11670	UE377-equipo personal común	180	04-Oct-25	02-Apr-26
C-11680	UE377-Equipamiento especial	180	04-Oct-25	02-Apr-26
C-11690	UE377-Otros equipos	180	04-Oct-25	02-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.15.2	UE378: Suministro del 50% de acuerdo al AT8	180	02-Apr-26	29-Sep-26
C-13930	UE378-equipo pesado	180	02-Apr-26	29-Sep-26
C-13940	Equipamiento ferroviario específico UE378	180	02-Apr-26	29-Sep-26
C-13950	Equipo de taller estándar UE378	180	02-Apr-26	29-Sep-26
C-13960	UE378-equipo personal común	180	02-Apr-26	29-Sep-26
C-13970	UE378-Equipamiento especial	180	02-Apr-26	29-Sep-26
C-13980	UE378-Otros equipos	180	02-Apr-26	29-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.15.3	UE379: Instalacion de equipos en patios y talleres de acuerdo al AT8	270	22-May-26	16-Feb-27
C-14730	UE379-Instalación de equipo pesado	270	22-May-26	16-Feb-27
C-14740	Instalación de equipos ferroviarios específicos de UE379	270	22-May-26	16-Feb-27
C-14750	Instalación de equipo de taller estándar UE379	270	22-May-26	16-Feb-27
C-14760	UE379-Instalación de equipo personal común	270	22-May-26	16-Feb-27
C-14770	UE379-Instalación de equipos especiales	270	22-May-26	16-Feb-27
C-14780	UE379-Instalación de otros equipos	270	22-May-26	16-Feb-27
PLMB-T1-V04.2.15.4	UE380: Pruebas equipos patio taller de acuerdo al AT8	210	16-Feb-27	14-Sep-27
C-16450	Depuración única de dispositivo UE380	90	16-Feb-27	17-May-27
C-16590	Depuración conjunta de dispositivos UE380	120	17-May-27	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.15.5	UE381: Estructura via, suministro e instalacion de acuerdo al AT8	351	26-Apr-25	12-Apr-26
C-9800	Construcción de pistas de prueba	151	26-Apr-25	24-Sep-25
C-11580	Construcción de otras vías en Patio taller	200	24-Sep-25	12-Apr-26
C-12870	Equipo de accesorios de carril incluyendo letreros de líneas y señales, instalaciones de	90	12-Jan-26	12-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.16	Sistema Poder-Equipo	1463	05-Sep-23	07-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.16.01	SER-Sub Estaciónes Receptoras	1174	05-Sep-23	22-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.16.01.01	UE382: SER-Suministro de equipos sub estaciones 1/3 (30%)	300	05-Sep-23	01-Jul-24
C-4110	UE382-115kV GIS y equipos relacionados	300	05-Sep-23	01-Jul-24
C-4120	Equipo transformador UE382	300	05-Sep-23	01-Jul-24
C-4130	Equipo de distribución de media tensión UE382-34.5kV y equipos relacionados	300	05-Sep-23	01-Jul-24
C-4140	UE382-Protección de relés de subestación e instalación del sistema de automatizaciór	300	05-Sep-23	01-Jul-24
C-4150	UE382-Equipo de control de calidad de energía	300	05-Sep-23	01-Jul-24
C-4160	UE382-Cable y accesorios	300	05-Sep-23	01-Jul-24
C-4170	UE382-Otros equipos	300	05-Sep-23	01-Jul-24
PLMB-T1-V04.2.16.01.02	UE383: SER-Suministro de equipos sub estaciones 2/3 (35%)	240	01-Jul-24	26-Feb-25
C-6660	UE383-115kV GIS y equipos relacionados	240	01-Jul-24	26-Feb-25
C-6670	Equipo transformador UE383	240	01-Jul-24	26-Feb-25
C-6680	Equipo de distribución de media tensión UE383-34.5kV y equipos relacionados	240	01-Jul-24	26-Feb-25
C-6690	UE383-Protección de relés de subestación e instalación del sistema de automatizaciór	240	01-Jul-24	26-Feb-25
C-6700	UE383-Equipo de control de calidad de energía	240	01-Jul-24	26-Feb-25
C-6710	UE383-Cable y accesorios	240	01-Jul-24	26-Feb-25
C-6720	UE383-Otros equipos	240	01-Jul-24	26-Feb-25
PLMB-T1-V04.2.16.01.03	UE384: SER-Suministro de equipos sub estaciones 3/3 (35%)	150	26-Feb-25	26-Jul-25
C-8820	UE384-115kV GIS y equipos relacionados	150	26-Feb-25	26-Jul-25
C-8830	Equipo transformador UE384	150	26-Feb-25	26-Jul-25
C-8840	Equipo de distribución de media tensión UE384-34.5kV y equipos relacionados	150	26-Feb-25	26-Jul-25
C-8850	UE384-Protección de relés de subestación e instalación del sistema de automatizaciór	150	26-Feb-25	26-Jul-25
C-8860	UE384-Equipo de control de calidad de energía	150	26-Feb-25	26-Jul-25
C-8870	UE384-cable y accesorios	150	26-Feb-25	26-Jul-25
C-8880	UE384-Otros equipos	150	26-Feb-25	26-Jul-25

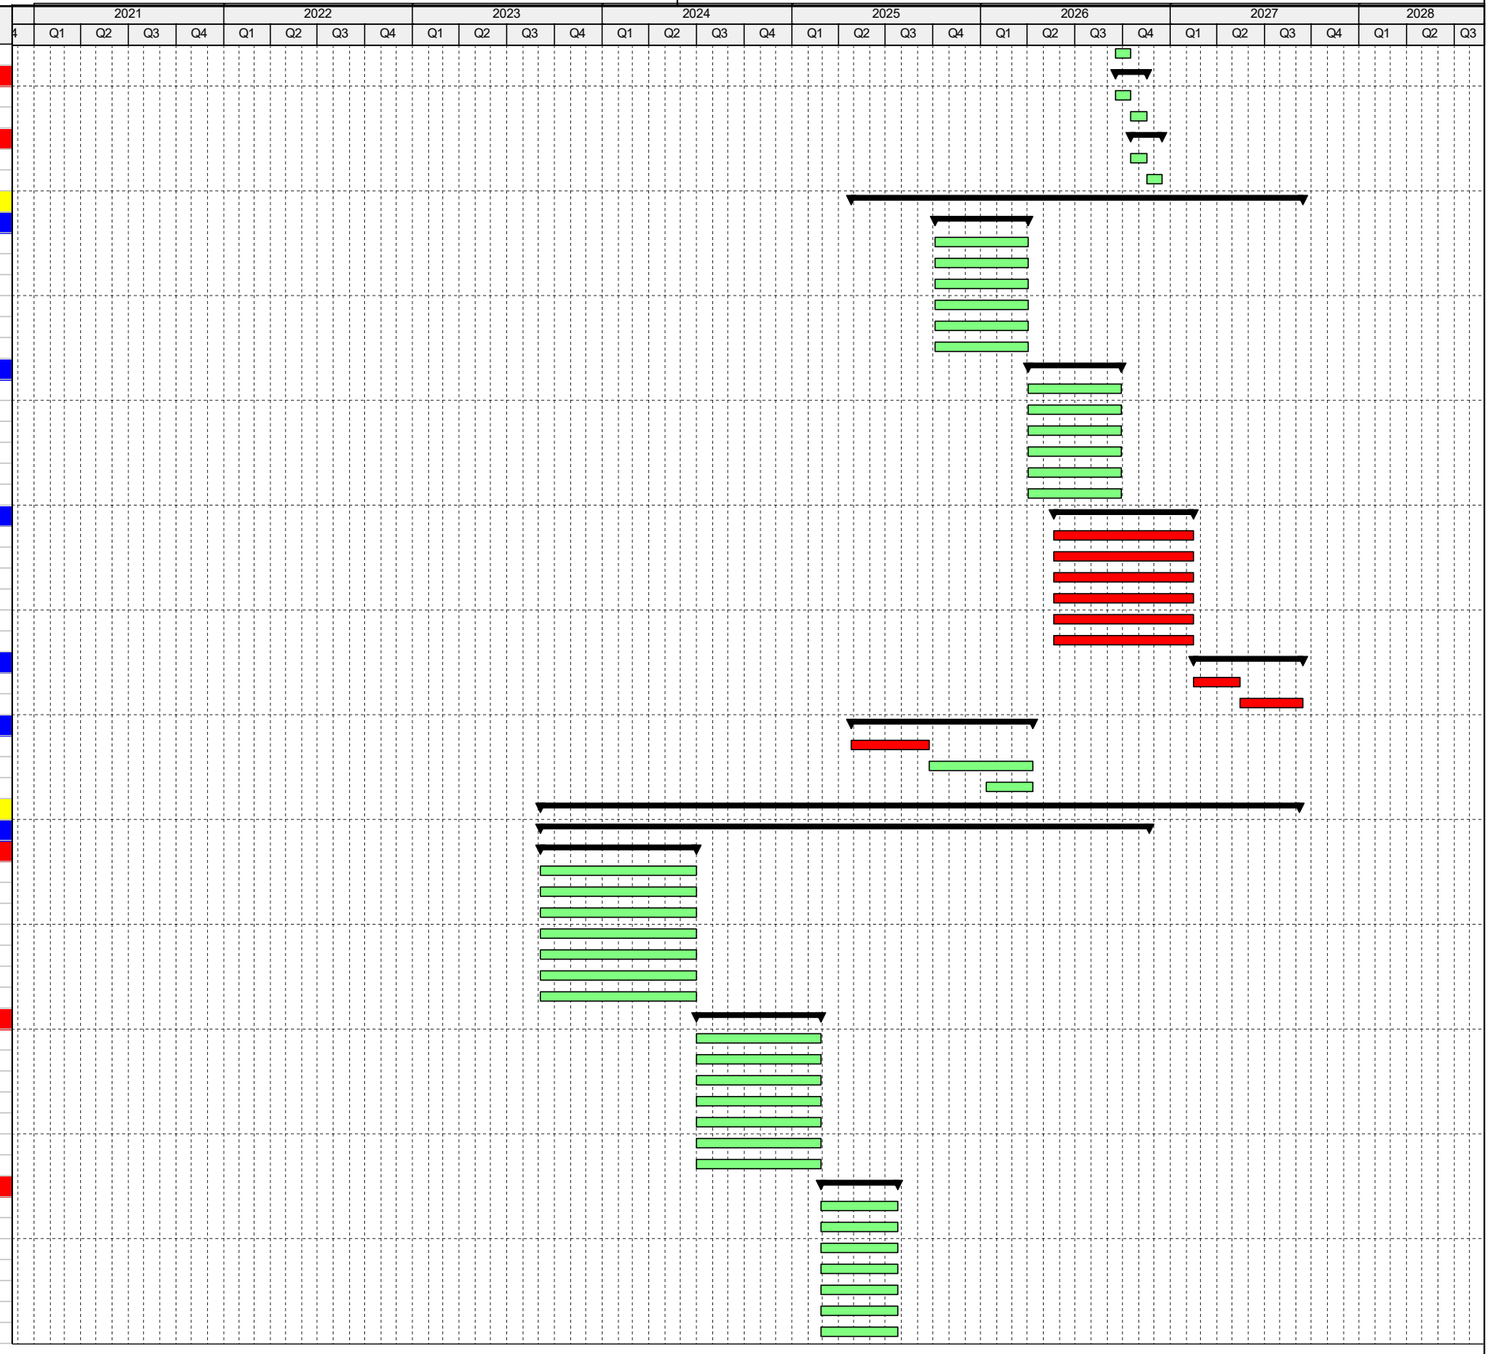


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.2.16.01.04	UE385: SER-Instalación y montaje de Equipós Subestaciones 1/3 (30%)	330	02-May-24	28-Mar-25
C-5930	UE385-Instalación de conexión de alimentación externa	330	02-May-24	28-Mar-25
C-5940	UE385-Instalar. de equipos de transformadores y aparamenta de alta y media tensión	330	02-May-24	28-Mar-25
C-5950	UE385-Protección de relés de subestación e instalación del sistema de automatizació	330	02-May-24	28-Mar-25
C-5960	UE385-Tendido de cables	330	02-May-24	28-Mar-25
C-5970	UE385-instalación de otros equipos	330	02-May-24	28-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.16.01.05	UE386: SER-Instalación y montaje de Equipós Subestaciones 2/3 (35%)	240	26-Feb-25	24-Oct-25
C-8890	UE386-Instalación de conexión de alimentación externa	240	26-Feb-25	24-Oct-25
C-8900	UE386-Instalacion. De aparamenta de alta y media tensión, equipo transformador, etc	240	26-Feb-25	24-Oct-25
C-8910	UE386-Protección de relés de subestación e instalación del sistema de automatizació	240	26-Feb-25	24-Oct-25
C-8920	UE386-Tendido de cables	240	26-Feb-25	24-Oct-25
C-8930	UE386-Instalación de otros equipos	240	26-Feb-25	24-Oct-25
PLMB-T1-V04.2.16.01.06	UE387: SER-Instalación y montaje de Equipós Subestaciones 3/3 (35%)	180	26-Jul-25	22-Jan-26
C-11060	UE387-Instalación de conexión de alimentación externa	180	26-Jul-25	22-Jan-26
C-11070	UE387-Instalacion. De aparamenta de alta y media tensión, equipo transformador, etc	180	26-Jul-25	22-Jan-26
C-11080	UE387-Protección de relés de subestación e instalación del sistema de automatizació	180	26-Jul-25	22-Jan-26
C-11090	UE387-Tendido de cables	180	26-Jul-25	22-Jan-26
C-11100	UE387-Instalación de otros equipos	180	26-Jul-25	22-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.16.01.07	UE388: SER - Pruebas en Estaciones Receptoras.	304	22-Jan-26	22-Nov-26
C-13050	UE388-Depuración de equipos	152	22-Jan-26	23-Jun-26
C-15070	Depuración y depuración conjunta de dispositivos UE388	152	23-Jun-26	22-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.16.02	Conjunto-Tracción SubEstación	983	28-Dec-24	07-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.16.02.01	UE389: Estación 1- Suministro de todos los equipos Acorde al AT.8	200	28-Dec-24	16-Jul-25
C-8130	Equipo de distribución de media tensión UE389-34.5kV y equipos relacionados	200	28-Dec-24	16-Jul-25
C-8140	UE389-750V DC equipo. y equipos relacionados.interruptor, transformador rectificador,	200	28-Dec-24	16-Jul-25
C-8150	UE389-Protección derelés de subestaciony autómata integrado. instalación del sistem	200	28-Dec-24	16-Jul-25
C-8160	UE389-Cable y accesorios	200	28-Dec-24	16-Jul-25
C-8170	UE389-Otro equipo (protección contra corriente parásita y equipo de monitoreo, protec	200	28-Dec-24	16-Jul-25
PLMB-T1-V04.2.16.02.02	UE390: Estacion 3- Suministro de todos los equipos Acorde al AT.8	360	28-Dec-24	23-Dec-25
C-8180	Equipo de distribución de media tensión UE390-34.5kV y equipos relacionados	360	28-Dec-24	23-Dec-25
C-8190	UE390-750V DC equipo. y equipos relacionados.interruptor, transformador rectificador,	360	28-Dec-24	23-Dec-25
C-8200	UE390-Protección derelés de subestaciony autómata integrado. instalación del sistem	360	28-Dec-24	23-Dec-25
C-8210	UE390-Cable y accesorios	360	28-Dec-24	23-Dec-25
C-8220	UE390-Otro equipo (protección contra corriente parásita y equipo de monitoreo, protec	360	28-Dec-24	23-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.16.02.03	UE391: Estacion 5- Suministro de todos los equipos Acorde al AT.8	200	16-Jul-25	01-Feb-26
C-10760	Equipo de distribución de media tensión UE391-34.5kV y equipos relacionados	200	16-Jul-25	01-Feb-26
C-10770	UE391-750V DC equipo. y equipos relacionados.interruptor, transformador rectificador,	200	16-Jul-25	01-Feb-26
C-10780	UE391-Protección derelés de subestaciony autómata integrado. instalación del sistem	200	16-Jul-25	01-Feb-26
C-10790	UE391-Cable y accesorios	200	16-Jul-25	01-Feb-26
C-10800	UE391-Otro equipo (protección contra corriente parásita y equipo de monitoreo, protec	200	16-Jul-25	01-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.16.02.04	UE392: Estacion 7- Suministro de todos los equipos Acorde al AT.8	160	16-Jul-25	23-Dec-25
C-10810	Equipo de distribución de media tensión UE392-34.5kV y equipos relacionados	160	16-Jul-25	23-Dec-25
C-10820	UE392-750V DC equipo. y equipos relacionados.interruptor, transformador rectificador,	160	16-Jul-25	23-Dec-25
C-10830	UE392-Protección derelés de subestaciony autómata integrado. instalación del sistem	160	16-Jul-25	23-Dec-25
C-10840	UE392-Cable y accesorios	160	16-Jul-25	23-Dec-25
C-10850	UE392-Otro equipo (protección contra corriente parásita y equipo de monitoreo, protec	160	16-Jul-25	23-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.16.02.05	UE393: Estacion 9- Suministro de todos los equipos Acorde al AT.8	120	23-Dec-25	22-Apr-26
C-12460	Equipo de distribución de media tensión UE393-34.5kV y equipos relacionados	120	23-Dec-25	22-Apr-26
C-12470	UE393-750V DC equipo. y equipos relacionados.interruptor, transformador rectificador,	120	23-Dec-25	22-Apr-26
C-12480	UE393-Protección derelés de subestaciony autómata integrado. instalación del sistem	120	23-Dec-25	22-Apr-26
C-12490	UE393-Cable y accesorios	120	23-Dec-25	22-Apr-26
C-12500	UE393-Otro equipo (protección contra corriente parásita y equipo de monitoreo, protec	120	23-Dec-25	22-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.16.02.06	UE394: Estacion 11- Suministro de todos los equipos Acorde al AT.8	120	23-Dec-25	22-Apr-26
C-12510	Equipo de distribución de media tensión UE394-34.5kV y equipos relacionados	120	23-Dec-25	22-Apr-26
C-12520	UE394-750V DC equipo. y equipos relacionados.interruptor, transformador rectificador,	120	23-Dec-25	22-Apr-26
C-12530	UE394-Protección derelés de subestaciony autómata integrado. instalación del sistem	120	23-Dec-25	22-Apr-26
C-12540	UE394-cable y accesorios	120	23-Dec-25	22-Apr-26
C-12550	UE394-Otro equipo (protección contra corriente parásita y equipo de monitoreo, protec	120	23-Dec-25	22-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.16.02.07	UE395: Estacion 13- Suministro de todos los equipos Acorde al AT.8	360	28-Dec-24	23-Dec-25
C-8230	Equipo de distribución de media tensión UE395-34.5kV y equipos relacionados	360	28-Dec-24	23-Dec-25
C-8240	UE395-750V DC equipo. y equipos relacionados.interruptor, transformador rectificador,	360	28-Dec-24	23-Dec-25
C-8250	UE395-Protección derelés de subestaciony autómata integrado. instalación del sistem	360	28-Dec-24	23-Dec-25

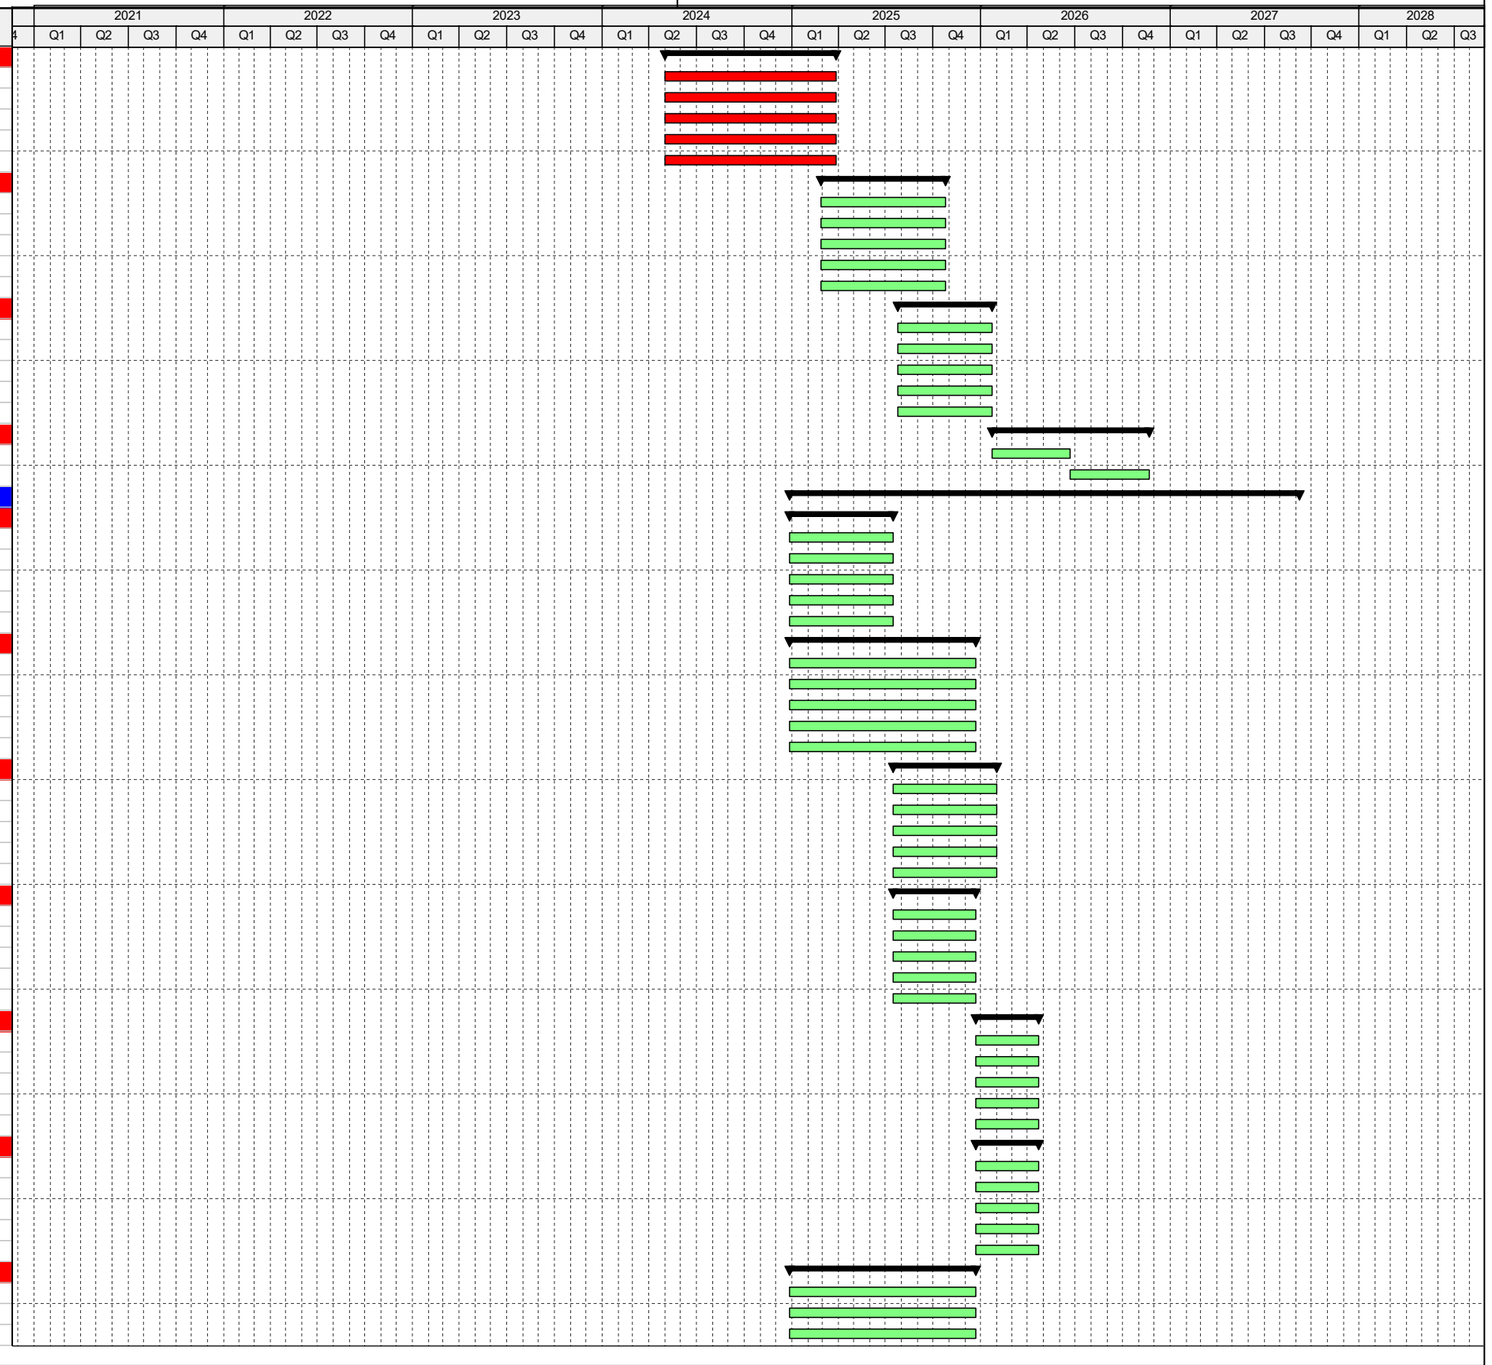

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-8260	UE395-Cable y accesorios	360	28-Dec-24	23-Dec-25
C-8270	UE395 Otro equipo (protección contra corrientes parásitas y equipo de monitoreo, prot	360	28-Dec-24	23-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.16.02.08	**UE396: Estacion 15- Suministro de todos los equipos Acorde al AT.8**	360	28-Dec-24	23-Dec-25
C-8280	Equipo de distribución de media tensión UE396-34.5kV y equipos relacionados	360	28-Dec-24	23-Dec-25
C-8290	UE396-750V DC equipo. y equipos relacionados.interruptor, transformador rectificador.	360	28-Dec-24	23-Dec-25
C-8300	UE396-Protección derelés de subestaciony autómata integrado. instalación del sistem:	360	28-Dec-24	23-Dec-25
C-8310	UE396-Cable y accesorios	360	28-Dec-24	23-Dec-25
C-8320	UE396 Otro equipo (protección contra corrientes parásitas y equipo de monitoreo, prot	360	28-Dec-24	23-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.16.02.09	**UE397: Estacion 16- Suministro de todos los equipos Acorde al AT.8**	200	16-Jul-25	01-Feb-26
C-10860	Equipo de distribución de media tensión UE397-34.5kV y equipos relacionados	200	16-Jul-25	01-Feb-26
C-10870	UE397-750V DC equipo. y equipos relacionados.interruptor, transformador rectificador.	200	16-Jul-25	01-Feb-26
C-10880	UE397-Protección derelés de subestaciony autómata integrado. instalación del sistem:	200	16-Jul-25	01-Feb-26
C-10890	UE397-Cable y accesorios	200	16-Jul-25	01-Feb-26
C-10900	UE397 Otro equipo (protección contra corriente parásita y equipo de monitoreo, protec	200	16-Jul-25	01-Feb-26
PLMB-T1-V04.2.16.02.10	**UE398: Patio Taller - Suministro de todos los equipos Acorde al AT.8**	200	28-Dec-24	16-Jul-25
C-8330	Equipo de distribución de media tensión UE398-34.5kV y equipos relacionados	200	28-Dec-24	16-Jul-25
C-8340	UE398-750V DC equipo. y equipos relacionados.interruptor, transformador rectificador.	200	28-Dec-24	16-Jul-25
C-8350	UE398-Protección derelés de subestaciony autómata integrado. instalación del sistem:	200	28-Dec-24	16-Jul-25
C-8360	UE398-Cable y accesorios	200	28-Dec-24	16-Jul-25
C-8370	UE398 Otro equipo (protección contra corriente parásita y equipo de monitoreo, protec	200	28-Dec-24	16-Jul-25
PLMB-T1-V04.2.16.02.11	**UE399: Estacion 1- Instalacion de todos los equipos Acorde al AT.8**	273	27-Oct-25	27-Jul-26
C-11970	UE399-Instalar. de potencia media tensión AC equipo interruptor, equipo transformado	273	27-Oct-25	27-Jul-26
C-11980	Instalación del equipo UE399-750V DC	273	27-Oct-25	27-Jul-26
C-11990	Instalación del sistema de automatización integrado y protección derelés de subestacic	273	27-Oct-25	27-Jul-26
C-12000	UE399-Tendido de cables	273	27-Oct-25	27-Jul-26
C-12010	UE399-Instalación de otros equipos	273	27-Oct-25	27-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.16.02.12	**UE400: Estacion 3- Instalacion de todos los equipos Acorde al AT.8**	273	23-Dec-25	22-Sep-26
C-12560	UE400-Instalar. de potencia media tensión AC equipo interruptor, equipo transformado	273	23-Dec-25	22-Sep-26
C-12570	Instalación de equipos UE400-750V DC	273	23-Dec-25	22-Sep-26
C-12580	Instalación del sistema de automatización integrado y protección de relés de subestaci	273	23-Dec-25	22-Sep-26
C-12590	UE400-tendido de cables	273	23-Dec-25	22-Sep-26
C-12600	UE400-Instalación de otros equipos	273	23-Dec-25	22-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.16.02.13	**UE401: Estacion 5- Instalacion de todos los equipos Acorde al AT.8**	303	01-Feb-26	01-Dec-26
C-13130	UE401-Instalar. de potencia media tensión AC equipo interruptor, equipo transformado	303	01-Feb-26	01-Dec-26
C-13140	Instalación del equipo UE401-750V DC	303	01-Feb-26	01-Dec-26
C-13150	UE401-Protección derelés de subestacione instalación del sistema de automatización	303	01-Feb-26	01-Dec-26
C-13160	UE401-Tendido de cables	303	01-Feb-26	01-Dec-26
C-13170	UE401-Instalación de otros equipos	303	01-Feb-26	01-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.16.02.14	**UE402: Estacion 7- Instalacion de todos los equipos Acorde al AT.8**	210	26-Jul-26	21-Feb-27
C-15290	UE402-Instalar. de potencia media tensión AC equipo interruptor, equipo transformado	210	26-Jul-26	21-Feb-27
C-15300	Instalación del equipo UE402-750V DC	210	26-Jul-26	21-Feb-27
C-15310	UE402-Protección derelés de subestacione instalación del sistema de automatización	210	26-Jul-26	21-Feb-27
C-15320	UE402-Tendido de cables	210	26-Jul-26	21-Feb-27
C-15330	UE402-Instalación de otros equipos	210	26-Jul-26	21-Feb-27
PLMB-T1-V04.2.16.02.15	**UE403: Estacion 9- Instalacion de todos los equipos Acorde al AT.8**	272	22-Apr-26	19-Jan-27
C-14160	UE403-Instalar. de potencia media tensión AC equipo interruptor, equipo transformado	272	22-Apr-26	19-Jan-27
C-14170	Instalación del equipo UE403-750V DC	272	22-Apr-26	19-Jan-27
C-14180	UE403-Protección derelés de subestacione instalación del sistema de automatización	272	22-Apr-26	19-Jan-27
C-14190	UE403-Tendido de cables	272	22-Apr-26	19-Jan-27
C-14200	UE403-Instalación de otros equipos	272	22-Apr-26	19-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.16.02.16	**UE404: Estacion 11- Instalacion de todos los equipos Acorde al AT.8**	272	22-Apr-26	19-Jan-27
C-14210	UE404-Instalar. de potencia media tensión AC equipo interruptor, equipo transformado	272	22-Apr-26	19-Jan-27
C-14220	Instalación del equipo UE404-750V DC	272	22-Apr-26	19-Jan-27
C-14230	UE404-Protección derelés de subestacione instalación del sistema de automatización	272	22-Apr-26	19-Jan-27
C-14240	UE404-Tendido de cables	272	22-Apr-26	19-Jan-27
C-14250	UE404-Instalación de otros equipos	272	22-Apr-26	19-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.16.02.17	**UE405: Estacion 13- Instalacion de todos los equipos Acorde al AT.8**	305	23-Dec-25	24-Oct-26
C-12610	UE405-Instalar. de potencia media tensión AC equipo interruptor, equipo transformado	305	23-Dec-25	24-Oct-26
C-12620	Instalación del equipo UE405-750V DC	305	23-Dec-25	24-Oct-26
C-12630	Instalación del sistema de automatización integrado y protección de relés de subestaci	305	23-Dec-25	24-Oct-26
C-12640	UE405-Tendido de cables	305	23-Dec-25	24-Oct-26
C-12650	UE405-Instalación de otros equipos	305	23-Dec-25	24-Oct-26

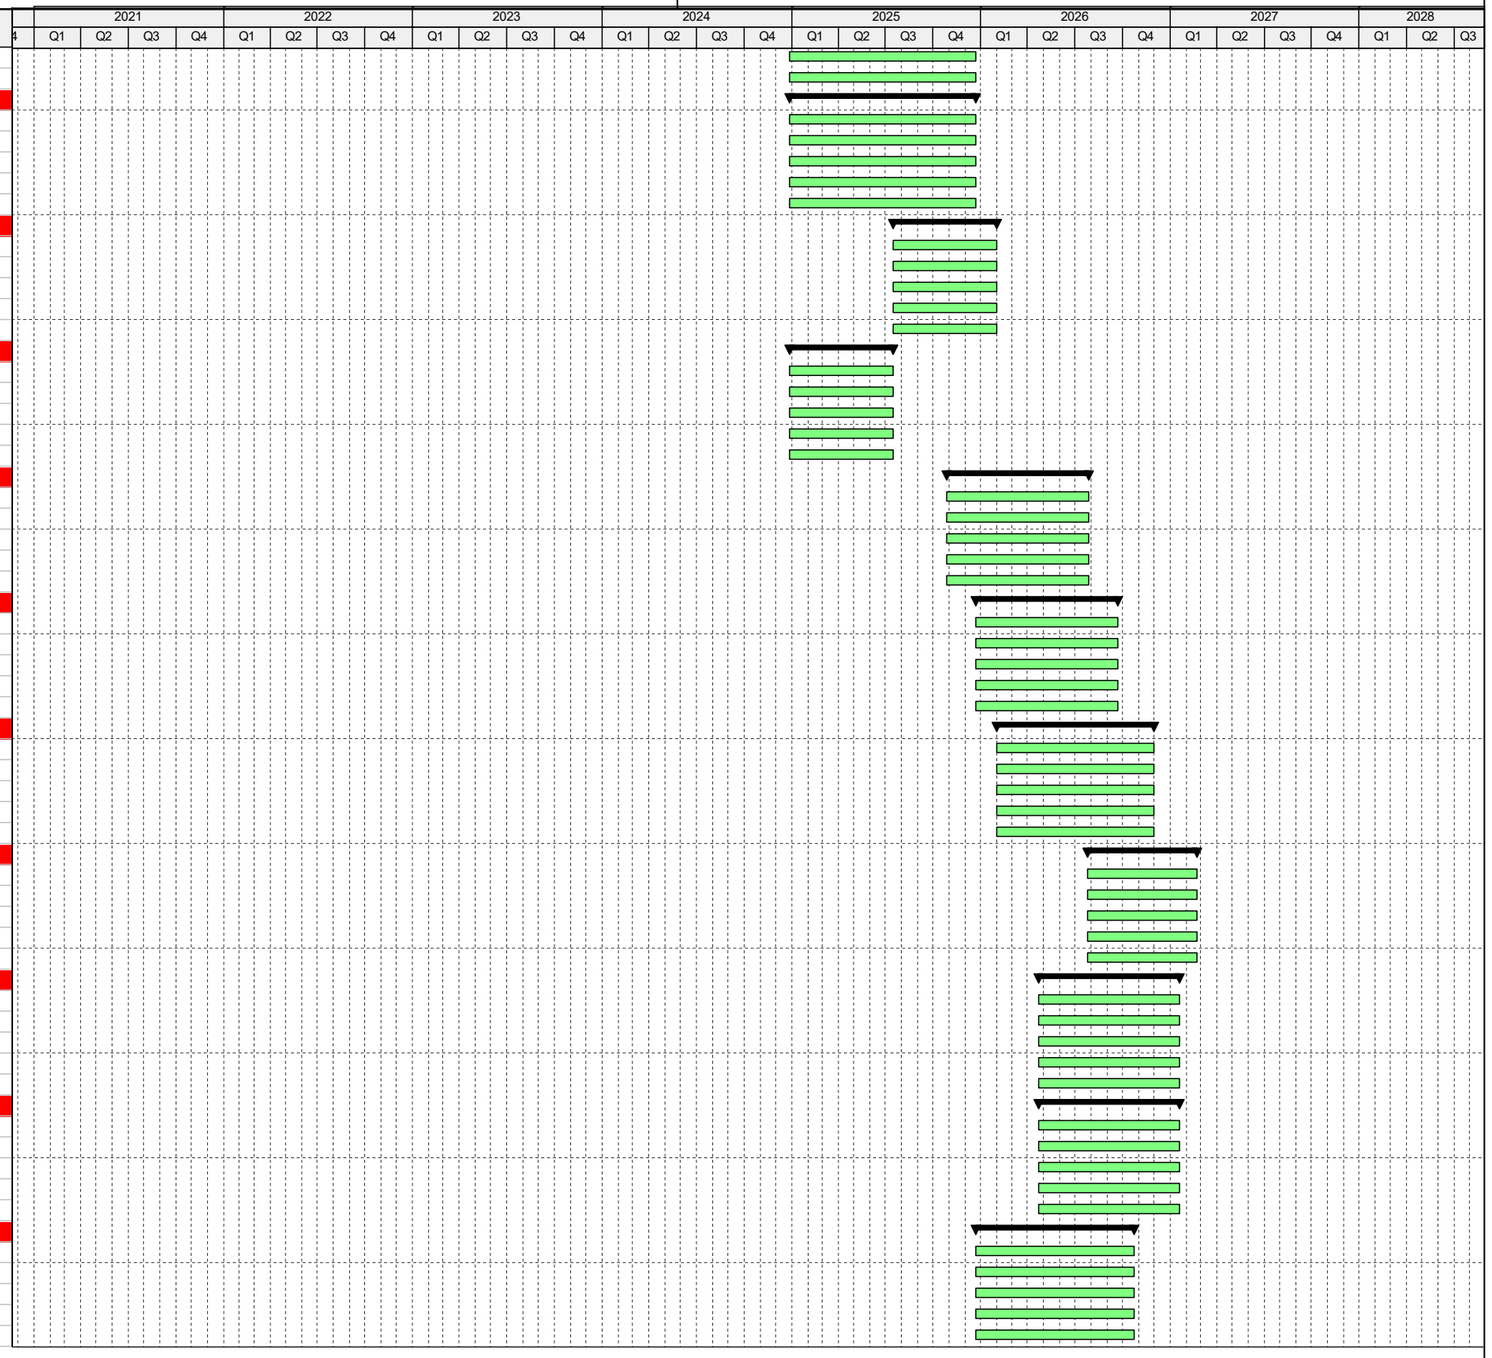


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.2.16.02.18	UE406: Estacion 15- Instalacion de todos los equipos Acorde al AT.8	272	23-Dec-25	21-Sep-26
C-12660	UE406-Instalar. de potencia media tensión AC equipo interruptor, equipo transformado	272	23-Dec-25	21-Sep-26
C-12670	Instalación del equipo UE406-750V DC	272	23-Dec-25	21-Sep-26
C-12680	Instalación del sistema de automatización integrado y protección de relés de subestaci	272	23-Dec-25	21-Sep-26
C-12690	UE406-Tendido de cables	272	23-Dec-25	21-Sep-26
C-12700	UE406-Instalación de otros equipos	272	23-Dec-25	21-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.16.02.19	UE407: Estacion 16- Instalacion de todos los equipos Acorde al AT.8	200	09-Aug-26	25-Feb-27
C-15420	UE407-Instalar. de potencia media tensión AC equipo interruptor, equipo transformado	200	09-Aug-26	25-Feb-27
C-15430	Instalación del equipo UE407-750V DC	200	09-Aug-26	25-Feb-27
C-15440	Instalación del sistema de automatización integrado y protección de relés de subestaci	200	09-Aug-26	25-Feb-27
C-15450	UE407-Tendido de cables	200	09-Aug-26	25-Feb-27
C-15460	UE407-Instalación de otros equipos	200	09-Aug-26	25-Feb-27
PLMB-T1-V04.2.16.02.20	UE408: Patio Taller Instalación de todos los equipos Acorde al AT.8	366	16-Jul-25	17-Jul-26
C-10910	UE408-Instalar. de potencia media tensión AC equipo interruptor, equipo transformado	366	16-Jul-25	17-Jul-26
C-10920	Instalación del equipo UE408-750V DC	366	16-Jul-25	17-Jul-26
C-10930	Instalación del sistema de automatización integrado y protección de relés de subestaci	366	16-Jul-25	17-Jul-26
C-10940	UE408-Tendido de cables	366	16-Jul-25	17-Jul-26
C-10950	UE408-Instalación de otros equipos	366	16-Jul-25	17-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.16.02.21	UE409: Configuración de la prueba en todo el sistema	378	25-Aug-26	07-Sep-27
C-15580	UE409-Depuración de equipos	184	25-Aug-26	25-Feb-27
C-16480	Depuración conjunta de dispositivos UE409	194	25-Feb-27	07-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.16.03	Traccion Patio Taller -CT- Centro de Traccion Suministro Equipos	1023	22-May-24	11-Mar-27
PLMB-T1-V04.2.16.03.01	UE410: Traccion-CT Suministro de todos los equipos para la subestación A	340	22-May-24	27-Apr-25
C-6080	UE410-Suministro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados.	340	22-May-24	27-Apr-25
C-6090	UE410-cable y accesorios	340	22-May-24	27-Apr-25
C-6100	UE410-Otros equipos	340	22-May-24	27-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.16.03.02	UE411: Traccion-CT-Estación 1 Suministro todos los equipos para la subes	340	22-May-24	27-Apr-25
C-6110	UE411-Suministro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	340	22-May-24	27-Apr-25
C-6120	UE411-cable y accesorios	340	22-May-24	27-Apr-25
C-6130	UE411-Otros equipos	340	22-May-24	27-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.16.03.03	UE412: Traccion-CT-Estación 2 Suministro todos los equipos para la subes	360	22-May-24	17-May-25
C-6140	UE412-Suministro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	360	22-May-24	17-May-25
C-6150	UE412-cable y accesorios	360	22-May-24	17-May-25
C-6160	UE412-Otros equipos	360	22-May-24	17-May-25
PLMB-T1-V04.2.16.03.04	UE413: Traccion-CT-Estación 3 Suministro todos los equipos para la subes	360	22-May-24	17-May-25
C-6170	UE413-Suministro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	360	22-May-24	17-May-25
C-6180	UE413-Cable y accesorios	360	22-May-24	17-May-25
C-6190	UE413-Otros equipos	360	22-May-24	17-May-25
PLMB-T1-V04.2.16.03.05	UE414: Traccion-CT-Estación 4 Suministro todos los equipos para la subes	360	22-May-24	17-May-25
C-6200	UE414-Suministro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	360	22-May-24	17-May-25
C-6210	UE414-cable y accesorios	360	22-May-24	17-May-25
C-6220	UE414-Otros equipos	360	22-May-24	17-May-25
PLMB-T1-V04.2.16.03.06	UE415: Traccion-CT-Estación 5 Suministro todos los equipos para la subes	340	22-May-24	27-Apr-25
C-6230	UE415-Suministro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	340	22-May-24	27-Apr-25
C-6240	UE415-Cable y accesorios	340	22-May-24	27-Apr-25
C-6250	UE415-Otros equipos	340	22-May-24	27-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.16.03.07	UE416: Traccion-CT-Estación 6 Suministro todos los equipos para la subes	360	27-Apr-25	22-Apr-26
C-9890	UE416-Suministro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	360	27-Apr-25	22-Apr-26
C-9900	UE416-cable y accesorios	360	27-Apr-25	22-Apr-26
C-9910	UE416-Otros equipos	360	27-Apr-25	22-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.16.03.08	UE417: Traccion-CT-Estación 7 Suministro todos los equipos para la subes	360	27-Apr-25	22-Apr-26
C-9920	UE417-Suministro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	360	27-Apr-25	22-Apr-26
C-9930	UE417-cable y accesorios	360	27-Apr-25	22-Apr-26
C-9940	UE417-Otros equipos	360	27-Apr-25	22-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.16.03.09	UE418: Traccion-CT-Estación 8 Suministro todos los equipos para la subes	340	22-May-24	27-Apr-25
C-6260	UE418-Sumistro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	340	22-May-24	27-Apr-25
C-6270	UE418-Cable y accesorios	340	22-May-24	27-Apr-25
C-6280	UE418-Otros equipos	340	22-May-24	27-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.16.03.10	UE419: Traccion-CT-Estación 9 Suministro todos los equipos para la subes	360	27-Apr-25	22-Apr-26
C-9950	UE419-Sumnistro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	360	27-Apr-25	22-Apr-26
C-9960	UE419-Cable y accesorios	360	27-Apr-25	22-Apr-26
C-9970	UE419-Otros equipos	360	27-Apr-25	22-Apr-26

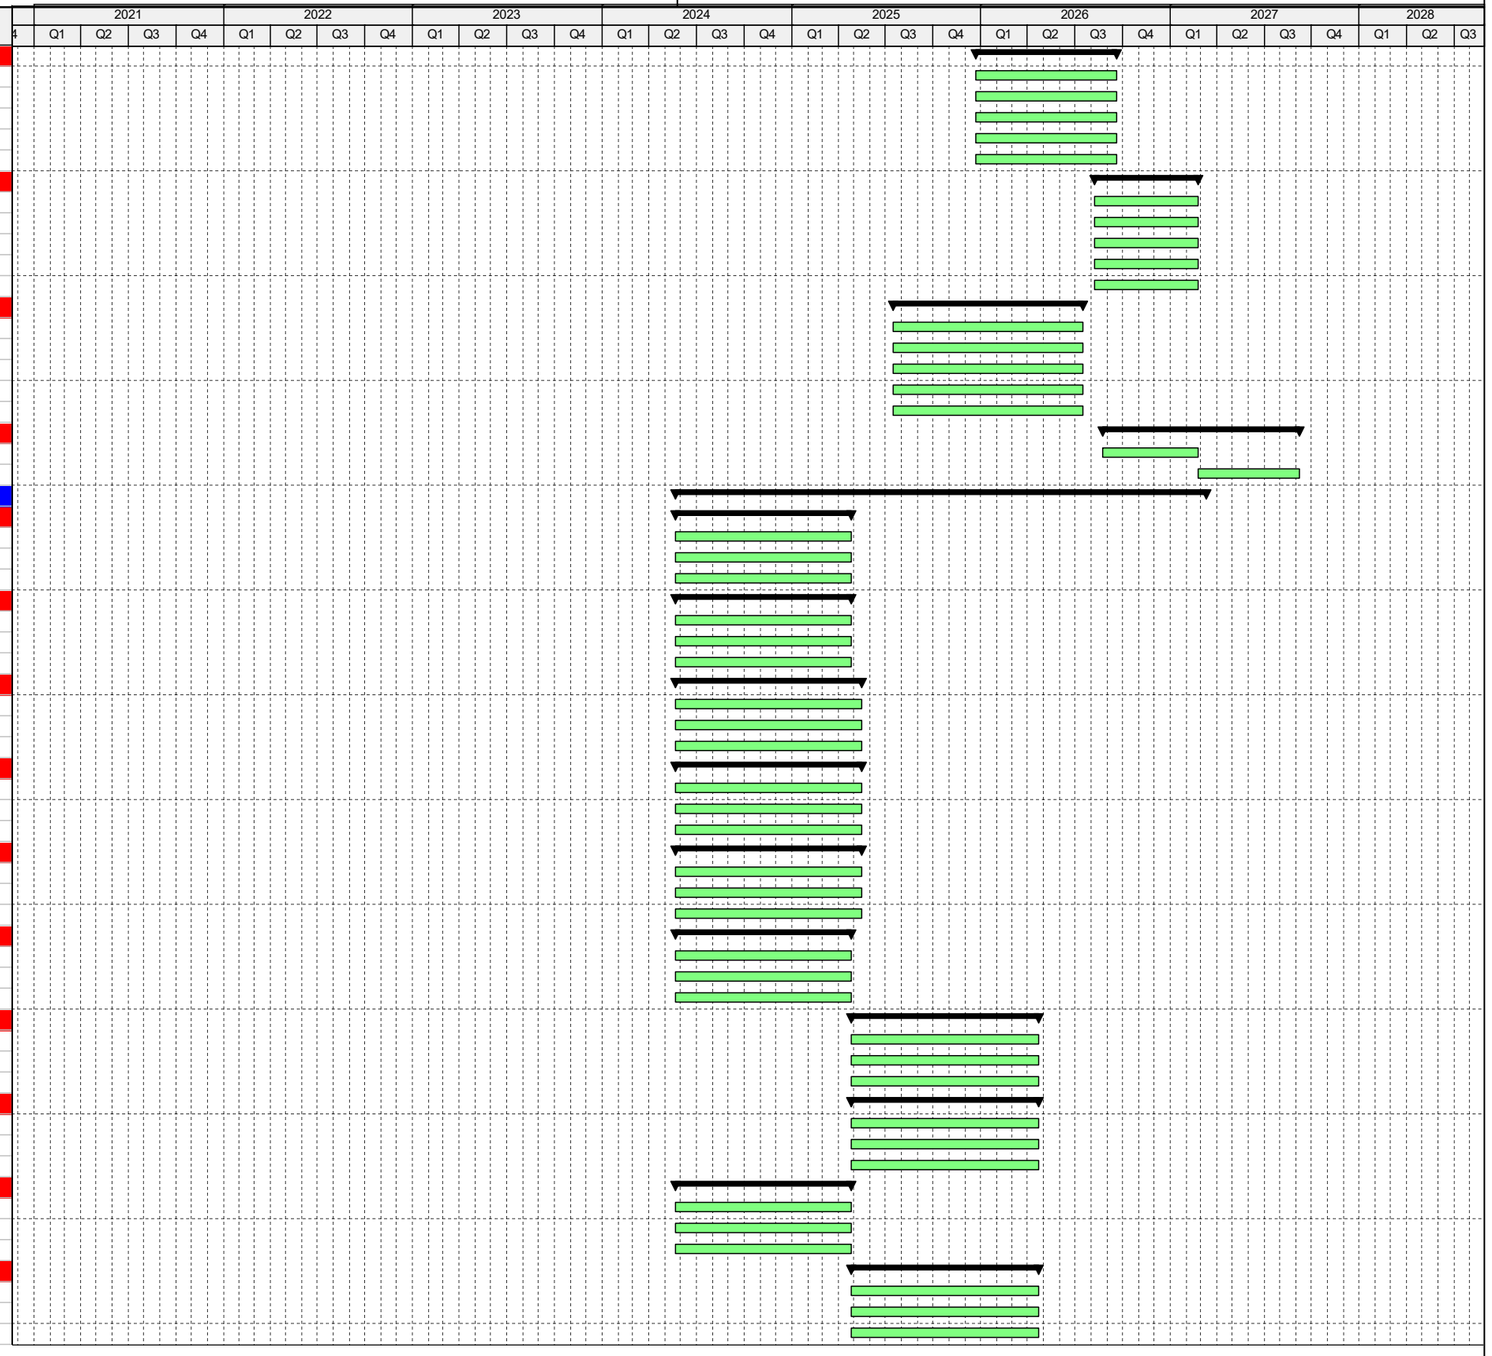


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.2.16.03.11	UE420: Traccion-CT-Estación 10 Suministro todos los equipos para la subes	340	22-May-24	27-Apr-25
C-6290	UE420: Suministro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	340	22-May-24	27-Apr-25
C-6300	UE420-cable y accesorios	340	22-May-24	27-Apr-25
C-6310	UE420-Otros equipos	340	22-May-24	27-Apr-25
PLMB-T1-V04.2.16.03.12	UE421: Traccion-CT-Estación 11 Suministro todos los equipos para la subes	360	27-Apr-25	22-Apr-26
C-9980	UE421-Suministro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	360	27-Apr-25	22-Apr-26
C-9990	UE421-Cable y accesorios	360	27-Apr-25	22-Apr-26
C-10000	UE421-Otros equipos	360	27-Apr-25	22-Apr-26
PLMB-T1-V04.2.16.03.13	UE422: Traccion-CT-Estación 12 Suministro todos los equipos para la subes	500	18-Mar-25	31-Jul-26
C-9160	UE422-Suministro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	500	18-Mar-25	31-Jul-26
C-9170	UE422-cable y accesorios	500	18-Mar-25	31-Jul-26
C-9180	UE422-Otros equipos	500	18-Mar-25	31-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.16.03.14	UE423: Traccion-CT-Estación 13 Suministro todos los equipos para la subes	300	22-May-24	18-Mar-25
C-6320	UE423-Suministro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	300	22-May-24	18-Mar-25
C-6330	UE423-Cable y accesorios	300	22-May-24	18-Mar-25
C-6340	UE423-Otros equipos	300	22-May-24	18-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.16.03.15	UE424: Traccion-CT-Estación 14 Suministro todos los equipos para la subes	500	18-Mar-25	31-Jul-26
C-9190	UE424-Suministro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	500	18-Mar-25	31-Jul-26
C-9200	UE424-cable y accesorios	500	18-Mar-25	31-Jul-26
C-9210	UE424-Otros equipos	500	18-Mar-25	31-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.16.03.16	UE425: Traccion-CT-Estación 15 Suministro todos los equipos para la subes	300	22-May-24	18-Mar-25
C-6350	UE425: Suministro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	300	22-May-24	18-Mar-25
C-6360	UE425-Cable y accesorios	300	22-May-24	18-Mar-25
C-6370	UE425-Otros equipos	300	22-May-24	18-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.16.03.17	UE426: Traccion-CT-Estación 16 Suministro todos los equipos para la subes	350	22-May-24	07-May-25
C-6380	UE426-Suminsitro equipos de media y baja tensión y equipos relacionados	350	22-May-24	07-May-25
C-6390	UE426-Cable y accesorios	350	22-May-24	07-May-25
C-6400	UE426-Otros equipos	350	22-May-24	07-May-25
PLMB-T1-V04.2.16.03.1	Instalacion del Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las	683	27-Apr-25	11-Mar-27
C-9880	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 0	420	27-Apr-25	21-Jun-26
C-10190	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 3	200	17-May-25	03-Dec-25
C-11850	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 2	220	21-Oct-25	29-May-26
C-12020	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 1	200	27-Oct-25	15-May-26
C-12260	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 8	270	03-Dec-25	30-Aug-26
C-12270	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 10	270	03-Dec-25	30-Aug-26
C-14260	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 11	270	22-Apr-26	17-Jan-27
C-14270	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 9	270	22-Apr-26	17-Jan-27
C-14600	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 15	150	15-May-26	12-Oct-26
C-14900	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 16	150	29-May-26	26-Oct-26
C-15010	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 4	150	21-Jun-26	18-Nov-26
C-15640	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 12	150	30-Aug-26	27-Jan-27
C-15650	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 14	150	30-Aug-26	27-Jan-27
C-15920	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 13	150	12-Oct-26	11-Mar-27
C-16020	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 6	120	25-Oct-26	22-Feb-27
C-16040	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 5	120	26-Oct-26	23-Feb-27
C-16260	Sistema automático integrado y Sistema de Protección de las Subestaciones 7	60	23-Dec-26	21-Feb-27
PLMB-T1-V04.2.16.04	Linea de Traccion	1020	30-Aug-24	16-Jun-27
PLMB-T1-V04.2.16.04.01	UE427: Tracción línea Suministro todos los equipos de Sub Estacion 20+80	200	25-Aug-25	13-Mar-26
C-11300	UE427-Carril de alimentación y accesorios (incluye aislantes, codos terminales, juntas	200	25-Aug-25	13-Mar-26
C-11310	UE427-Cable y accesorios	200	25-Aug-25	13-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.16.04.02	UE428: Tracción línea Suministro todos los equipos de Sub Estacion 18+15	360	30-Aug-24	25-Aug-25
C-7190	UE428-Carril de alimentación y accesorios (incluye aisladores, codos terminales, juntas	360	30-Aug-24	25-Aug-25
C-7200	UE428-Cable y accesorios	360	30-Aug-24	25-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.16.04.03	UE429: Tracción línea Suministro todos los equipos de Sub Estacion-12 + 7	360	30-Aug-24	25-Aug-25
C-7210	UE429-Carril de alimentación y accesorios (incluye aislantes, codos terminales, juntas	360	30-Aug-24	25-Aug-25
C-7220	UE429-Cable y accesorios	360	30-Aug-24	25-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.16.04.04	UE430: Tracción línea Suministro todos los equipos de Sub Estacion- 8 + 8	360	30-Aug-24	25-Aug-25
C-7230	UE430-Power rail y accesorios (incluye aislantes, codos terminales, juntas de expansió	360	30-Aug-24	25-Aug-25
C-7240	UE430-cable y accesorios	360	30-Aug-24	25-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.16.04.05	UE431: Tracción línea Suministro todos los equipos de Sub Estacion- 5 + 7	360	30-Aug-24	25-Aug-25
C-7250	UE431-Carril de alimentación y accesorios (incluye aislantes, codos terminales, juntas	360	30-Aug-24	25-Aug-25
C-7260	UE431-Cable y accesorios	360	30-Aug-24	25-Aug-25

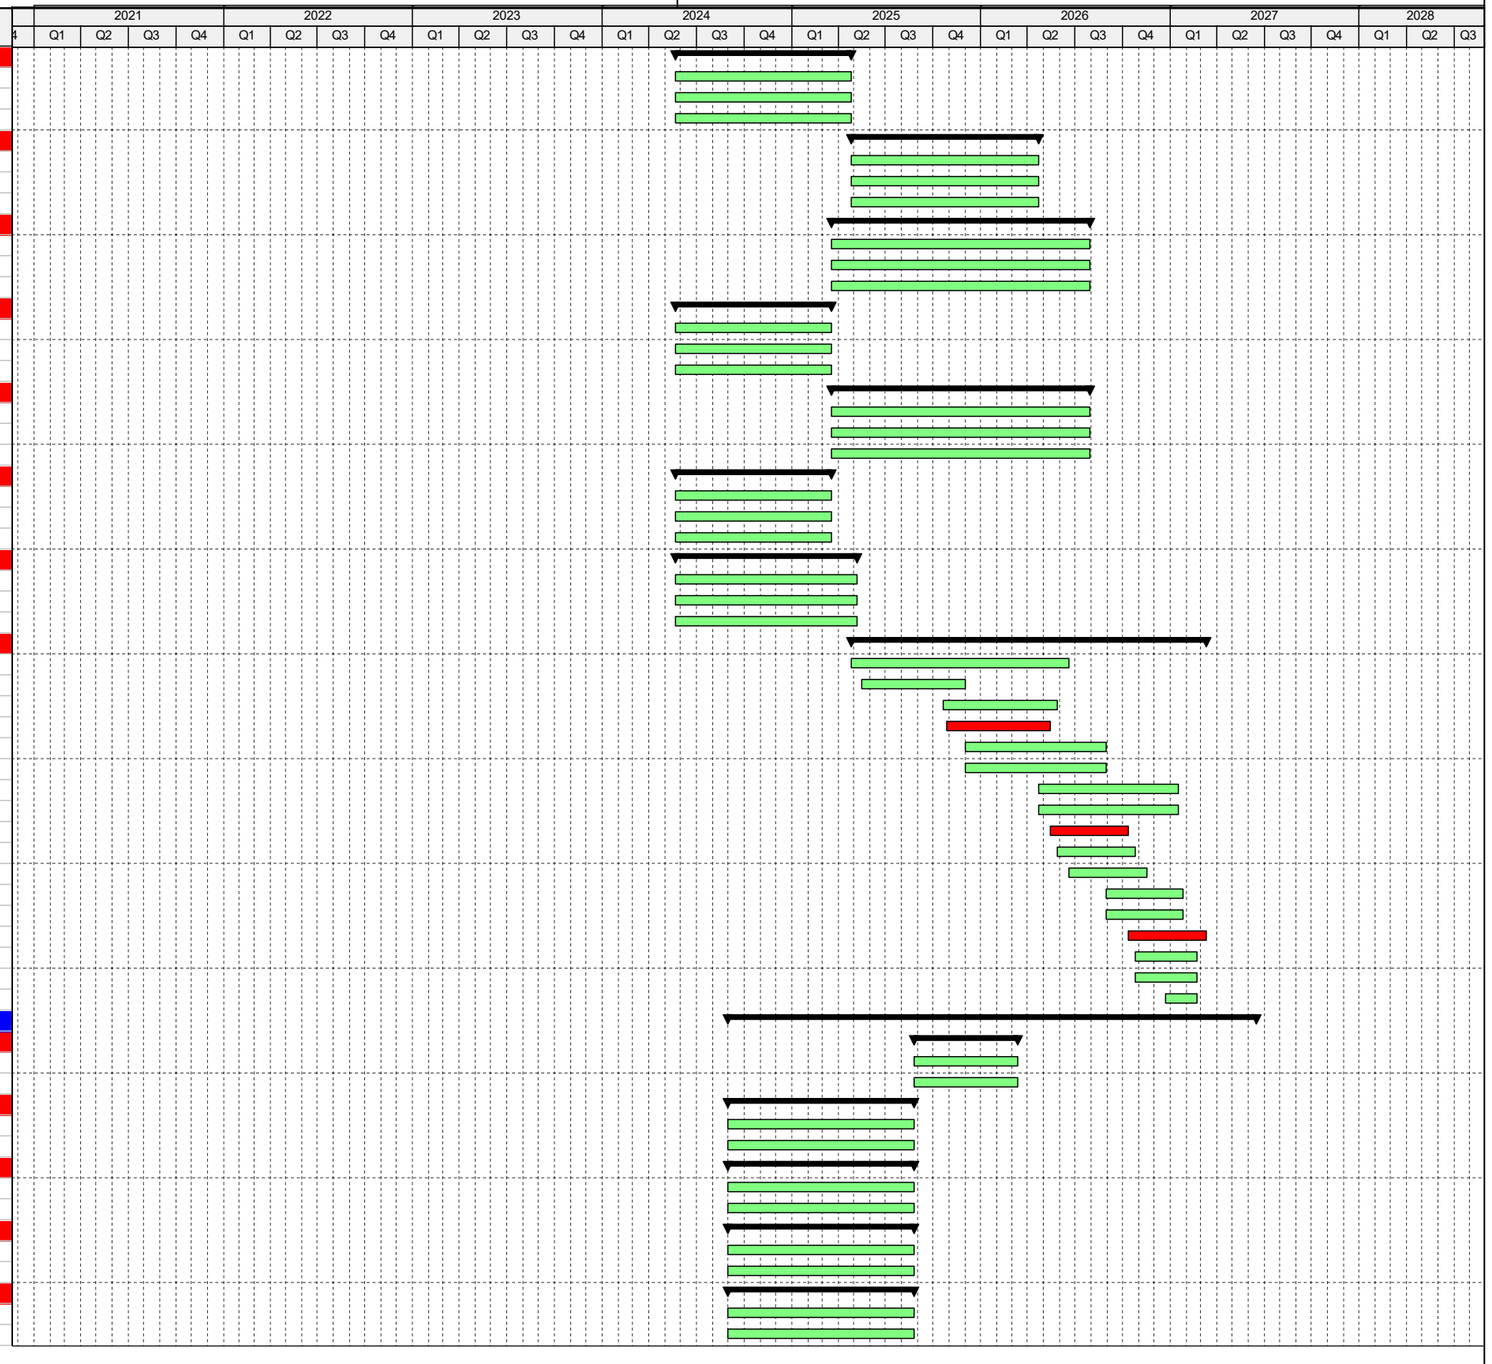


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.2.16.04.06	UE432: Tracción línea Suministro todos los equipos de Sub Estacion- 0 + 0	360	30-Aug-24	25-Aug-25
C-7270	UE432-Power rail y accesorios (incluye aislantes, codos terminales, juntas de expansió	360	30-Aug-24	25-Aug-25
C-7280	UE432-Cable y accesorios	360	30-Aug-24	25-Aug-25
PLMB-T1-V04.2.16.04.07	UE433: Tracción línea Instalación todos los equipos de Sub Estacion20+80	220	07-Apr-26	13-Nov-26
C-14040	Instalación del sistema de carril de alimentación UE433	220	07-Apr-26	13-Nov-26
C-14050	UE433-Instalación del dispositivo de puesta a tierra de protección contra rayos	220	07-Apr-26	13-Nov-26
C-14060	UE433-Tendido de cables	220	07-Apr-26	13-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.16.04.08	UE434: Tracción línea Instalación todos los equipos de Sub Estacion18 + 1	150	09-Dec-25	08-May-26
C-12360	Instalación del sistema de carril de alimentación UE434	150	09-Dec-25	08-May-26
C-12370	UE434- instalación del dispositivo de puesta a tierra de protección contra rayos	150	09-Dec-25	08-May-26
C-12380	UE434-Tendido de cables	150	09-Dec-25	08-May-26
PLMB-T1-V04.2.16.04.09	UE435: Tracción línea Instalación todos los equipos de Sub Estacion12 + 7	150	09-May-26	06-Oct-26
C-14470	Instalación del sistema de carril de alimentación UE435	150	09-May-26	06-Oct-26
C-14480	UE435- instalación del dispositivo de puesta a tierra de protección contra rayos	150	09-May-26	06-Oct-26
C-14490	UE435-Tendido de cables	150	09-May-26	06-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.16.04.10	UE436: Tracción línea Instalación todos los equipos de Sub Estacion8 + 82	120	30-Mar-26	28-Jul-26
C-13410	Instalación del sistema de carril de alimentación UE436	120	30-Mar-26	28-Jul-26
C-13420	UE436- instalación del dispositivo de puesta a tierra de protección contra rayos	120	30-Mar-26	28-Jul-26
C-13430	UE436-Tendido de cables	120	30-Mar-26	28-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.16.04.11	UE437: Tracción línea Instalación todos los equipos de Sub Estacion5 + 76	210	17-Feb-26	15-Sep-26
C-13240	UE437-Instalación del sistema de carril de alimentación	210	17-Feb-26	15-Sep-26
C-13250	UE437-Instalación del dispositivo de puesta a tierra de protección contra rayos	210	17-Feb-26	15-Sep-26
C-13260	UE437-Tendido de cables	210	17-Feb-26	15-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.16.04.12	UE438: Tracción línea Instalacion todos los equipos de Sub Estacion0 + 00	159	16-Jan-26	24-Jun-26
C-12950	Instalación del sistema de carril de alimentación UE438	159	16-Jan-26	24-Jun-26
C-12960	UE438- instalación del dispositivo de puesta a tierra de protección contra rayos	159	16-Jan-26	24-Jun-26
C-12970	UE438-Tendido de cables	159	16-Jan-26	24-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.16.04.13	UE439 Tracción- Línea- Pruebas de toda la linea de acuerdo a AT8	206	22-Nov-26	16-Jun-27
C-16140	UE439-Depuración de equipos	90	22-Nov-26	20-Feb-27
C-16520	Depuración conjunta de dispositivos UE439	97	11-Mar-27	16-Jun-27
PLMB-T1-V04.2.17	El equipo del Puesto central de Control OCC	990	28-Dec-24	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.17.1	UE506: Control de estación central - Suministro de todos los equipos Subestacion	430	28-Dec-24	03-Mar-26
C-8380	UE506 Equipo de sistema de monitoreo integral de la estación central	430	28-Dec-24	03-Mar-26
C-8390	UE506 Equipo de sistema de monitoreo integral del centro de control	430	28-Dec-24	03-Mar-26
C-8400	UE506 Equipo de sistema de monitoreo integral de Patio taller	430	28-Dec-24	03-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.17.2	UE507: Control de estación central - Instalacion de todos los equipos Subestacion	500	05-Sep-25	18-Jan-27
C-11430	UE507 Equipo de sistema de monitoreo integral de la estacion.Instalar (incluido tendid	500	05-Sep-25	18-Jan-27
C-11440	UE507 Equipo de sistema de monitoreo integral (incluido tendido de cables)	500	05-Sep-25	18-Jan-27
C-11450	UE507-Monitoreo integral del Patio taller de vehículos. equipo del sistema. Instalar (inc	500	05-Sep-25	18-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.17.3	UE508: Control de estación central - Pruebas de todos los equipos Subestacion. A	239	18-Jan-27	14-Sep-27
C-16400	UE508-Depuración de equipos	60	18-Jan-27	19-Mar-27
C-16530	Depuración conjunta de dispositivos UE508	179	19-Mar-27	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.18	Señalizacion y Control de Trenes	897	18-Mar-25	01-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.18.1	UE509: Señalizacion y control de trenes - Suministro de todos las equipos.-K20+ 8	360	18-Mar-25	13-Mar-26
C-9220	UE509 Equipo de señalización del centro de control	360	18-Mar-25	13-Mar-26
C-9230	UE509-equipo de señal de línea principal (estación, sección)	360	18-Mar-25	13-Mar-26
C-9240	UE509-Equipo de señalización para Patio taller de vehículos	360	18-Mar-25	13-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.18.2	UE510: Señalizacion y control de trenes - Suministro de todos las equipos.-K18+ 1	280	13-Mar-26	18-Dec-26
C-13500	UE510 Equipo de señalización del centro de control	280	13-Mar-26	18-Dec-26
C-13510	UE510-equipo de señal de línea principal (estación, sección)	280	13-Mar-26	18-Dec-26
C-13520	UE510-Equipo de señalización para Patio taller de vehículos	280	13-Mar-26	18-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.18.3	UE511: Señalizacion y control de trenes - Suministro de todos las equipos...K12+ 7	360	26-Jun-25	21-Jun-26
C-10610	UE511 Equipo de señalización del centro de control	360	26-Jun-25	21-Jun-26
C-10620	UE511-equipo de señal de línea principal (estación, sección)	360	26-Jun-25	21-Jun-26
C-10630	UE511-Equipo de señalización para Patio taller de vehículos	360	26-Jun-25	21-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.18.4	UE512: Señalizacion y control de trenes - Suministro de todos las equipos....-K8+ 8	360	12-Jan-26	07-Jan-27
C-12880	UE512 Equipo de señalización del centro de control	360	12-Jan-26	07-Jan-27
C-12890	UE512-equipo de señal de línea principal (estación, sección)	360	12-Jan-26	07-Jan-27
C-12900	UE512-Equipo de señalización para Patio taller de vehículos	360	12-Jan-26	07-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.18.5	UE513: Señalizacion y control de trenes - Suministro de todos las equipos....-K5+ 7	360	07-May-25	02-May-26
C-10050	UE513 Equipo de señalización del centro de control	360	07-May-25	02-May-26
C-10060	UE513-equipo de señal de línea principal (estación, sección)	360	07-May-25	02-May-26

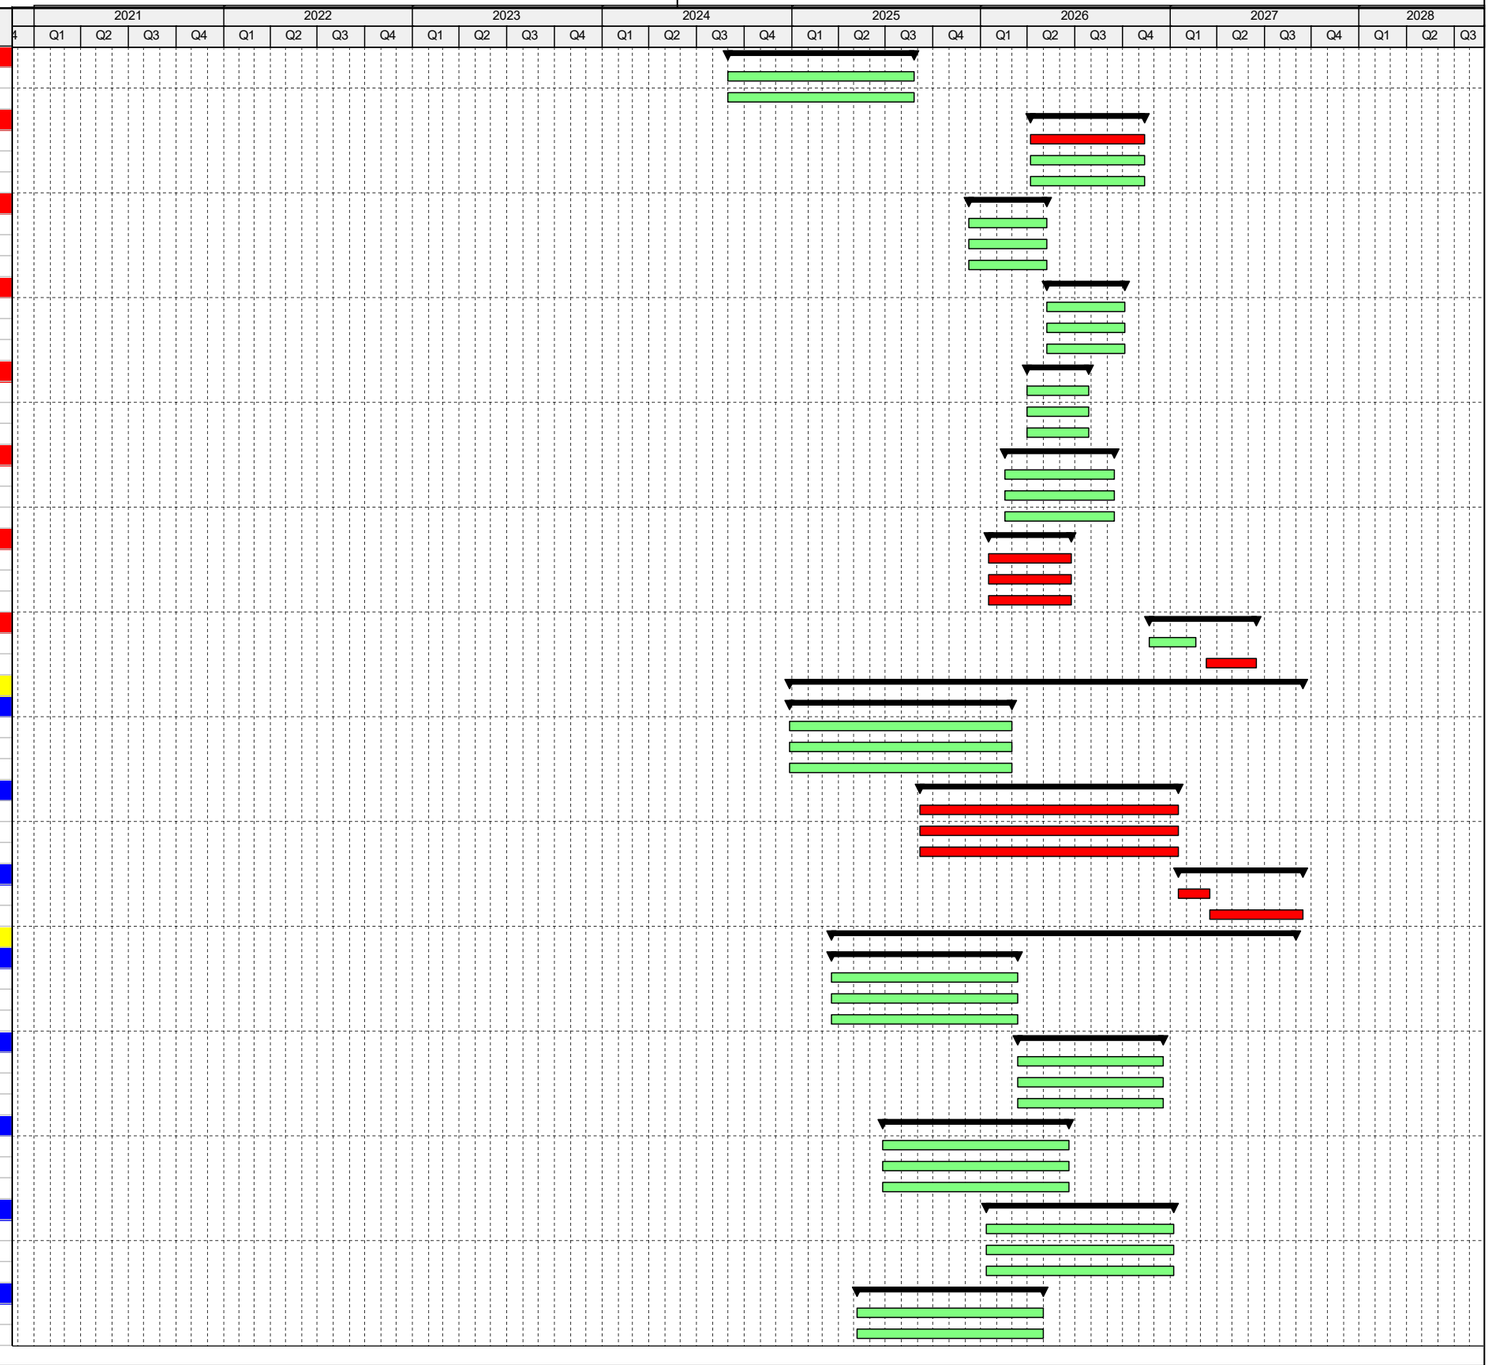


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-10070	UE513-Equipo de señalización para Patio taller de vehículos	360	07-May-25	02-May-26
PLMB-T1-V04.2.18.6	UE514: Señalizacion y control de trenes - Suministro de todos las equipos.-K0+ 0(	320	18-Mar-25	01-Feb-26
C-9250	UE514 Equipo de señalización del centro de control	300	18-Mar-25	12-Jan-26
C-9260	UE514-equipo de señal de línea principal (estación, sección)	320	18-Mar-25	01-Feb-26
C-9270	UE514-Equipo de señalización para Patio taller de vehículos	300	18-Mar-25	12-Jan-26
PLMB-T1-V04.2.18.7	UE515: Señalizacion y control de trenes - Instalacion de todos las equipos...-K20+	240	07-May-26	02-Jan-27
C-14420	UE515 Equipo de señalización del centro de control	240	07-May-26	02-Jan-27
C-14430	UE515-equipo de señal de línea principal (estación, sección)	240	07-May-26	02-Jan-27
C-14440	UE515-Instalación de equipos de señalización en Patio taller de vehículos	240	07-May-26	02-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.18.8	UE516: Señalizacion y control de trenes - Instalacion de todos las equipos...-K18+	195	02-Jan-27	16-Jul-27
C-16290	UE516 Equipo de señalización del centro de control	195	02-Jan-27	16-Jul-27
C-16300	UE516-equipo de señal de línea principal (estación, sección)	195	02-Jan-27	16-Jul-27
C-16310	UE516- Instalación de equipos de señalización en Patio taller	195	02-Jan-27	16-Jul-27
PLMB-T1-V04.2.18.9	UE517: Señalizacion y control de trenes - Instalacion de todos las equipos...-K12+	210	08-Jul-26	03-Feb-27
C-15140	UE517 Equipo de señalización del centro de control	210	08-Jul-26	03-Feb-27
C-15150	UE517-equipo de señal de línea principal (estación, sección)	210	08-Jul-26	03-Feb-27
C-15160	UE517- Instalación de equipos de señalización en Patio taller	210	08-Jul-26	03-Feb-27
PLMB-T1-V04.2.18.10	UE518: Señalizacion y control de trenes - Instalacion de todos las equipos...-K8+	120	03-Feb-27	03-Jun-27
C-16420	UE518 Equipo de señalización del centro de control	120	03-Feb-27	03-Jun-27
C-16430	UE518-equipo de señal de línea principal (estación, sección)	120	03-Feb-27	03-Jun-27
C-16440	UE518-Instalación de equipos de señalización en Patio taller de vehículos	120	03-Feb-27	03-Jun-27
PLMB-T1-V04.2.18.11	UE519: Señalizacion y control de trenes - Instalacion de todos las equipos...-K5+	240	02-May-26	28-Dec-26
C-14390	UE519 Equipo de señalización del centro de control	240	02-May-26	28-Dec-26
C-14400	UE519-equipo de señal de línea principal (estación, sección)	240	02-May-26	28-Dec-26
C-14410	UE519- Instalación de equipos de señalización en Patio taller	240	02-May-26	28-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.18.12	UE520: Señalizacion y control de trenes - Instalacion de todos las equipos...-K0+	240	05-Apr-26	01-Dec-26
C-14000	UE520 Equipo de señalización del centro de control	240	05-Apr-26	01-Dec-26
C-14010	UE520-equipo de señal de línea principal (estación, sección)	240	05-Apr-26	01-Dec-26
C-14020	UE520-Instalación de equipos de señalización en Patio taller de vehículos	240	05-Apr-26	01-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.18.13	UE521: Señalizacion y control de trenes - Pruebas de acuerdo a AT8	90	03-Jun-27	01-Sep-27
C-16620	UE521-Depuración de equipos	30	03-Jun-27	03-Jul-27
C-16640	Depuración conjunta de dispositivos UE521	60	03-Jul-27	01-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.19	Sistema de Puerta de Andén	906	18-Mar-25	10-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.19.1	UE522: Puerta de Anden Estación 1- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	18-Mar-25	13-Mar-26
C-9280	UE522-Equipo de puerta de estación	360	18-Mar-25	13-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.19.2	UE523: Puerta de Anden Estación 2- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	18-Mar-25	13-Mar-26
C-9290	UE523-Equipo de puerta de estación	360	18-Mar-25	13-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.19.3	UE524: Puerta de Anden Estación 3- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	18-Mar-25	13-Mar-26
C-9300	UE524-Equipo de puerta de estación	360	18-Mar-25	13-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.19.4	UE525: Puerta de Anden Estación 4- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	18-Mar-25	13-Mar-26
C-9310	UE525-Equipo de puerta de estación	360	18-Mar-25	13-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.19.5	UE526: Puerta de Anden Estación 5- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	18-Mar-25	13-Mar-26
C-9320	UE526-Equipo de puerta de plataforma	360	18-Mar-25	13-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.19.6	UE527: Puerta de Anden Estación 6- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	13-Mar-26	08-Mar-27
C-13530	UE527-Equipo de puerta de estación	360	13-Mar-26	08-Mar-27
PLMB-T1-V04.2.19.7	UE528: Puerta de Anden Estación 7- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	13-Mar-26	08-Mar-27
C-13540	UE528-Equipo de puerta de estación	360	13-Mar-26	08-Mar-27
PLMB-T1-V04.2.19.8	UE529: Puerta de Anden Estación 8- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	18-Mar-25	13-Mar-26
C-9330	UE529-Equipo de puerta de estación	360	18-Mar-25	13-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.19.9	UE530: Puerta de Anden Estación 9- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	18-Mar-25	13-Mar-26
C-9340	UE530-Equipo de puerta de estación	360	18-Mar-25	13-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.19.10	UE531: Puerta de Anden Estación 10- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	18-Mar-25	13-Mar-26
C-9350	UE531-Equipo de puerta de estación	360	18-Mar-25	13-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.19.11	UE532: Puerta de Anden Estación 11- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	18-Mar-25	13-Mar-26
C-9360	UE532-Equipo de puerta de estación	360	18-Mar-25	13-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.19.12	UE533: Puerta de Anden Estación 12- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	13-Mar-26	08-Mar-27
C-13550	UE533-Equipo de puerta de estación	360	13-Mar-26	08-Mar-27
PLMB-T1-V04.2.19.13	UE534: Puerta de Anden Estación 13- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	18-Mar-25	13-Mar-26
C-9370	UE534-Equipo de puerta de estación	360	18-Mar-25	13-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.19.14	UE535: Puerta de Anden Estación 14- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	13-Mar-26	08-Mar-27
C-13560	UE535-Equipo de puerta de estación	360	13-Mar-26	08-Mar-27
PLMB-T1-V04.2.19.15	UE536: Puerta de Anden Estación 15- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	18-Mar-25	13-Mar-26

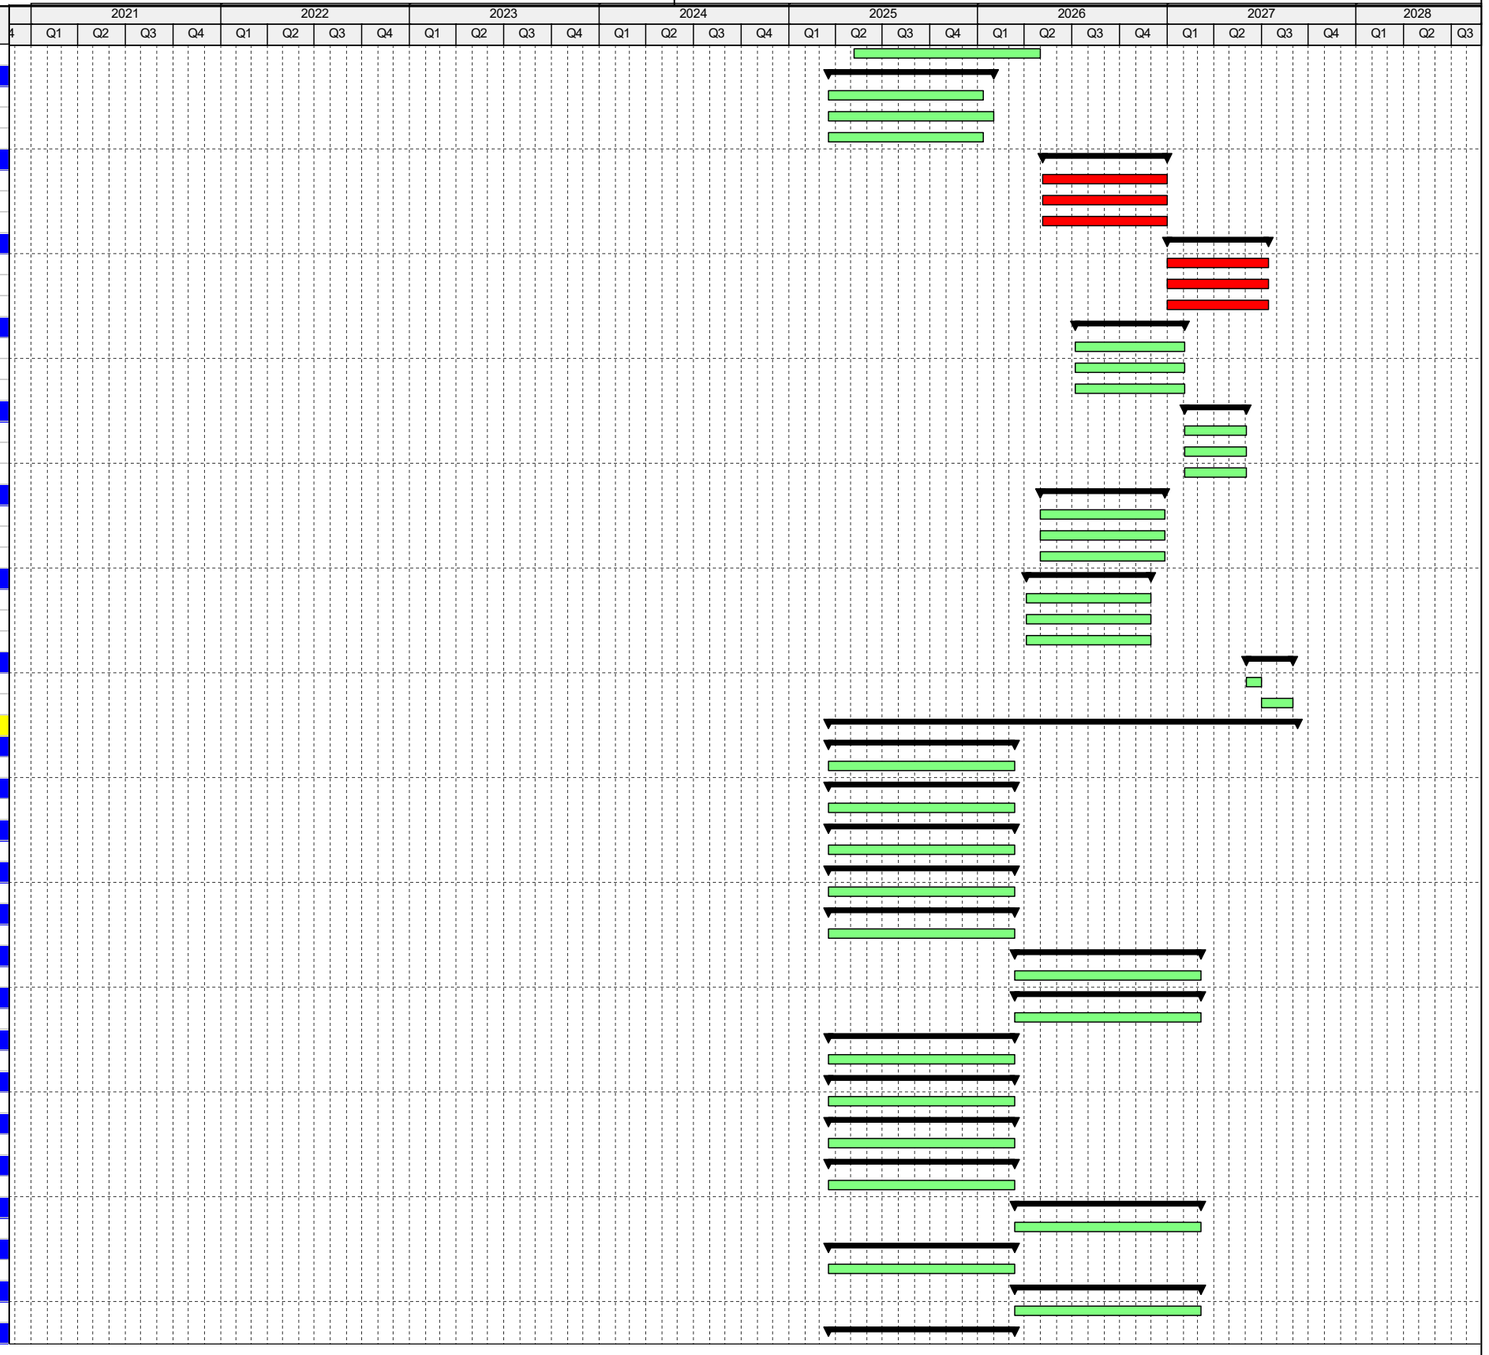


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-9380	UE536-Equipo de puerta de estación	360	18-Mar-25	13-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.19.16	UE537: Puerta de Anden Estación 16- Suministro todos Equipos Acorde AT.8	360	13-Mar-26	08-Mar-27
C-13570	UE537-Equipo de puerta de estación	360	13-Mar-26	08-Mar-27
PLMB-T1-V04.2.19.17	UE538: Puerta de Anden Estación 1-Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	08-Mar-27	07-May-27
C-16490	UE538-Instalación de puerta de plataforma	60	08-Mar-27	07-May-27
PLMB-T1-V04.2.19.18	UE539: Puerta de Anden Estación 2- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	17-Jan-27	18-Mar-27
C-16380	UE539-Instalación de puerta de plataforma	60	17-Jan-27	18-Mar-27
PLMB-T1-V04.2.19.19	UE540: Puerta de Anden Estación 3- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	13-Mar-26	12-May-26
C-13580	Instalación de puerta de plataforma UE540	60	13-Mar-26	12-May-26
PLMB-T1-V04.2.19.20	UE541: Puerta de Anden Estación 4- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	12-May-26	11-Jul-26
C-14550	UE541-Instalación de puerta de plataforma	60	12-May-26	11-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.19.21	UE542: Puerta de Anden Estación 5- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	09-May-26	08-Jul-26
C-14510	UE542-Instalación de puerta de plataforma	60	09-May-26	08-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.19.22	UE543: Puerta de Anden Estación 6- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	23-Apr-27	22-Jun-27
C-16580	Instalación de puerta de plataforma UE543	60	23-Apr-27	22-Jun-27
PLMB-T1-V04.2.19.23	UE544: Puerta de Anden Estación 7- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	22-May-27	21-Jul-27
C-16600	UE544-Instalación de puerta de plataforma	60	22-May-27	21-Jul-27
PLMB-T1-V04.2.19.24	UE545: Puerta de Anden Estación 8- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	12-May-26	11-Jul-26
C-14560	UE545-Instalación de puerta de plataforma	60	12-May-26	11-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.19.25	UE546: Puerta de Anden Estación 9- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	07-Jan-27	08-Mar-27
C-16320	UE546-Instalación de puerta de plataforma	60	07-Jan-27	08-Mar-27
PLMB-T1-V04.2.19.26	UE547: Puerta de Anden Estación 10- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	11-Jul-26	09-Sep-26
C-15180	UE547-Instalación de puerta de plataforma	60	11-Jul-26	09-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.19.27	UE548: Puerta de Anden Estación 11- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	08-Nov-26	07-Jan-27
C-16090	UE548-Instalación de puerta de plataforma	60	08-Nov-26	07-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.19.28	UE549: Puerta de Anden Estación 12- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	14-Apr-27	13-Jun-27
C-16570	UE549-Instalación de puerta de plataforma	60	14-Apr-27	13-Jun-27
PLMB-T1-V04.2.19.29	UE550: Puerta de Anden Estación 13- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	11-Jul-26	09-Sep-26
C-15190	Instalación de puerta de plataforma UE550	60	11-Jul-26	09-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.19.30	UE551: Puerta de Anden Estación 14- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	08-Mar-27	07-May-27
C-16500	Instalación de puerta de plataforma UE551	60	08-Mar-27	07-May-27
PLMB-T1-V04.2.19.31	UE552: Puerta de Anden Estación 15- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	09-Sep-26	08-Nov-26
C-15680	UE552-Instalación de puerta de plataforma	60	09-Sep-26	08-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.19.32	UE553: Puerta de Anden Estación 16- Instalación todos Equipos Acorde AT.8	60	08-Mar-27	07-May-27
C-16510	UE553-Instalación de puerta de plataforma	60	08-Mar-27	07-May-27
PLMB-T1-V04.2.19.33	UE554:Puerta de Anden - Pruebas - Sistema puerta de anden de acuerdo a lo est	80	22-Jun-27	10-Sep-27
C-16630	UE554-Depuración de equipos	50	22-Jun-27	11-Aug-27
C-16690	Depuración conjunta de dispositivos UE554	30	11-Aug-27	10-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.20	Sistemas de Comunicaciones	1255	02-Apr-24	09-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.20.1	UE555: Sistema de comunicaciones - Suministro de todos los equipos de acuerdo	360	02-Apr-24	28-Mar-25
C-5590	UE555-Suministro integrado del sistema de comunicación dedicado (incluido el cable)	360	02-Apr-24	28-Mar-25
C-5600	UE555- suministro de equipos de comunicación de troncales inalámbricos (incluido el c	360	02-Apr-24	28-Mar-25
C-5610	UE555-Suministro del sistema de control de acceso (incluido cable)	360	02-Apr-24	28-Mar-25
PLMB-T1-V04.2.20.2	UE556: Sistema de comunicaciones - Instalación de todos los equipos de acuerdo	480	28-Mar-25	21-Jul-26
C-9570	UE556-Instalación del sistema de comunicación especial	480	28-Mar-25	21-Jul-26
C-9580	UE556-Instalación de comunicación troncal inalámbrica	480	28-Mar-25	21-Jul-26
C-9590	UE556 Instalación del sistema de control de acceso	480	28-Mar-25	21-Jul-26
PLMB-T1-V04.2.20.3	UE557: Sistema de comunicación - Pruebas de acuerdo a AT8	415	21-Jul-26	09-Sep-27
C-15260	UE557-Depuración de equipos	180	21-Jul-26	17-Jan-27
C-16390	UE557-Depuración conjunta de dispositivos	235	17-Jan-27	09-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.21	Sistema de peaje	894	28-Mar-25	08-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.21.1	UE558: Sistema Peaje suministro de todos los equipos	180	28-Mar-25	24-Sep-25
C-9600	Equipo AFC UE558-Station	180	28-Mar-25	24-Sep-25
C-9610	UE558-Equipo AFC central	180	28-Mar-25	24-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.21.2	UE559: Sistema Peaje estación-1 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	90	19-Sep-26	18-Dec-26
C-15770	UE559-Instalación de equipos de emisión de billetes AFC	90	19-Sep-26	18-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.21.3	UE560: Sistema Peaje estación-2 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	114	23-Jan-27	17-May-27
C-16410	Instalación del equipo de emisión de billetes UE560-AFC	114	23-Jan-27	17-May-27
PLMB-T1-V04.2.21.4	UE561: Sistema Peaje estación-3 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	90	24-Sep-25	23-Dec-25
C-11590	UE561-Instalación de equipos de emisión de billetes AFC	90	24-Sep-25	23-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.21.5	UE562: Sistema Peaje estación-4 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	90	23-Dec-25	23-Mar-26
C-12710	Instalación del equipo de emisión de billetes UE562-AFC	90	23-Dec-25	23-Mar-26

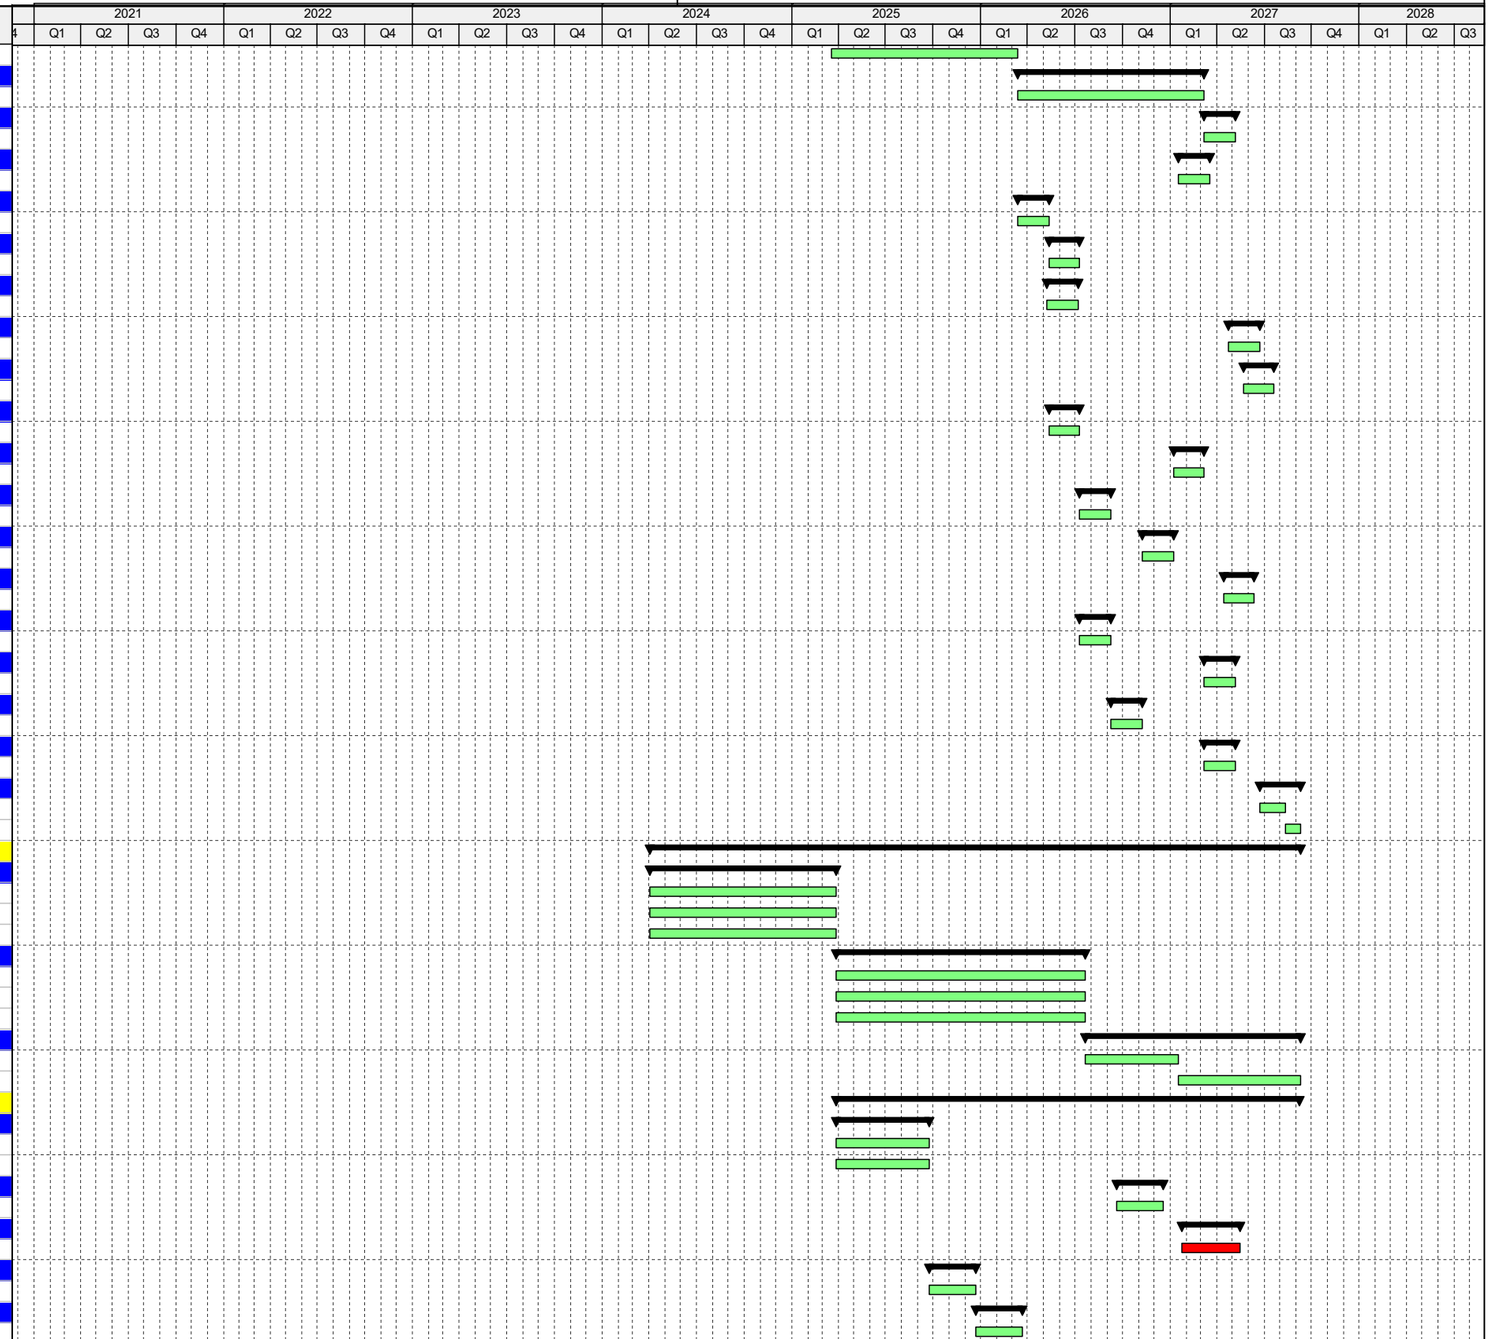


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
PLMB-T1-V04.2.21.6	UE563: Sistema Peaje estación-5 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	90	21-Jun-26	19-Sep-26
C-15020	Instalación del equipo de emisión de billetes UE563-AFC	90	21-Jun-26	19-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.21.7	UE564: Sistema Peaje estación-6 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	90	25-Oct-26	23-Jan-27
C-16030	UE564-Instalación de equipos de emisión de billetes AFC	90	25-Oct-26	23-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.21.8	UE565: Sistema Peaje estación-7 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	90	07-Jan-27	07-Apr-27
C-16350	Instalación del equipo de emisión de billetes UE565-AFC	90	07-Jan-27	07-Apr-27
PLMB-T1-V04.2.21.9	UE566: Sistema Peaje estación-8 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	90	24-Sep-25	23-Dec-25
C-11600	Instalación del equipo de emisión de billetes UE566-AFC	90	24-Sep-25	23-Dec-25
PLMB-T1-V04.2.21.10	UE567: Sistema Peaje estación-9 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	90	23-Mar-26	21-Jun-26
C-13810	UE567-Instalación de equipos de emisión de billetes AFC	90	23-Mar-26	21-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.21.11	UE568: Sistema Peaje estación-10 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	90	23-Dec-25	23-Mar-26
C-12720	UE568 Instalación de equipos de venta de entradas AFC	90	23-Dec-25	23-Mar-26
PLMB-T1-V04.2.21.12	UE569: Sistema Peaje estación-11 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	90	23-Mar-26	21-Jun-26
C-13820	UE569-Instalación de equipos de emisión de billetes AFC	90	23-Mar-26	21-Jun-26
PLMB-T1-V04.2.21.13	UE570: Sistema Peaje estación-12 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	90	19-Oct-26	17-Jan-27
C-15950	Instalación del equipo de emisión de billetes UE570-AFC	90	19-Oct-26	17-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.21.14	UE571: Sistema Peaje estación-13 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	90	21-Jun-26	19-Sep-26
C-15030	UE571-Instalación de equipos de emisión de billetes AFC	90	21-Jun-26	19-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.21.15	UE572: Sistema Peaje estación-14 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	90	19-Sep-26	18-Dec-26
C-15780	Instalación del equipo de emisión de billetes UE572-AFC	90	19-Sep-26	18-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.21.16	UE573: Sistema Peaje estación-15 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	90	18-Dec-26	18-Mar-27
C-16230	Instalación del equipo de emisión de billetes UE573-AFC	90	18-Dec-26	18-Mar-27
PLMB-T1-V04.2.21.17	UE574: Sistema Peaje estación-16 Instalacion de todos Equipos Acorde AT.8	90	19-Sep-26	18-Dec-26
C-15790	UE574-Instalación de equipos de emisión de billetes AFC	90	19-Sep-26	18-Dec-26
PLMB-T1-V04.2.21.18	UE575: Sistema de Peaje - Pruebas Acorde a AT.8	150	11-Apr-27	08-Sep-27
C-16560	UE575-Depuración de equipos	90	11-Apr-27	10-Jul-27
C-16650	Depuración conjunta de dispositivos UE575	60	10-Jul-27	08-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.22	Material Rodante	1710	08-Jan-23	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.22.20	UE576: Material rodante-25% de los materiales comprados	120	08-Jan-23	08-May-23
C-1260	Sistema de tracción y auxiliar	120	08-Jan-23	08-May-23
C-1270	Sistema de red	120	08-Jan-23	08-May-23
PLMB-T1-V04.2.22.21	UE577: material rodante-50% de los materiales comprados	100	08-May-23	16-Aug-23
C-2720	Sistema de freno	100	08-May-23	16-Aug-23
C-2730	Sistema de puertas	100	08-May-23	16-Aug-23
C-2740	Sistema de ventilación	100	08-May-23	16-Aug-23
C-2750	Fuelle	100	08-May-23	16-Aug-23
C-2760	Acoplador	100	08-May-23	16-Aug-23
C-2770	Placa de acero y acero conformado en frío	100	08-May-23	16-Aug-23
PLMB-T1-V04.2.22.22	UE578: material rodante-75% de los materiales comprados	100	16-Aug-23	24-Nov-23
C-3190	PIS	100	16-Aug-23	24-Nov-23
C-3210	Receptor	100	16-Aug-23	24-Nov-23
C-3220	Decoración interior	100	16-Aug-23	24-Nov-23
C-3230	Sistema de iluminación	100	16-Aug-23	24-Nov-23
C-3240	Batería y caja de batería	100	16-Aug-23	24-Nov-23
C-3250	Piso	100	16-Aug-23	24-Nov-23
C-3260	Tela de piso	100	16-Aug-23	24-Nov-23
C-3270	Silla	100	16-Aug-23	24-Nov-23
C-3280	Pupitre y gabinete eléctrico	100	16-Aug-23	24-Nov-23
C-3290	Parabrisas	100	16-Aug-23	24-Nov-23
C-3300	Ventana lateral de salón	100	16-Aug-23	24-Nov-23
PLMB-T1-V04.2.22.1	UE579: Material Rodante 100% Adquisicion de Materia prima materiales	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3200	Limpia parabrisas y Patio taller de agua	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3310	Sombrilla	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3320	Mangueras de freno y juntas de tubería	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3330	Conectores	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3340	Piezas fundidas y forjadas de bogies	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3350	Dispositivo de lubricación de la brida de la rueda	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3360	Amortiguador	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3370	Buffer	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3380	Dispositivo anti-escalada, dispositivo de absorción de energía	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3390	Varilla de tracción	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3400	Barra de torsión anti-balanceo	120	24-Nov-23	23-Mar-24

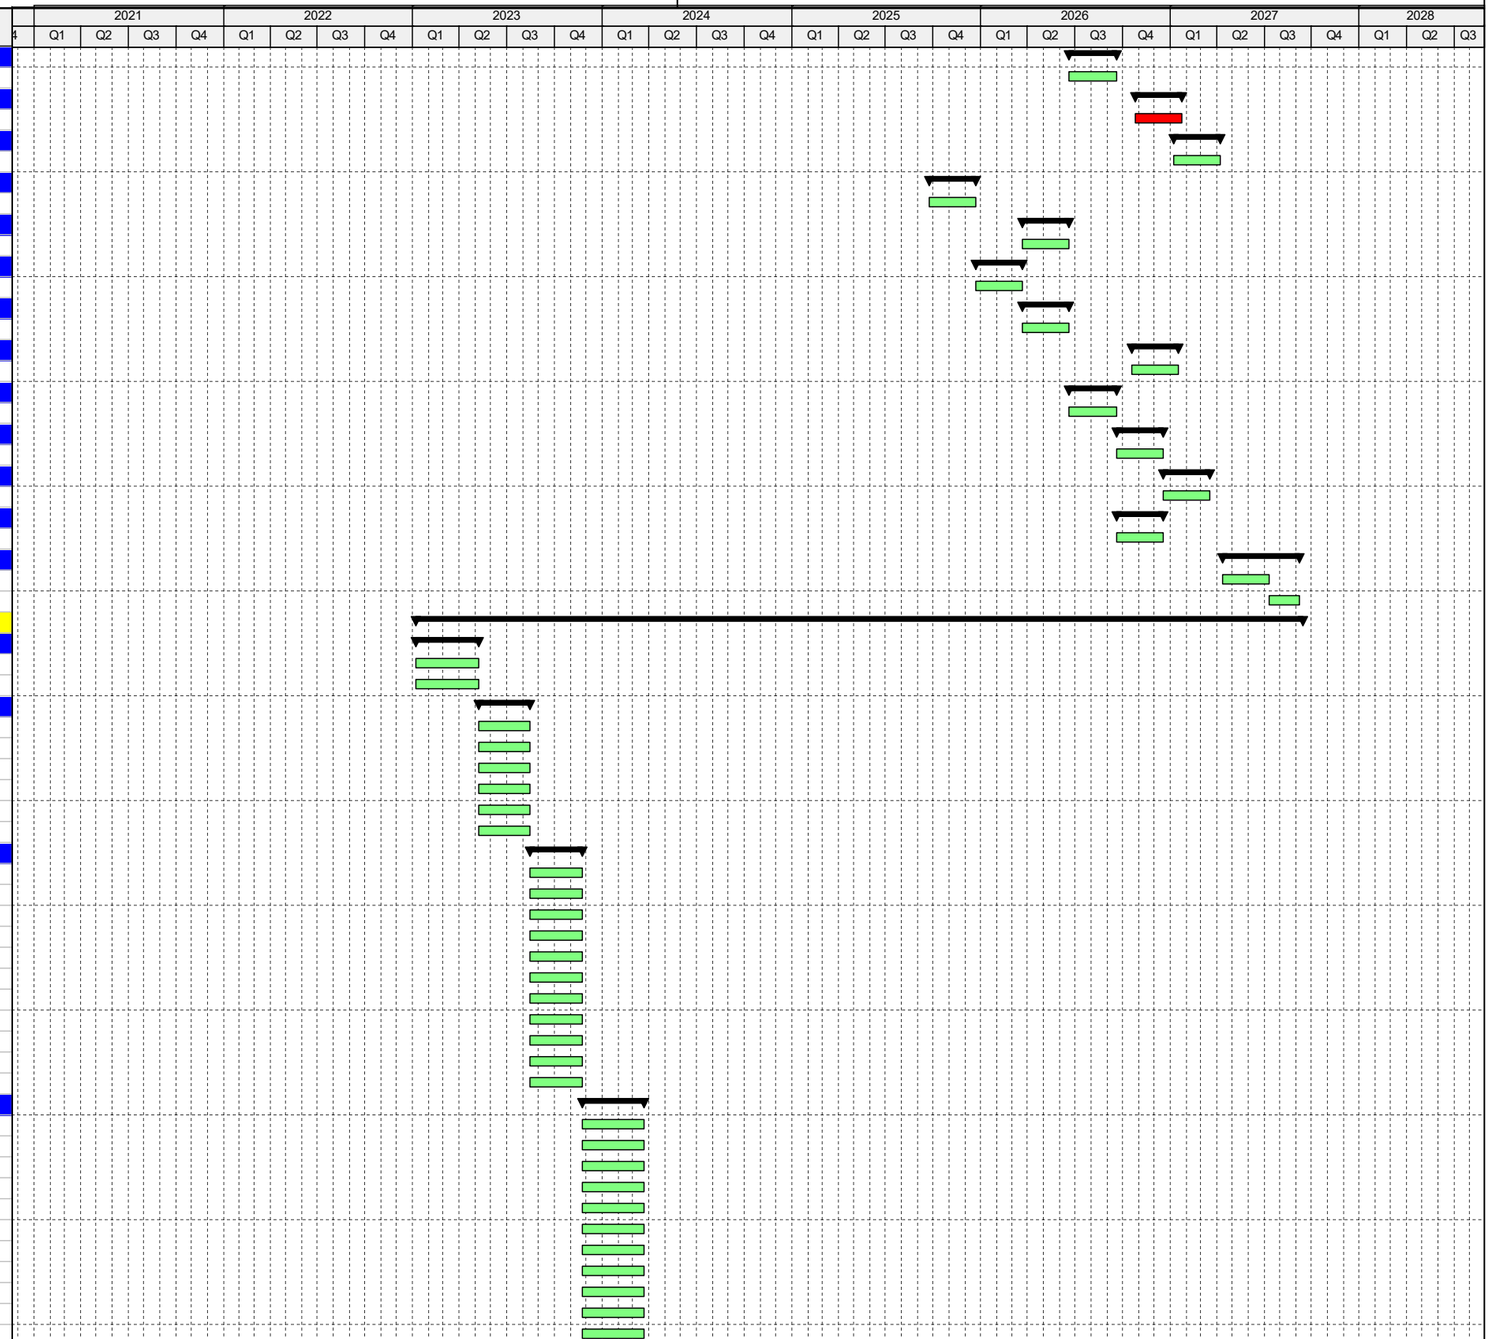

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-3410	Material anti-frío	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3420	Piezas de procesamiento de carrocería	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3430	Piezas de procesamiento de ensamblaje	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3440	Productos químicos de pintura	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3450	Pequeñas piezas no metálicas	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3460	Cierre	120	24-Nov-23	23-Mar-24
C-3470	Material auxiliar	120	24-Nov-23	23-Mar-24
PLMB-T1-V04.2.22.2	**UE580: Material Rodante - Pruebas en fábrica a el primer tren**	**790**	**07-Jul-23**	**04-Sep-25**
C-3800	UE580-Fabricación del tren	550	07-Jul-23	07-Jan-25
C-8460	UE580-Prueba e inspección en fábrica	240	07-Jan-25	04-Sep-25
PLMB-T1-V04.2.22.3	**UE581: Material Rodante Suministro y Pruebas del primer tren probado en Colom**	**380**	**04-Sep-25**	**19-Sep-26**
C-11390	UE581-Tansporte a sitio PLMB	240	04-Sep-25	02-May-26
C-15080	UE581-Prueba de depuración	87	24-Jun-26	19-Sep-26
PLMB-T1-V04.2.22.4	**UE582: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 1 (Dos trenes)**	**659**	**07-Jan-25**	**28-Oct-26**
C-8470	UE582-Fabricación y prueba en planta	240	07-Jan-25	04-Sep-25
C-10090	UE582-Prueba e inspección en fábrica (Tren N .2)	120	07-May-25	04-Sep-25
C-11400	UE582-Tansporte a Sitio PLMB	240	04-Sep-25	02-May-26
C-11420	UE582-Tansporte al lugar (Tren No. 2)	210	04-Sep-25	02-Apr-26
C-15610	UE582-Prueba de depuración	60	29-Aug-26	28-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.22.5	**UE583: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 2 (Dos trenes)**	**629**	**06-Feb-25**	**28-Oct-26**
C-8670	UE583-Fabricación y prueba en planta	240	06-Feb-25	04-Oct-25
C-11700	UE583-Tansporte a Sitio PLMB	240	04-Oct-25	01-Jun-26
C-15620	UE583-Prueba de depuración	60	29-Aug-26	28-Oct-26
PLMB-T1-V04.2.22.6	**UE584: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 3 (Dos trenes)**	**629**	**08-Mar-25**	**27-Nov-26**
C-9040	UE584-Fabricación y prueba en planta	240	08-Mar-25	03-Nov-25
C-12040	UE584-Tansporte a Sitio PLMB	210	03-Nov-25	01-Jun-26
C-15860	Depuración de prueba UE584	60	28-Sep-26	27-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.22.7	**UE585: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 4 (Dos trenes)**	**599**	**07-Apr-25**	**27-Nov-26**
C-9670	UE585-Fabricación y prueba en planta	240	07-Apr-25	03-Dec-25
C-12280	UE585-Tansporte a Sitio PLMB	210	03-Dec-25	01-Jul-26
C-15870	Depuración de prueba UE585	60	28-Sep-26	27-Nov-26
PLMB-T1-V04.2.22.8	**UE586: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 5 (Dos trenes)**	**619**	**07-May-25**	**16-Jan-27**
C-10080	UE586-Fabricación y prueba en planta	194	07-May-25	17-Nov-25
C-12090	UE586-Tansporte a Sitio PLMB	210	17-Nov-25	15-Jun-26
C-16110	Depuración de prueba UE586	60	17-Nov-26	16-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.22.9	**UE587: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 6 (Dos trenes)**	**590**	**06-Jun-25**	**17-Jan-27**
C-10410	UE587-Fabricación y prueba en planta	194	06-Jun-25	17-Dec-25
C-12420	UE587-Tansporte a Sitio PLMB	210	17-Dec-25	15-Jul-26
C-16120	Depuración de prueba UE587	61	17-Nov-26	17-Jan-27
PLMB-T1-V04.2.22.10	**UE588: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 7 (Dos trenes)**	**577**	**06-Jul-25**	**03-Feb-27**
C-10660	UE588-Fabricación y prueba en planta	194	06-Jul-25	16-Jan-26
C-12980	UE588-Tansporte a Sitio PLMB	210	16-Jan-26	14-Aug-26
C-16200	Depuración de prueba UE588	60	05-Dec-26	03-Feb-27
PLMB-T1-V04.2.22.11	**UE589: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 8 (Dos trenes)**	**587**	**05-Aug-25**	**15-Mar-27**
C-11190	UE589-Fabricación y prueba en planta	194	05-Aug-25	15-Feb-26
C-13190	UE589-Tansporte a Sitio PLMB	210	15-Feb-26	13-Sep-26
C-16370	UE589-Prueba de depuración	60	14-Jan-27	15-Mar-27
PLMB-T1-V04.2.22.12	**UE590: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 9 (Dos trenes)**	**597**	**04-Sep-25**	**24-Apr-27**
C-11410	UE590-Fabricación y prueba en planta	194	04-Sep-25	17-Mar-26
C-13590	UE590-Tansporte a Sitio PLMB	210	17-Mar-26	13-Oct-26
C-16460	Depuración de prueba UE590	60	23-Feb-27	24-Apr-27
PLMB-T1-V04.2.22.13	**UE591: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 10 (Dos trenes)**	**567**	**04-Oct-25**	**24-Apr-27**
C-11710	UE591-Fabricación y prueba en planta	194	04-Oct-25	16-Apr-26
C-14100	UE591-Tansporte a Sitio PLMB	210	16-Apr-26	12-Nov-26
C-16470	UE591-Prueba de depuración	60	23-Feb-27	24-Apr-27
PLMB-T1-V04.2.22.14	**UE592: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 11 (Dos trenes)**	**583**	**03-Nov-25**	**09-Jun-27**
C-12050	UE592-Fabricación y prueba en planta	194	03-Nov-25	16-May-26
C-14610	UE592-Tansporte a Sitio PLMB	210	16-May-26	12-Dec-26
C-16540	Depuración de prueba UE592	60	10-Apr-27	09-Jun-27
PLMB-T1-V04.2.22.15	**UE593: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 12 (Dos trenes)**	**553**	**03-Dec-25**	**09-Jun-27**
C-12290	UE593-Fabricación y prueba en planta	194	03-Dec-25	15-Jun-26
C-14950	UE593-Transporte a Sitio PLMB	210	15-Jun-26	11-Jan-27

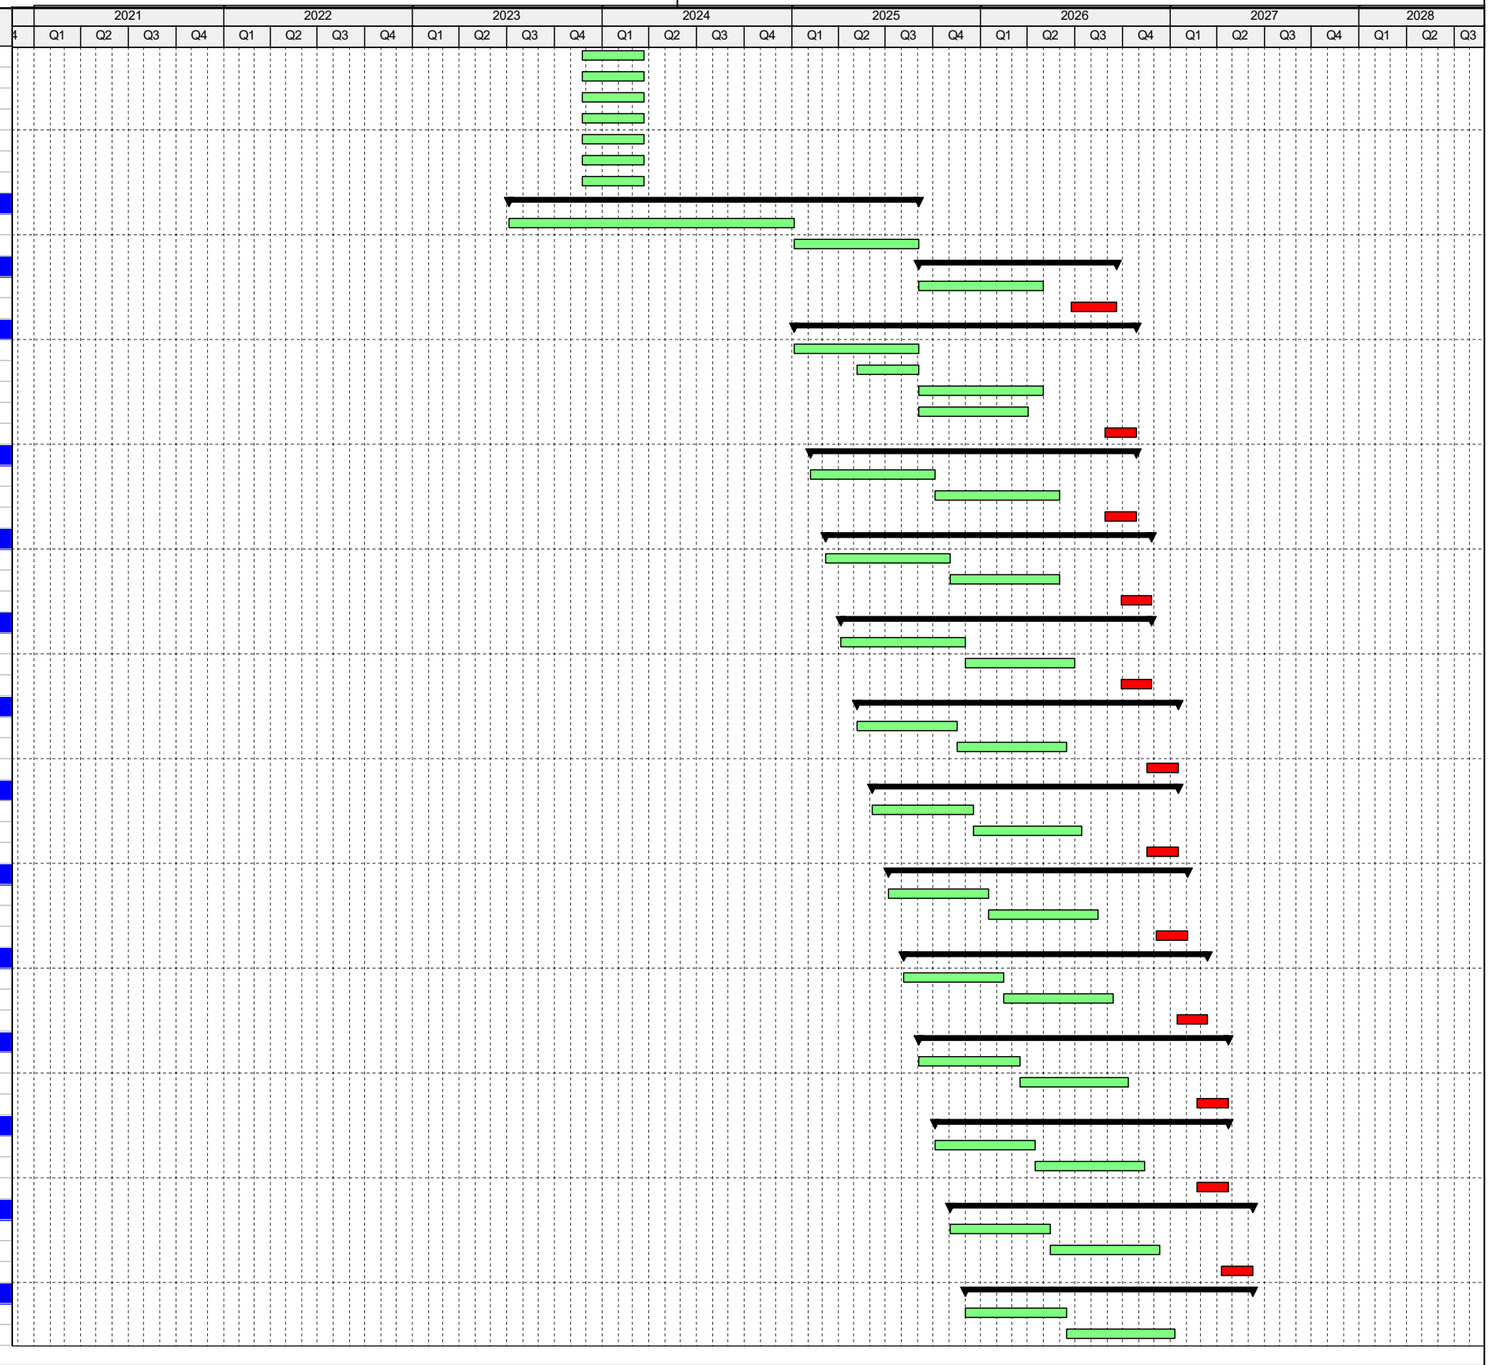


Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
C-16550	UE593-Prueba de depuración	60	10-Apr-27	09-Jun-27
PLMB-T1-V04.2.22.16	UE594: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 13 (Dos trenes)	573	02-Jan-26	29-Jul-27
C-12830	UE594-Fabricación y prueba en planta	194	02-Jan-26	15-Jul-26
C-15210	UE594-Ttansporte a Sitio PLMB	210	15-Jul-26	10-Feb-27
C-16610	UE594-Prueba de depuración	60	30-May-27	29-Jul-27
PLMB-T1-V04.2.22.17	UE595: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 14 complementarios (L	583	01-Feb-26	07-Sep-27
C-13180	UE595-Fabricación y prueba en planta	194	01-Feb-26	14-Aug-26
C-15490	UE595-Ttansporte a Sitio PLMB	210	14-Aug-26	12-Mar-27
C-16660	Depuración de prueba UE595	50	19-Jul-27	07-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.22.18	UE596: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 15 complementarios (U	568	16-Feb-26	07-Sep-27
C-13200	UE596-Fabricación y prueba en planta	194	16-Feb-26	29-Aug-26
C-15630	UE596-Ttansporte a Sitio PLMB	210	29-Aug-26	27-Mar-27
C-16670	Depuración de prueba UE596	50	19-Jul-27	07-Sep-27
PLMB-T1-V04.2.22.19	UE597: Material Rodante Suministro Trenes (con prueba) 16 complementarios (L	545	18-Mar-26	14-Sep-27
C-13600	UE597-Fabricación y prueba en planta	194	18-Mar-26	28-Sep-26
C-15880	UE597-Ttansporte a Sitio PLMB	210	28-Sep-26	26-Apr-27
C-16680	Depuración de prueba UE597	57	19-Jul-27	14-Sep-27
PLMB-T1-V04.3	FASE DE PRUEBAS, CERTIFICACIONES Y PUESTA EN MARCHA	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1	Gestion Social	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1	PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO SOCIAL	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.1	PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN PUBLICA	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.1.1	Plan Estratégico de Comunicaciones	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10007	Presentar propuesta de implementación del PEC (Dentro de los 15 días hábiles de ca	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10008	Mantener informada a la comunidad sobre el desarrollo de las actividades	170	14-Sep-27	02-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.1.2	Sistema de información "Metro comunica" (Páqina web, mini site, Redes s	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10009	Mantener informada a la ciudadanía sobre alcance, tiempo, actividades y caracterísitca	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10010	Entrega de parrilla de información (mensual)	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10011	Encuesta de percepción y satisfacción (semestral)	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.1.3	Metro en cifras de cumplimiento: Aplicación de encuestas de percepción	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10012	Medición y evaluación de cumplimiento de indicadores (Mensual)	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.1.4	Metro de Bogota es cultura	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10013	Campañas, estrategias espacios lúdicos y pedagógicos	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.1.5	Mecanismos de Divulgación del Proyecto	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10014	Funcionamiento oficina fija por frente de obra según necesidad	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10015	Disponibilidad puntos móviles de atención por frente de obra según necesidad	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10016	Entrega de volantes, afiches, folletos, infografía (Divulgación debe hacerse mín. 5 días	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10017	Tecnologías de información y comunicación	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.2	PROGRAMA METRO ESCUCHA, METRO RESUELVE	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10002	Atención al ciudadano	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10018	Generación de reportes (mensuales, trimestrales y anuales)	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10019	Comunicación y atención de PQRS- "Metro escucha - Metro resuelve"	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.3	PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10020	Medidas de mitigación ante corte de SP (Plantas de energia, carro tanques)	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10021	Gestión con Empresas de Servicios Públicos (Coordinar con entidades minimo una ser	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10022	Reuniones con directivas Centros Educativos (Semestral)	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10023	Comités de Participación Zonal (Frecuencia Bimestral)	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10024	Reuniones informativas, extraordinarias y/o atencion a veedurias	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.4	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCION	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10025	Proyecto de Fortalecimiento ciudadano	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10026	Fortalecimiento al control social	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10105	Reporte semestral (Mecanismo de control y seguimiento)	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.5	PROGRAMA DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10003	La EMB determinara de forma puntual la vinculación del Concesionario a la Mesa Inter	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10027	Según las necesidades de articulación interinstitucional, se remitir a la EMB un informe	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.6	PROGRAMA DE CULTURA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10028	Taller de Movilidad Sostenible (Frecuencia Cuatrimestral)	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10029	Capacitación para conductores vinculados al proyecto	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10030	Prevención de accidentes	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10031	Coordinación con el sector Salud para la Movilidad Sostenible	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.7	PROGRAMA DE PROTECCION A LA INSFRAESTRUCTURA Y BIENES DE TER	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10032	Registro Fílmico Vias de desvío	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10033	Atención para daños de bienes a terceros	180	14-Sep-27	12-Mar-28

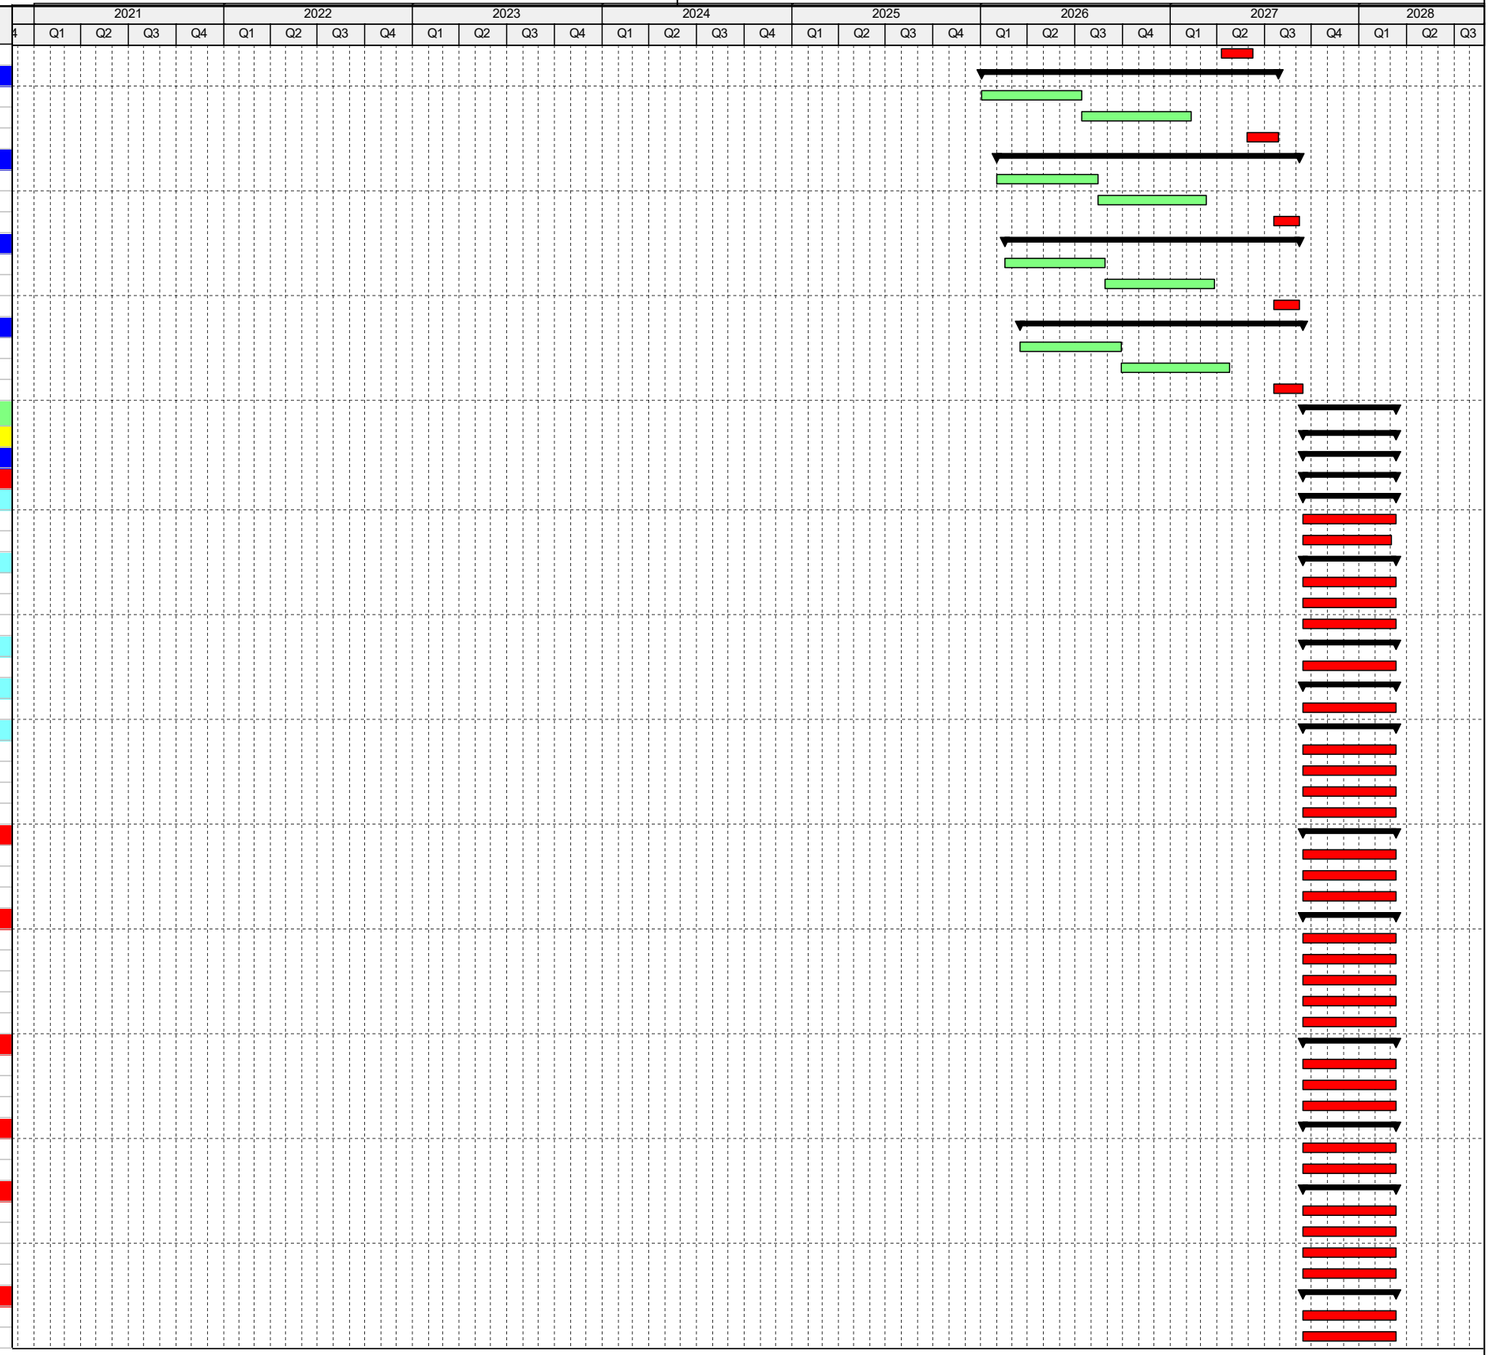


© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
T10034	Programa de acompañamiento en el control de las vibraciones	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10045	Cierre de las actas de vecindad	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10046	Proyecto de manejo de culatas y remanentes	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.8	PROGRAMA DE INCLUSION SOCIO LABORAL	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10004	Implementación de estrategia para la generación de empleo	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10035	Jornadas de capacitación	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.9	PROGRAMA DE MANEJO PARA LA SOSTENABILIDAD ECONOMICA DEL COM	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10036	Gestión cargue y descargue de mercancia	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.10	PROGRAMA DE MANEJO PARA OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10005	Monitoreo de las dinamicas del comercio informal en el AID del proyecto.(Frecuencia Q	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.11	PROGRAMA DE OBSERVATORIO DE OCUPACIÓN Y VALOR DEL SUELO	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10006	Recolectar la información solicitada por la EMB para aportar al seguimiento de las diná	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.12	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO URBANO DE LA PLMB	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10037	Proyecto de sensibilizar y capacitar al personal vinculado al Proyecto Metro	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.13	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10038	Divulgación de Planes de Manejo de Tránsito	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.1.14	PROGRAMA DE MANEJO PARA EL INFLUJO LABORAL	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10039	Jornadas de sensibilización para abordar el riesgo de violencia de genero	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10040	Comite zonal de participación de mujeres y personas LGBTI	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.2	INFORMES DE GESTIÓN	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.2.1	INFORMES DE GESTIÓN SOCIAL	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10042	Informes de Gestion Social (mensual)	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10047	Presentar Informes de Cierre de cada una de las fases (Etapa Preoperativa)	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.1.3	COMITÉS	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10043	Comite Social	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10044	Comités de seguimiento integrados SST, Ambiental y Social	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.2	Gestión Ambiental	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.2.1	PERMISOS AMBIENTALES	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.2.1.1	Pin de Generador de RCD - SDA	180	14-Sep-27	12-Mar-28
A1190	Envío del reporte mensual de RCD a SDA	180	14-Sep-27	12-Mar-28
A1200	Envío de radicación del reporte mensual a Interventoría	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.2.1.2	Permiso Generación de RCD - CAR	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10054	Entrega mensual del informe de implementación a la interventoría	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10075	Entrega de reporte de implementación de la fase de construcción a la CAR (45 días)	1	28-Oct-27	29-Oct-27
T10076	Entrega de radicación del reporte de implementación de la fase de construcción de la	1	30-Oct-27	31-Oct-27
PLMB-T1-V04.3.2.2	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.2.2.1	Informe de Cierre Ambiental para la Etapa Preoperativa	149	14-Oct-27	11-Mar-28
T10063	Elaboración del documento	97	14-Oct-27	19-Jan-28
T10084	Entrega a la Interventoría	1	19-Jan-28	20-Jan-28
T10085	Revisión de la Interventoría	10	19-Jan-28	29-Jan-28
T10086	Entrega al Concesionario	1	29-Jan-28	30-Jan-28
T10087	Ajustes del Concesionario	5	29-Jan-28	03-Feb-28
T10089	Revisión y Validación de la Interventoría	3	03-Feb-28	06-Feb-28
T10090	Entrega a la Interventoría	1	03-Feb-28	04-Feb-28
T10091	Remisión a la EMB	1	06-Feb-28	07-Feb-28
T10092	Revisión por la EMB	25	06-Feb-28	02-Mar-28
T10093	Entrega de EMB al Concesionario para ajustes	1	02-Mar-28	03-Mar-28
T10094	Atención de observaciones por el Concesionario	5	02-Mar-28	07-Mar-28
T10095	Revisión y Concepto de No Objeción de EMB y Entidades Multilaterlaes	3	07-Mar-28	10-Mar-28
T10096	No Objeción Ambiental y Social por la EMB	1	10-Mar-28	11-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.2.2.2	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10055	Actualización permanente del Sistema de Gestión SST	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10056	Entrega Anual de la certificación de implementación del SG-SST expedido por la ARL	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.2.2.3	Informe de cierre de Fase de Construcción de las actividades de Gestión Ambi	30	14-Sep-27	14-Oct-27
T10049	Elaboración del informe	30	14-Sep-27	14-Oct-27
T10062	Entrega del informe	0	14-Oct-27	14-Oct-27
PLMB-T1-V04.3.2.2.4	Plan de Gestión del Riesgo de Desastres	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10000	Actualización semestral	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.2.2.5	Matriz de Huella de Carbono	180	14-Sep-27	12-Mar-28
P18357	Levantameinto Matriz Huella de Carbono (Mensual)	180	14-Sep-27	12-Mar-28
A1140	Radicación del levantamiento de matriz huella de carbono (anual) a interventoría	67	05-Jan-28	12-Mar-28
A1150	Revisión y validación por interventoría	67	05-Jan-28	12-Mar-28

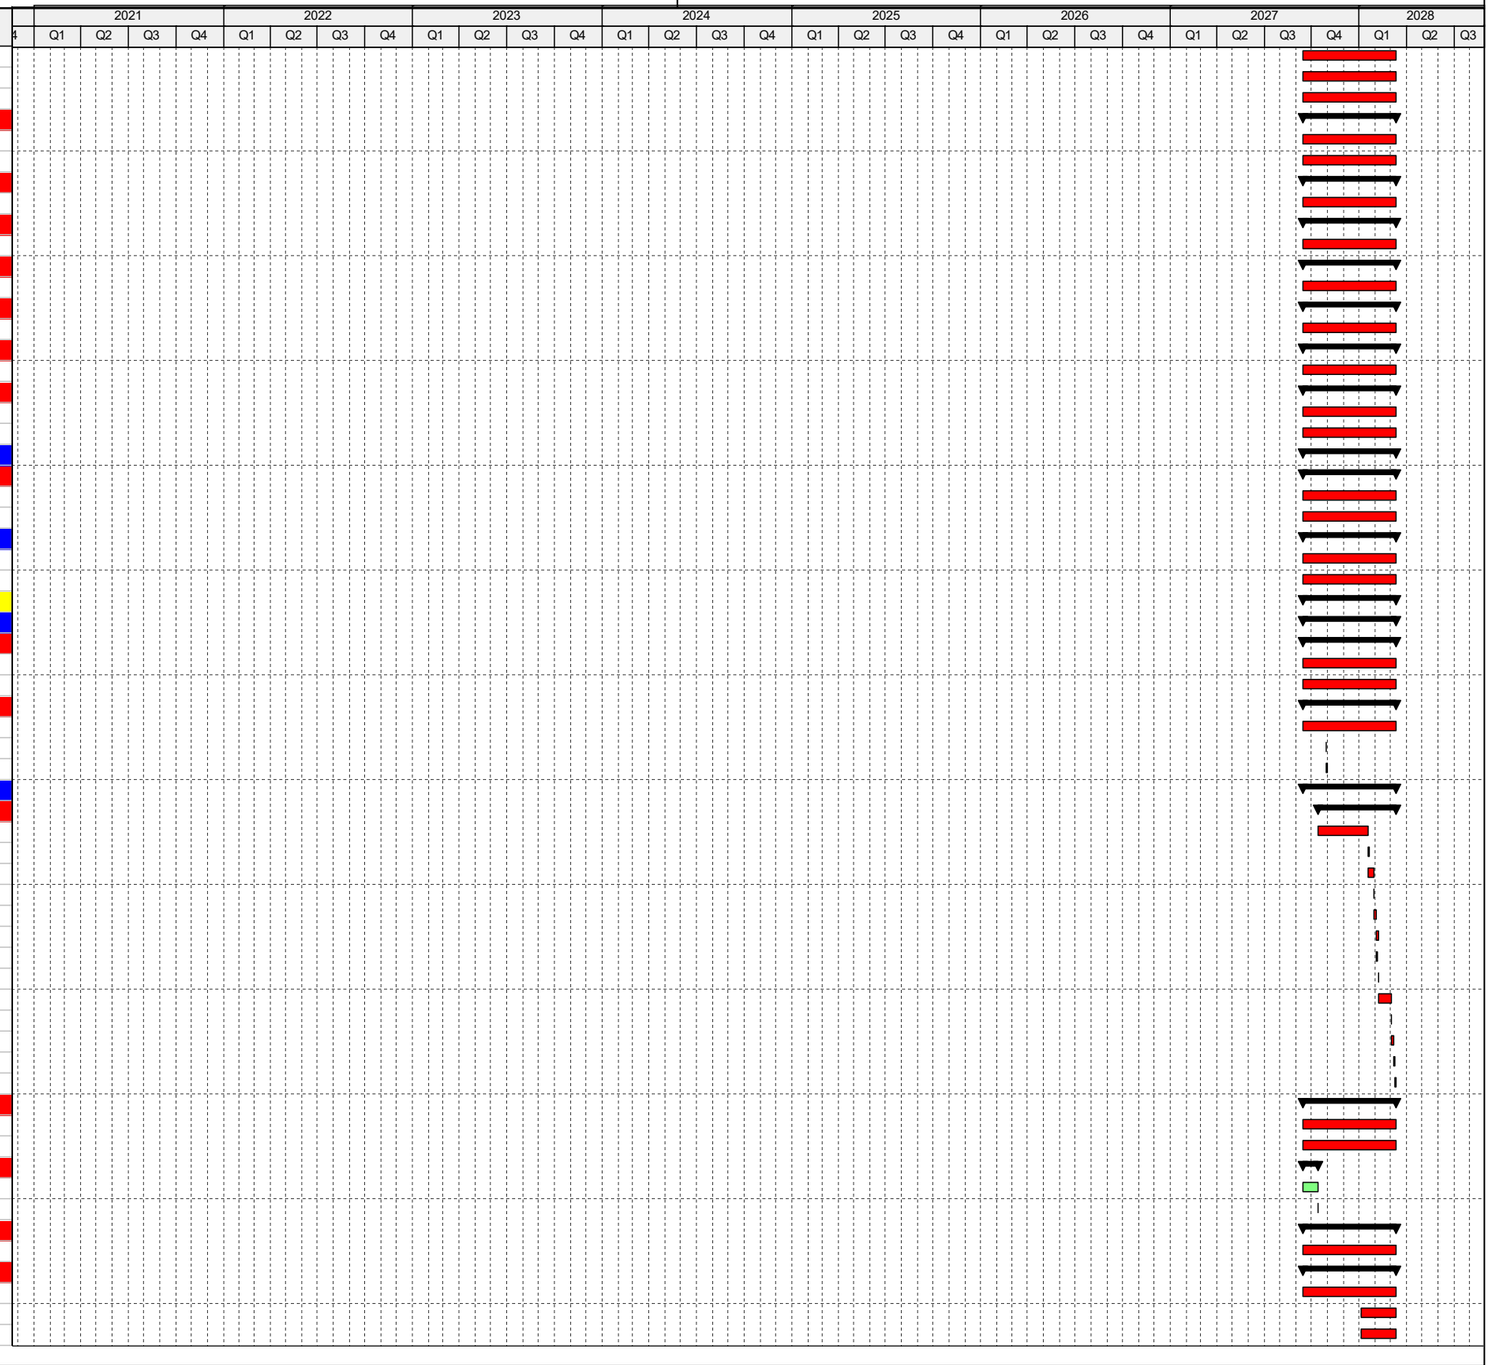

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish
A1160	Respuesta a observaciones por parte del concesionario	62	10-Jan-28	12-Mar-28
A1170	Revisión por interventoría	62	10-Jan-28	12-Mar-28
A1180	Radicación a EMB	57	15-Jan-28	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.2.2.6	Informe de Avance mensual de la Gestión Ambiental y SST por cada frente de c	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10050	Elaboración del Informe	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10064	Entrega del Informe a la Interventoría	147	17-Oct-27	12-Mar-28
T10065	Revisión del Informe por la interventoría	147	17-Oct-27	12-Mar-28
T10072	Entrega de observaciones de la Interventoría al Concesionario	137	27-Oct-27	12-Mar-28
T10073	Atención de observaciones de la Interventoría por el Concesionario	137	27-Oct-27	12-Mar-28
T10077	Revisión y validacion de las observaciones por la Interventoría	127	06-Nov-27	12-Mar-28
T10078	Remisión del Informe a la EMB	127	06-Nov-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.2.2.7	Comite Ambiental y SST Semanal	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10052	Comite Ambiental y SST que se realiza semanal	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.2.2.8	Comite Integral Mensual	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10053	Comite Intergral que se realiza una vez al mes	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.2.3	IMPLEMENTACIÓN	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.2.3.1	Implementación PMAS y PMS del EIAS	180	14-Sep-27	12-Mar-28
T10048	Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social y Plan de Monitoreo y Seguimi	180	14-Sep-27	12-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.01	Preparación antes de la prueba	5	14-Sep-27	19-Sep-27
PLMB-T1-V04.3.01.1	En las instalaciones de material compuesto	5	14-Sep-27	19-Sep-27
T10001	Examen de preparación	5	14-Sep-27	19-Sep-27
PLMB-T1-V04.3.02	Ensayos, Certificación y Puesta en Marcha	145	20-Sep-27	11-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.02.1	Prueba	134	20-Sep-27	28-Feb-28
PLMB-T1-V04.3.02.1.01	Prueba de fábrica	90	20-Sep-27	07-Jan-28
T10057	Prueba de escritura	25	20-Sep-27	19-Oct-27
T10068	Inspección de fábrica	15	20-Oct-27	06-Nov-27
T10079	Prueba de subsistema (en planta)	25	08-Nov-27	07-Dec-27
T10082	Prueba de integración (en planta)	25	09-Dec-27	07-Jan-28
PLMB-T1-V04.3.02.1.02	Prueba solo sistema	134	20-Sep-27	28-Feb-28
T10058	Prueba de un solo equipo	90	20-Sep-27	07-Jan-28
T10083	Pruebas y pruebas de subsistemas	44	08-Jan-28	28-Feb-28
PLMB-T1-V04.3.02.2	Depuración	60	20-Sep-27	01-Dec-27
PLMB-T1-V04.3.02.2.01	Conjunto integral de depuración	60	20-Sep-27	01-Dec-27
T10059	Depuración de EMU	30	20-Sep-27	25-Oct-27
T10071	depuración del sistema	30	26-Oct-27	01-Dec-27
PLMB-T1-V04.3.02.3	Ejecución de Prueba	50	02-Dec-27	31-Jan-28
T10081	Ejecucion de pruebas	50	02-Dec-27	31-Jan-28
PLMB-T1-V04.3.02.4	Certificación	35	01-Feb-28	11-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.02.4.01	Certificación de seguridad independiente	35	01-Feb-28	11-Mar-28
T10088	Certificaciones	35	01-Feb-28	11-Mar-28
PLMB-T1-V04.3.02.5	Reporte Final	90	26-Nov-27	11-Mar-28
T10080	Elaborar Reporte final	90	26-Nov-27	11-Mar-28

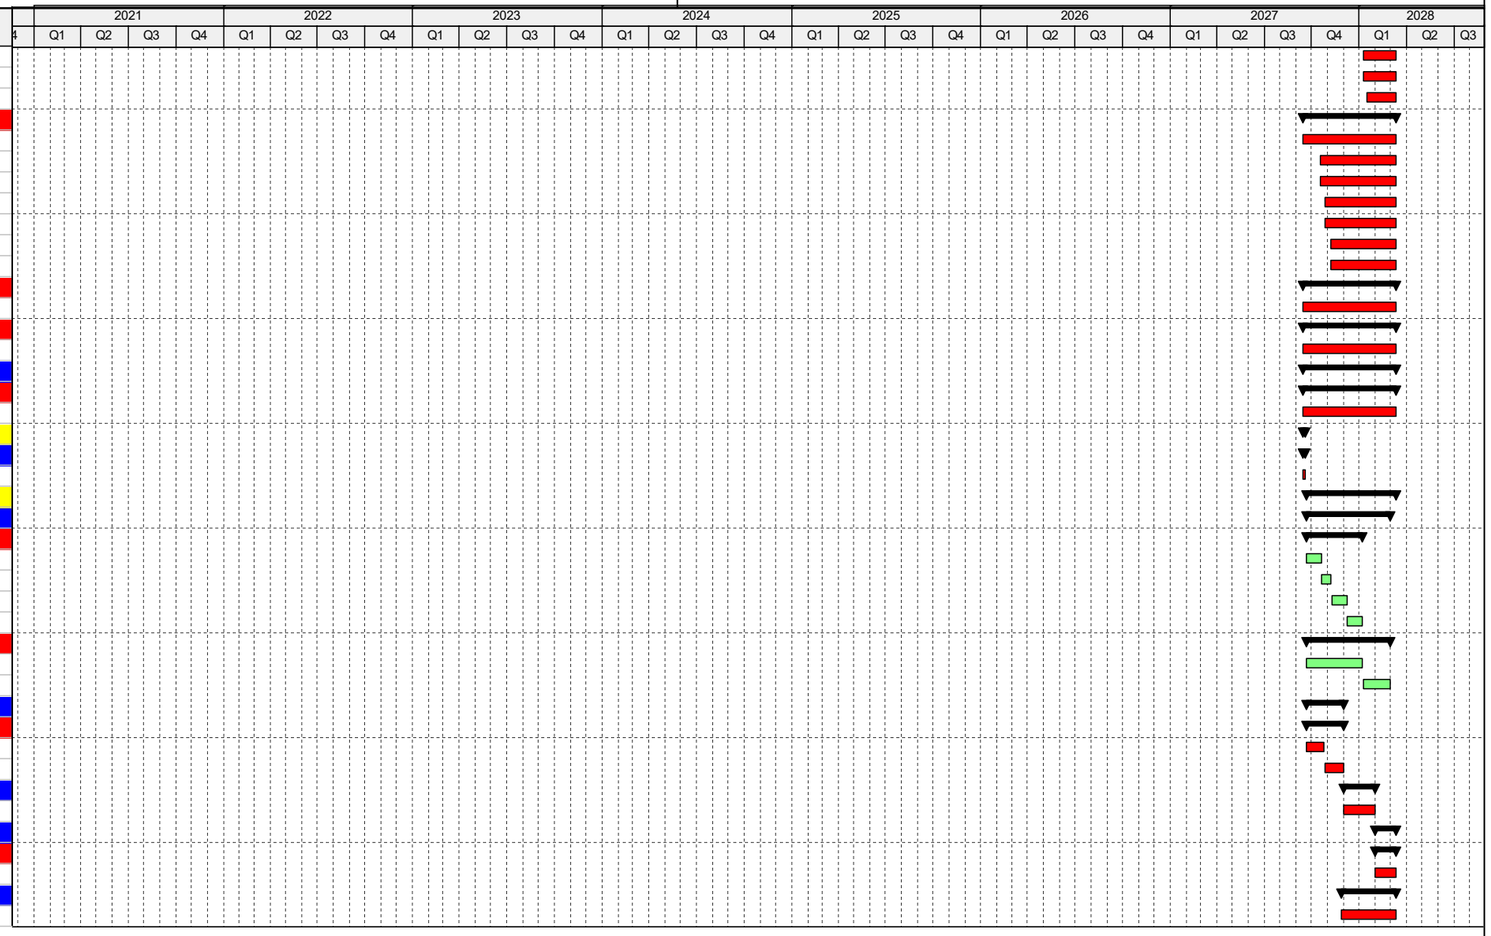

© Oracle Corporation
